Actas de comité

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	ACTA DE REUNION	PAGINAS	1 de 4

269

PROCESO: _____

DEPENDENCIA: _____

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- ☐ Consejo _____
- ☒ Comité _____
- ☐ Reunión _____
- ☐ Otro _____

ACTA N°		FECHA	17 - octubre - 2023.	
LUGAR				
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	Julián Molina	80791603	Residente Win	jmolinama123@gmail.
	Ismael Gutierrez	19 379 912	R.L suplente Obra	ismael6h26@yahoo.es
	Norma P. Luna Hernandez	40.441.590	Representante Legal	normaplona1518@gmail.com
	Hareo Julio Yáñez U.	13,450.383	Director de Obra	ager.mdecatyanez@gmail.com
	Mauricio [illegible]	11704391	Supervisor	—
INVITADOS	Lorna Villanueva Gomez	1022378888	Interventoria	administracion@integroup.com
	Miguel Cantor		R.L Interventoria	administracion@integroup.com
	Camila Brochero	1007445269	Interventoria	gerenciatecnica@integroup.com

1. OBJETIVO DE LA REUNION

- Firma Acta de inicio
- Presentación equipos de trabajo obra e interventoria
- Revisión tecnica para iniciar obra.

2. ORDEN DEL DÍA

1. Se inicia con el comite a las 8:30 am con presencia del equipo contratista, interventoria y supervisión.
   - Se realiza presentación de los asistentes.
   - Se procede a dar revisión de las actas de inicio.
   - Se manifiesta situaciones técnicas que involucran directamente el inicio a la ejecución de la obra.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	2 de 4

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- Una vez validadas las actas de inicio se da la respectiva suscripción de estas, con la firma de los representantes legales y supervisión.

- El contratista manifiesta tener adelantado un balance del Contrato en el que se incluye las cantidades y actividades requeridas según diseños. Sin embargo se deja en claridad que este debe ser revisado por interventoria y a su vez supervisión con el planeador del proyecto para definir realmente cuál es el alcance del contrato, y que actividades deben ser priorizadas.

- Respecto a los diseños el contratista indica: No encontrar,
  - Diseño de Filtros y ubicaciones no se encuentran.
  - Ubicación y detalles de cajas inspección.
  - Ubicación y detalle de hidrantes.
  - (Caja) Redes de aguas lluvias y negras indicando su llegada.
  - Detalles y ubicación pozos de aguas negras
  - Detalles y ubicación tuberias de drenaje.
  - Aclarar ubicación loceta prefabricada incluida en el presupuesto.
  - Detalles de planimetria y especificaciones
- Se indica a supervisión (como es el proceso) la necesidad de conocer cuál es el proceso para hacer modificatorios del Contrato, quien realizará las consultas pertinentes para definir cual es el proceder.

- Profesional SST de interventoria indica al contratista que cuando vaya a ingresar el personal operativo se debe remitir la documentación requerida según normatividad para aceptación de esta. Así mismo se remitirá oficio con los parametros que se Solicitara para la gestión SST.

4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- Se realizará reunión entre contratista e interventoria el dia Jueves 19/10/23 a las 2:00 pm para revisión del balance y luego proceder a dar concenso de este con el supervisor para definir.
- El contratista indica que las actividades programadas a realizar esta semana serán temas de topografia y balance.

5. ANEXOS

-

6. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO

FIRMAS

SUPERVISOR

40 441.590

Director de obra

Residente interventoria.

Prof. SST.

Interventoría.

Interventoría.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 4

PROCESO: 27 de Octubre de 2023

DEPENDENCIA: Obras Publicas - Alcaldia Municipal de Chia

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- ☐ Consejo
- ☑ Comité
- ☐ Reunión
- ☐ Otro

ACTA N°	2	FECHA	27 de Octubre de 2023	
LUGAR				
	NOMBRE	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO/DEPENDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
ASISTENTES	Julian Molina	80 791 603	Residente Contratista	
	Marco Tulio	13 950 383	Contratista	
	Ismael Gutierrez	19 379 912	RL Suplente. Contratista	
	Mauricio Cantor		Interventoria	
INVITADOS	Mauricio Bueno		Supervisor.	

1. OBJETIVO DE LA REUNIÒN

- Revisión de Planos Arquitectonicos
- Revision de diseños hidraulicos.
- Avance de obra - Seguimiento
- Revision planos electricos
- Levantamiento topografico.

2. ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de Planos Arquitectonicos:

Para las obras de urbanismos a ejecutar en lindero costado SUR del predio, la Interventoria sugiere un retroceso de 2 metros para dejar zona verde.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	2 de 4

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Por parte de la Supervisión solicité a diseñador, planos con detalle de cotas del proyecto.

- Revisión de diseños hidrosanitarios:

El contratista verifica el diseño hidrosanitario para definir instalación de fittings - solicita a la supervisión detalle.

Avance de Obra:

Se realizan verificación del avance de las actividades a la fecha se ha realizado cerramiento en tela verde (mayor cantidad) debido a que se hace necesario cerrar todo el predio, debido a las condiciones actuales del predio, con el aval de la Supervisión

Localización y replanteo ya realizaron levantamiento topográfico y están en actividades de implantación del proyecto.

- Revisión Planos Eléctricos

El contratista solicita aclaración de los planos existentes del proyecto la supervisión eleva solicitud a la consultoría, la cual esta pendiente dar respuesta

- Levantamiento topográfico:

Asiste a comité comisión topográfico

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	4 de 4

4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

. Próximo Comité 31 de octubre de 2023 en Obra
hora: 8:00 am

5. ANEXOS

6. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Modulación andenes	Compras/Contratista	1 de noviembre
Implantación del proyecto	Contratista	31 de Octubre
Detalle de los filtros	Supervisión	31 de Octubre

FIRMAS

Supervisor

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 4

PROCESO: _____

DEPENDENCIA: _____

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- ☐ Consejo _____
- ☑ Comité _____
- ☐ Reunión _____
- ☐ Otro _____

ACTA N°	3	FECHA	31 de Octubre. de 2023	
LUGAR				
	NOMBRE	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO/DEPENDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
ASISTENTES	Mauricio Bueno	1120439	S O P	mauricio.bueno@chia.gov.co
	Julian Molina		Residente de obra	
	Marco Julio Yañez		Director de obra	
	María del carmen Giral		SST contratista	
INVITADOS	Lorena villavecera		Interventoria	
	Katherin Toro	1.117503062	interventoria	—

1. OBJETIVO DE LA REUNIÒN

- Revision compromisos acta de comité N° 2
- Implantacion proyecto
- Avance de obra.
- Disposición de material

2. ORDEN DEL DÍA

1.

- El contratista entrega implantación del proyecto se realiza recorrido en compañia de la supervisión y la interventoria para verificación del estado actual del predio
de acuerdo a los compromisos del acta de comité N° 2 solo quedó Pendiente por parte del contratista, presentar la propuesta de la modulación

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	2 de 4

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La supervisión a la fecha no cuenta con el detalle de filtros, se espera la entrega para el próximo comité.

El contratista informa que se va iniciar actividades de limpieza y descapote en el predio - excavación a máquina. el dia 1 de noviembre Están realizando construcción del (de>() campamento.

Se debe verificar la disposición del material el sitio autorizado así como la ubicacion, para el respectivo ajuste en balance de Kilómetros km adicionales al ítem contractual (5km).

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	4 de 4

4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÒN

Próximo comité 7 de noviembre de 2023 Hora: 8 am
lugar Predio - sitio de la Obra

5. ANEXOS

- Documentos entregados por el Contratista Total folios 252 y Oficio de radicación.

6. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
· Detalles planos hidrosanitarios	Supervisión	7 de noviembre

FIRMAS

SUPERVISOR

1345038 3
Marco T. Yañez V.

80791603
Julián Molina

1937997 Z
Ismael Gafoores

79157021

1069098383

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 4

PROCESO: Construcción de la primera Etapa del parque de la mujer en el municipio de chía cundinamarca.

DEPENDENCIA: _____

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- ☐ Consejo _____
- ☑ Comité _____
- ☐ Reunión _____
- ☐ Otro _____

ACTA N°	4	FECHA	7 de noviembre de 2023	
LUGAR				
	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
ASISTENTES	Mauricio Bueno		Supervisión	
	Mauricio Cantor		Interventoría	
	Julian Molina		Contratista	
	Ismael Gutierrez		Contratista	
INVITADOS				

1. OBJETIVO DE LA REUNIÒN

- Seguimiento avance de obra
- Revisión documentación entregada por el contratista

2. ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento avance de obra: Se realiza recorrido en compañía de la supervisión, contratista e interventoría. En obra se encuentran realizando excavaciones y construcción del campamento, y baños.
2. Se envia por parte de la Interventoría solicitud al contratista de revisión del analisis de los precios unitarios.

Quien enviará los ajustes el próximo jueves 9 de noviembre de 2023.

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- En obra se encuentra
  - 1 residente de obra
  - 1 profesional de SST
  - Comisión topografica (2)
  - 1 oficial
  - 2 ayudantes
  - 1 operador Grúa - retroexcavadora
- Se verifica en sitio conexiones de desagüe (aguas lluvias)
- Se solicita programación de obra ajustada al contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	4 de 4

4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÒN

5. ANEXOS

6. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Ajuste análisis de precios unitarios	Contratista	9 de noviembre
Programación de Obra	Contratista	9 de noviembre
Implantación proyecto en terreno	Contratista	14 de noviembre

FIRMAS

Supervisor. Residente

TOPOGRAFO

Interventoria

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 5

PROCESO: _____

DEPENDENCIA: _____

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- ☐ Consejo _____
- ☒ Comité _____
- ☐ Reunión _____
- ☐ Otro _____

ACTA N°		FECHA		
LUGAR				
	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
ASISTENTES	Mauricio Bueno		Supervisión	
	Miguel Cantor		Interventoría	
	Julian Molina		Contratista	
INVITADOS	Ricardo Gonzalez		Contratista	
	Mario Tito Yanez		Contratista	

1. OBJETIVO DE LA REUNIÒN

- Seguimiento avance de obra
- Entrega documentacion

2. ORDEN DEL DÍA

1. Recepcion de documentos
   Se reciben documentos del analisis de precios unitarios
   Se recibe balance y no previstos para revision de la interventoria

- El contratista presenta las propuestas de urbanismo y detalles hidraulicos
- la interventoria solicita entregar las propuestas definitivas para su revision y aprobacion
- Se programa reunion entre contratista y interventoria reunion para la verificacion del balance.
- la supervision solicita mantener el alcance del contrato con la verificacion del balance.

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	4 de 5

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÒN


5. ANEXOS

6. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Entrega Detalles hidraulicos	Contratistas	16/11/2023
Entrega Detalles Urbanistas	Contratistas.	16/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	5 de 5

FIRMAS		

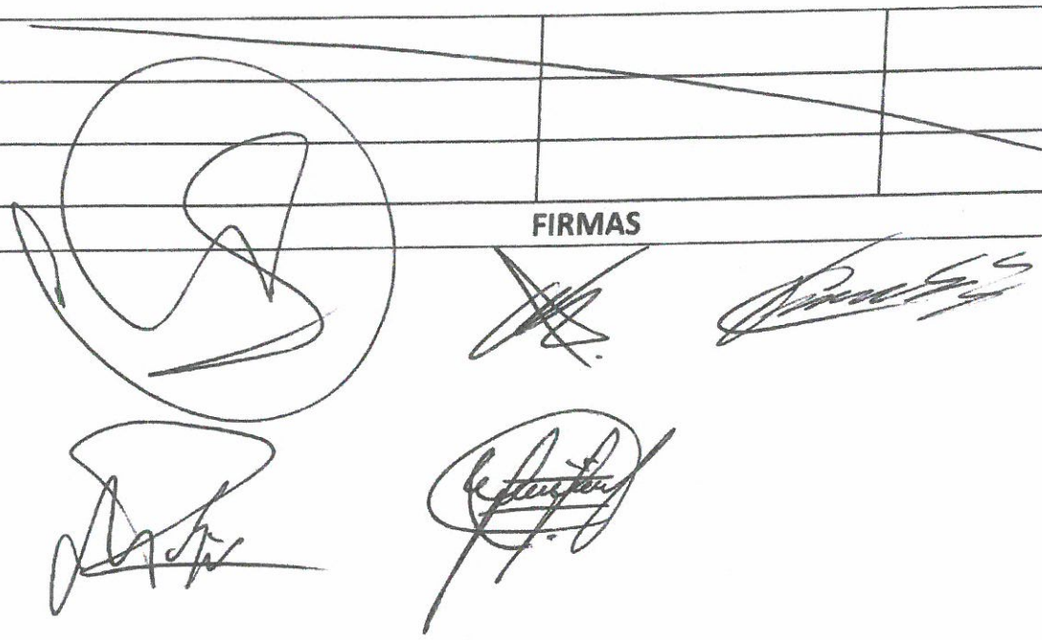

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 4

PROCESO: Construcción de la primera etapa del parque de la mujer en el municipio de Chía Cundinamarca

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- [ ] Consejo
- [x] Comité
- [ ] Reunión
- [ ] Otro

ACTA N°	6	FECHA	20 de noviembre de 2023.	
LUGAR				
	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
ASISTENTES	Mauricio Bueno	c	Supervisión.	
	Miguel Cantor		Interventoria	
	Julio Molina		Contratista	
INVITADOS				

1. OBJETIVO DE LA REUNIÒN

1. Verificacion de implantación de redes hidrosanitarias
2. verificación de planos arquitectonicos
3. Avance de obra
4. Balance presupuesto

2. ORDEN DEL DÍA

1. verificacion de implantacion de redes hidrosanitarias: En la ejecución de las obras de la primera etapa de Urbanismo se manejara redes solamente de aguas lluvias con descarga en Pozo existente en el lote.

Cota de llegada 2543, 92

La pendiente minima que se manejara en el proyecto es de 6%

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La instalación proyectada de tubería es de 250 metros lineales aproximadamente, construcción de 5 pozos.
Se realizó la revisión del trazado de redes. y no interfiere con los árboles existentes en el predio. Adicional respetando la distancia mínima de tolerancia de la ronda hídrica.
La tubería de recolección de aguas lluvia es de. 10" y 12"
Durante la verificación de redes existentes, se constató que no existe redes sanitarias cercanas al proyecto, lo que se sugiere para la segunda etapa prolongación de las redes hasta los puntos existentes.
En cuanto a la tubería de recolección (No previsto) se verifica que no se encuentra en los ítems contractuales, para lo que se requiere incluirlos.

Para la instalación de los filtros se cuenta con tubería de drenaje PVC 160 y 250, se verifica detalle y especificación de los filtros a instalar, a lo anterior la Interventoría solicita incluir en planos de detalle el filtro.
Se tiene proyectado la ejecución de 208,56 metros lineales.
En diseño se realizó la implantación de los filtros con su ubicación, y cotas. Con sus respectivos pozos de descarga.
Una vez socializado por parte del contratista la implantación de los diseños hidrosanitarios, la supervisión y la Interventoría dan visto bueno para que se inicien con las respectivas excavaciones y realicen la respectiva instalación de redes pluviales, construcción de pozos y filtros.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	3 de 4

2. Verificación de planos arquitectónicos El ítem presupuestal inicial para confinar la instalación del adoquín no esta previsto, dentro del balance el contratista incluye viga de confinamiento de 10 x 20cm

Nivel del proyecto: La supervisión y la interventoría solicito al contratista evitar las sobre excavaciones y tomar como referencia el nivel del proyecto

3. Avance de obra: En obra se encuentra, dos topografos, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 residente de SST, 1 residente de obra, 1 operador de maquinaria,

En obra se encuentra equipo bocat, retroexcavadora, minicargador. se encuentran realizando trabajo de excavaciones.

4. Balance de obra - Presupuesto.
Se realiza verificación del balance de obra con mayores y menores cantidades y la inclusión de los items no previstos, para asi verificar el alcance de proyecto.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	4 de 4

4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- Inicio de actividades de excavaciones para instalación de redes hidrosanitarias.

5. ANEXOS

6. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
1 Informe de avance de obra	Contratista	27 de noviembre

FIRMAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 5

PROCESO: 779-2023 obra / 791-2023 Interventoria

DEPENDENCIA: Secretaria de obras públicas

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Secretaría de obras públicas.

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- ☐ Consejo
- ☒ Comité
- ☐ Reunión
- ☐ Otro

ACTA N°	7	FECHA	29 Noviembre 2023	
LUGAR				
	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
ASISTENTES	Mauricio Bueno.	———	Supervición.	———
	Miguel Cantor	———	Interventoría	———
	Marco Tulio.	———	Contratista.	———
INVITADOS	Julian Molina.	———	Residente de obra.	———
	Ismael Gutierrez	———	Contratista.	———
	Johanna Vanegas.	———	Interventoría	———

1. OBJETIVO DE LA REUNIÒN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato.
2. Definición de compromisos.

2. ORDEN DEL DÍA

1. Se inicia Comité a las 10:15a.m en compañía de Supervisión, Interventoría y Contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	2 de 5

- Se procede a hacer recorrido en obra para identificar el avance en obra
- Se procede a levantar el acta de comité y definir los compromisos.

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se evidencia que el contratista viene adelantando actividades de compactación para el terreno, así mismo, instalación de recebo. También se evidencia que el contratista se encuentra realizando los pozos de los redes hidrosanitarios así como la excavación e instalación de tuberías.
2. Se propone que los sobrantes de material encontrados en sitio sean utilizados para construir un jarillon en los costados del lote.
3. Respecto a los cajas de 60x60 para acometidas eléctricas encontradas en diseño, se determina hacer estas de 40x40 ya que son las que están presupuestadas y son óptimas para ser empleadas en el proyecto, esto confirmado con el Supervisor del proyecto.
4. En cuanto al balance presentado por el contratista, se define no emplear el ítem de empradización y realizar todo lo del mobiliario contemplado en el presupuesto y lo demás

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	3 de 5

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

empleado en instalaciones eléctricas.

5. El Contratista manifiesta tener programado para la siguiente Semana iniciar con el suministro e instalación de adoquín para las zonas de acceso en el proyecto.

6. Interventoría solicita aumentar las cuadrillas para un mayor avance en la ejecución de las actividades y cumplir con los tiempos establecidos.

7. El Contratista indica que requiere una prórroga en tiempo teniendo en cuenta las problemáticas encontradas en cuanto al material de escombro (encontrado) en obra, el cual, tuvo que ser retirado o (con) dispuesto en otros lugales del proyecto para poder iniciar con las actividades.
dispuesto.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	4 de 5

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÒN

→ Se evidencia en obra: ejecución de actividades de:
- Conformación del terreno.
- Instalación y compactación del recebo.
- Elaboración de pozos.
- Excavación e instalación de tubería de aguas lluvias.

→ El contratista no entregó informe según compromiso del acta anterior.

5. ANEXOS

6. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Balance ajustado de acuerdo a lo acordado.	Contratista.	30/11/2023.
Solicitud de prórroga en tiempo.	Contratista	30/11/2023.
Entrega informe avance de obra Mensual N.1	Contratista	30/11/2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	5 de 5

FIRMAS

Interventoría.

INTERVENTORIA.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 5

PROCESO: 779-2023 obra / 791-2023 Interventoría

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas.

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- ☐ Consejo
- ☒ Comité
- ☐ Reunión
- ☐ Otro

ACTA N°	8.	FECHA	7 de diciembre.	
LUGAR				
	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
ASISTENTES	Julian Molina	———	Residente de Obra	———
	Ismael Gutierrez.	———	Contratista.	———
	Miguel Cantor.	———	Interventoría.	———
INVITADOS	Johanna Vanegas	———	Interventoría.	———
	Marco Tulio.	———	Contratista.	———

1. OBJETIVO DE LA REUNIÒN

1. Revisión de la documentación entregada para primer corte.

2. ORDEN DEL DÍA

Se inicia comité a las 2:15pm en compañía de interventoría y Contratista.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	2 de 5


Se procede a levantar el acta de comité y definir las observaciones y/o aprobación de la documentación para el primer corte.

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se solicita al contratista modificar en el Acta de Obra N.1 las cantidades para el ítem 2.1. Adoquín Concreto 6cm.
2. Se solicita presentar esquema en la memoria de cálculo de cantidades para el ítem 3.4. Relleno con material del sitio compactado mecánicamente.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	3 de 5

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

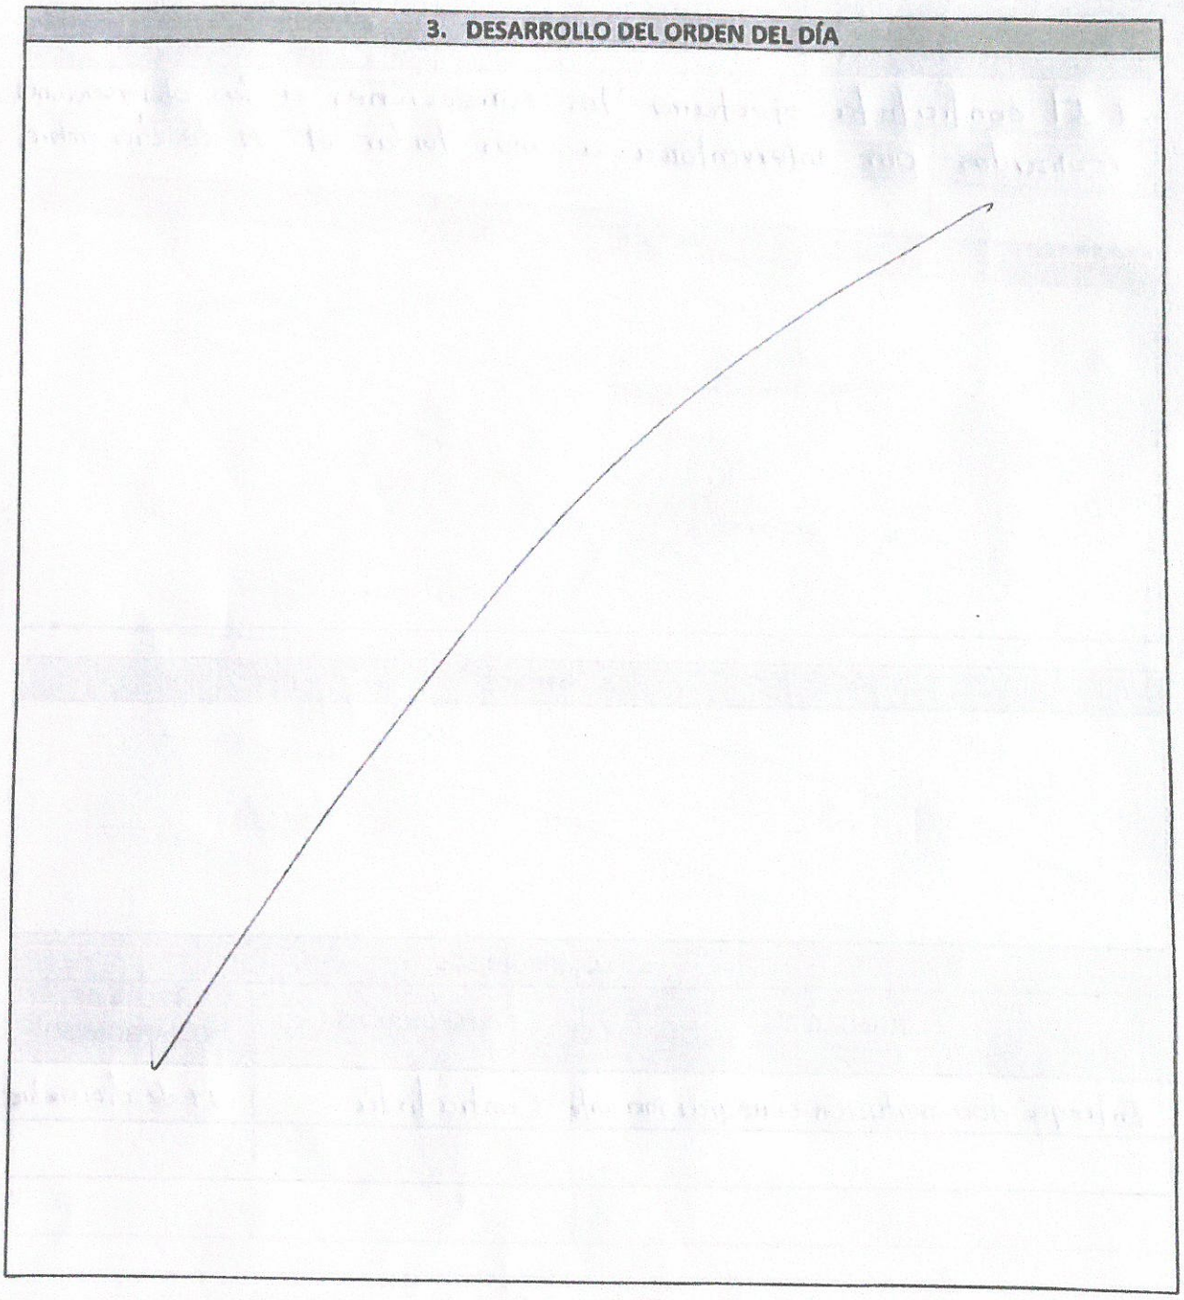

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	4 de 5

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

4. CONCLUSIONES DE LA REUNIÒN

1 El contratista efectuará las correcciones a las observaciones realizadas por Interventoría a más tardar el 11 de diciembre.

5. ANEXOS

6. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Entrega documentación corregida para corte	Contratista.	11 de diciembre

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	5 de 5

FIRMAS

Interventoría

Dirección de Obra

Interventoría.
