29


CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA No 030 de 2023 FRR**		
CONTRATISTA:	GRUPO INARCO SAS	**NIT**	900.042.482-1
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR DE ENGATIVA- CENTRO BOGOTA D.C.		
CIUDAD:	BOGOTA D.C.		
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTIUN PESOS M/L ($ 216.228.021)		
VALOR EJECUTADO:	DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTIUN PESOS M/L ($ 216.228.021)		
VALORES PAGADOS:	**CIENTO OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL DIEZ PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($** 108.114.010,50)		
VALOR A CANCELAR:	OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L. ($ 86.491.208,40)		
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	**TRES (3) MESES**		
FECHA DEL CONTRATO:	**18-07-2023**	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	**16-08-2023**
OBSERVACIONES:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**15-11-2023**	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**15-11-2023**

En la ciudad de Bogotá D.C., se reunió **JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ**, interventor del contrato 030 de 2023, y el **MARIO DE JESUS SALAZAR** (representante legal contratista), con el fin de suscribir acta de recibido parcial de obra del 100% a satisfacción.

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución de la presente acta cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2023.



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
CC: 79.696.673 de Bogotá.
INTERVENTOR



MARIO DE JESUS SALAZAR
CC: 19.499.723 de Bogotá.
CONTRATISTA.

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT15
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS DE OBRA	VERSIÓN	0

Aprobado: 26/01/

CONTRATO:	Contrato de Obra No. 030 de 2023 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
CONTRATISTA	GRUPO INARCO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	MARIO DE JESUS SALAZAR
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR DE ENGATIVA-CENTRO BOGOTA D.C**
CIUDAD:	**BOGOTA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	**16/08/2023**
FECHA DE INICIO:	**16/08/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15/11/2023**
INFORME NRO.	**FINAL**
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**11 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA EJECUCION DE LA OBRA**
FECHA PRESENTE INFORME:	**15/11/2023**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
se reflejó un avance ejecutado del 100% del total de la obra en las fechas establecidas, sin tener ningún tipo de atraso el contratista de conformidad con lo acordado por ambas entidades el 16 de agosto de 2023. Por otro lado, se informa que se mantenían constantes visitas de supervisión de obra junto al contratista y la interventoría, asl para generar las retroalimentaciones respectivas que estas deben tener, para asl llevar un mejor control de ambas entidades. Se informa que se realizó la modificación del balance de mayores y menores cantidades de obra, entre las partes (contratista e interventoría y entidad) se evidencia que NO genero una solicitud de adición presupuestal, debido a los cambios que hubo en las mediadas del balance de la mampostería total incluyendo las cantidades existentes, donde se evidenciaron una mayor cantidad de la esperada. Este aumento se fue medido debida a las cantidades que muros adicionales que debían levantarse que no fueron previstos en el análisis inicial. Se informa que se realizó la solicitud de inclusión de ítems complementarios, los cuales no estaban incluidos en el balance inicial, ya que no se tenía previstos en los ítems totales 1. Se realizo la validación documental del contratista de obra GRUPO INARCO S.A.S, 2023, técnica, legal, administrativa y financiera con el fin de proseguir con la ejecución del contrato. El contratista ha ido realizando todas las actividades según lo programado; terminación de mampostería nueva y mampostería existente, incluyendo el montaje de toda el área de la cubierta metálica. adicionalmente la terminación del pañete respectivo en la mampostería interior.	100%

RECOMENDACIONES:

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2023.

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENORIA

EL INTERVENTOR JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ - SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 030 de 2023 FRR CERTIFICA:

Que, GRUPO INARCO SAS con Nit. 900,042,482-1, cumplió a satisfacción con las obligaciones y el objeto del contrato correspondiente al 100% de avance de obra, en el período comprendido entre el 11 de octubre de 2023 al 15 de noviembre del 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR DE ENGATIVA - CENTRO BOGOTA D.C."

Que el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se evidencia en el informe de seguimiento de Supervisión e Interventoría, el cual reposa en el expediente contractual.

Que el Contratista acreditó en debida forma, el cabal cumplimiento de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, atendiendo a lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la (Ley 1562 de 2012 aplica únicamente para persona natural) (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 aplica únicamente para persona jurídica).

Dada a los (15) días del mes de noviembre de 2023


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Representante legal interventoria

GRUPO INARCO S.A.S.

INFORME N° 02 DEL CONTRATISTA GRUPO INARCO SAS

CONTRATO ELECTRONICO N°030 DE 2023

AVANCE DEL 100%

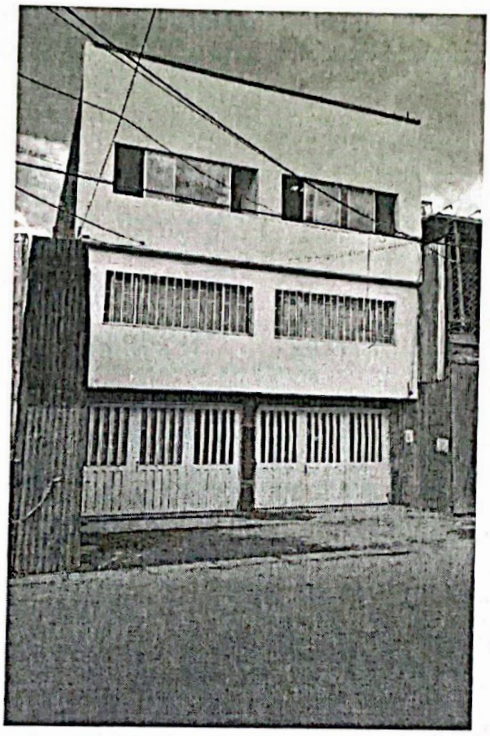

FONDO ROTATORIO REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR DE ENGATIVA-CENTRO BOGOTAD.C."

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 noviembre de 2023

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

GRUPO INARCO S.A.S.

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN – CONSORCIO

ELABORÓ -APROBO	
	
Nombre: ING. YOVANY INSUASTY RODRIGUEZ	
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	
Fecha: 18/10/2023	

APROBADO	
NOMBRE:	MARIO DE JESÚS SALAZAR
FECHA:	octubre de 2023
FIRMA:	

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 ☎ 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 4
2. Descripción del contrato 4
3. Objetivo. 4
4. Actividades ejecutadas por el contratista.....5
5. Aspectos económicos y financieros.....6
6. Características legales.....7
7. Relación del personal.....7
8. Registro fotográfico.....8
9. Conclusiones.....46
10. Anexos.....47

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

1. INTRODUCCION.

En el presente informe, se presenta en detalle las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 31 de julio de 2023 hasta el 15 de octubre de 2023, proporcionando una descripción completa y precisa de las actividades realizadas en este periodo, con el objeto de brindar una comprensión clara de su desarrollo y resultados.

2. DESCRIPCION DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	**FONDO ROTATORIO REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**
NIT:	899,999,737-9
CONTRATISTA:	GRUPO INARCO SAS
NIT:	900,042,482-1
OBJETO:	**"CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR DE ENGATIVA- CENTRO BOGOTA D.C."**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 216,228.021
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	18 DE JULIO DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	16 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
TIEMPO DE EJECUCION:	3 MESES
APROBACION POLIZAS:	

3. OBJETIVOS

- Informar a la interventoría y al Fondo Rotatorio de la Registraduría nacional del Estado Civil de todas las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 16 de octubre al 15 de noviembre de 2023.

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

- Describir las cantidades y actividades desarrolladas en este periodo.

- Realizar un registro fotográfico como respaldo documental de los trabajos realizados en el periodo.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Para efectos de este primer informe el contratista realiza las siguientes actividades:

- Desmonte de 2 aparatos sanitarios en el baño del piso 2
- Demolición de 2.64 m^2 de muros existentes en segundo piso para ampliar el vano del espacio que queda para estantes.
- Desmonte de 25 lámparas existentes en el primer y segundo piso.
- Demolición de 25.5 m^2 de pisos existentes en baño segundo piso y patio.
- Desmonte manto existente sobre placa de cubierta y terraza 68.13 m^2.
- Demolición de enchapes de pisos y muros en baños y patio 52.81 m^2
- Se realiza la construcción de las vigas de confinamiento: 29.81 m. tipo alfajía en patio primer piso y azotea tercer piso.
- Se realiza la construcción estructura metálica 48 m. para la construcción de cielo raso en tercer piso.
- Montaje de 34 luminarias tipo led de 60 x 60 de incrustar y sobre poner para los pisos 1, 2 y 3.
- Reparación de puntos eléctricos en los pisos 1 y 2.
- Se realiza el diagnostico general de electricidad, donde se concluye que hay que cambiar el contador monofásico a trifásico para optimizar las cargas. Se da inicio al cambio de acometida trifásica y queda en espera la gestión ante la empresa de servicio eléctrica.
- Se realiza la colocación de 250 m. de cable No. 10 para actualizar las redes

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

eléctricas entre contador principal y contadores que hay en cada piso.

- Instalación de 3 tableros trifásicos en primer, segundo y tercer piso.
- Se realiza instalación de 24.6 m2 de ventanería para puntos fijos de tercer piso y ventana que da a la azotea y calle.
- Se realizan actividades de resanes, estucos y pinturas en el primer, segundo y tercer piso.
- Construcción de 30 m2 de pañete impermeabilizado en fachada principal.
- Se continua con las actividades de alistado de pisos aproximadamente 98.57 m^2 en primer, segundo y tercer piso, para dejar listo los pisos para enchape con cerámica.
- Se realiza enchapes de piso y paredes baños en primer, segundo y tercer piso aproximadamente 292.40 m^2.
- Se colocan 3.90 m. de bajantes para recoger aguas lluvias de cubierta patio primer piso.
- Se da inicio a la instalación 20 salidas eléctricas necesarias en el tercer piso, para tomas, interruptores e iluminación.

5. ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.

EL FONDO pagará el valor del contrato de la siguiente manera: a. Un primer pago equivalente al 50% del valor del contrato, previa presentación del acta de avance del 50% de la obra, expedida por el interventor del contrato. B. Un segundo pago equivalente al 40% del valor del contrato, previa presentación del acta de ejecución del 100% de la obra, expedida por el interventor del contrato. Se. un último pago equivalente al 10% del valor del contrato, previa presentación del acta de recibo definitivo Satisfacción expedida por el interventor, la suscripción del acta determinación y liquidación del contrato, las pólizas actualizadas debidamente aprobadas. Nota uno: para cada pago el contratista deberá presentar la respectiva factura debidamente diligenciada, la constancia de pago de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 11 50 del 2007 y el para fiscales de conformidad con lo normado en el artículo 50 de la ley 189 de 2002. Nota 2: en caso de persona Natural deberá

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

aportar para cada pago copia de las planillas de pago sobre el 40% del valor facturado, como cotizante independiente. Nota t3: el fondo realizará los pagos, de acuerdo a la programación del CONFIS Respectivo.

6. CARACTERISTICAS LEGALES DEL PROYECTO

oo

POLIZAS CONTRATISTA GRUPO INARCO SAS			
AMPARO	**NUMERO**	**VALOR**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del Contrato	14-44-101189456	$43.245.604,20	31/08/2023 24/06/2024
Pago de Salarios prestaciones sociales e indemizaciones laborales	14-44-101189456	$10.811.401,05	31/08/2023 25/12/2026
Estabilidad de obra	14-44-101189456	$43.245.604,20	31/08/2023 31/08/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14-44-101189456	$43.245.604,20	Si ampara 1 años, 3 meses y 25 dias

7. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Ingeniero residente	1	Si
Maestro de Obra	1	Si
Electricista	2	Si
Pintores	2	Si
Soldador	1	SI
Ayudantes	4	Si

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

PERSONAL TOTAL	11	

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



Figure 1

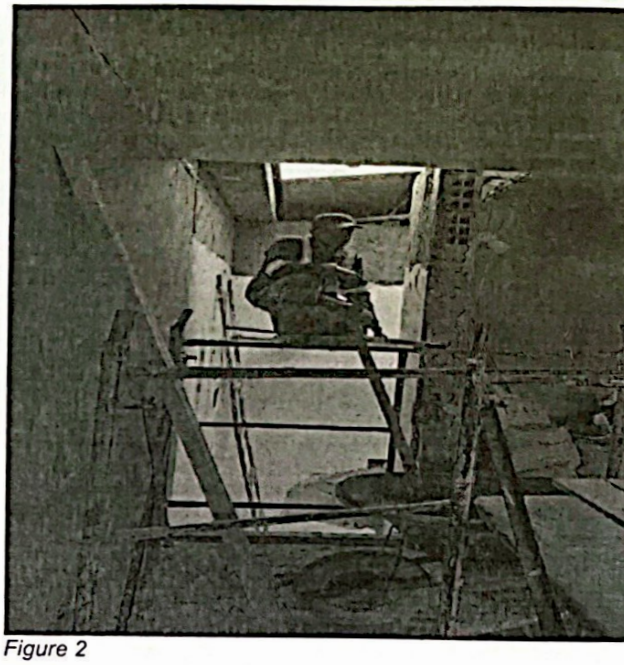


Figure 2

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

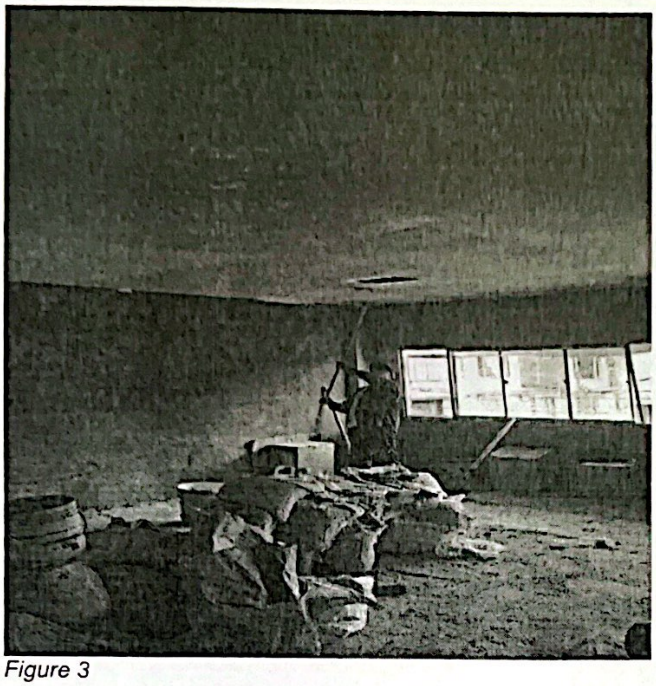


Figure 3



Figure 5



Figure 4



Figure 6

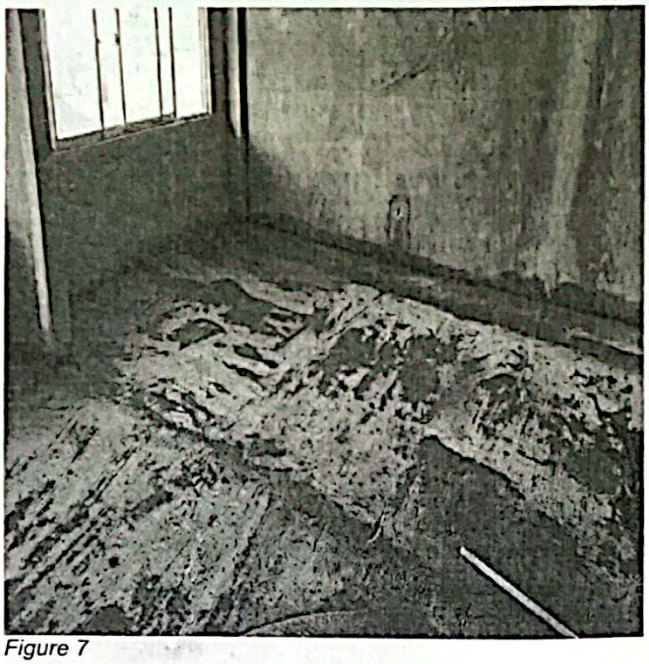


Figure 7

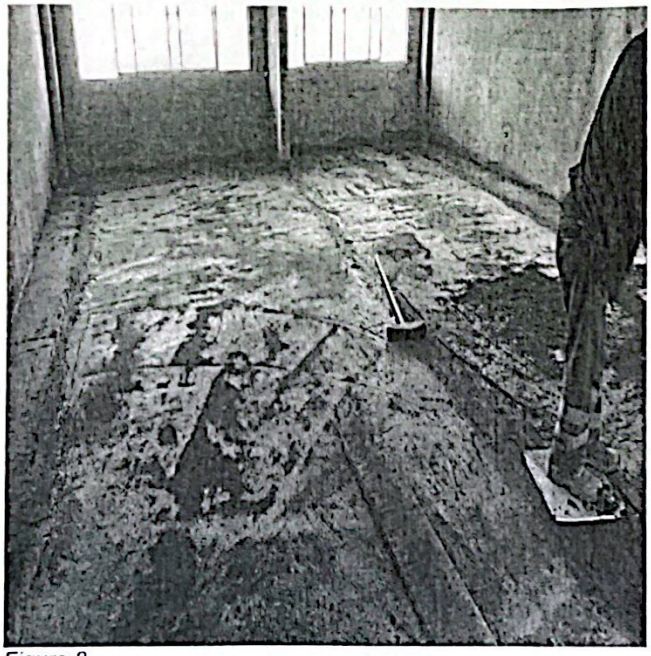


Figure 8



Figure 9

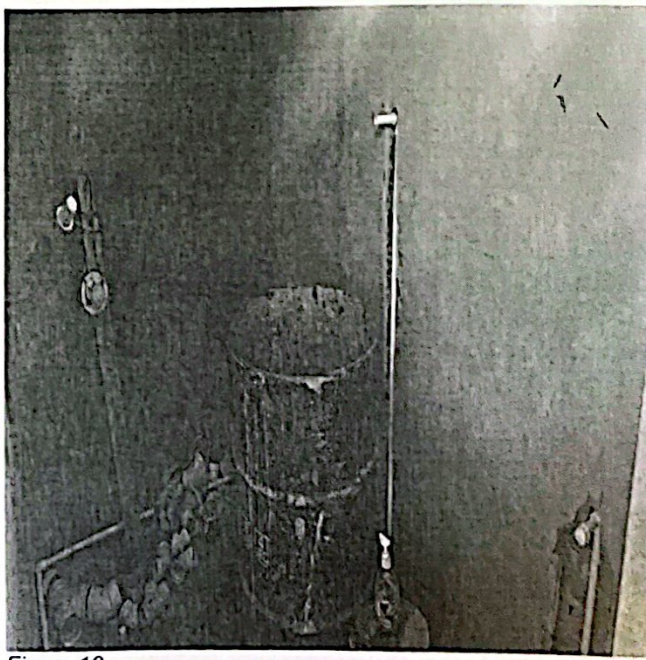


Figure 10

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co



Figure 11



Figure 12



Figure 13



Figure 14

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

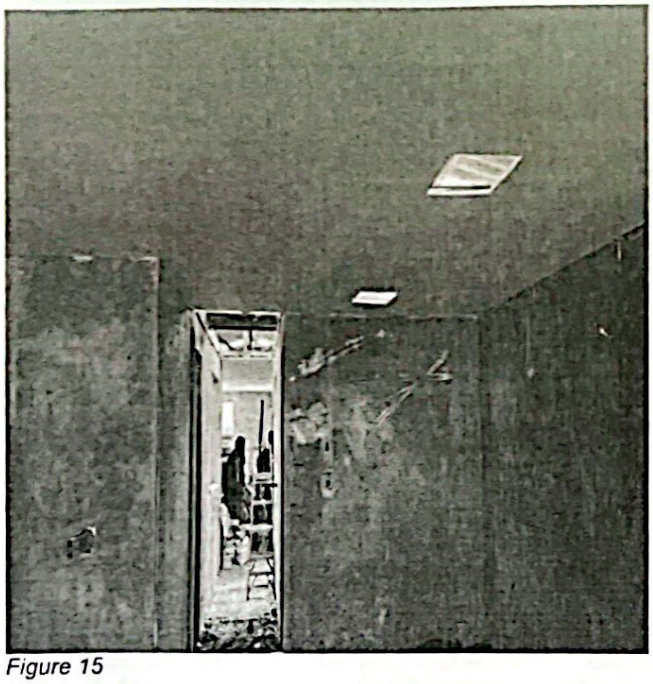


Figure 15

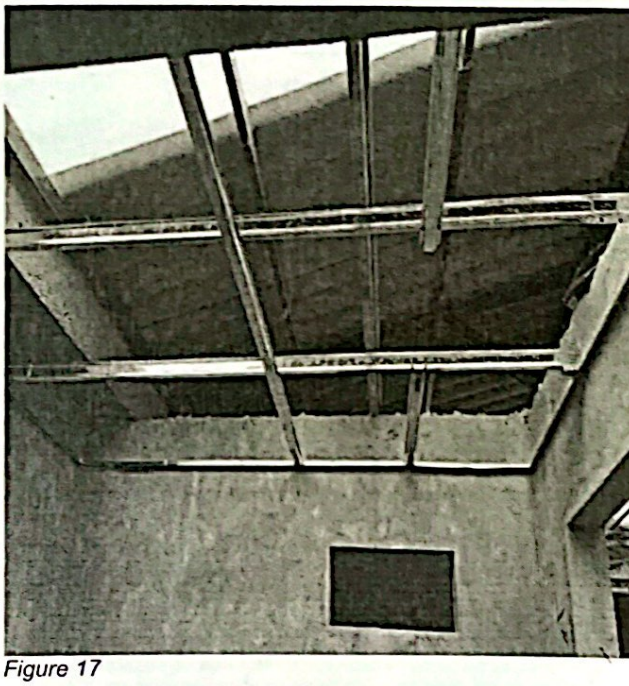


Figure 17



Figure 16



Figure 18



Figure 19

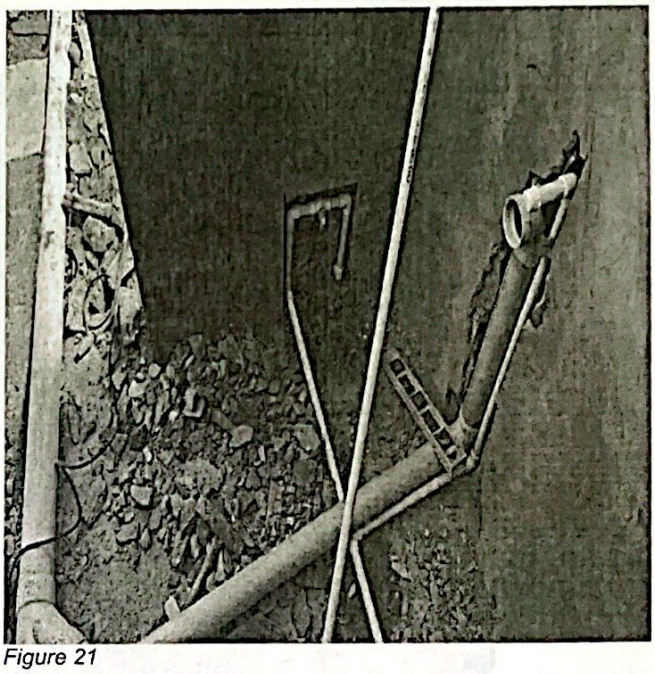


Figure 21



Figure 20

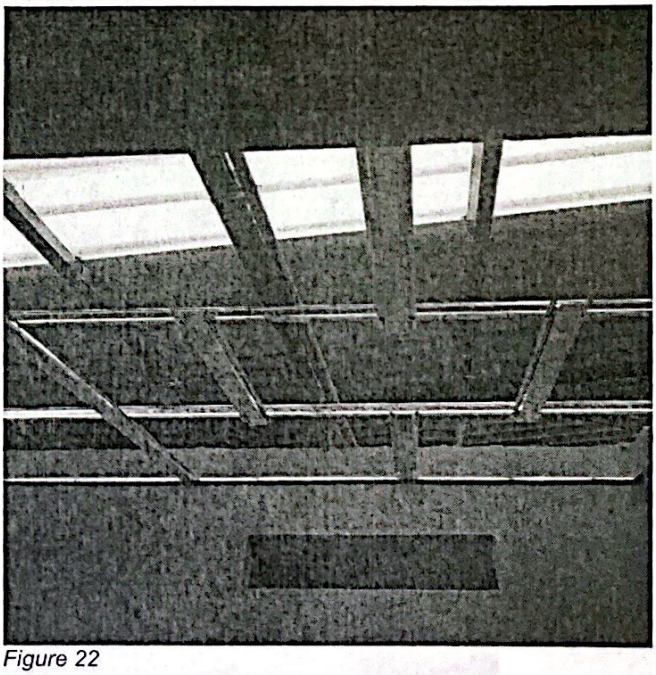


Figure 22

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 ☎ 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

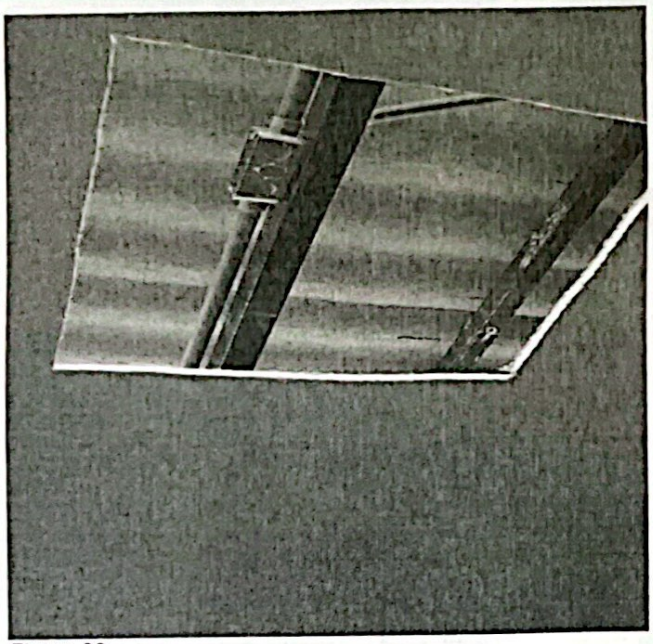


Figure 23



Figure 24

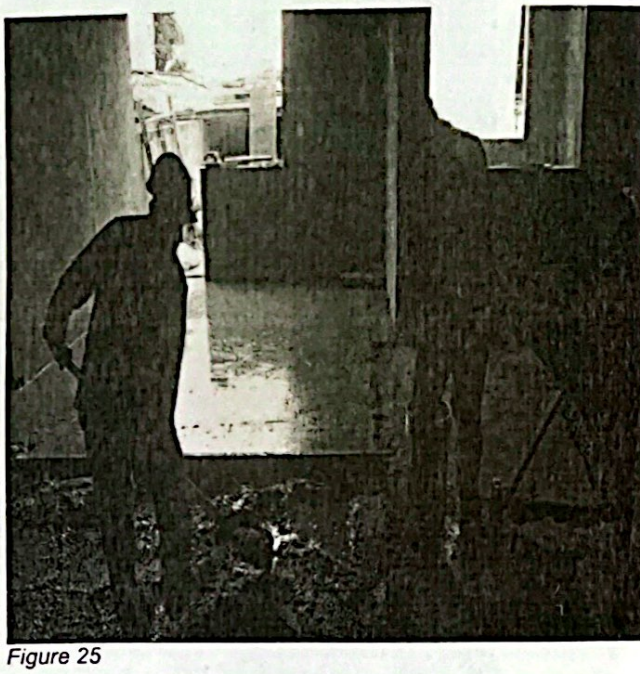


Figure 25



Figure 26

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co



Figure 27

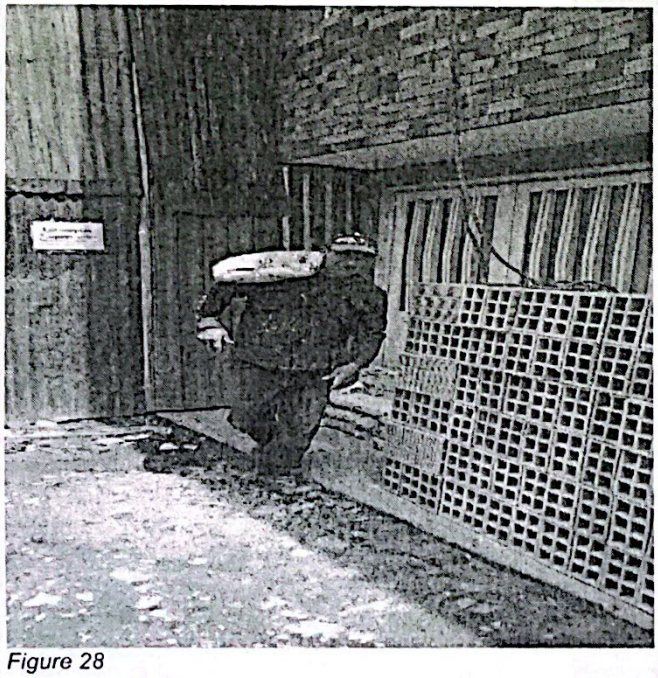


Figure 28



Figure 29

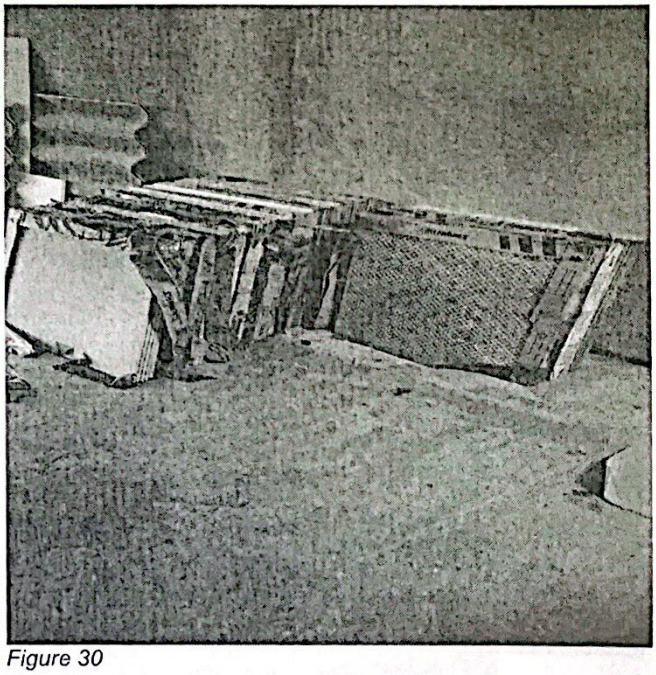


Figure 30

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co



Figure 31



Figure 33

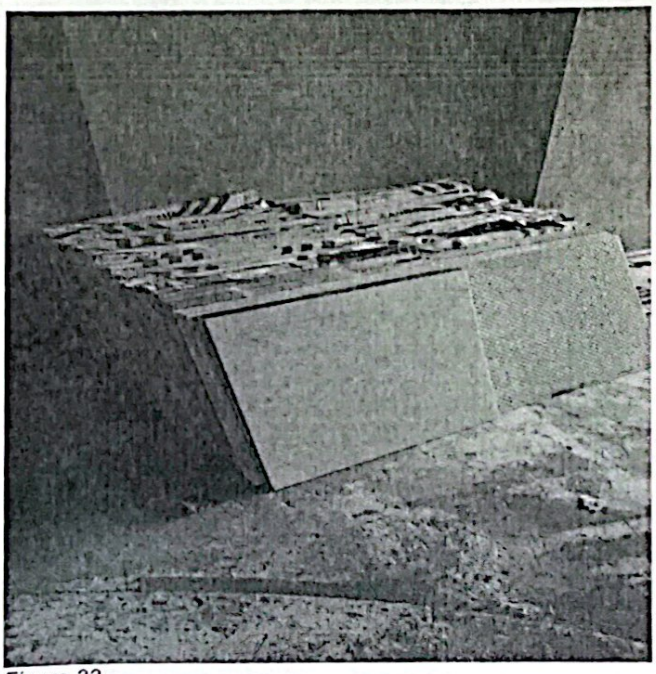


Figure 32

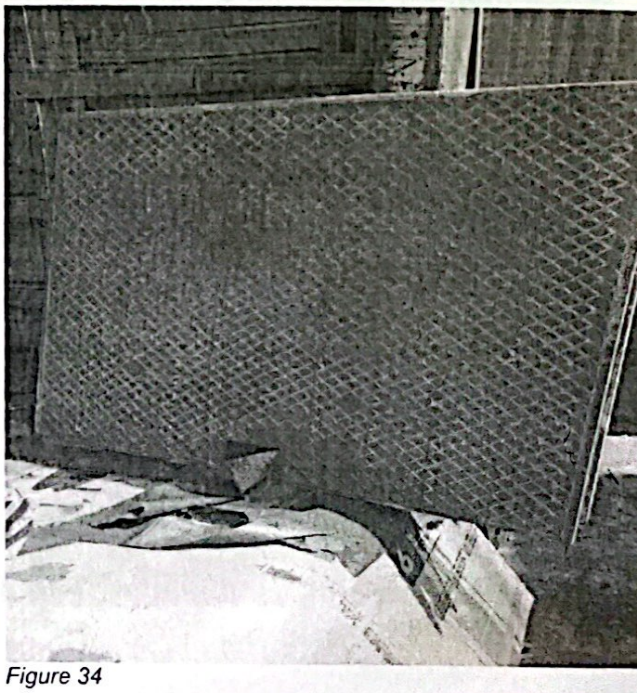


Figure 34

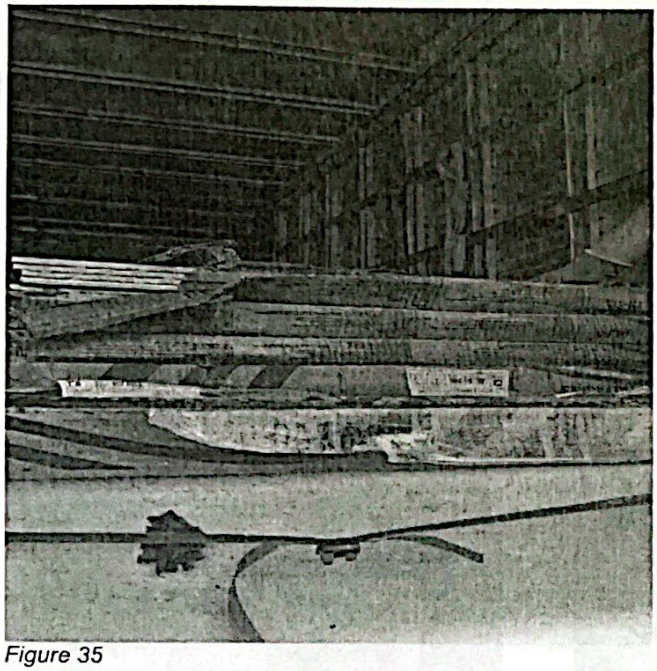


Figure 35

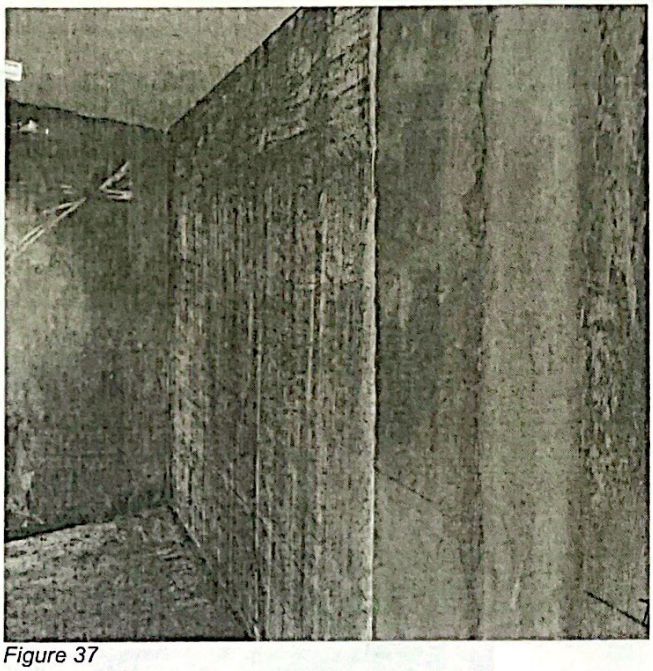


Figure 37



Figure 36

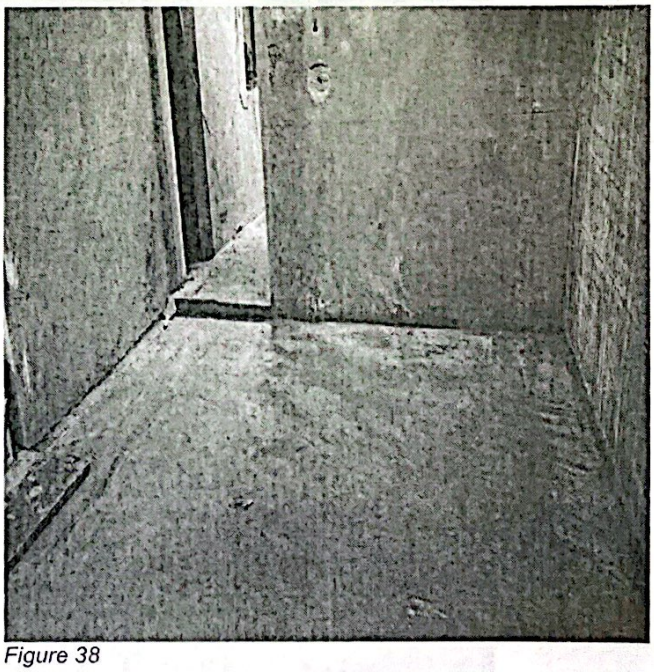


Figure 38

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 ☎ 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

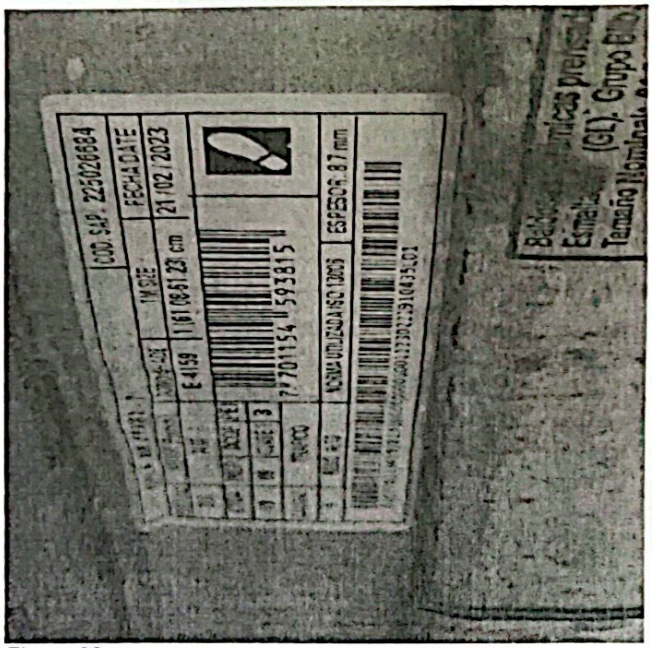


Figure 39



Figure 40

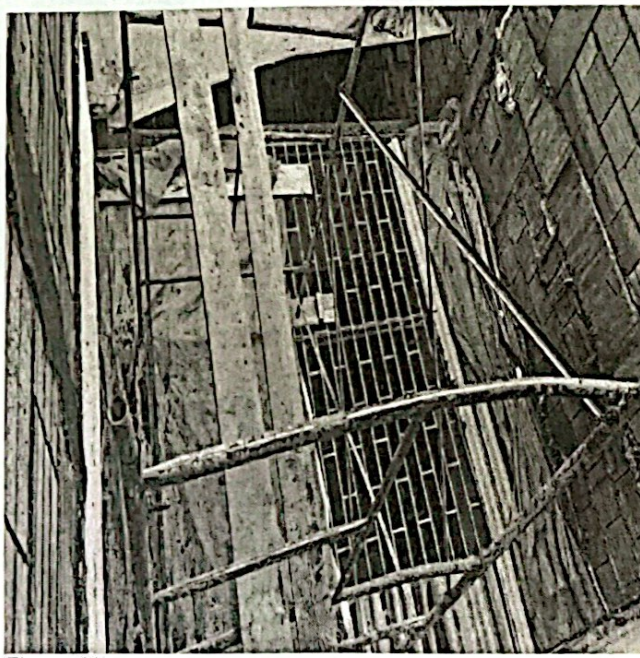


Figure 41

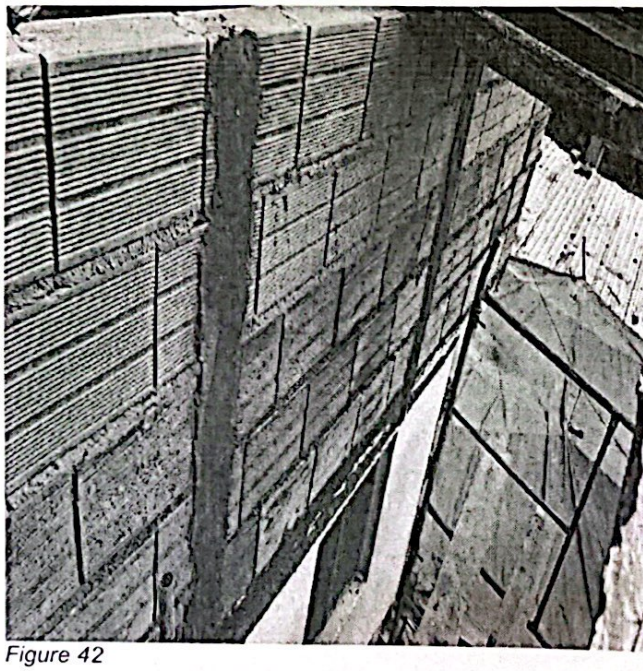


Figure 42

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 ☎ 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

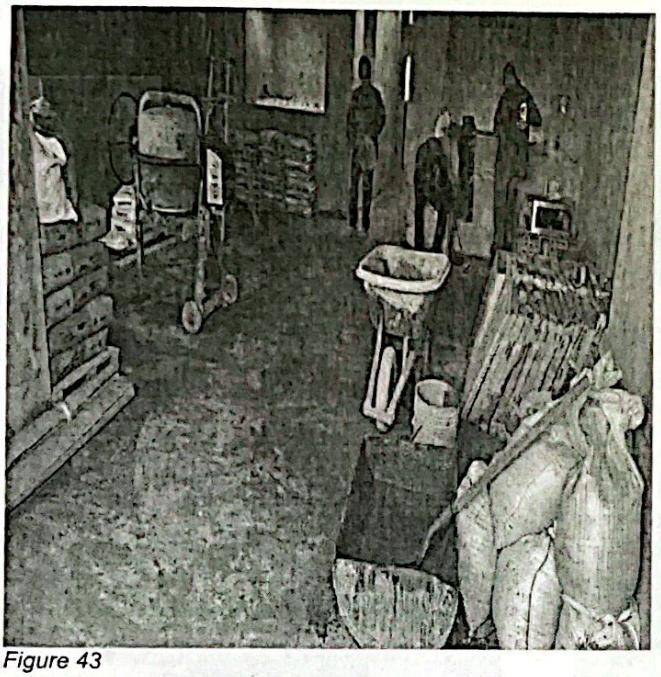


Figure 43

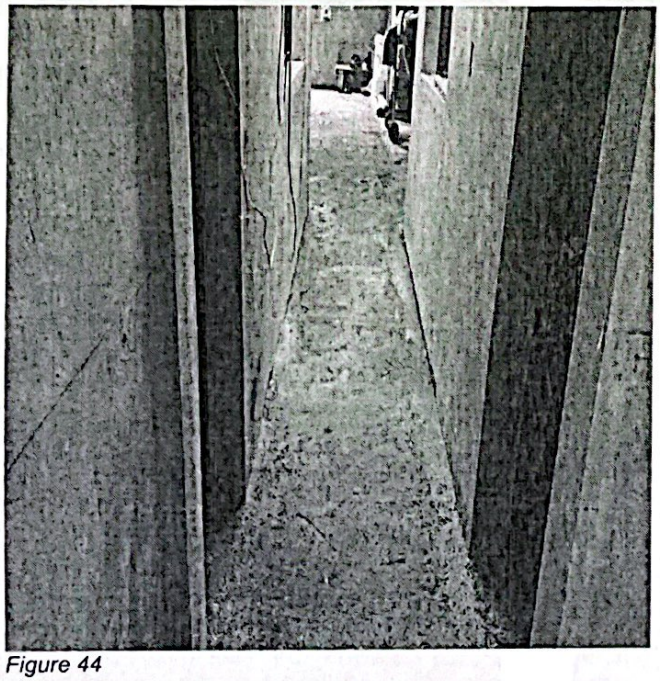


Figure 44

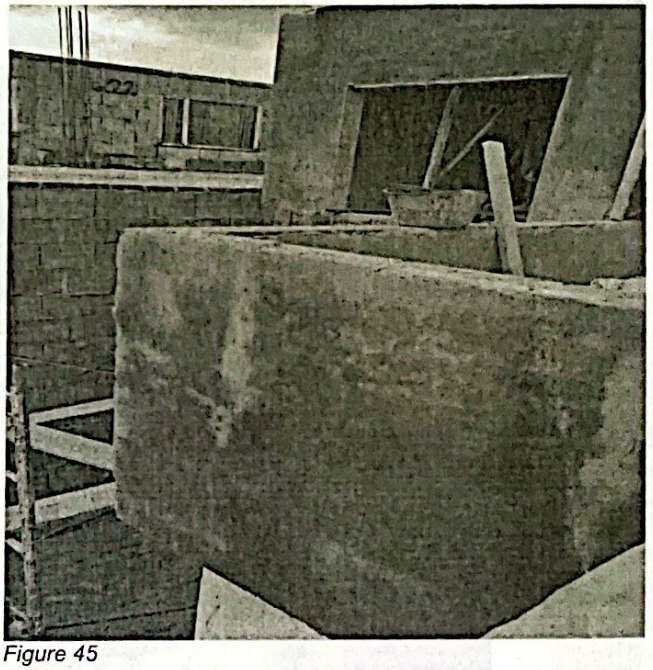


Figure 45



Figure 46

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 ☎ 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co



Figure 47

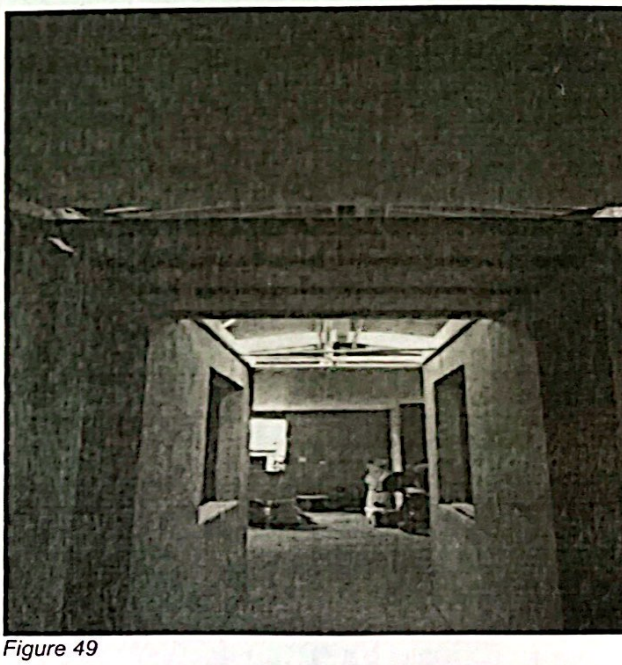


Figure 49

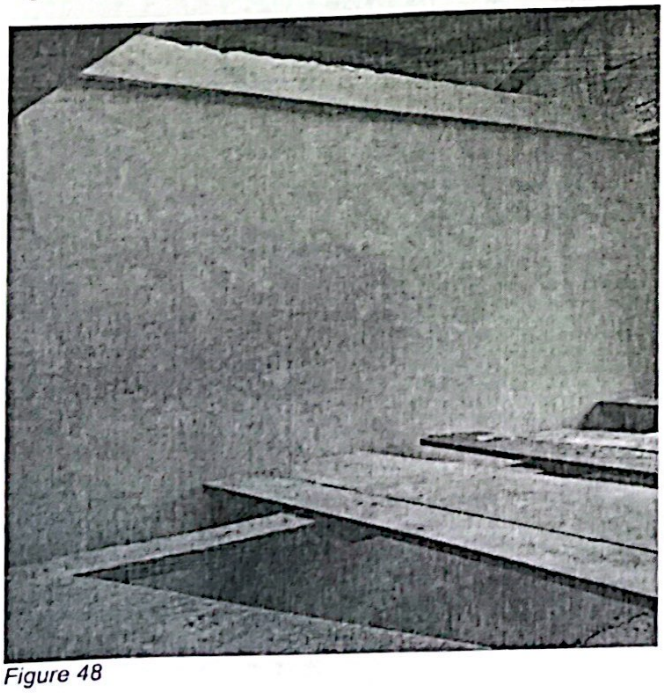


Figure 48

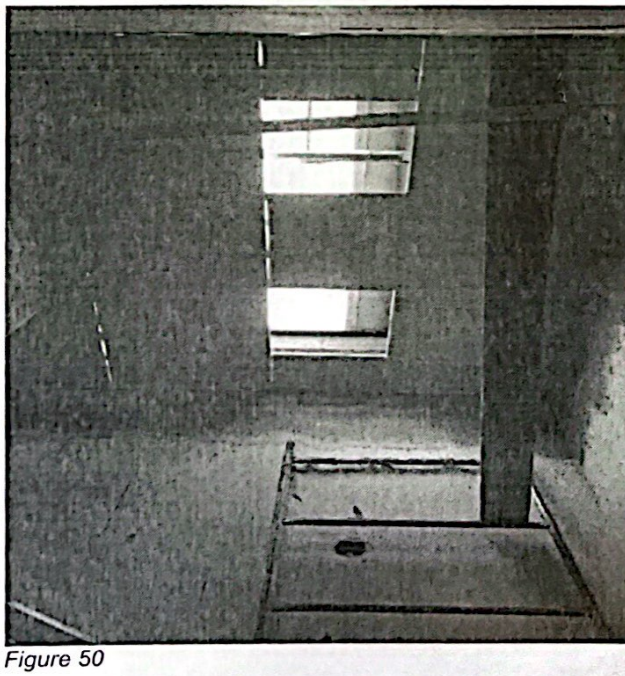


Figure 50

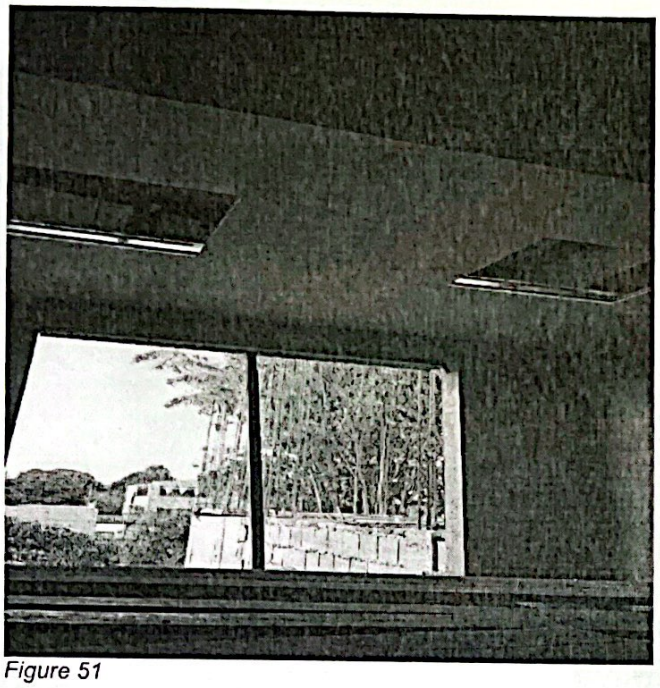


Figure 51

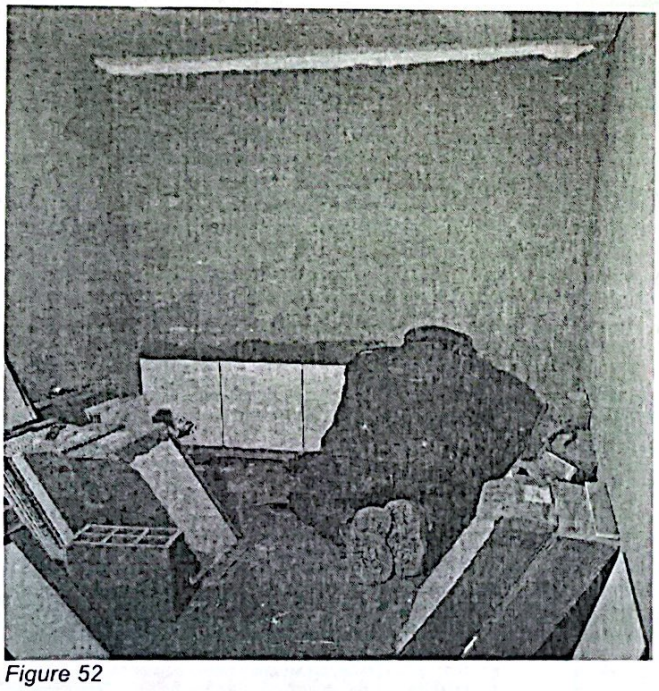


Figure 52

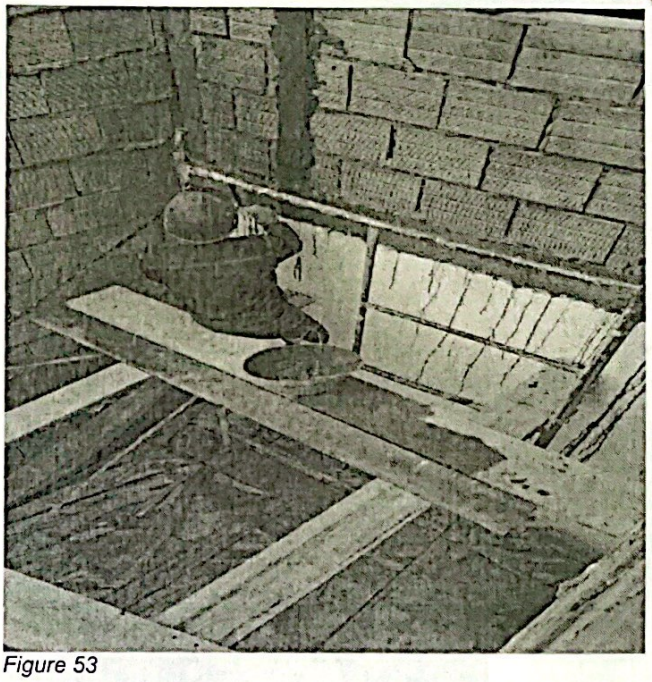


Figure 53

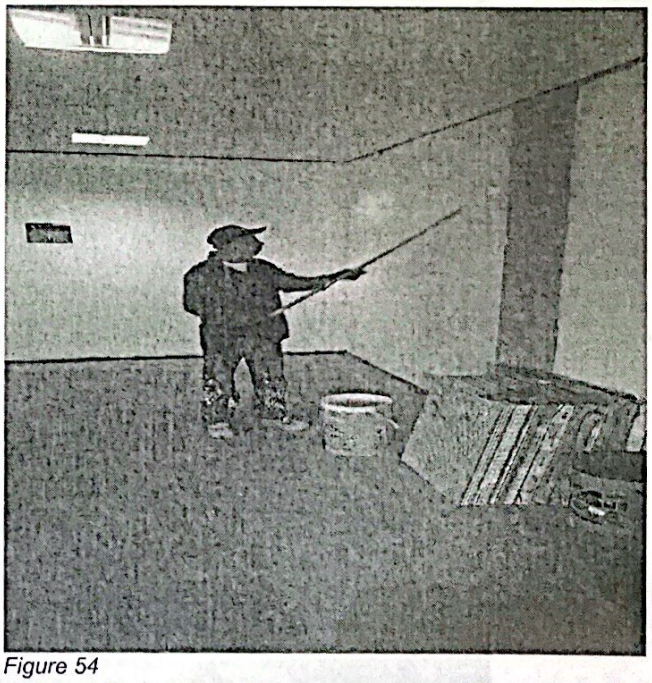


Figure 54

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

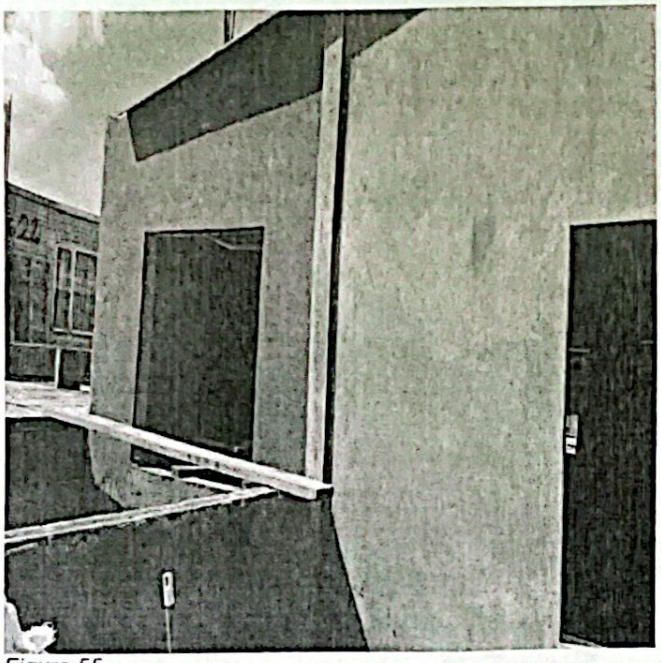


Figure 55

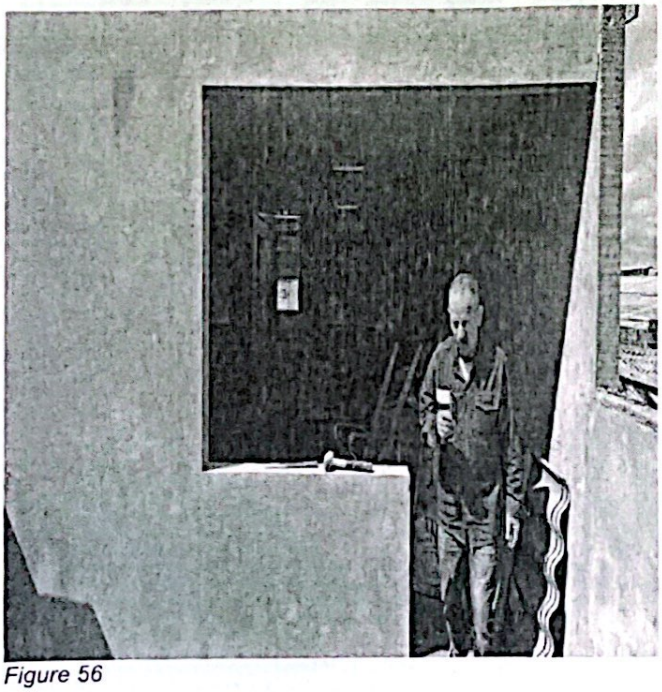


Figure 56



Figure 57



Figure 58

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

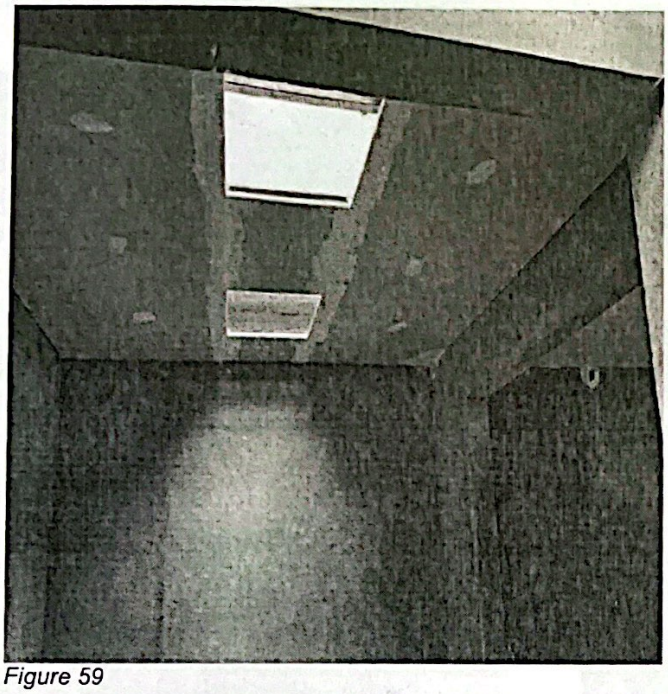


Figure 59

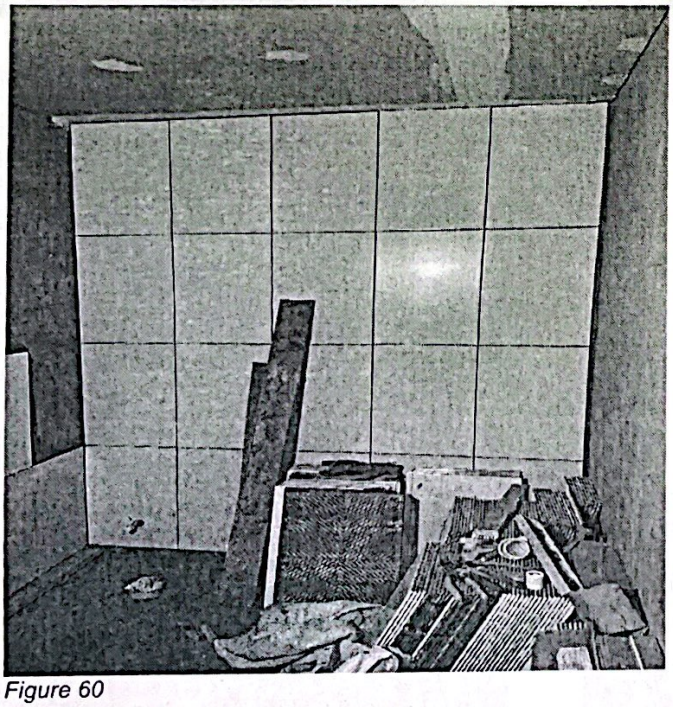


Figure 60

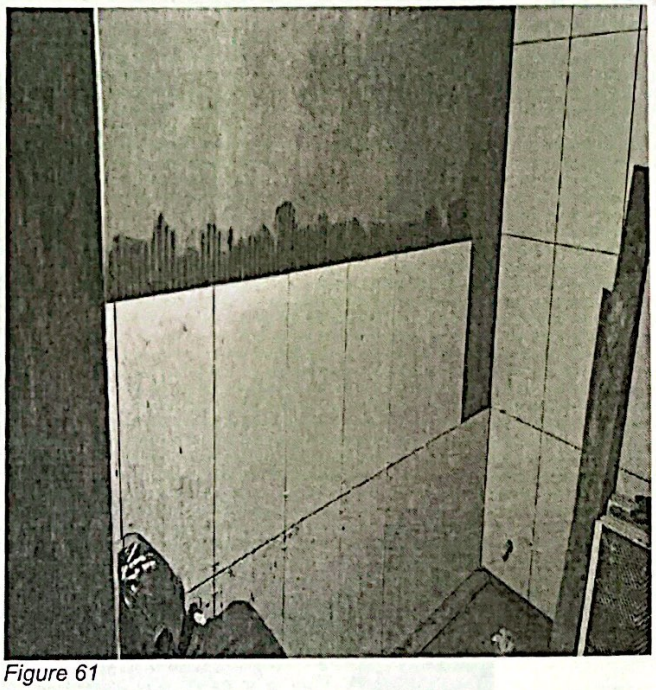


Figure 61

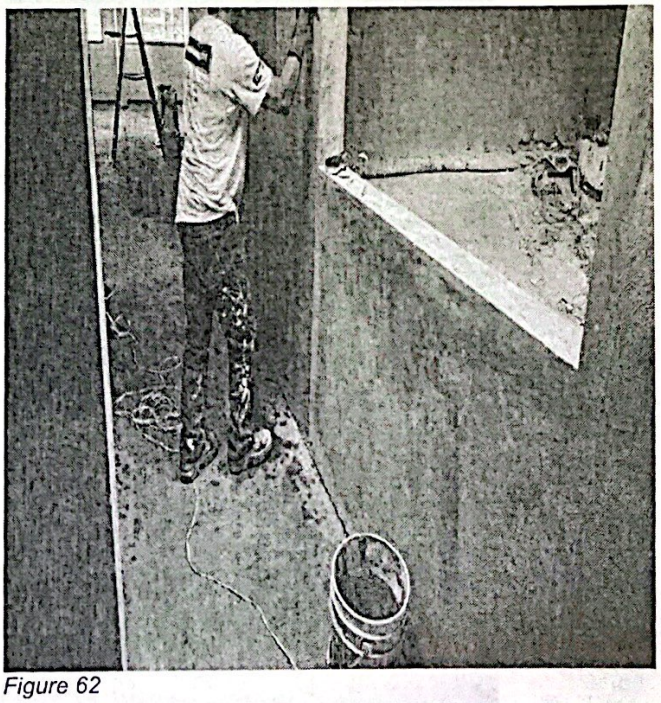


Figure 62

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 ☎ 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co



Figure 63

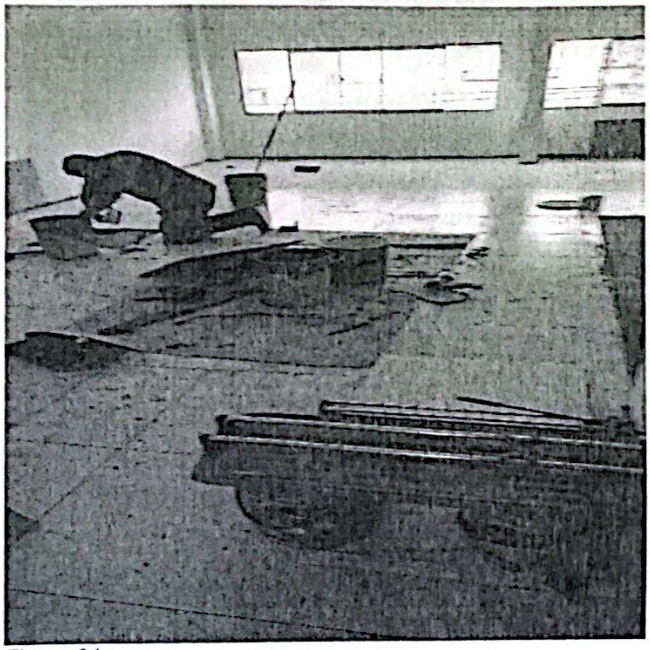


Figure 64

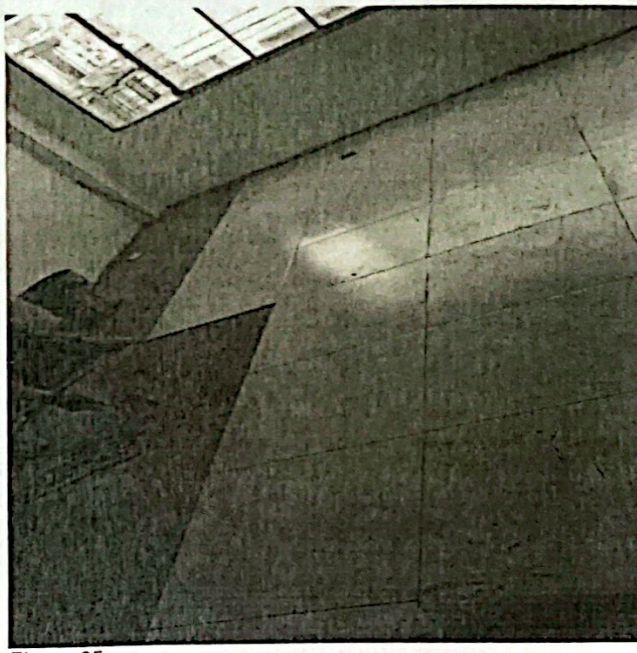


Figure 65

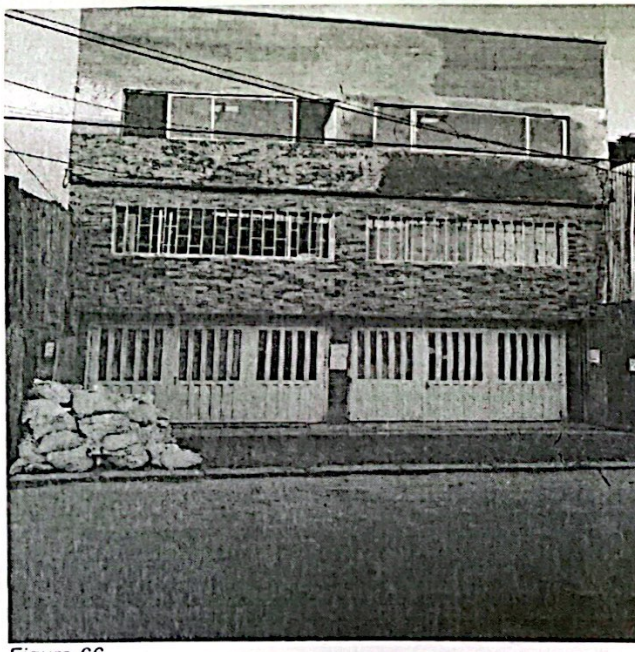


Figure 66

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 ☎ 6017748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

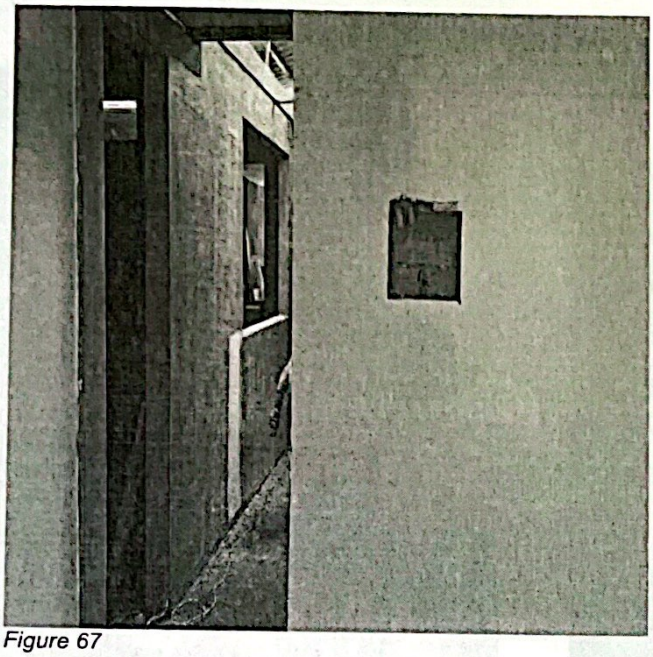


Figure 67



Figure 69

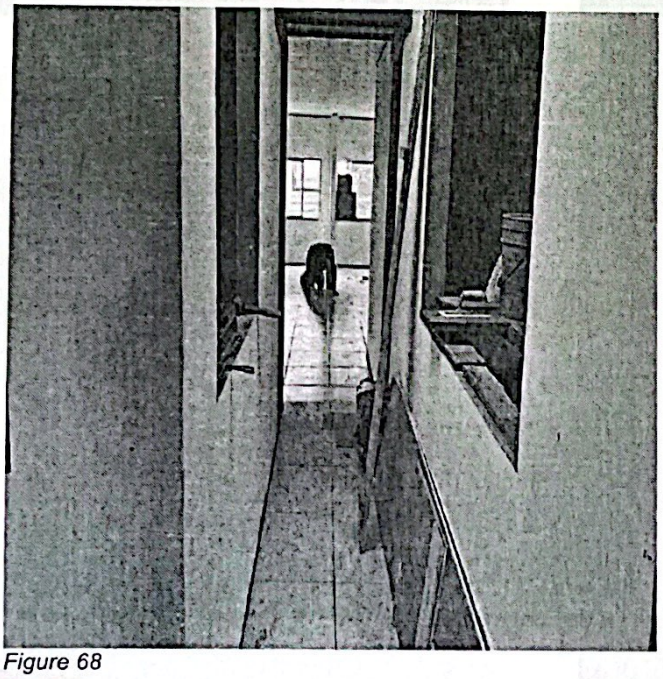


Figure 68



Figure 70

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co



Figure 71



Figure 72



Figure 73



Figure 74

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 ☎ 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co



Figure 75



Figure 77

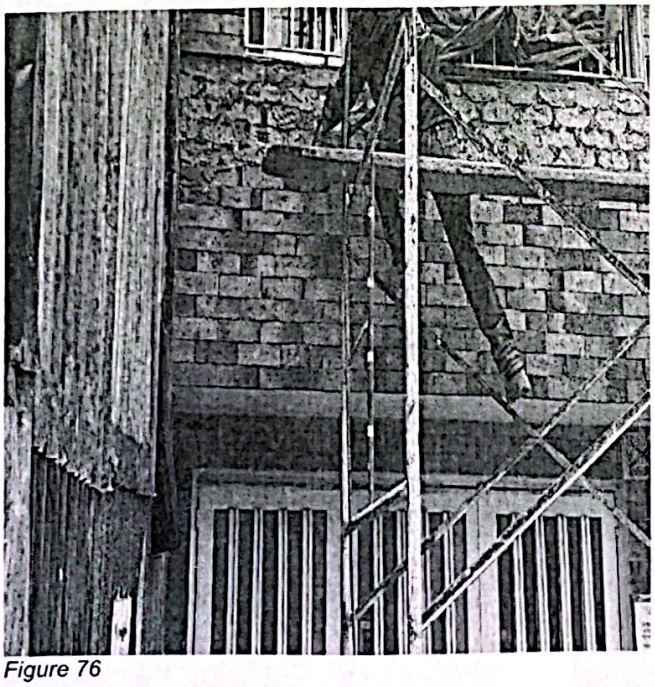


Figure 76



Figure 78

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

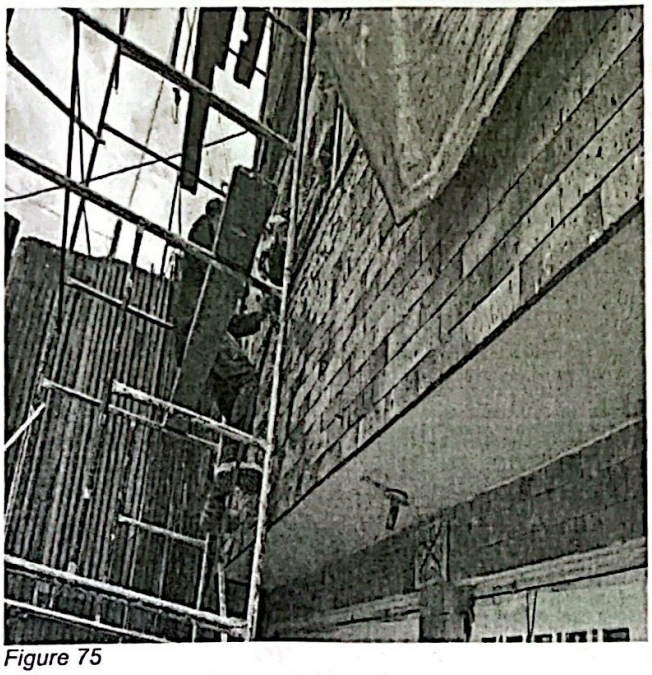


Figure 75

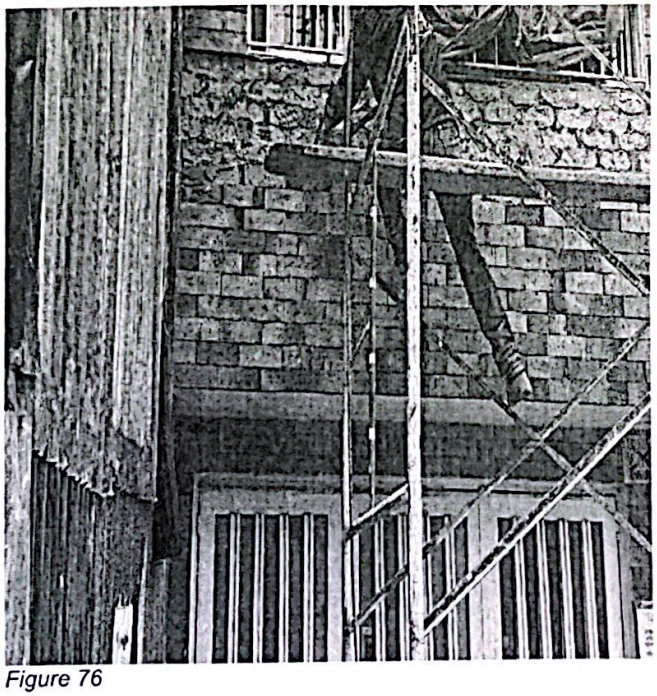


Figure 76



Figure 77



Figure 78

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

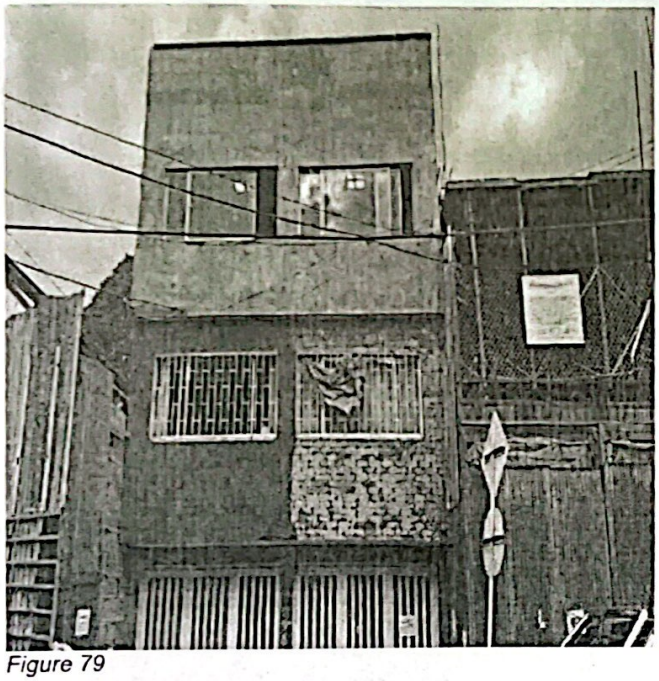


Figure 79

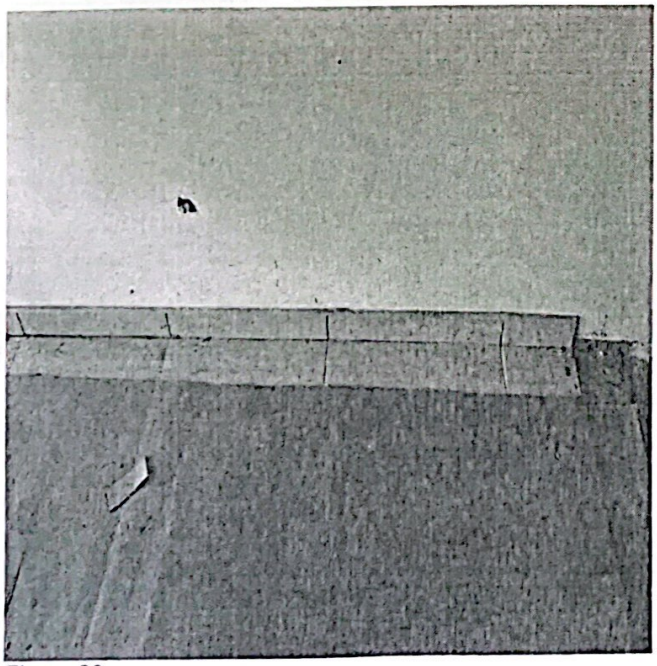


Figure 80



Figure 81



Figure 82

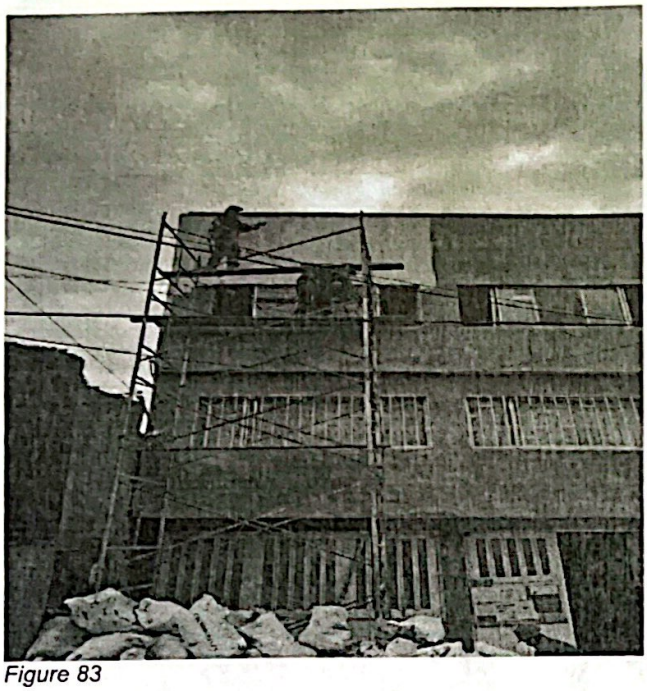


Figure 83



Figure 85

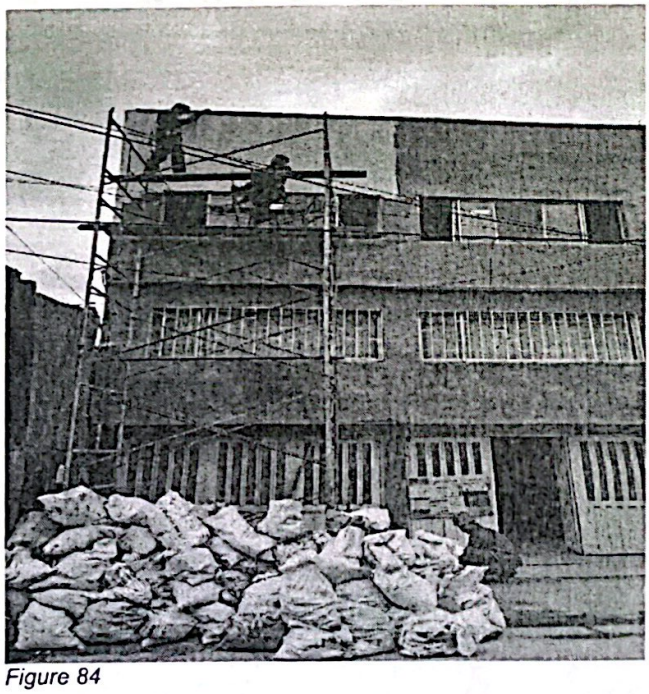


Figure 84



Figure 86

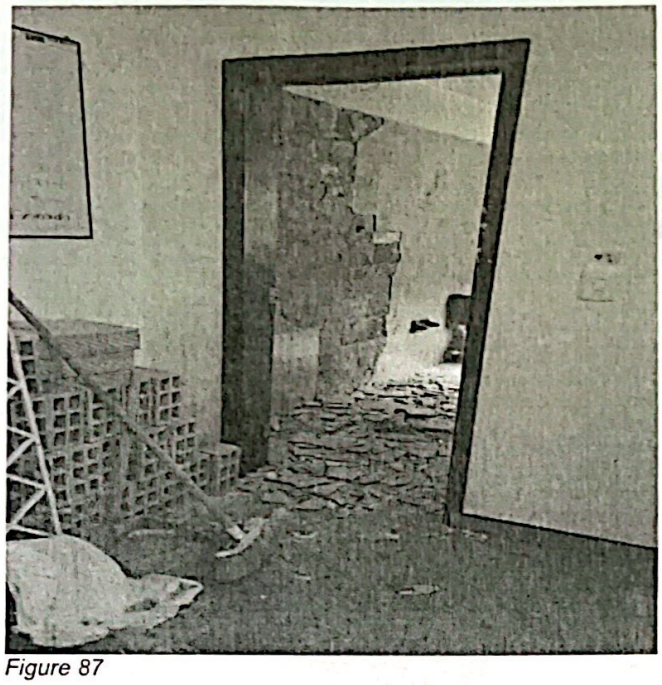


Figure 87



Figure 88

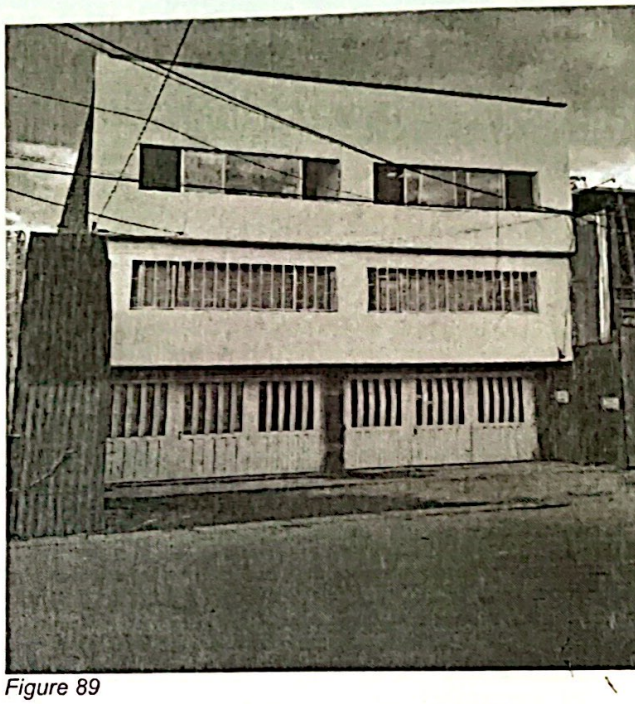


Figure 89



Figure 90

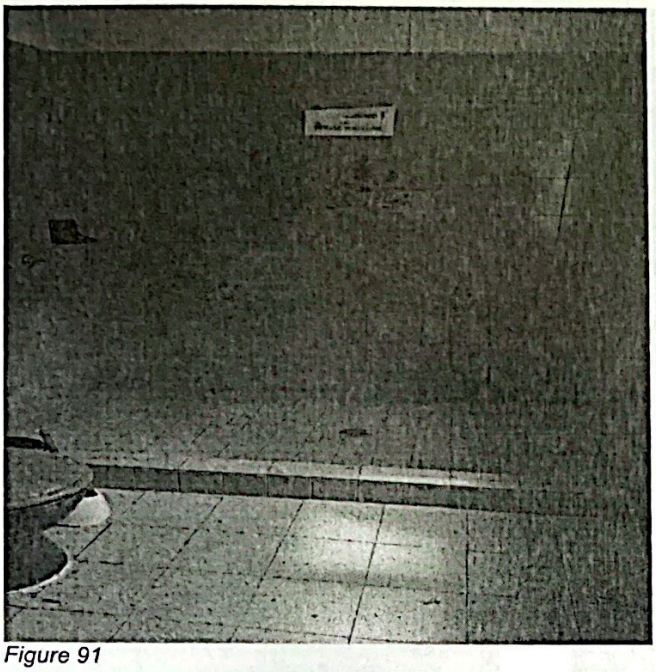


Figure 91

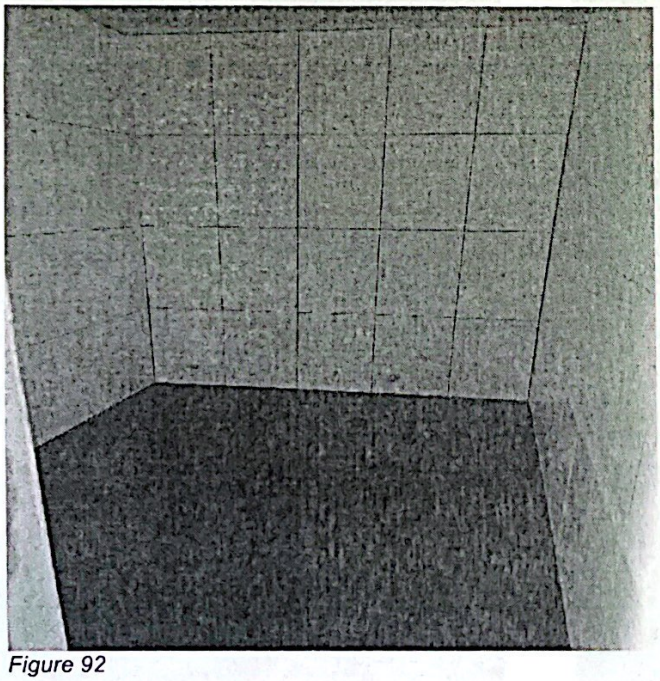


Figure 92

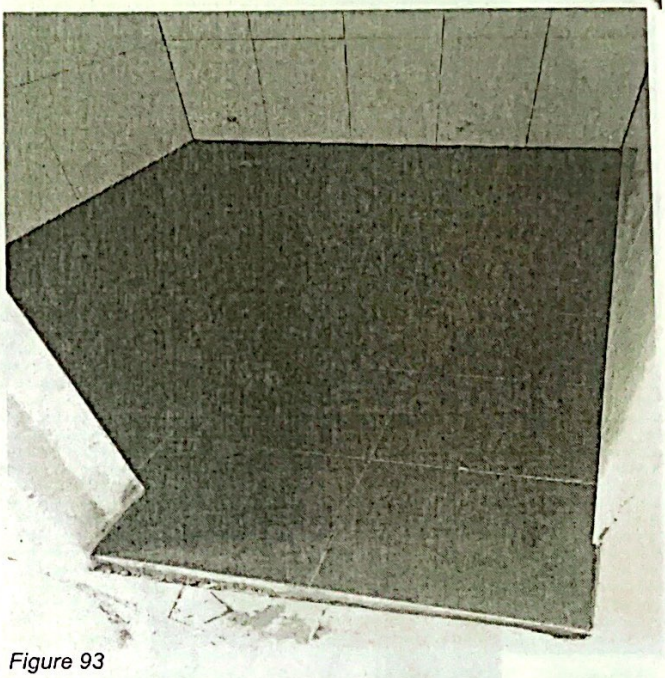


Figure 93

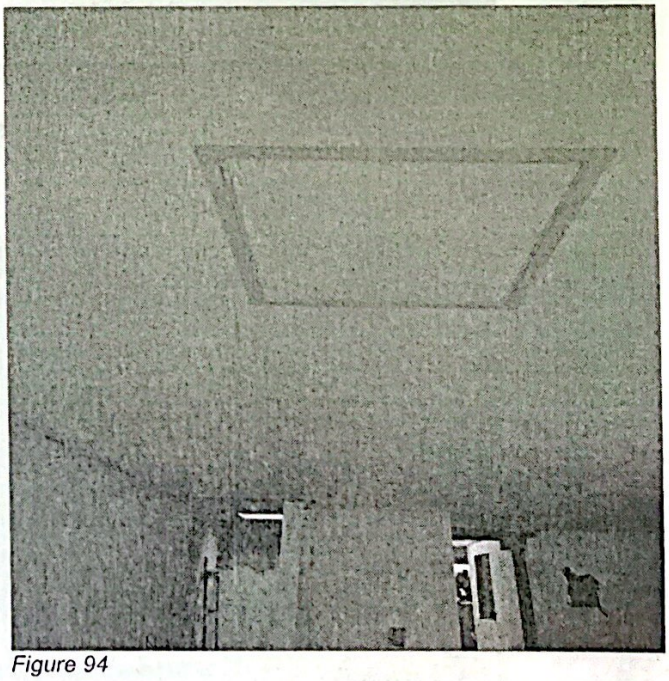


Figure 94

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 ☎ 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

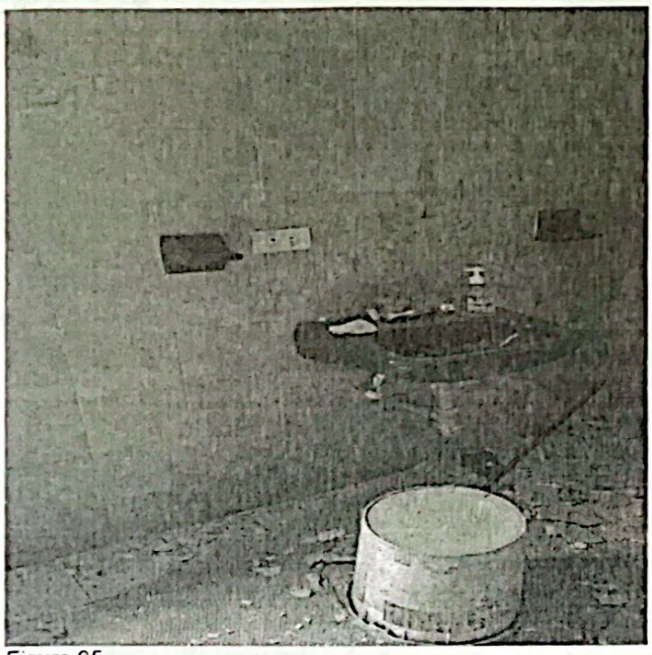


Figure 95

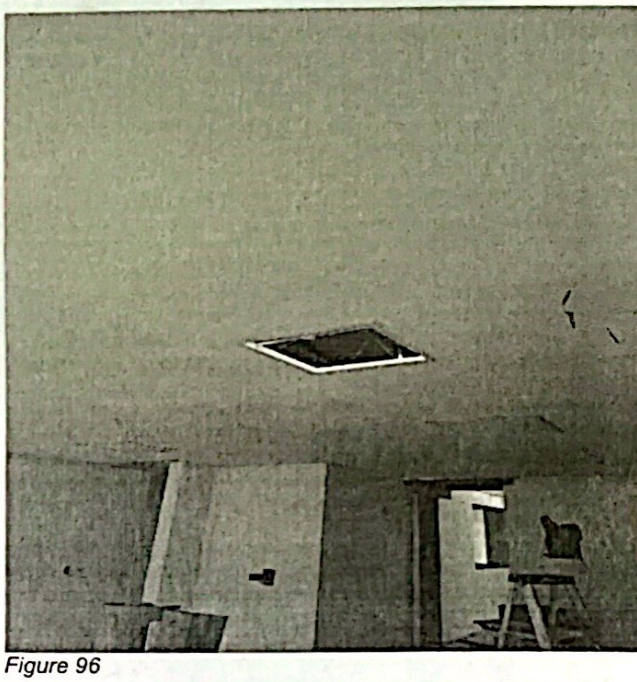
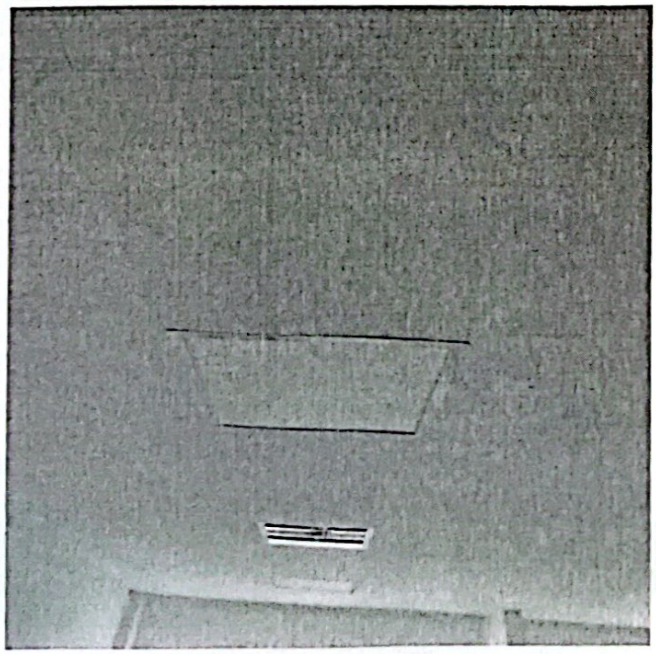


Figure 96



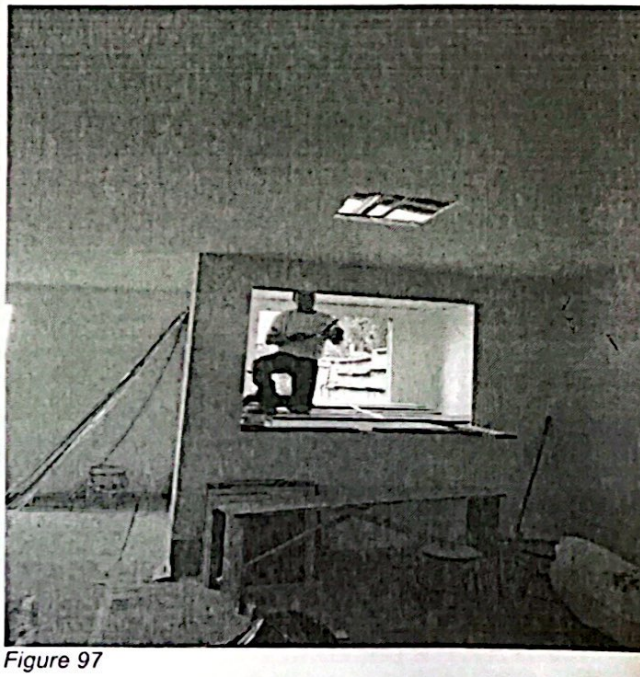


Figure 97

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

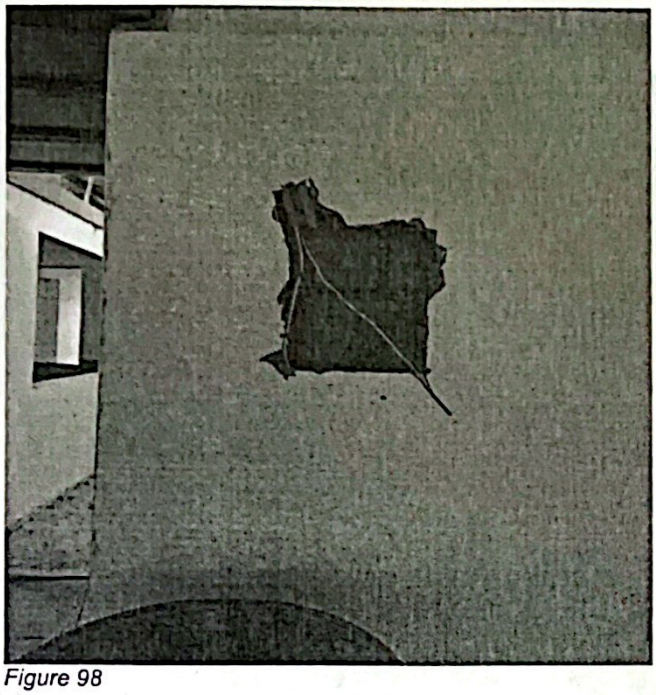


Figure 98

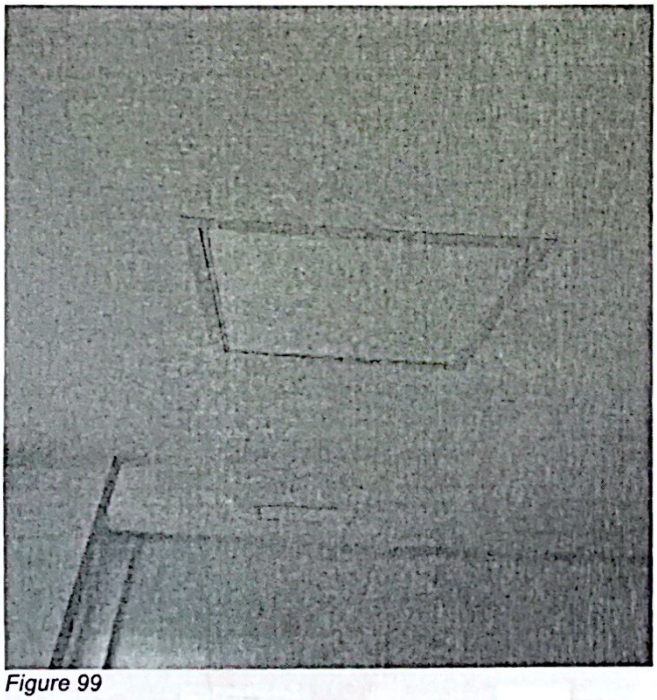


Figure 99

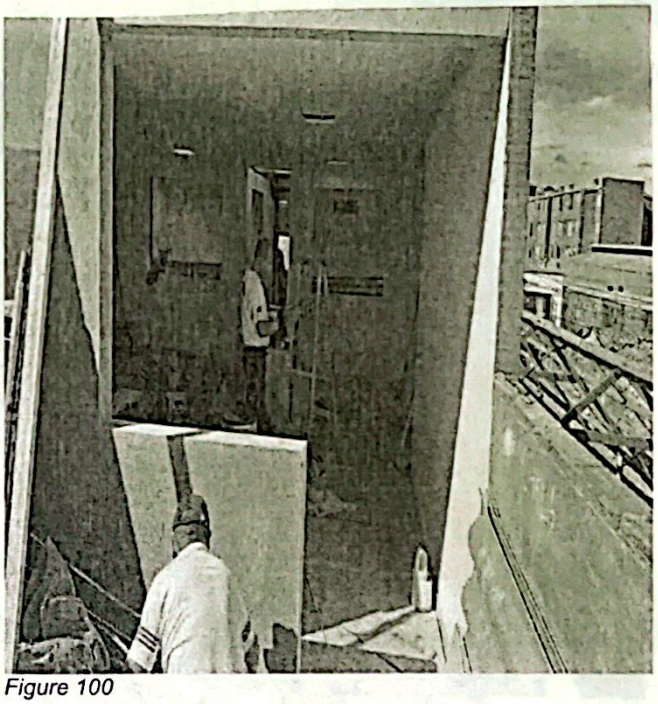


Figure 100

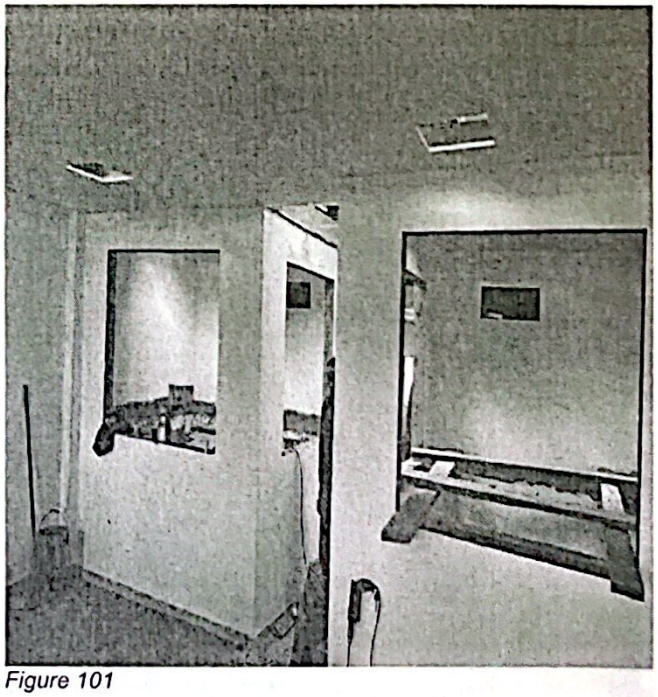


Figure 101

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

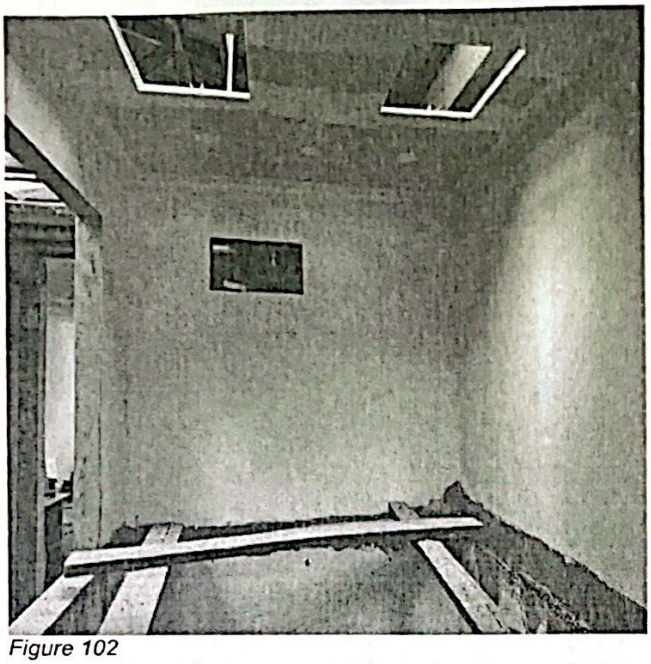


Figure 102

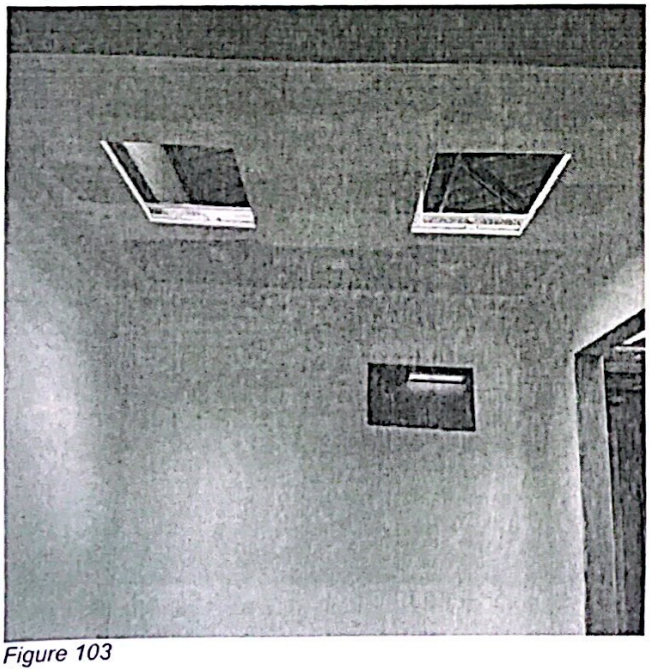


Figure 103

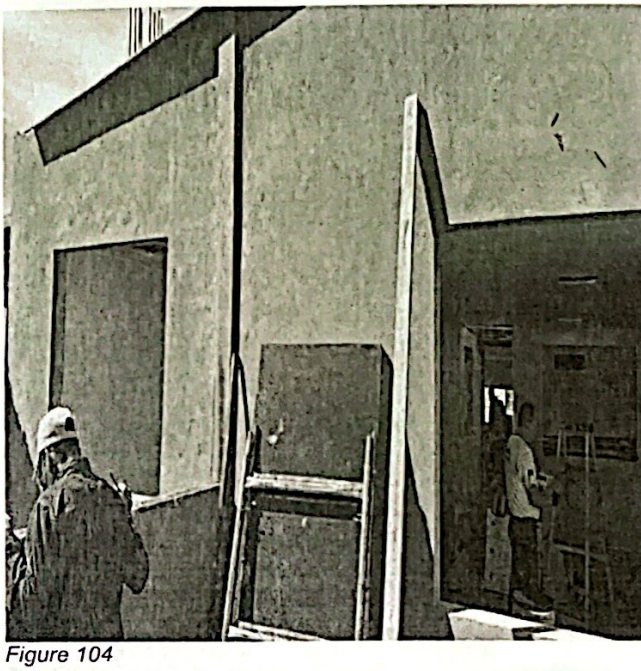


Figure 104

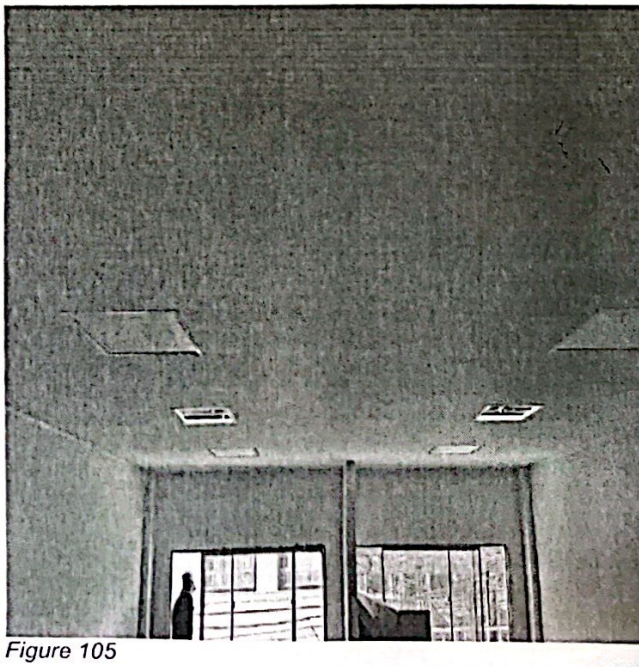


Figure 105

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

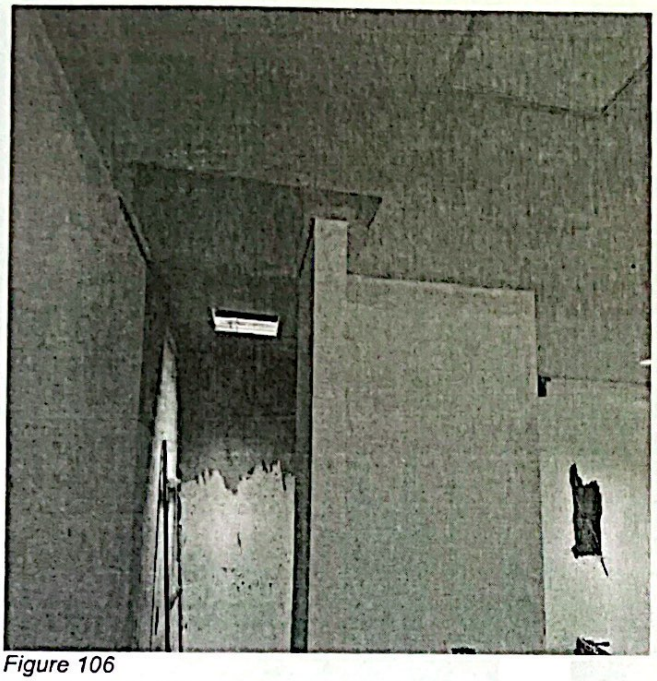


Figure 106

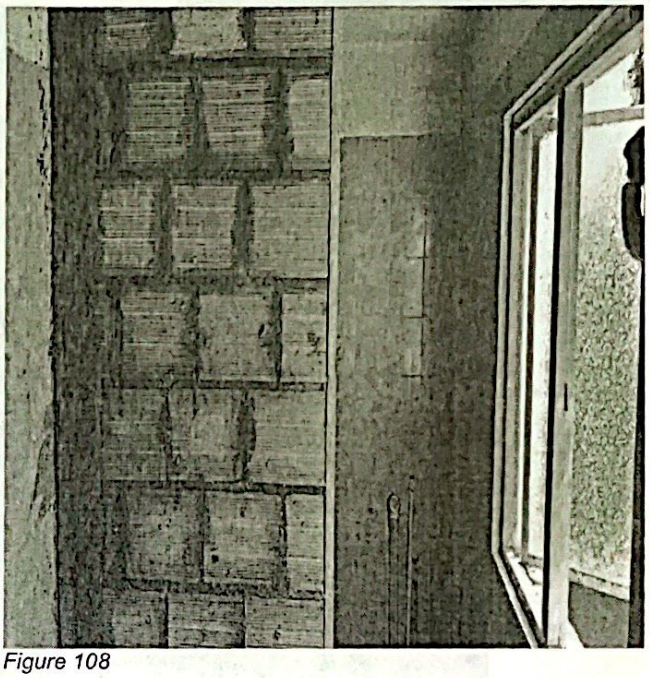


Figure 108

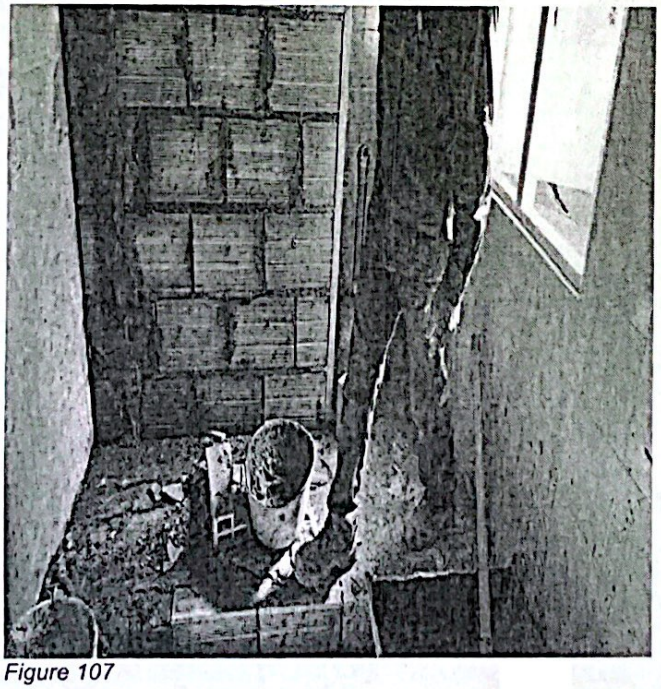


Figure 107

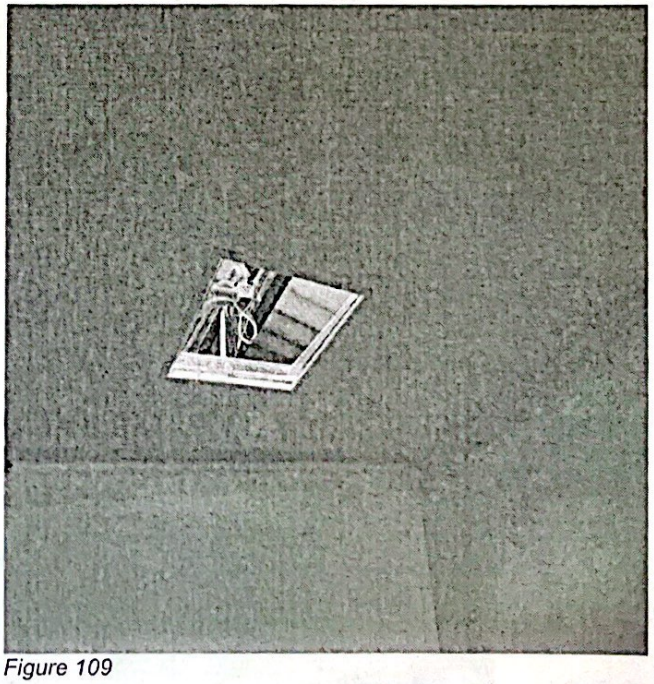


Figure 109

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

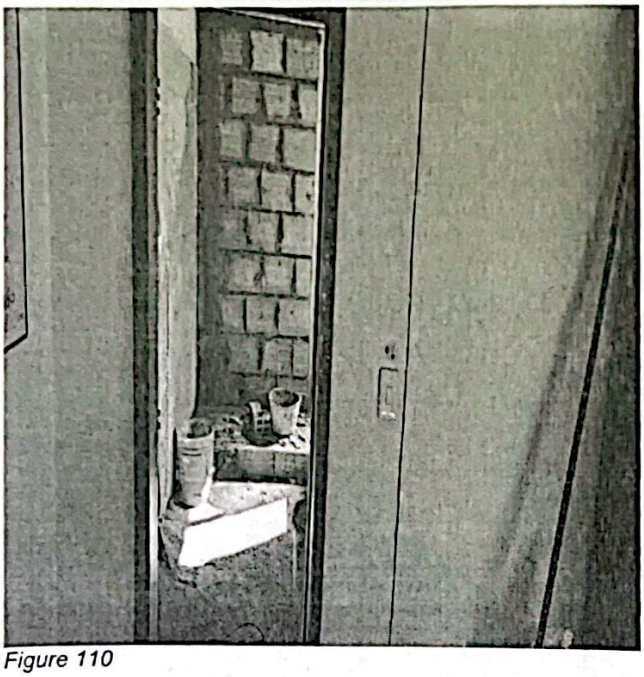


Figure 110



Figure 112

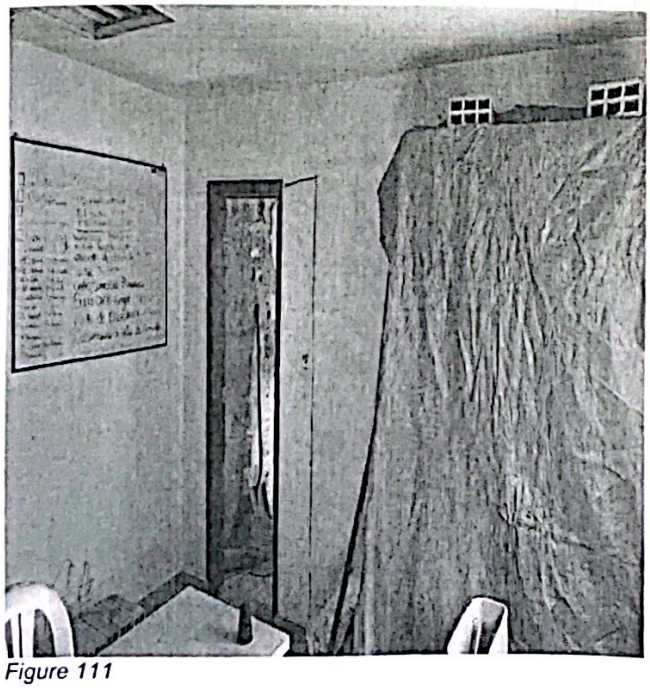


Figure 111



Figure 113

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

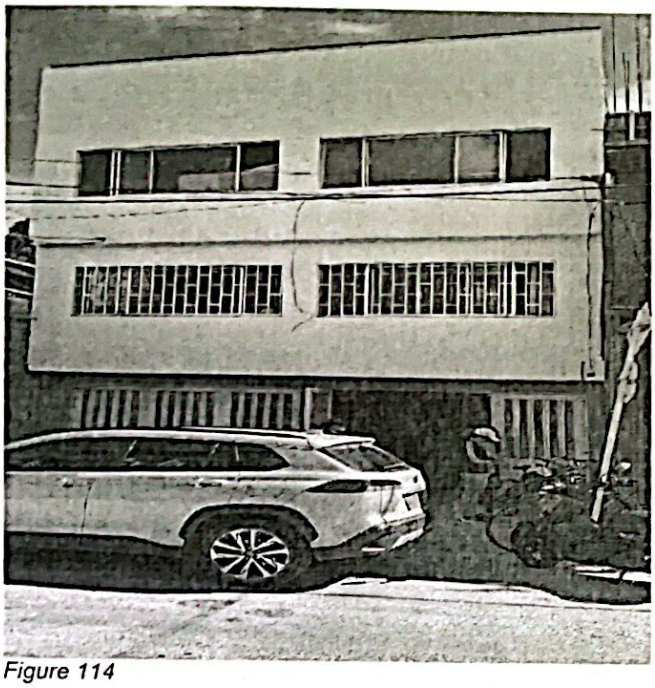


Figure 114



Figure 116

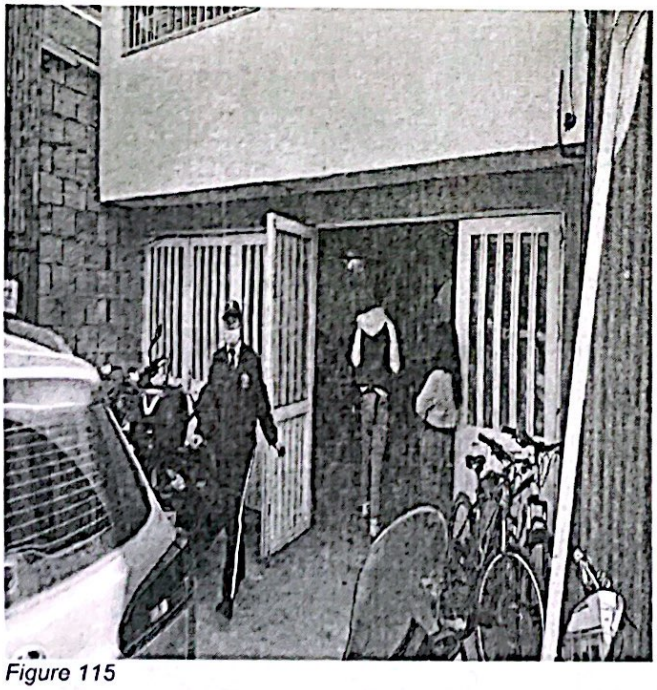


Figure 115



Figure 117

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co



Figure 118



Figure 119



Figure 120



Figure 121

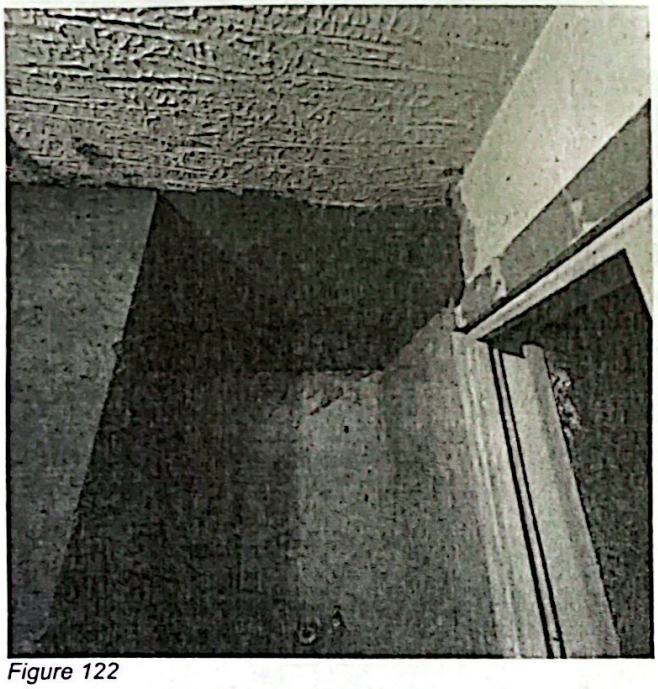


Figure 122

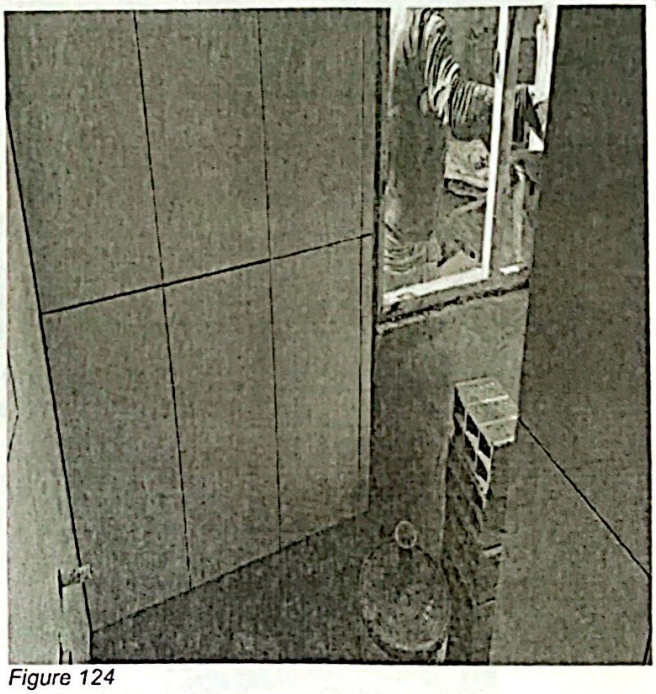


Figure 124

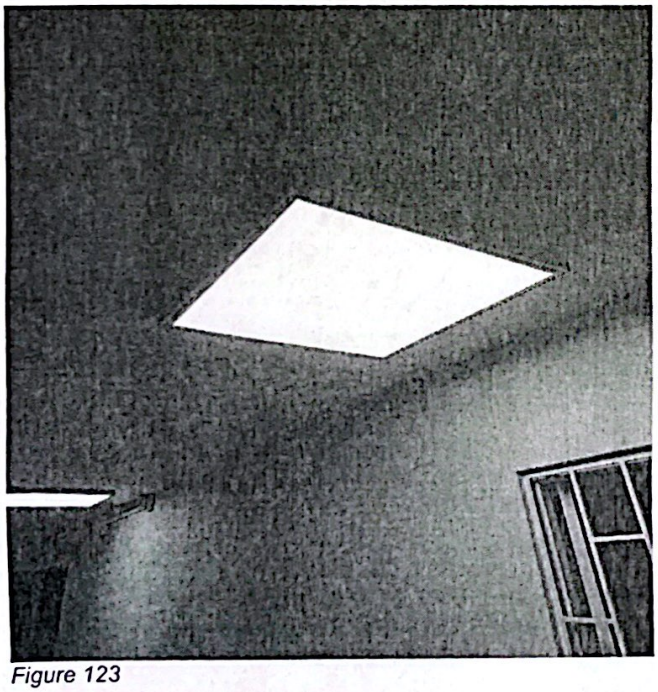


Figure 123

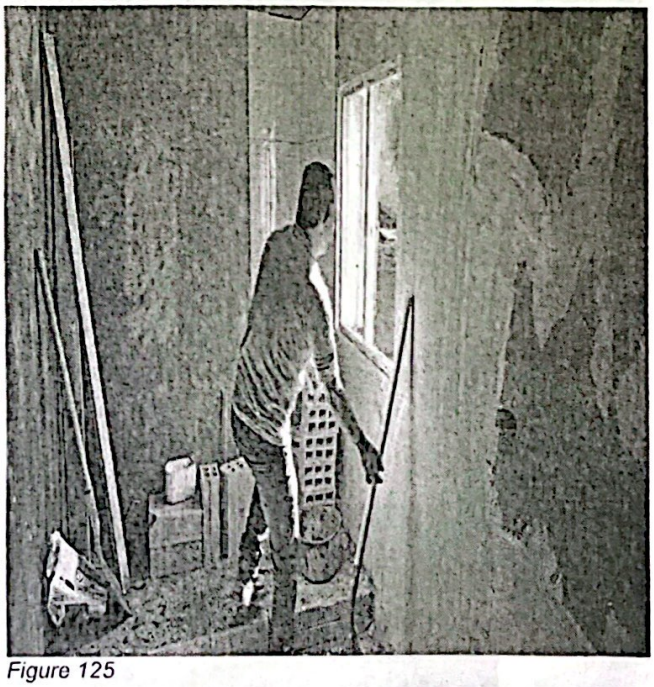


Figure 125

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

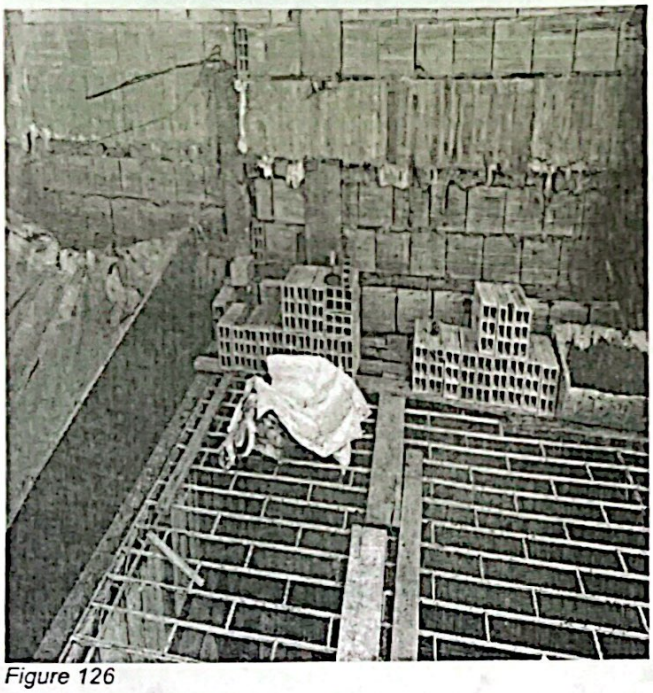


Figure 126

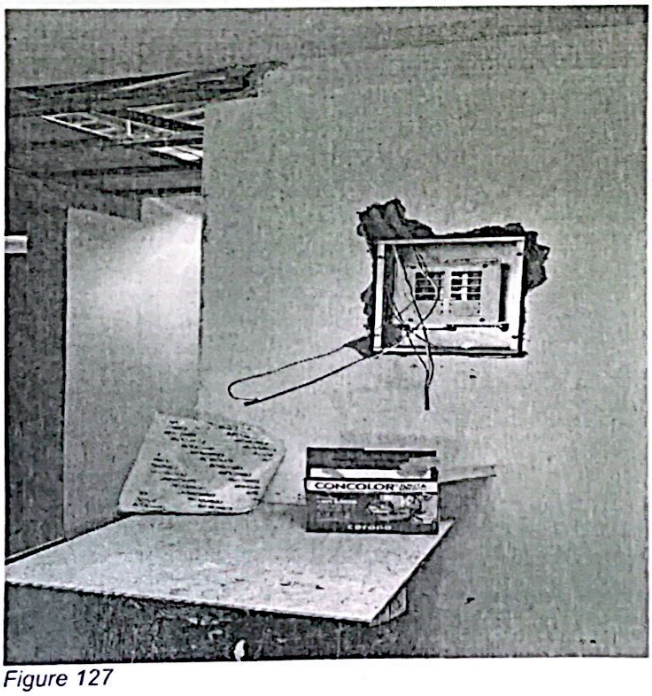


Figure 127



Figure 128



Figure 129

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

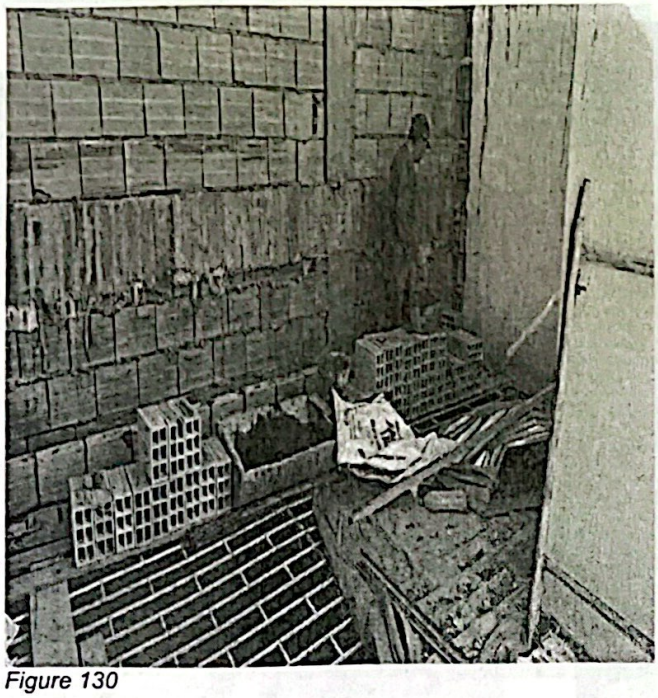


Figure 130



Figure 131

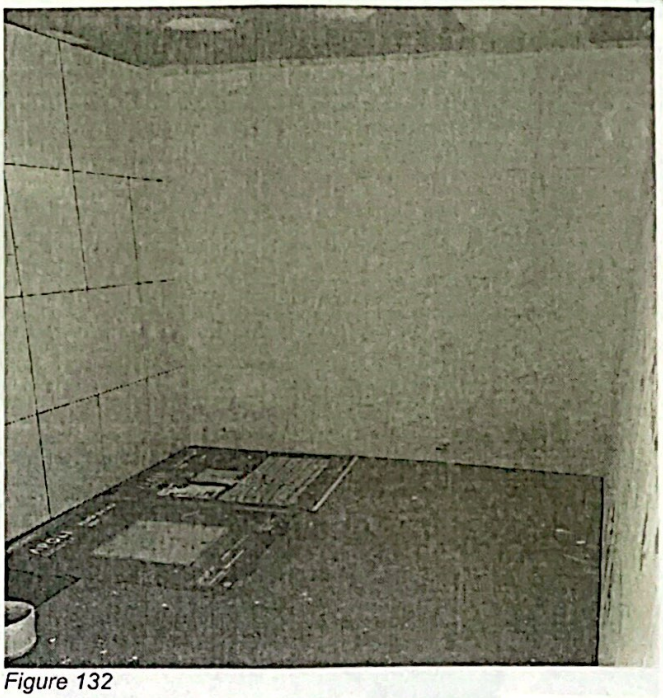


Figure 132



Figure 133

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co



Figure 134



Figure 135

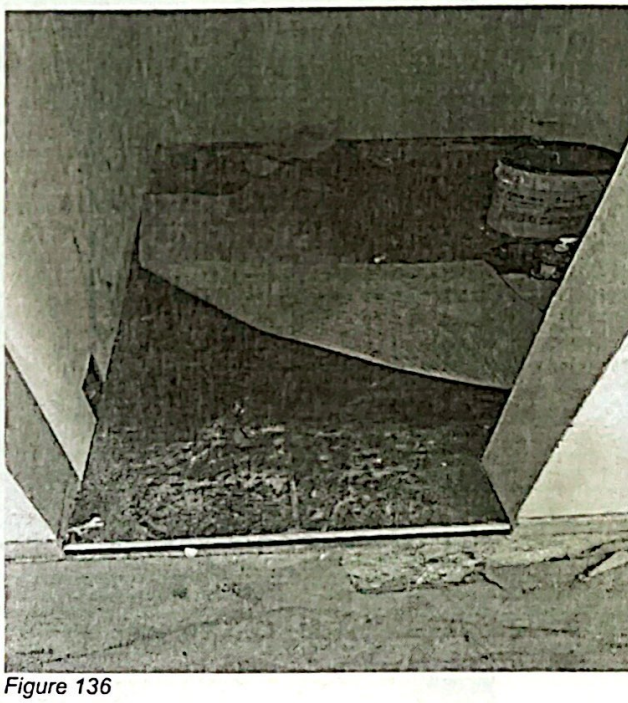


Figure 136



Figure 137

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

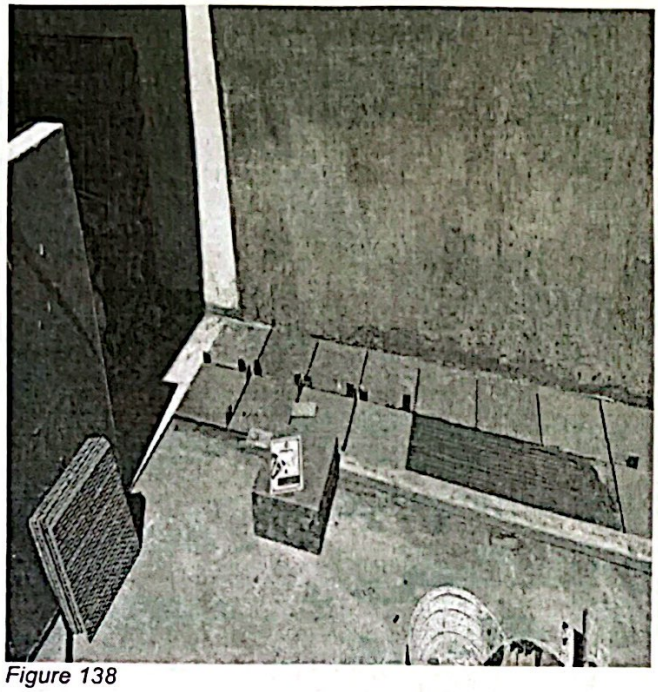


Figure 138

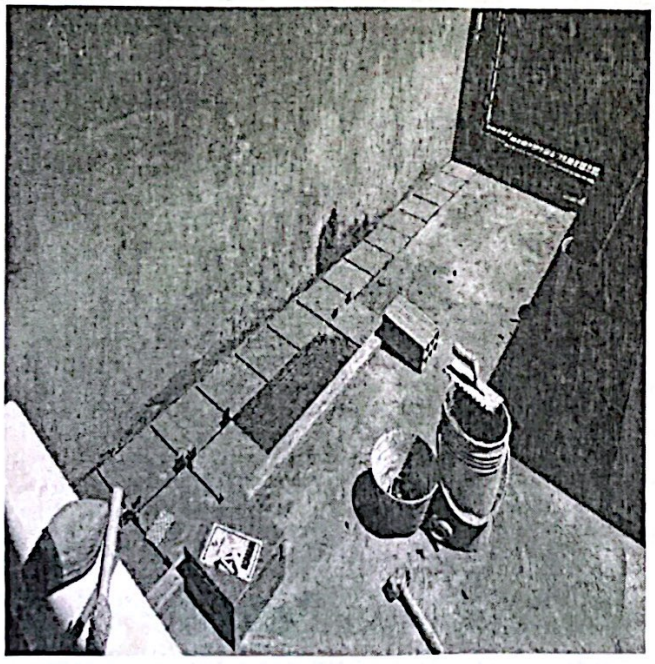


Figure 139



Figure 140

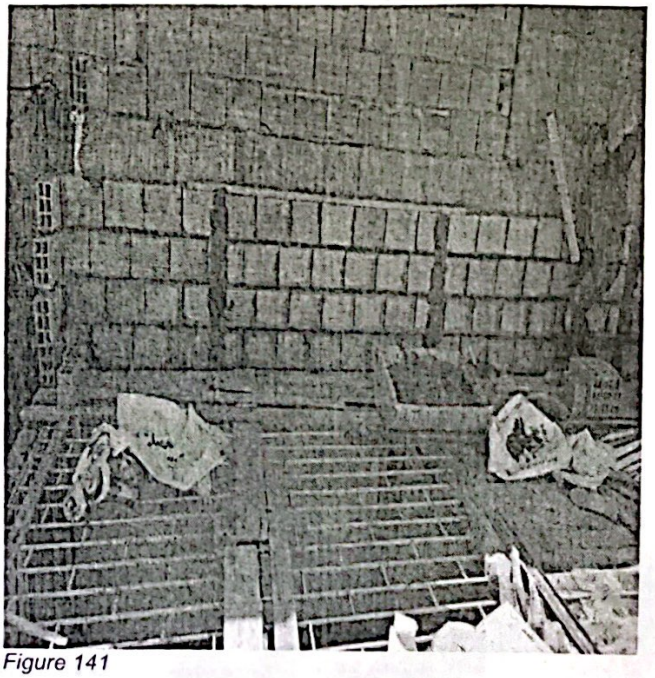


Figure 141

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co



Figure 142

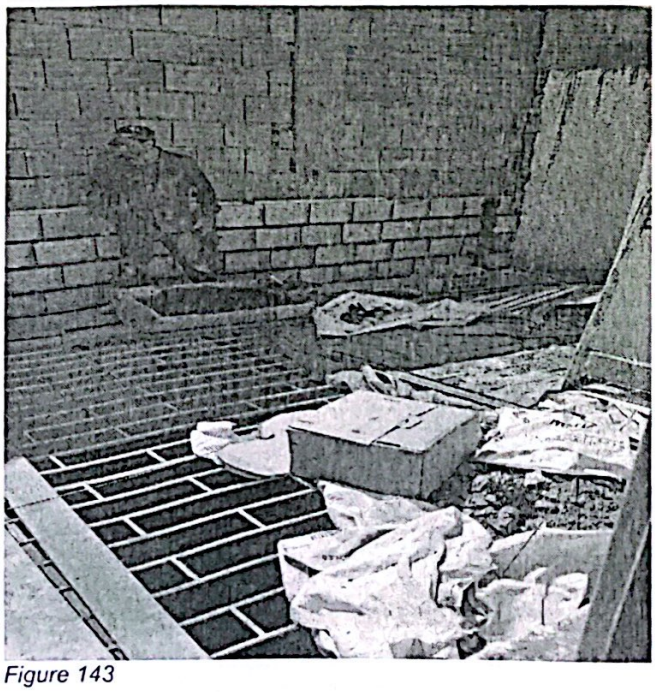


Figure 143

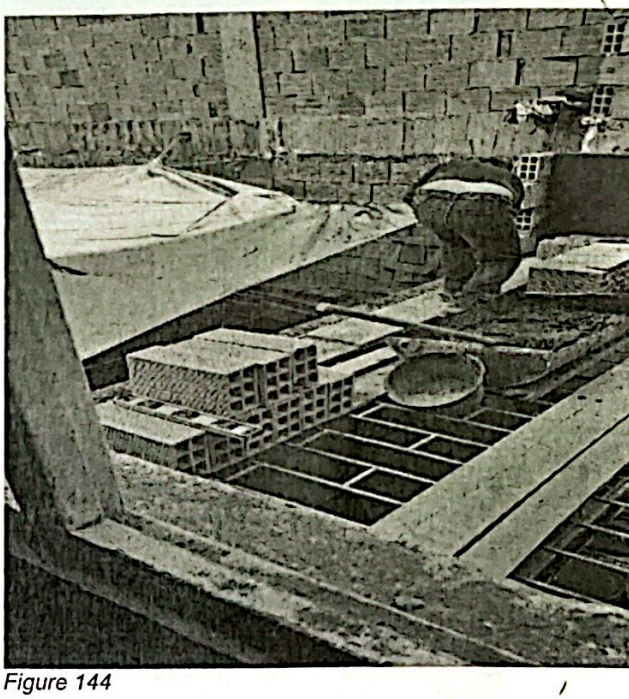


Figure 144

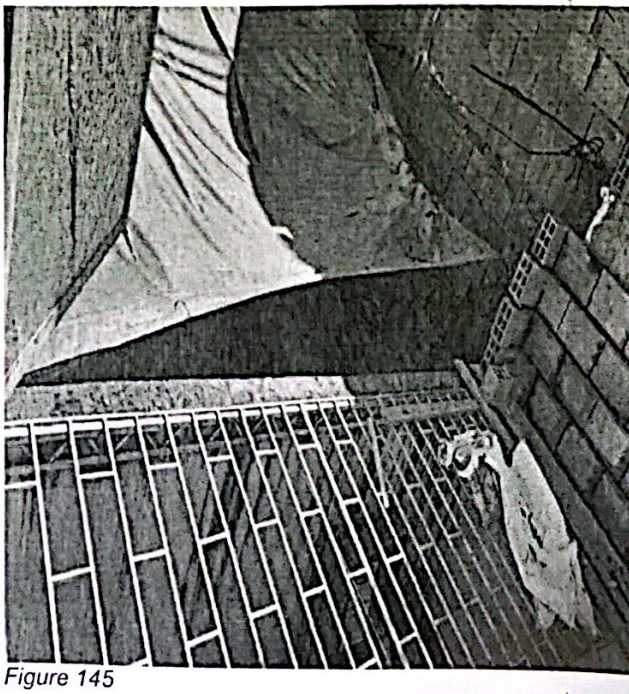


Figure 145

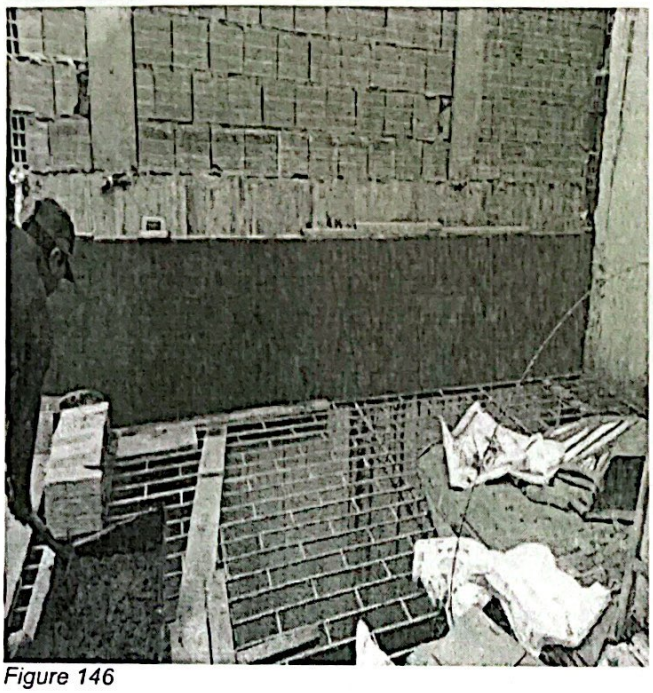


Figure 146



Figure 148



Figure 147

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 (601) 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co

9. CONCLUSIONES

Para el anterior periodo se puede concluir lo siguiente:

- Se realizan algunos análisis de actividades complementarias adicionales que son necesarias para darle el alcance apropiado al proyecto. Para este periodo son las siguientes:

    - Salidas eléctricas para el tercer piso.

- Se concluye que en este periodo se cumple con el cronograma pactado y aprobado por la interventoría donde nos muestra que para la sexta semana de actividades se tiene un avance real de obra del 100%.

Calle 2 Bis No. 71 D - 16 601 7748610
info@grupoinarco.co www.grupoinarco.co
