

Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1			**obra rama judicial**	**51 días**	**mié 22/11/23**	**sáb 13/01/24**		
2			inicio	0 días	mié 22/11/23	mié 22/11/23		9;10;4FC+22 días;5FC+1
3		**1**	**MANTENIMIENTO DE PUERTA**	**29 días**	**mar 12/12/23**	**mié 10/01/24**		
4		1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTA DE MADERA ENTANORADA SIN CAMBIO DE CERRADURRA INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.	26 días	jue 14/12/23	mié 10/01/24	2FC+22 días	29
5		1.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS Y/O BRAZO CIERRA PUERTA	28 días	mar 12/12/23	mar 9/01/24	2FC+19 días	29
6		**2**		**30 días**	**sáb 25/11/23**	**mié 27/12/23**		
7		2.1	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTUR	30 días	sáb 25/11/23	mié 27/12/23	2FC+4 días	
8		**3**	**MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ACABADOS**	**51 días**	**mié 22/11/23**	**sáb 13/01/24**		
9		3.1	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO. INCLUYE RASPADA, RESANE, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANADAMIO Y TODOS LOS ELEMENOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	51 días	mié 22/11/23	sáb 13/01/24	2	29

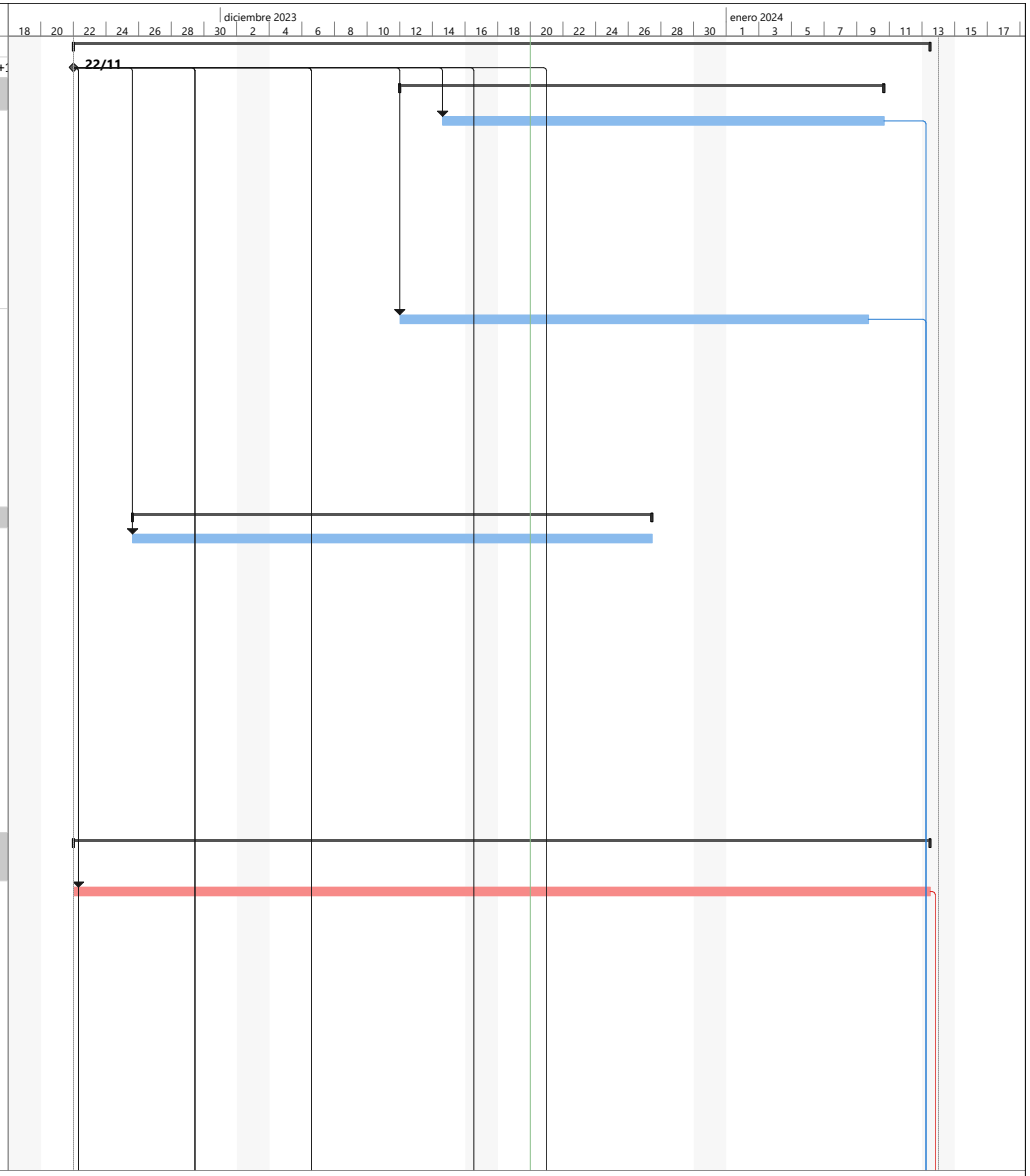

Proyecto:
PROGRAMACION SINCELEJO V.1
Fecha: mié 20/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
10		3.2	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	51 días	mié 22/11/23	sáb 13/01/24	2	29
11		**4**	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATO**	**34 días**	**mié 6/12/23**	**mié 10/01/24**		
12		4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO CON TOMA CORRIENTE REGULADO DOBLE A 120V CON SALIDA ELECTRICA EN CABLE # 12 Y CONDUCIDO POR CANALETA PLASTICA 100 X 45 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	34 días	mié 6/12/23	mié 10/01/24	2FC+14 días	29
13		4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 x 45 PARA ADECUACION DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE (DESCUBIERTO) EN LAS DISITINTAS DEPENDENCIAS INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	34 días	mié 6/12/23	mié 10/01/24	2FC+14 días	29
14		4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI DOBLE A 125V EN BAÑO INCLUYE DESMONTE DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	20 días	sáb 16/12/23	sáb 6/01/24	2FC+24 días	

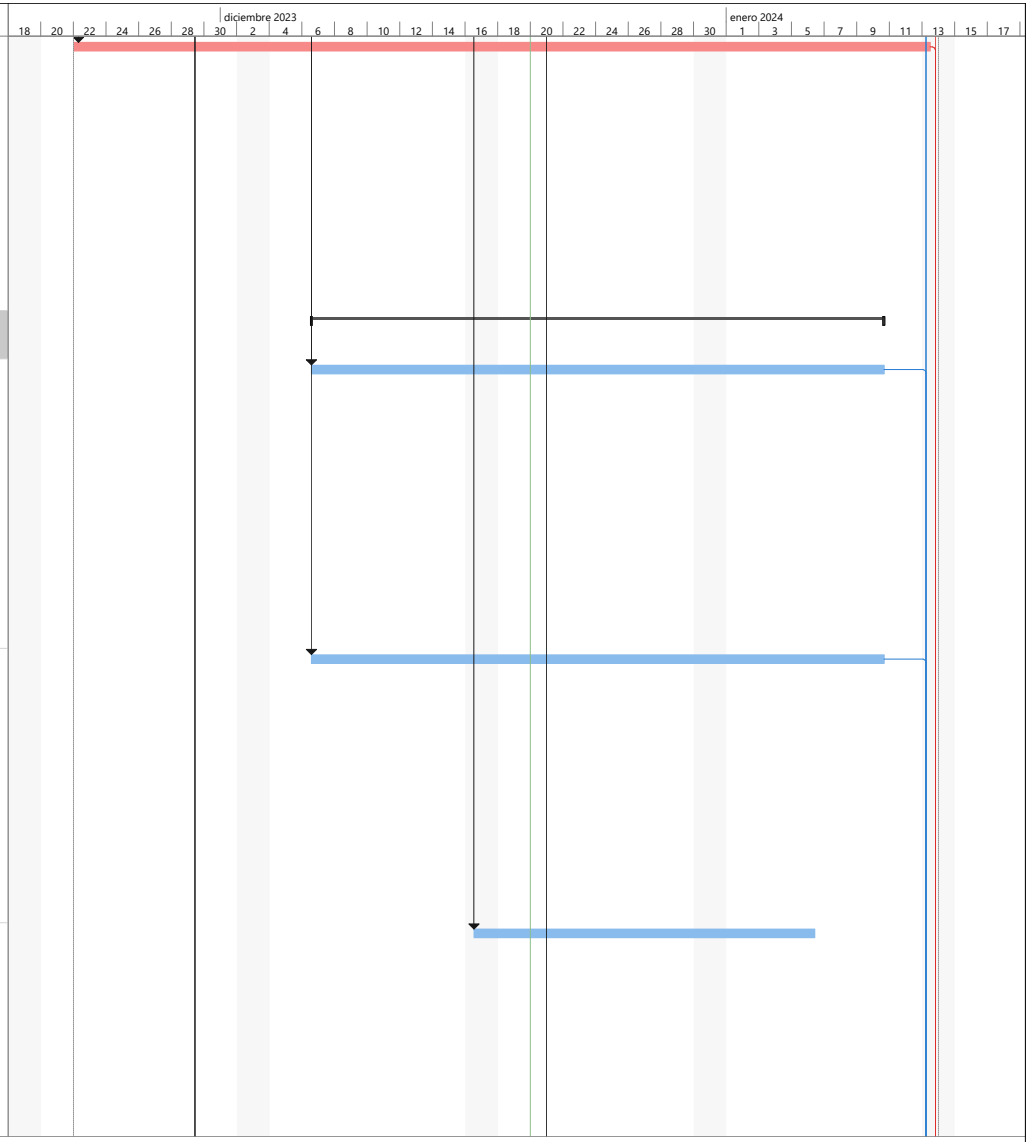

Proyecto:
PROGRAMACION SINCELEJO V.1
Fecha: mié 20/12/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas				
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica				
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso				


Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
15		4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS CON CABLE UTP Y CONDUCIDO POR CANALETA PLASTICA A 20X12 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	2 días	jue 21/12/23	vie 22/12/23	2FC+28 días	
16		**5**	**REMPLAZO DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED**	**37 días**	**mié 29/11/23**	**sáb 6/01/24**		
17		5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL REDONDO INCRUSTADO LED 6" INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTEN EN EL	8 días	mié 29/11/23	jue 7/12/23	2FC+7 días	
18		5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 30X120 INCRUSTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTEN EN EL DEPOSITO QUE	37 días	mié 29/11/23	sáb 6/01/24	2FC+7 días	
19		**6**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**20 días**	**sáb 23/12/23**	**sáb 13/01/24**		
20		NP1	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO. INCLUYE RASPADA, RESANE, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANADAMIO Y TODOS LOS	20 días	sáb 23/12/23	sáb 13/01/24	29FF	
21		NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA METALICA CON ACCESO A DEPENDENCIAS (INCLUYE JUEGO DE LLAVES, RETIRO DE LAS EXISTENTES Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION)	20 días	sáb 23/12/23	sáb 13/01/24	29FF	

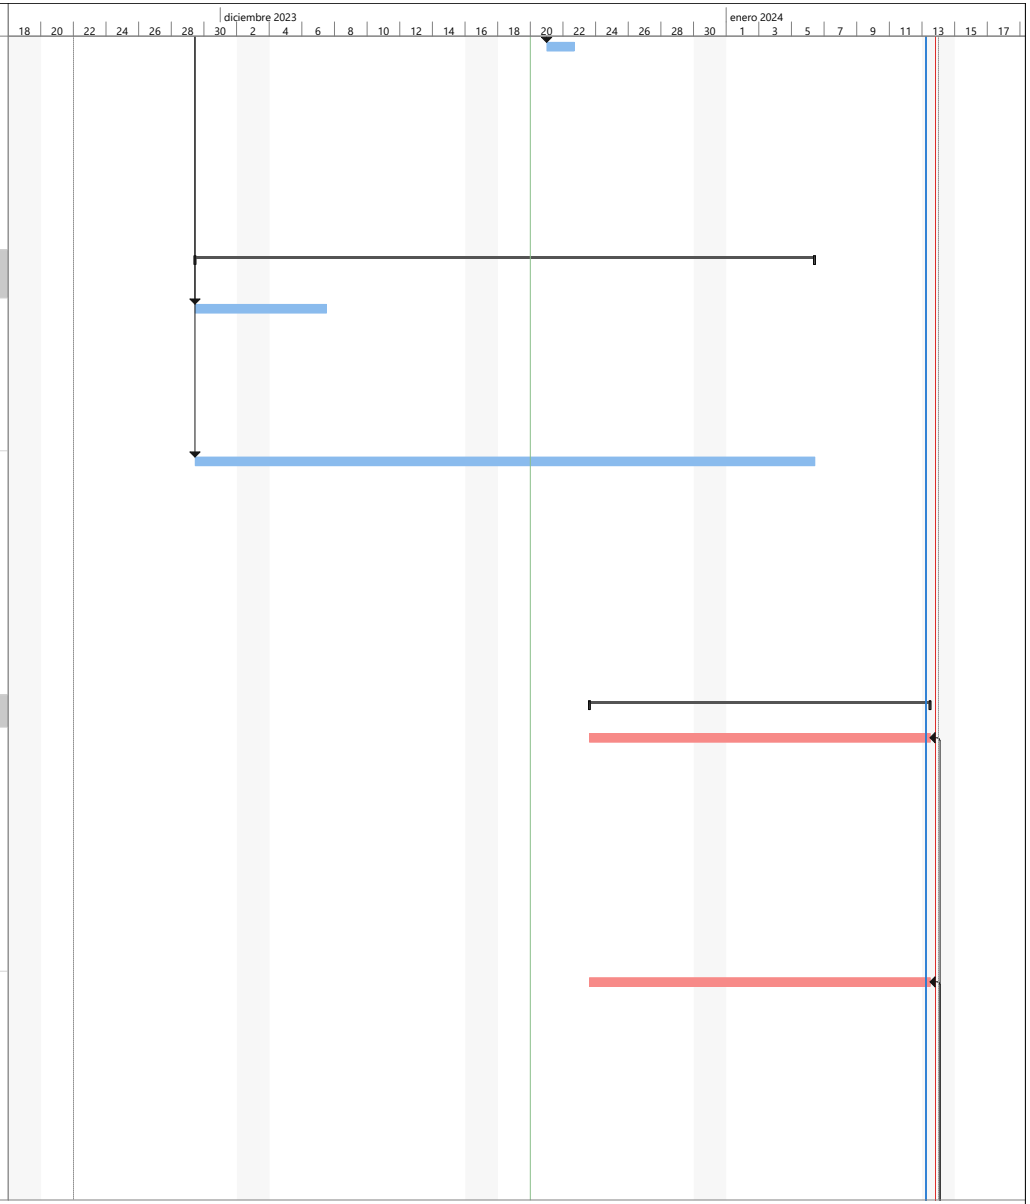

Proyecto:
PROGRAMACION SINCELEJO V.1
Fecha: mié 20/12/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	

Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
22		NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PORCELANA CON PEDESTAL INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	20 días	sáb 23/12/23	sáb 13/01/24	29FF	
23		NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AHORRADOR DE DOBLE DESCARGA INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	20 días	sáb 23/12/23	sáb 13/01/24	29FF	
24		NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO DE JARDINERIA (MATERA CILINDRICA-TRONC DE LA FELICIDAD-SOPORT DE MADERA)	15 días	vie 29/12/23	sáb 13/01/24	29FF	
25		NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDINERA EN CEMENTO	15 días	vie 29/12/23	sáb 13/01/24	29FF	
26		NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE JARDIN DE USO INTERNO INCLUYE ABONO	15 días	vie 29/12/23	sáb 13/01/24	29FF	
27		NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA TIPO PANEL CON CORREDERA HORIZONTAL INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y HERRAJES DE 4,00 M X 2,4 M APROX	15 días	vie 29/12/23	sáb 13/01/24	29FF	
28		NP9	MATENIMIENTO DE MUEBLES EN MADRA (2 ESCRITORIOS, 1 ARMARIO, 1 MUEBLE BAJO, 3 PUERTAS Y ENTREPAÑOS) INCLUYE PINTURA TOTAL, BISAGRAS, HERRAJES Y AJUSTES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15 días	vie 29/12/23	sáb 13/01/24	29FF	
29			fin	0 días	sáb 13/01/24	sáb 13/01/24	10;9;4;5;12;13	20FF;21FF;22FF;23FF;24FF

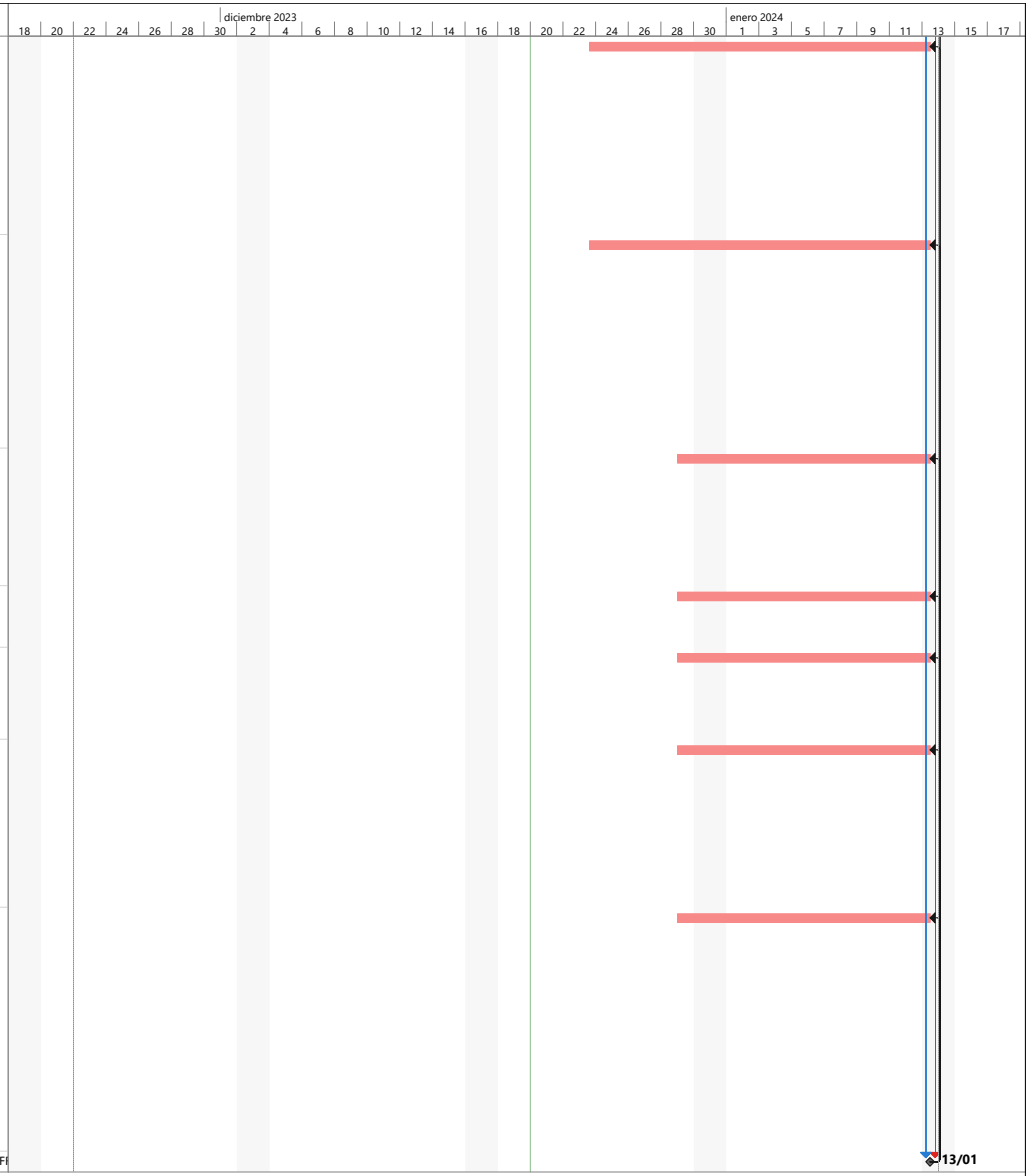

Proyecto:
PROGRAMACION SINCELEJO V.1
Fecha: mié 20/12/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	
