# Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

**INFORME DE SUPERVISION**

NUM. CONSECUTIVO DEL INFORME: 8

FECHA DE ELABORACION: 18 | 12 | 2023

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 8 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 18 de noviembre de 2023 | Y EL | 17 de diciembre de 2023 |
| OBJETO | "MEJORAMIENTO URBANÍSTICO DE LA AVENIDA "FRANCISCO EL HOMBRE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" | | | | |
| LOCALIZACIÓN | DISTRITO DE RIOHACHA ENTRE CALLE 15 Y LA CALLE 33 SOBRE LA CARRERA 7H "AVENIDA FRANCISCO EL HOMBRE" | | | | |

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 587 DE 2022 |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA |
| PLAZO INICIAL | 13 MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN | 18 de abril de 2023 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| *FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 18 de mayo de 2024 |
| PLAZO ACTUALIZADO | N/A |
| VALOR INICIAL | $ 14.961.100.754,54 |
| ANTICIPO PACTADO | N/A |
| VALOR ADICION(ES) | N/A |
| VALOR ACTUALIZADO | N/A |
| VALOR PAGADO | $ 9.172.706.587,43 |
| VALOR POR PAGAR | $ 5.788.394.167,11 |

| CONTRATO DE CONSULTORIA | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 240 DE 2023 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL FRANCISCO EL HOMBRE |
| PLAZO INICIAL | 10 MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN | 18 de abril de 2023 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| *FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 18 de Febrero 2024 |
| PLAZO ACTUALIZADO | N/A |
| VALOR INICIAL | $ 1.084.668.634,00 |
| ANTICIPO PACTADO | N/A |
| VALOR ADICION(ES) | N/A |
| VALOR ACTUALIZADO | N/A |
| VALOR PAGADO | N/A |
| VALOR POR PAGAR | N/A |

* Inserte las filas que requiera segun el número de suspensiones y reinicios

## 2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

**CONTRATO DE OBRA**

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 12/12/2023 | 16/09/2024 | $ 1.591.592.261,49 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 12/12/2023 | 18/05/2024 | $ 2.244.165.113,18 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 12/12/2023 | 19/05/2027 | $ 795.796.130,74 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 18/05/2024 | 19/05/2029 | $ 1.591.592.261,49 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 12/12/2023 | 18/05/2024 | $ 1.591.592.261,49 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 18/04/2023 | 18/06/2024 | $ 108.466.863,40 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 18/04/2023 | 18/02/2027 | $ 54.233.431,70 |
| CALIDAD DE SERVICIO | 18/02/2024 | 18/02/2029 | $ 108.466.863,40 |

## 3. RESUMEN DE PAGOS

**CONTRATO DE OBRA**

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| Anticipo Pactado (15%) | 17/05/2023 | $ 2.244.165.113,18 |
| Acta Parcial No 1 | 19/07/2023 | $ 2.620.540.937,35 |
| Acta Parcial No 2 | 18/08/2023 | $ 2.087.542.539,90 |
| Acta Parcial No 3 | 18/12/2023 | $ 2.220.457.997,00 |
| | | |
| | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA**


| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - OBRA**




**AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - INTERVENTORIA**

## 4. CURVA "S"

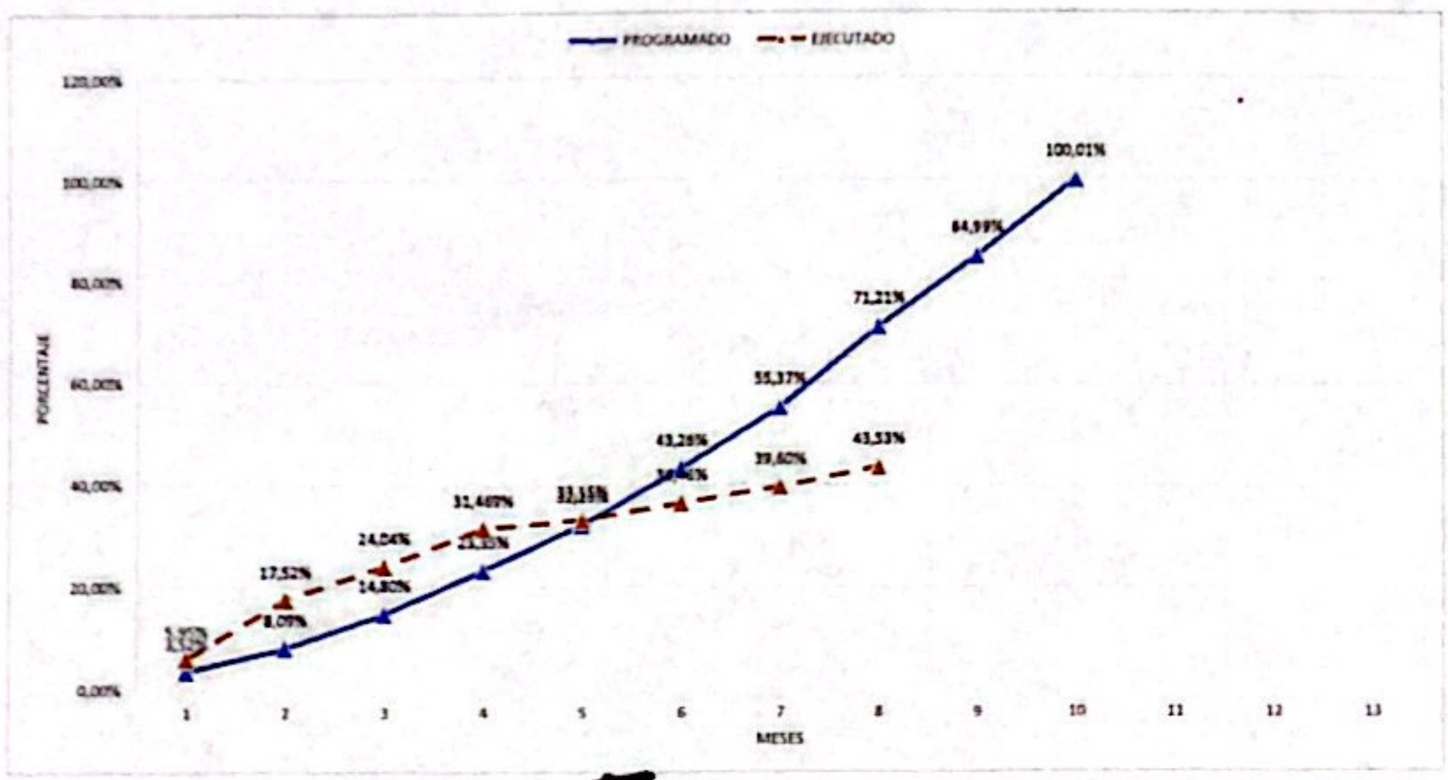


**PROGRAMADO:** Valor acumulado conforme a la programación vigente


**EJECUTADO:** Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

**PAGADO:** Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago)

Powered by CamScanner

# Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

## 5. RELACION DE HITOS (AVANCE)

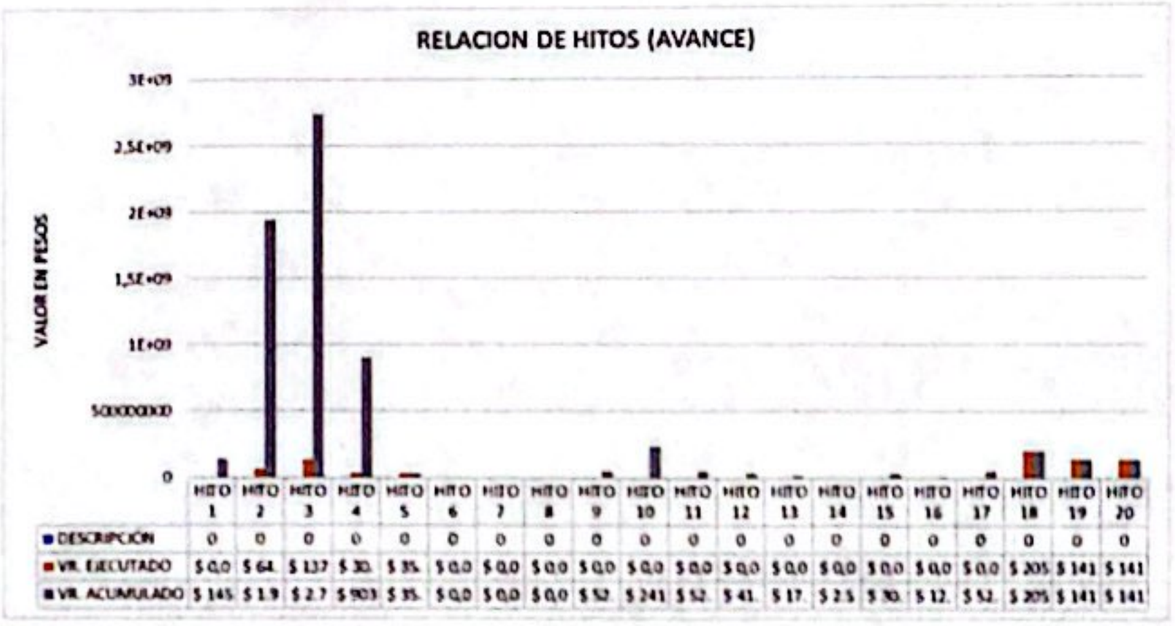


| | HITO 1 | HITO 2 | HITO 3 | HITO 4 | HITO 5 | HITO 6 | HITO 7 | HITO 8 | HITO 9 | HITO 10 | HITO 11 | HITO 12 | HITO 13 | HITO 14 | HITO 15 | HITO 16 | HITO 17 | HITO 18 | HITO 19 | HITO 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR. EJECUTADO | $ 0,0 | $ 64. | $ 1.37 | $ 30. | $ 35. | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 205 | $ 141 | $ 141 |
| VR. ACUMULADO | $ 145. | $ 1.9 | $ 2.7 | $ 903 | $ 35. | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 52. | $ 241 | $ 52. | $ 41. | $ 17. | $ 2.5 | $ 30. | $ 12. | $ 52. | $ 205 | $ 141 | $ 141 |

## 4. GESTION AMBIENTAL

FUENTE MATERIALES

UBICACIÓN

SITIO LLAMADO "LAGUNETA"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTADEROS | SI | | NO | X | N.A | |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | | NO | X | N.A | |
| PERMISO TALA | SI | | NO | X | N.A | |
| ESCOMBRERAS | SI | X | NO | | N.A | |
| VERTIMIENTOS | SI | | NO | X | N.A | |
| EMISIONES | SI | | NO | X | N.A | |

OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA MANTENER INFORMADO AL SUPERVISOR SOBRE LOS MATERIALES SOBRANTES Y SU DISPOSICION FINAL Y ENVIAR LA DIRECCION DEL SITIO.

| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| HITO 1 | COMPONENTE PAVIMENTOS |
| HITO 2 | ADECUACION DE TERRENO |
| HITO 3 | PAVIMENTO |
| HITO 4 | ACERO DE REFUERZO |
| HITO 5 | ANDENES Y SARDINEL |
| HITO 6 | ACTIVIDADES ELECTRICAS Y LUMINARIAS |
| HITO 7 | MOBILARIO URBANO |
| HITO 8 | SEÑALIZACION |
| HITO 9 | COMPONENTE ALCANTARILLADO |
| HITO 10 | MOVIMIENTOS |
| HITO 11 | INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO |
| HITO 12 | OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA |
| HITO 13 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |
| HITO 14 | INSTALACION DE TUBERIA RED DE ACUEDUCTO |
| HITO 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS |
| HITO 16 | SUMINISTRO REDES DE ALCANTARILLADO |
| HITO 17 | SUMINISTRO REDES DE ACUEDUCTO |

## 5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En el presente mes no se presentaron mayores o menores cantidades de obras

## 6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

| Control de Seguridad Industrial | Actividades Realizadas | |
|---|---|---|
| 1. Diariamente se realizan pausas activas de los trabajadores y durante ese lapso de tiempo se hidrata el personal de obra, ya que las temperaturas están haciendo muy altas.<br>2. Se realiza aprobación por parte de la interventoría de 45 trabajadores a obra.<br>3.Contratista realiza envío de formatos de entrega de EPP al personal a la interventoría.<br>4. Se realiza recorrido en obra en compañía de la interventoría y se evidencia el uso de EPP.<br>5. En el presente periodo no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes en obra. | **De medida Preventiva** | Las Charlas y otros:<br>1. Cerramiento como protercion a la comunidad y al trafico vehicular.<br>2. Se realizaron encuesta de sintomatologia al personal que labora en obra.<br>4. Se envían por parte del Coordinador HSEQ del contratista UT VIAS GEO PAZ RIOHACHA, reporte de las actividades implementadas en obra del PAPSO y reporte de novedades del dia. |
| | **Actividades de Higiene y Seguridad Industrial** | La limpieza de baños y oficinas se continúa ejecutando al menos dos veces por semana<br>La interventoría se acoge a las medidas establecidas en el PAPSO del contratista en obra, e implementa medidas de bioseguridad propias del consorcio CID, como son; encuesta digital de sintomatología y bitácora de recorridos. Sin novedad hasta la fecha. Se observa lavado de Baños con frecuencia diaria |
| *Se deberá Anexar los listados de entrada y Salida del Personal | **Ingreso Personal** 07:00a.m | **Salida Personal** 05:00p.m |

Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica)

## 7. GESTION SOCIAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 50 | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 8 | **OBSERVACIONES** |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 32 | No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: | 3 | **- Se debe reforzar la comunicación con la comunidad.** |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 18 | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 2 | **- Se verificó el Buzón de Sugerencia y esta semana no se encontraron PQRS por parte de la comunidad ni de los trabajadores.** |
| | | SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | | |
| | | SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 1 | |
| | | VISITAS- ACTAS DE VECINDAD | 25 | |

## 6.1 PERSONAL EN OBRA

CONTRATO DE OBRA

| NOMBRE | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|
| MIGUEL GARCIA ROMANI | 8779865 | DIRECTOR DE OBRA |
| YERALDITH RAMOS BONILLA | 1063961586 | RESIDENTE DE OBRA |
| DAVID MESA CALVO | 1118826381 | TOPOGRAFO |
| LIESEL PATRICIA HERNANDEZ M. | 1118826362 | REP LEGAL |
| ROSMIRA BRITO BLANCO | 40941758 | TRABAJADORA SOCIAL |
| SHERYL ARANZA COTES | 1118871844 | TRABAJADORA SOCIAL |

CONTRATO DE INTERVENTORIA

| NOMBRE | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|
| JORGE MARIO DURAN ROMERO | 7572339 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
| CARLOS CRISTIAN CAMARO IGUARAN | 1118818038 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| SNEIDER JAVIER REDONDO BRUGES | 84084937 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 |
| MARCOS DAZA JULIO | 7574355 | ING CIVIL ESP EN VIAS |
| ALEJANDRO NEL PACHECO | 9086932 | ING CIVIL ESP EN SUELOS |
| SAMIUEL RAMIREZ DE LA HOZ | 7573021 | ING CIVIL ESP EN HIDRAULICA |
| CINDY BAQUERO MONTAÑO | 1124404844 | PROFESIONAL SISO |
| ELDA GOMEZ PEÑALVER | 40847426 | CONTADOR PUBLICO |
| ANGEL HERNANDEZ FONSECA | 1124514835 | ASESOR JURIDICO |
| JOSE EDUARDO TORO CALVO | 17830592 | TOPOGRAFO 1 |
| JHON CARLOS FLOREZ FONSECA | 1143357398 | TOPGRAFO 2 |
| JOSE GABRIEL MEZA CALVO | 1118815544 | CADENERO 1 |
| ROBERTO ANDRES VARELA DUARTE | 1075647469 | CADENERO 2 |
| JORGE ISAAC GAMEZ MOREU | 1124532267 | CADENERO 3 |
| LAUREANO COTES ARISTIZABAL | 72345439 | CADENERO 4 |
| EIDY LINE VIZCAINO CAMPO | 36466646 | SECRETARIA |
| FRANKLIN LUIS BONIVENTO GOMEZ | 1124505067 | INSPECTOR |

Powered by CamScanner


## 6. REGISTRO FOTOGRAFICO



GEOTEXTIL



PEDRAPLÉN EN PIEDRA DE RÍO

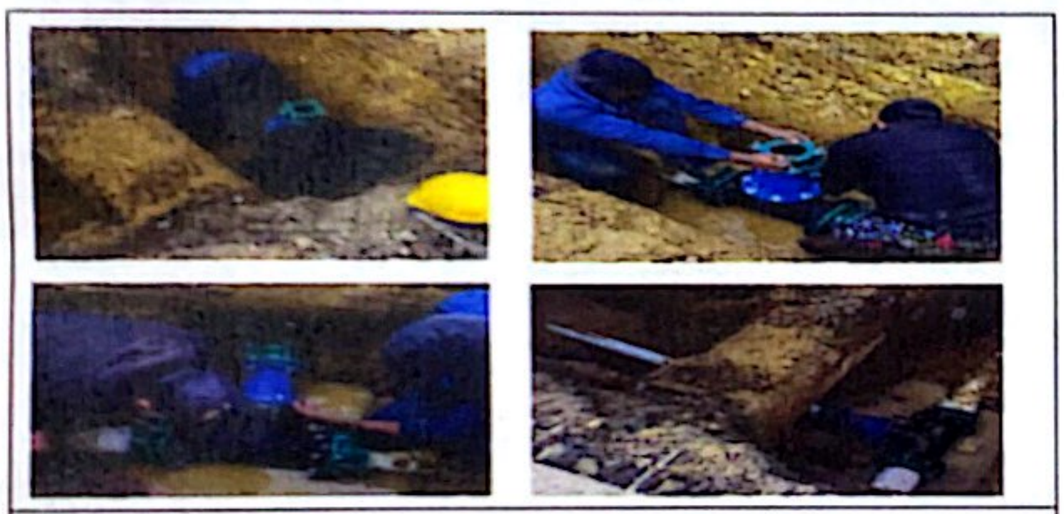


INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ACUEDUCTO



MEZCLA DE CONCRETO FABRICADO CON EQUIPO AUTOHORMIGONERA PARA COLOCACIÓN EN SITIO, VIBRÂDO, ALLANADO, TEXTURIZADO Y CURADO CON ANTISOL, PAVIMENTO EN CONCRETO DE e=0.25 mt Y Mor = 4.2 Mpa



CORTE, DILATACIÓN Y SELLO DE JUNTAS EN CORDÓN DE POLIRUETANO CON SELLO DE SILICONA

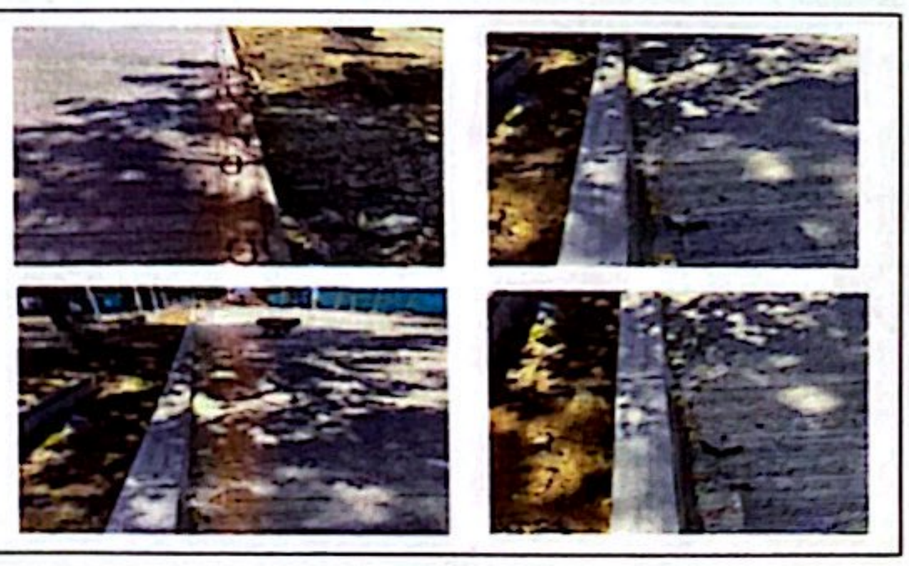

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO

## 6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION

1. SE RECOMENDO MEJORAR LA IMPLEMENTACION DEL PMT, PRESENTA DEFICIENCIA EN TEMA DE SEÑALIZACIONES
2. SE SOLICITO VERIFICAR DIARIAMENTE QUE EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO TENGAS LOS EPP COMPLETOS
3. IMPLEMENTAR EL PAGA YA QUE SE EVIDENCIA QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO AL 100%
4. SE RECOMIENDA ABRIR MAS FRENTES DE TRABAJO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS

APOYO A LA SUPERVISION

Powered by CamScanner
