No: 20-2-2023-004168
22/12/2023 16:37:06

Doctor
JAIME JOSE BAUTE DANGON
Subdirector (E)
CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
SENA – REGIONAL CESAR
KM 7 VIA LA PAZ
Valledupar

Asunto: Informe de supervisión Parcial de contrato CO1.PCCNTR.5555517 diciembre 2023

Cordial saludo;

Con el fin de surtir el trámite de pago parcial respectivo, me permito allegar el informe de supervisión del contrato CO1.PCCNTR.5555517por parte del contratista SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos para continuar con el proceso:

- Acta de supervisión parcial
- Informe contratista
- Factura electrónica
- Soporte seguridad social
- Certificación bancaria
- Rut expedido por la DIAN
- Garantias

Atentamente;

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN
Fecha: 2023.12.19 10:33:46 -05'00'

MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN
Instructora G17
Supervisora de contrato

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 01 del 20/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.55555217
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	Contratar el mantenimiento Preventivo y Correctivo de las redes sanitaria Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar
VALOR:	CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MTE ($ 112.646.954 COP).
CONTRATISTA:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I.S.A.S.
NIT:	900.950.957.-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/11/23
FECHA DE INICIO:	30/12/23
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	40 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 112.646.954 COP

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 112.646.954 COP
PRÓRROGA No x:	NO APLICA
ADICIÓN No. x:	**NO HAY ADICION**
SUSPENSIÓN No. x:	NO APLICA

1. **FORMA DE PAGO:**

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera:

Pagos que se realizarán durante el contrato	**Porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato**	**Requisito para el pago**
PAGO 1	50%	A. POR PARTE DEL CONTRATISTA: presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN (En caso de estar obligado). Acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes al periodo facturado. Estos documentos deben soportarse en el secop II
PAGO 2	25%	
PAGO 3	25%	
TOTAL	100%	

		cumpliendo el procedimiento establecido por los lineamientos trámite de pago Contratistas del SENA que se encuentre vigente para ello. B. POR PARTE DEL SENA: El informe de supervisión suscrito por el Supervisor del contrato del recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales (art. 50 Ley789 de 2002 y art. 23 Ley 1150 de 2007), de acuerdo al derecho de turno. Del Derecho de Turno: Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos

		conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. El pago al que se obliga EL SENA por el presente acto, queda subordinado a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

2. ASPECTOS LEGALES

GARANTÍAS CONTRACTUALES:

1. Cumplimiento del contrato.
2. Pago de salarios.
3. Calidad del servicio.
4. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO					
NOMBRE DE ASEGURADORA	**No POLIZA**	**GARANTIAS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101187240	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2023	30/06/2024	$ 11.264.695,40
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACION LABORALES	16/11/2023	30/12/2026	$ 5.632.347,70
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	16/11/2023	30/06/2024	$ 22.529.390,80
	25-40-101049714	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	16/11/2023	30/12/2023	$ 232.000.000,00

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO					
NOMBRE DE ASEGURADORA	**No POLIZA**	**GARANTIAS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101187240	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2023	12/07/2024	$ 11.264.695,40
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACION LABORALES	28/11/2023	11/01/2027	$ 5.632.347,70
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	28/11/2023	12/07/2024	$ 22.529.390,80
	25-40-101049714	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/11/2023	11/01/2024	$ 232.000.000,00

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

4. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I.S.A.S., con NIT 900950957-3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales por lo tanto se recibe parcialmente a satisfacción segun factura No E42

6. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MARIA FERNANDA ESCALANTE con comunicación/mediante SECOP II de fecha 21 de NOVIEMBRE de 2023, hasta EL 30 DE DICIEMBRE de 2023.

7. BALANCE DEL CONTRATO:

I. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$112.646.954	18/12/2023	DICIEMBRE	$ 72.265.480	64,15%
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)	$112.646.954.				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	.				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 82.226.472 .				
Vr. SALDO A LA FECHA	$ 72.265.480				

(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)		Vr. Pagado a la fecha (3)	**$ 72.265.480**

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
18/12/2023	**E42**	**$ 72.265.480**	**$ 72.265.480**		**64,15%**		

II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:


ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	64,15%
Financiera	64,15%

Para el periodo informado se realizaron avances en las siguientes actividades:

AREA ADMINISTRATIVA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
1.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	45
2	**ACCESORIOS**		
2.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6
2.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6
2.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	6
3	**ASEO GENERAL**		
3.1	**ASEO GENERAL**	M2	30
AREA LABORATORIO BIOTECNOLOGIA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**CIELO RASOS**		
1.1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE SOPORTES Y PINTURA	M2	23
2	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
2.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	30
3	**ACCESORIOS**		
3.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	4
3.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	3
4	**ASEO GENERAL**		
4.1	ASEO GENERAL	M2	25
AREA ADMINISTRACION DE CENTRO			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		
1.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILZADO	M2	35
2	**CIELO RASOS**		
2.1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE SOPORTES Y PINTURA	M2	13
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
3.1	SALIDA LAMPARA INCANDECENTE	UND	6
4	**CARPINTERIA METALICA**		
4.1	PUERTA LAMINA C.R. CAL 18 INC PINTURA	M2	2
5	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
5.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	37
6	**APARATOS SANITARIOS**		
6.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	2
6.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	2
6.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	1
7	**ASEO GENERAL**		
7.1	ASEO GENERAL	M2	46
OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**TRANSPORTES**		
1.1	TRASIEGO Y DESECHOS DE MATERIALES INC. RETIRO VOLQUETA	M3	20

El anterior informe de ejecución se rinde a los 20 de diciembre 2023

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.



Elaboró: MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN-Instructora grado 17

.Revisó: MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN-Instructora grado 17

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5555517
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 11:23:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5555517
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento Preventivo y Correctivo de las redes sanitaria Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/04/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	24/04/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900950957

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	65600012547

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Lizeth Beltran Ortiz* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 9:09:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *jaime jose baute dangon* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 11:38:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(20/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5555517
Proveedor SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S
Creado por jaime jose baute dangon
Agregado en 21/11/2023 11:38:21 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario link del proceso https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28192907&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	Estudios Previos.pdf	Estudios Previos.pdf	Descargar Detalle
☐	Anexo Tecnico.pdf	Anexo Tecnico.pdf	Descargar Detalle
☐	Analisis de Riesgo.pdf	Analisis de Riesgo.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILÓMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección KILÓMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 7 VIA LA PAZ CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

1 CO1.PCCNTR.5555517

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
114.492.610,00	112.646.954,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Contratar el mantenimiento Preventivo y Correctivo de las redes sanitaria Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar	1,00	UN	114.492.610,00	112.646.954,00	114.492.610,00	112.646.954,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 9:09:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo a la _Aceptación_de_Oferta.pdf	Anexo a la _Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	jaime jose baute dangor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77168849	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA FERNANDA ESC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	56054500	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	jaime jose baute dangor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77168849	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	jaime jose baute dangon	21/11/2023 11:38:11 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	jaime jose baute dangon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	112.646.954
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	112.646.954

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-020-952110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7623	CDP	Generado	114.492.610 COP		36-02-00-020-911410	Editar

Saldo de CDP: 114.492.610 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 16/11/2023 3:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	**IBAGUE**	**25**	**25-44-101187240**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**12**	**2023**	**28**	**11**	**2023**	**00:00**	**11**	**01**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S	**NIT: 900.950.957-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 NRO. 13 B - 55 OF 203 BRR ALFONSO LOPEZ	VALLEDUPAR, CESAR	3112497792

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	**NIT: 899.999.034-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KILOMETRO 7 VIA A LA PAZ DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR	VALLEDUPAR, CESAR	5710101

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO A LA ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.5555517 DE 2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES SANITARIA CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**28/11/2023**	**12/07/2024**	**$11,264,695.40**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**28/11/2023**	**11/01/2027**	**$5,632,347.70**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**28/11/2023**	**12/07/2024**	**$22,529,390.80**	

ACLARACIONES

REFERENTE ACTA DE INICIO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5555517 SE ACLARA LAS VIGENCIAS INICIALES A PARTIR DEL DIA 28/11/2023 EN LOS AMPAROS ARRIBA CITADOS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******96,521.00	$ *******8,000.00	$ ******19,859.00	$ **********124,380.00	$ *******39,426,433.90	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
FRANCY LUZ CABEZAS MORENO	999236	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101187240

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	IBAGUE	25	25-44-101187240	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	12	2023	28	11	2023	00:00	11	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S		**NIT: 900.950.957-3**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 13 B - 55 OF 203 BRR ALFONSO LOPEZ	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	3112497792

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: KILOMETRO 7 VIA A LA PAZ DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	5710101

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

25-44-101187240

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	**IBAGUE**	**25**	**25-40-101049714**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**12**	**2023**	**28**	**11**	**2023**	**00:00**	**11**	**01**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S	**NIT: 900.950.957-3**	CR 15 NRO. 13 B - 55 OF 203 BRR ALFONSO LOPEZ	VALLEDUPAR, CESAR	3112497792

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	**NIT: 899.999.034-1**	KILOMETRO 7 VIA A LA PAZ DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR	VALLEDUPAR, CESAR	5710101

BENEFICIARIO: 899999034 - SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SURGEN DE LAS ACTUACIONES HECHOS U OMISIONES EN EL CONTRATO A LA ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.5555517 DE 2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES SANITARIA CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**28/11/2023**	**11/01/2024**	**$232,000,000.00**	

ACLARACIONES

REFERENTE ACTA DE INICIO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5555517 SE ACLARA LA VIGENCIA INICIAL A PARTIR DEL DIA 28/11/2023 EN EL AMPARO ARRIBA CITADO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******69,917.00	$ *******3,000.00	$ ******13,854.00	$ ***********86,772.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
FRANCY LUZ CABEZAS MORENO	999236	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-40-101049714

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	IBAGUE	25	25-40-101049714	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	12	2023	28	11	2023	00:00	11	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S		**NIT: 900.950.957-3**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 13 B - 55 OF 203 BRR ALFONSO LOPEZ	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	3112497792

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: KILOMETRO 7 VIA A LA PAZ DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	5710101

BENEFICIARIO: 899999034 - SENA REGIONAL CESAR - CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-40-101049714

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S

Valledupar, 18 de diciembre de 2023

Arquitecta:
MARÍA FERNANDA ESCALANTE DURAN
SUPERVISORA

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN PARA ACTA DE COBRO PARCIAL 01

Respetuosamente presento el informe de gestión de cobro parcial 01 del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5555517 cuyo objeto es ***"Contratar el mantenimiento Preventivo y Correctivo de las redes sanitaria Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar."*** con corte a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del 2023.

Atentamente,

LIZETH BELTRAN ORTIZ
C.C No.1.098.759.710 de Bucaramanga
Rep. Legal de SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES SANITARIA CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR.”

CONTRATO DE OBRA N°. **CO1.PCCNTR.5555517**

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.

INFORME DE GESTIÓN PARA COBRO PARCIAL 01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR

2023

INTRODUCCIÓN

En el marco de un compromiso enfocado en el mantenimiento de las instalaciones sanitarias en el centro educativo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Cesar, en el cual se lleva a cabo el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5555517, liderado por la empresa SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S en calidad de contratista. Este proyecto tiene como objetivo principal realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes sanitaria centro biotecnológico del caribe regional cesar, en cumplimiento de las obligaciones establecidas según el mencionado contrato.

La supervisión de esta importante iniciativa recae en la arquitecta María Fernanda Escalante Duran, quien desempeña el papel de instructora y garantiza la correcta ejecución de las tareas contempladas en el contrato. A lo largo de este informe, se detallarán las actividades realizadas, los logros obtenidos y se proporcionará información legal y financiera relevante para dar cuenta del progreso del proyecto.

La ficha técnica del contrato, así como las condiciones originales del mismo, revelan la magnitud y alcance de esta labor, destacando la modalidad de contratación (mínima cuantía) y la tipología del contrato (obra). El contrato, identificado con el número CO1.PCCNTR.5555517, fue suscrito el 21 de noviembre de 2023, con un plazo inicial de cuarenta (40) días y fecha de finalización establecida para el 30 de diciembre de 2023.

El valor inicial del contrato asciende a la suma de CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($112.646.954), reflejando el compromiso financiero para llevar a cabo las labores de mantenimiento en las redes sanitarias del Centro Biotecnológico del Caribe. Además, se presenta una descripción detallada del objeto del contrato, haciendo hincapié en la importancia de abordar el deterioro y mal estado de las instalaciones sanitarias y eléctricas, impactando directamente en la impresión institucional y la calidad de vida de la comunidad SENA.

A lo largo de este informe, se explorarán los aspectos clave del contrato, desde su suscripción hasta la fecha de corte del informe (18 de diciembre de 2023), proporcionando una visión integral del progreso y los desafíos enfrentados en el desarrollo de este proyecto fundamental para la comunidad educativa del SENA Regional Cesar.

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR
SUPERVISIÓN:	MARÍA FERNANDA ESCALANTE DURAN - INSTRUCTORA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
TIPOLOGÍA DE CONTRATACIÓN	OBRA
No. DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.5555517
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES SANITARIA CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I. S.A.S.
NIT	900.950.957-3
REPRESENTANTE LEGAL	LIZETH BELTRAN ORTIZ
IDENTIFICACIÓN DEL REP. LEGAL	1.098.759.710 DE BUCARAMANGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($112.646.954)
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO (30%)	N.A.
VALOR ADICIONAL	N.A.
PLAZO INICIAL	CUARENTA (40) DÍAS
FECHA DE INICIO	VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE CORTE DEL INFORME	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2023

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S

GARANTÍAS

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO					
NOMBRE DE ASEGURADORA	**No POLIZA**	**GARANTIAS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101187240	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2023	30/06/2024	$ 11.264.695,40
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACION LABORALES	16/11/2023	30/12/2026	$ 5.632.347,70
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	16/11/2023	30/06/2024	$ 22.529.390,80
	25-40-101049714	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	16/11/2023	30/12/2023	$ 232.000.000,00

GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO					
NOMBRE DE ASEGURADORA	**No POLIZA**	**GARANTIAS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101187240	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2023	12/07/2024	$ 11.264.695,40
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENIZACION LABORALES	28/11/2023	11/01/2027	$ 5.632.347,70
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	28/11/2023	12/07/2024	$ 22.529.390,80
	25-40-101049714	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/11/2023	11/01/2024	$ 232.000.000,00

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

El Centro Biotecnológico del Caribe presenta deterioro y mal estado en las baterías sanitarias e instalaciones eléctricas, originando de esta forma una impresión negativa institucional y como efecto colateral se ha visto afectada la comunidad SENA que se beneficia de estas zonas de servicios en el saneamiento básico. El 60% de los baños en ambientes de formación dentro del centro presentan problemas de saneamiento e inadecuadas condiciones físicas de infraestructura.

Este proyecto se encuentra enfocado en acceso continuo y adecuado del agua para consumo humano y al saneamiento básico, la gestión integral del recurso hídrico y la participación de la comunidad SENA en la gestión del agua. El proyecto desarrollará las actividades precisas para mantenimiento en infraestructura, equipos, redes e instalaciones sanitarias, las cuales procurarán sacar el máximo provecho de las cualidades y condiciones originales de los elementos, equipos e infraestructura, desarrollando los trabajos en la forma más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones constantes, lo cual permitirá las condiciones normales

de funcionamiento, llevando control y realizar actividades de limpieza periódica requerida a través de los registros.

Las actividades del contrato las redes sanitarias del Centro Biotecnológico del Caribe, SENA Regional Cesar, permitirá mejorar las condiciones de salubridad, garantizando la prestación del servicio mediante espacios propicios en el uso personal, controlando los patógenos y microorganismos que pueden ocasionar enfermedades a la salud humana, ya sea en áreas de Vestier, lavamanos, entre otros con el ánimo de satisfacer las necesidades de nuestros grupos de valor e interés.

LOCALIZACIÓN

CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR, VALLEDUPAR CESAR

El proyecto se desarrollará en El Centro Biotecnológico del Caribe ubicado a las afueras del municipio de Valledupar en el kilómetro 7 vía a La paz, Valledupar es la capital del departamento del Cesar, Colombia. Está ubicada al nororiente de la Costa Caribe colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá.

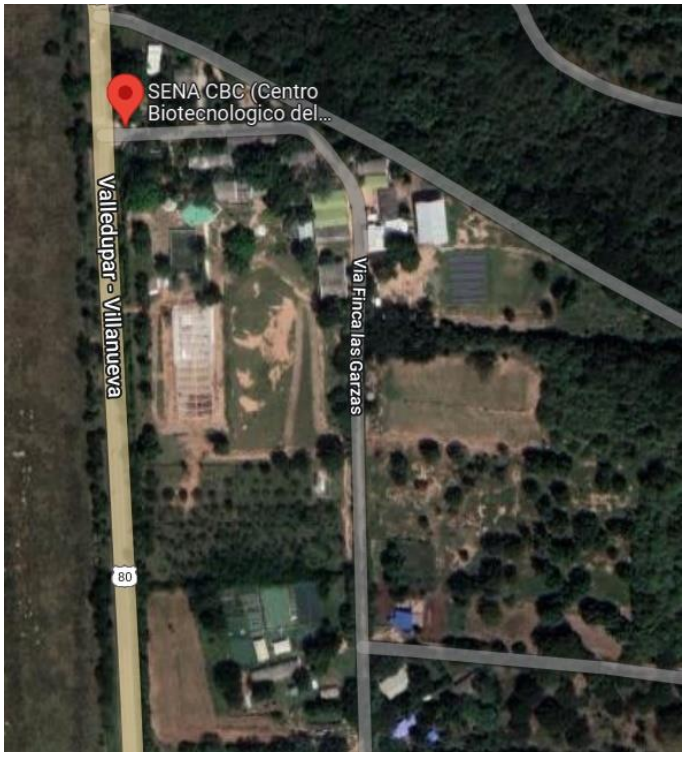


Imagen 1. *Localización Centro Biotecnológico del Caribe - SENA*

Valledupar está ubicada al norte del Valle del Cesar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, al margen de los ríos Cesar y Guatapurí, en la Costa Caribe colombiana.
Su territorio es llano y basculado hacia el sureste mediante una leve pendiente. La ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m al norte y 150 m a sur, siendo la altitud media de 168 m. Además de las enormes estructuras montañosas que la rodean (Pico Bolívar 5.775 m) sobresalen en inmediaciones de la ciudad dos cerros, al nororiente el "Cicolac" con 330 m.s.n.m. y el de "la Popa" con 310 m.s.n.m.



Imagen 2. *Localización general municipio de Valledupar (Cesar)*

Tiene una extensión total de 4.493 Km2 aproximadamente y la extensión en el área urbana: El casco urbano tiene una longitud norte-sur de 8.3 km y este-oeste de 6.2 km.
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): la ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m. al norte y 150 m. a sur, siendo la altitud media de 168 m.
Temperatura media: la temperatura Media Anual es de 28,4 ºC, con máximas y mínimas de 22ºC y 34ºC respectivamente, la temperatura máxima histórica registrada es de 41.5ºC y la mínima de 16ºC.

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S

ALCANCE

El servicio nacional de aprendizaje – SENA, REGIONAL CESAR, formuló el proyecto denominado: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES SANITARIA CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR." Con el fin de realizar el mantenimiento de las redes sanitarias del Centro Biotecnológico del Caribe sede principal.

Este proyecto contempla la ejecución de las siguientes condiciones:

MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS CBC VALLEDUPAR			
AREA VIVERO			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		
1.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILZADO EN MUROS	M2	32
1.2	NIVELACION PISO MORTERO 1:4 INCLUYE BALDOSA CERAMICA 33X33	M2	30
2	**CIELO RASOS**		
2.1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE SOPORTES Y PINTURA	M2	15
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
3.1	SALIDA LAMPARA INCANDECENTE	UND	6
4	**CARPINTERIA METALICA**		
4.1	PUERTA LAMINA C.R. CAL 18 INC PINTURA	M2	4
5	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
5.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	35
6	**APARATOS SANITARIOS**		
6.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	4
6.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	4
6.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	3
7	**ASEO GENERAL**		
7.1	ASEO GENERAL	M2	40
ESPECIES MENORES			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**CIELO RASOS**		
1.1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE SOPORTES Y PINTURA	M2	20
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
2.1	SALIDA LAMPARA INCANDECENTE	UND	4
3	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
3.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	25
4	**APARATOS SANITARIOS**		
4.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	4
4.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6
4.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	2
5	**ASEO GENERAL**		
5.1	ASEO GENERAL	M2	30
AREA GANADERIA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**CIELO RASOS**		
1.1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE SOPORTES Y PINTURA	M2	30
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
2.1	SALIDA LAMPARA INCANDECENTE	UND	9
3	**CARPINTERIA METALICA**		
3.1	PUERTA LAMINA C.R. CAL 18 INC PINTURA	M2	4
4	**APARATOS SANITARIOS**		
4.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	9
4.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6

4.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	4
5	**ASEO GENERAL**		
5.1	ASEO GENERAL	M2	32
AREA APRENDICES			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		
1.1	MURO BLOQUE 0,15 INC PAÑETE 1:4 IMPERMEABILZADO	M2	34
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
2.1	SALIDA LAMPARA INCANDECENTE	UND	12
3	**CIELO RASOS**		
3.1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE SOPORTES Y PINTURA	M2	15
4	**CARPINTERIA METALICA**		
4.1	PUERTA LAMINA C.R. CAL 18 INC PINTURA 2,00x1,00	M2	2
5	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
5.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	35
6	**ACCESORIOS**		
6.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	8
6.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	8
6.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	4
7	**IMPERMEABILIZACION Y ACABADOS**		
7.1	PAÑETES 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	96
8	**LIMPIEZA**		
8.1	ASEO GENERAL	M2	35
AREA ACUICULTURA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		
1.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILZADO	M2	16
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
2.1	SALIDA LAMPARA INCANDECENTE	UND	6
3	**CARPINTERIA METALICA**		
3.1	PUERTA LAMINA C.R. CAL 18 INC PINTURA	M2	6
4	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
4.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	25
5	**ACCESORIOS**		
5.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6
5.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	4
5.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	4
6	**ASEO GENERAL**		
6.1	ASEO GENERAL	M2	20
AREA ADMINISTRATIVA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
1.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	45
2	**ACCESORIOS**		
2.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6
2.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6
2.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	6
3	**ASEO GENERAL**		
3.1	**ASEO GENERAL**	M2	30
AREA LABORATORIO BIOTECNOLOGIA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**CIELO RASOS**		
1.1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE SOPORTES Y PINTURA	M2	23
2	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
2.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	30
3	**ACCESORIOS**		

3.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	4
3.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	3
4	**ASEO GENERAL**		
4.1	ASEO GENERAL	M2	25
AREA LABORATORIO LACTEOS			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		
1.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILZADO	M2	37
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
2.1	SALIDA LAMPARA INCANDECENTE	UND	6
3	**CARPINTERIA METALICA**		
3.1	PUERTA LAMINA C.R. CAL 18 INC PINTURA	M2	6
4	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
4.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	45
5	**ACCESORIOS**		
5.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6
5.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6
5.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	3
6	**ASEO GENERAL**		
6.1	ASEO GENERAL	M2	32
AREA ADMINISTRACION DE CENTRO			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		
1.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILZADO	M2	35
2	**CIELO RASOS**		
2.1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE SOPORTES Y PINTURA	M2	13
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
3.1	SALIDA LAMPARA INCANDECENTE	UND	6
4	**CARPINTERIA METALICA**		
4.1	PUERTA LAMINA C.R. CAL 18 INC PINTURA	M2	2
5	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
5.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	37
6	**APARATOS SANITARIOS**		
6.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	2
6.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	2
6.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	1
7	**ASEO GENERAL**		
7.1	ASEO GENERAL	M2	46
OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**TRANSPORTES**		
1.1	TRASIEGO Y DESECHOS DE MATERIALES INC. RETIRO VOLQUETA	M3	41

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S

ACTIVIDADES DEL PERIODO

El proyecto "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES SANITARIA CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR.", se desarrolla en el marco del contrato N° CO1.PCCNTR.5555517 desde el pasado veintiocho (28) de noviembre del año 2023, fecha en la que se suscribe acta de inicio, con un plazo de ejecución de cuarenta (40) días.

Los trabajos se iniciaron realizando inspección de verificación de las condiciones en las que se encontraba el área donde se realizará la intervención de dicho contrato y posterior a ello se iniciaron las actividades hasta corte del dieciocho (18) de diciembre de 2023.

Para el periodo informado se realizaron avances en las siguientes actividades:

AREA ADMINISTRATIVA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
1.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	45
2	**ACCESORIOS**		
2.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6
2.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	6
2.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	6
3	**ASEO GENERAL**		
3.1	**ASEO GENERAL**	M2	30
AREA LABORATORIO BIOTECNOLOGIA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**CIELO RASOS**		
1.1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE SOPORTES Y PINTURA	M2	23
2	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
2.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	30
3	**ACCESORIOS**		
3.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	4
3.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	3
4	**ASEO GENERAL**		
4.1	ASEO GENERAL	M2	25
AREA ADMINISTRACION DE CENTRO			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		
1.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILZADO	M2	35
2	**CIELO RASOS**		
2.1	CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE SOPORTES Y PINTURA	M2	13
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
3.1	SALIDA LAMPARA INCANDECENTE	UND	6
4	**CARPINTERIA METALICA**		
4.1	PUERTA LAMINA C.R. CAL 18 INC PINTURA	M2	2
5	**INSTALACIONES REDES SANITARIAS**		
5.1	RED SANITARIA PVCS 4"	ML	37
6	**APARATOS SANITARIOS**		
6.1	SANITARIOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	2
6.2	LAVAMANOS TIPO ACUACER INC GRIFERIA	UND	2
6.3	GRIFERIA DUCHA SENCILLA	UND	1

7	**ASEO GENERAL**		
7.1	ASEO GENERAL	M2	46
OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
1	**TRANSPORTES**		
1.1	TRASIEGO Y DESECHOS DE MATERIALES INC. RETIRO VOLQUETA	M3	20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el desarrollo del proyecto se recolectó las evidencias fotográficas que exponen el avance en la ejecución de las actividades.





SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S









SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S









SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S










Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S

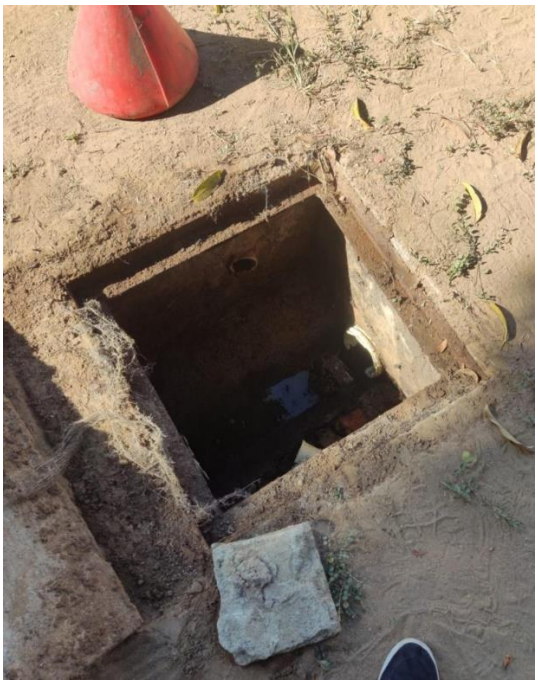







Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S









SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S










SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S

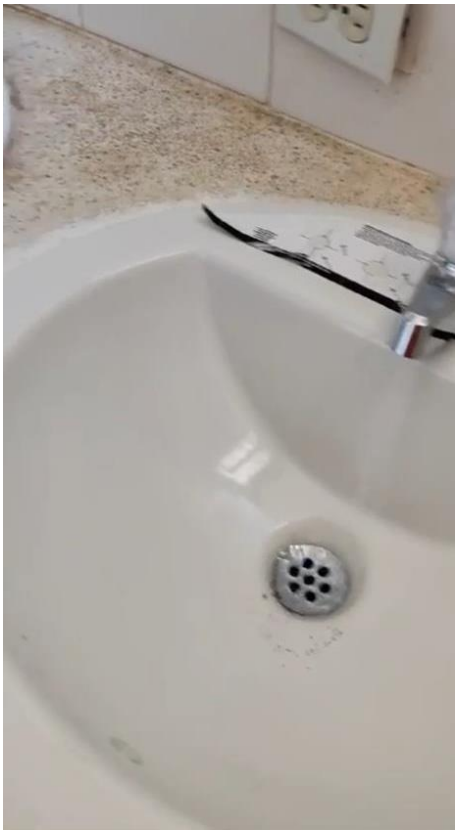







Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S









Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S









Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S










Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
C.I S.A.S



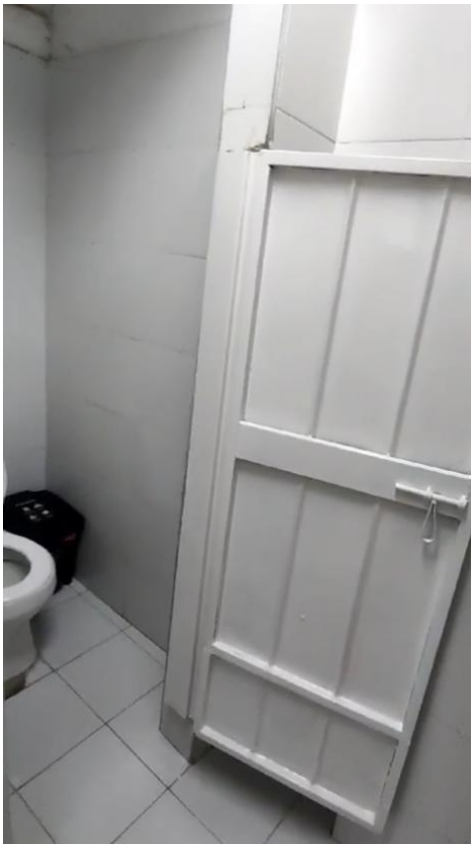





Carrera 15 No. 13B – 55 Ofic. 203 Valledupar, Cesar – Teléfono: 3112497792
E-mails: suministrosyconstrucciones2016@hotmail.com – jeisontarazonag@gmail.com





CONCLUSIONES

La culminación exitosa de cualquier proyecto de mantenimiento en instalaciones educativas implica una amalgama eficiente de gestión técnica, supervisión especializada y ejecución precisa. En el caso del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5555517, emprendido por SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Cesar, se ha logrado un avance sustancial en el cumplimiento de los objetivos establecidos. La intervención focalizada en el Centro Biotecnológico del Caribe ha permitido abordar de manera integral el deterioro y mal estado en las redes sanitarias, elementos críticos que influyen directamente en la impresión institucional y en la calidad de vida de la comunidad SENA.

El deterioro de las baterías sanitarias en el Centro Biotecnológico del Caribe ha creado una imperante necesidad a nivel institucional, afectando directamente a la comunidad que utiliza y reside en las instalaciones dependientes de estos servicios para el saneamiento básico. El hecho de que el 60% de los baños en áreas de formación presente problemas de saneamiento e infraestructura inadecuada destaca la urgencia de abordar estas deficiencias.

Este proyecto, centrado en el acceso continuo y adecuado al agua para consumo humano, así como en el saneamiento básico, la gestión integral del recurso hídrico y la participación comunitaria se propone como una solución integral. Las actividades planificadas abarcan el mantenimiento preciso de infraestructuras, equipos, redes e instalaciones sanitarias, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y minimizar la necesidad de reparaciones constantes. La meta es restaurar las condiciones normales de operación, estableciendo un control efectivo y llevando a cabo actividades de limpieza periódica mediante registros detallados.

Este proyecto tiene como propósito fundamental mejorar de manera significativa las condiciones de las instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias, con la meta de garantizar la prestación del servicio en espacios idóneos para el uso personal. El objetivo último es satisfacer las necesidades de los grupos de valor e interés, asegurando un entorno higiénico y seguro tanto para la comunidad SENA como para otros usuarios del Centro Biotecnológico del Caribe. La ejecución eficaz de este proyecto no solo contribuirá a la mejora de las instalaciones, sino que también fortalecerá la calidad de vida de aquellos que dependen diariamente de estos servicios.



LIZETH BELTRAN ORTIZ
C.C No.1.098.759.710 de Bucaramanga
Rep. Legal de SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S
