Santiago de Cali, 15 de diciembre de 2023

Señores
JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
Ing. Jaime Eduardo Duque
Gutiérrez Interventor
Calle 42N # 7-71
Casa 2D Santiago de Cali


Referencia: **"CONTRATO No. 4182.010.26.1.473-2023" "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO FLAMENCO - CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO".**

Asunto: **Solicitud de Prorroga**

Cordial saludo.

Por medio del presente, la empresa **CONSTRUCTORA LAS ELES (L) S.A.S**, con **NIT 900.356.989-1**, informa a la interventoría las situaciones que a pesar de ser ajenas a la voluntad de terminar el contrato en los tiempos estipulados en la **Cláusula Sexta** del contrato en referencia donde se aclara que el plazo del contrato no podrá superar la fecha del 25 de diciembre del año en curso. Expone ciertos eventos los cuales generaron atrasos en la normal ejecución del proyecto, tales como:

- **ASPECTOS TECNICOS**: De acuerdo con lo contractual se estableció Inicialmente el uso de collar de derivación tipo galápago de 2" con salida a ½" en hierro dúctil, presentado como INP-11. Sin embargo, su difícil adquisición ha ocasionado un retraso considerable debido a que actualmente no se encuentran unidades disponibles a nivel departamental. Motivo por el cual se solicitó a la interventoría autorizar el cambio del tipo de collarín, pasando de HD a PVC como nueva referencia. Los cuales son avalados por EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P y por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP cumpliendo con las especificaciones técnicas correspondientes.

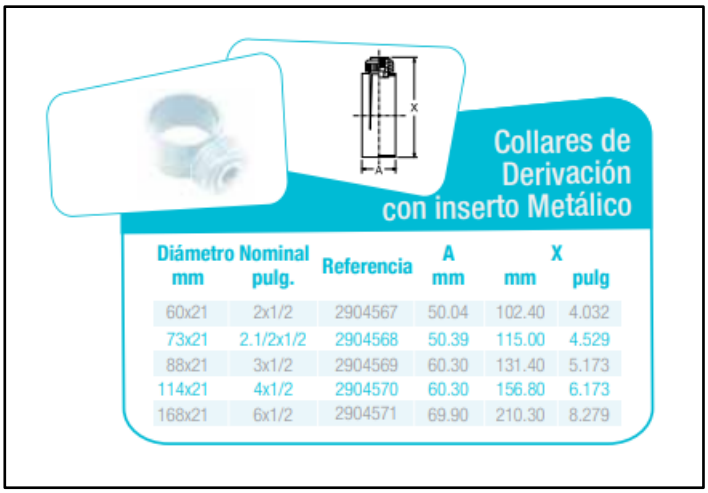

Diámetro Nominal mm	pulg.	Referencia	A mm	X mm	X pulg
60x21	2x1/2	2904567	50.04	102.40	4.032
73x21	2.1/2x1/2	2904568	50.39	115.00	4.529
88x21	3x1/2	2904569	60.30	131.40	5.173
114x21	4x1/2	2904570	60.30	156.80	6.173
168x21	6x1/2	2904571	69.90	210.30	8.279

Figura 1. Dimensiones de collares de derivación con inserto metálico

- Así mismo en las actas de vecindad se identificó algunos predios con 2 y hasta 3 acometidas, sin embargo, la junta administradora no entrego a tiempo el listado de acometidas y por tal motivo tampoco se pudo realizar la instalación toda vez que los propietarios como dueños de las acometidas adicionales, deben tramitar la reposición de las faltantes. El contrato de obra tiene estipulado 90 acometidas, pero en sitio se identificó un total de "120".

- **ASPECTOS CLIMATOLOGICOS:** Debido a que el proyecto se encuentra ubicado en el Corregimiento El Hormiguero zona rural del Distrito, se vio bastante afectado por las torrenciales lluvias presentadas; dichos episodios de lluvias generaron atraso en las actividades como excavaciones manuales, rellenos con material seleccionado y la compactación de este, toda vez que era imposibilidad ejecutar técnicamente estas actividades

- De acuerdo con la información oficial descrita en el boletín No. 11 Predicción Climática noviembre 2023 publicado por el IDEAM, se han reportado lluvias por encima del promedio esperado para la segunda temporada de lluvias que normalmente inicia en septiembre. De acuerdo con el IDEAM, "la región Pacífica - húmeda a lo largo del año - presenta sus mayores volúmenes de precipitación en sectores del centro de la región". Los modelos de predicción de precipitaciones del IDEAM pronostican: "en el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría POR ENCIMA de lo normal."

Particularmente para la zona de El Hormiguero la precipitación acumulada en octubre de 2023 fue de 228 mm, presentando un incremento de 49 mm respecto al promedio histórico el cual es 179 mm para el mes de octubre.

Lo anteriormente mencionado generó atrasos en el avance normal de la obra, por lo cual no será posible la terminación del proyecto en los plazos previamente establecidos; razón por la cual **Constructora Las Eles (L) S.A.S.**, solicita de la manera más atenta una prórroga por 30 días calendario, cambiando la fecha de terminación para el día 25 de enero de 2024.

Como soporte a esta solicitud, se adjunta el **REPORTE HIDROCLIMATOLOGICO – OCTUBRE 2023** de la CVC, y el **BOLETIN PREDICCIÓN CLIMATICA – NOVIEMBRE 2023.**

Cordialmente.

MARÍA ODEILDA ANGULO CORTES
GERENTE CONSTRUCTORA LAS ELE (L) S.A.S
CONTRATISTA
