R.1.1.16

Pereira, diciembre 22 de 2023

Informe estado ejecución contrato CO-023 DE 2023

En la fecha, se verificó con el interventor asignado al proceso, y el contratista, el avance de la ejecución de la obra dispuesta en el contrato de selección abreviada de menor cuantía CO-023 de 2023. Se tiene que a la fecha se ha presentado la siguiente ejecución.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA
1,017	Desmonte techo y estructura	m2	200	100
1,042	Desmonte canal PVC	m	310	310
2,001	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m^3	14	0
8,01	Techo teja ondulada Ac	m2	200	100
8,035	Canal Lám Galv C 22 S<=.50 m	m	310	310
7,037	Bajante PVC ALL 4" +Acces	M	72	0
1,025	Recorrido techos	m2	1.071	508

Dada las cantidades ejecutadas a la fecha, se tiene un avance en cuanto a los ítems contratados del sesenta y uno (61%) por ciento.

El contratista tuvo que instalar caballete articulado K43 AC, lo anterior pues se requirió para la instalación de las cubiertas de los salones 1 y 2, del bloque de primaria. Aunado se tiene que debido a las fuertes lluvias presentadas los días 15 y

16 de diciembre, el cielorraso de los salones 1 y 2 del bloque de primaria, presentó afectaciones; las cuales se evaluaran con el personal de mantenimiento y el contratista, una vez se verifique las necesidades dentro del contrato, y dependiendo de la disponibilidad de recursos.

A continuación se presenta el informe fotográfico de los avances en la ejecución:




Galaxy M23 5G


Galaxy M23 5G


Galaxy M23 5G

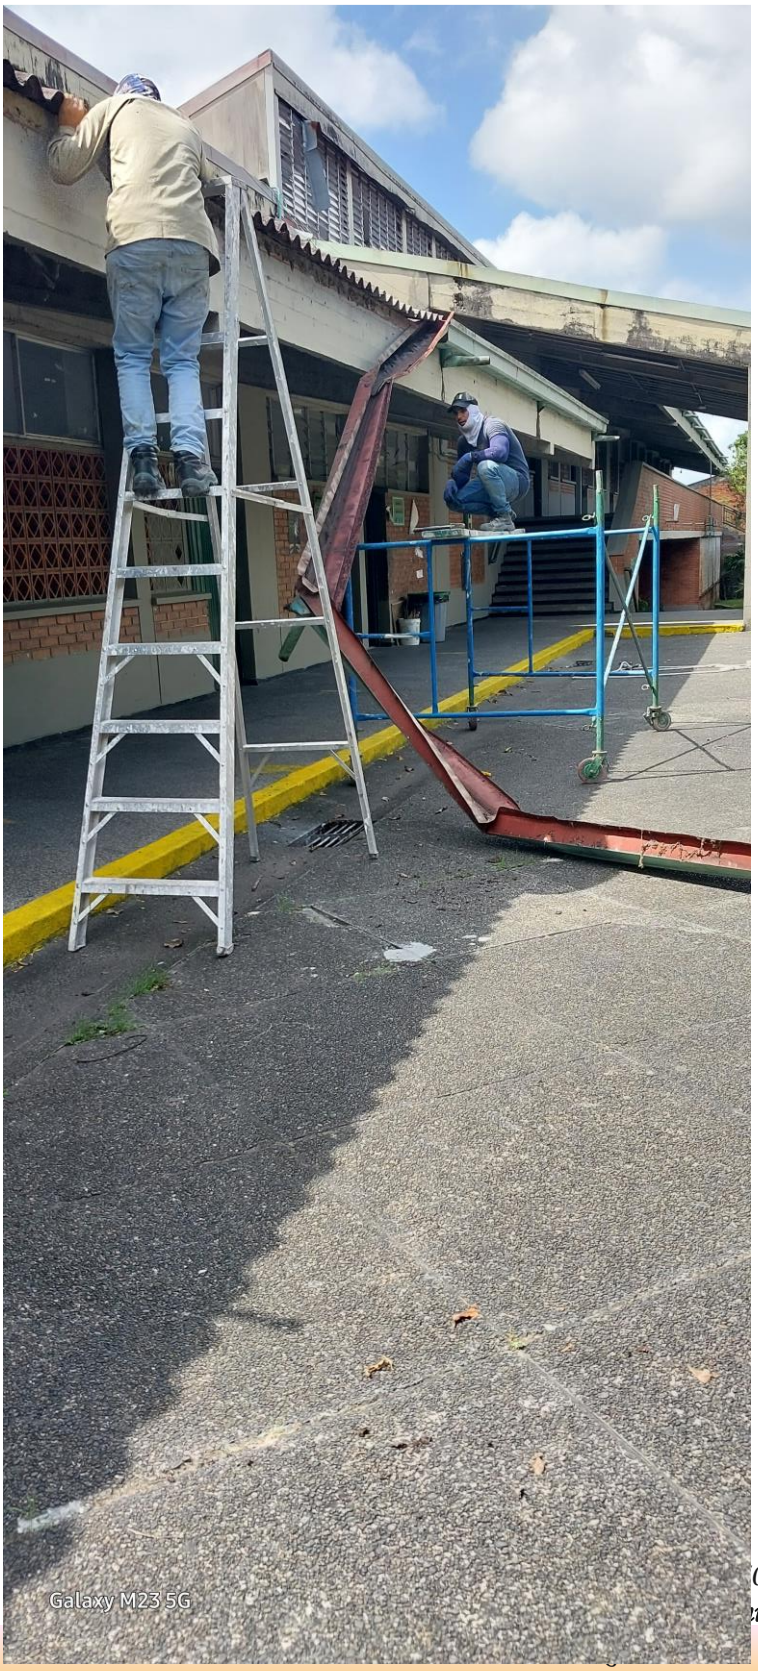

Galaxy M23 5G

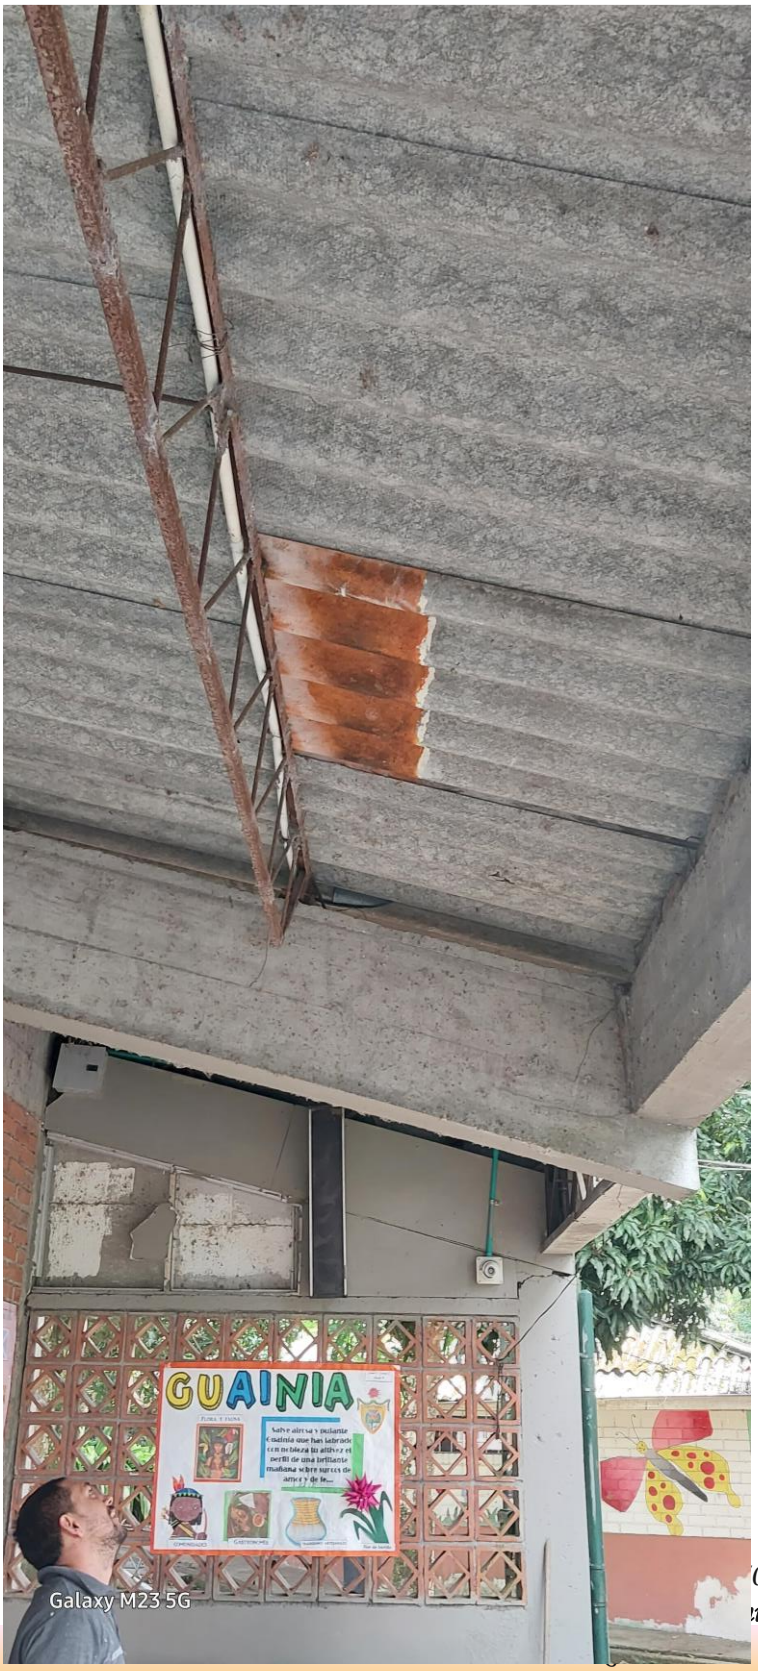

Galaxy M23 5G


Galaxy M23 5G


Galaxy M23 5G


Galaxy M23 5G


Galaxy M23 5G


GUAINIA
Galaxy M23 5G







Firmado en Pereira a los veintidós días del mes de diciembre de 2023

FANY TORO BEDOYA
Rectora - Supervisora
I.E INEM FELIPE PÉREZ
