
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred	AVANCE PROGRMADO
0		PROGRAMACION PROYECTO PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA-FEBRERO 1	87 días	mar 31/10/23	jue 15/02/24		60%
1		1 PROYECTO 1	87 días	mar 31/10/23	jue 15/02/24		60%
2		1.1 INICIO	0 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23		100%
3		**1.2 1.PRELIMINARES**	**84 días**	**mar 31/10/23**	**lun 12/02/24**		**100%**
4		1.2.1 DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL,	2 días	mar 31/10/23	mié 1/11/23	2	100%
5		1.2.2 DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INCLUYE EL MARCO Y	3 días	jue 2/11/23	mar 7/11/23	4	100%
6		1.2.3 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE	5 días	vie 3/11/23	jue 9/11/23	13	100%
7		1.2.4 DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	4 días	mié 8/11/23	sáb 11/11/23	5	100%
8		1.2.5 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	5 días	vie 10/11/23	jue 16/11/23	6	100%
9		1.2.6 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	15 días	mar 14/11/23	jue 30/11/23	7	100%
10		1.2.7 DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE	13 días	vie 17/11/23	vie 1/12/23	8	100%
11		1.2.8 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	2 días	mar 26/12/23	mié 27/12/23		100%
12		1.2.9 REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES,	6 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	8	100%
13		1.2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN	3 días	mar 31/10/23	jue 2/11/23	2	100%
14		1.2.11 DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA	6 días	mar 14/11/23	lun 20/11/23	7	100%
15		1.2.12 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS	3 días	vie 9/02/24	lun 12/02/24	14	100%
16		1.2.13 DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	7	100%
17		1.2.14 DEMOLICION DE MURO (INCLUYE REMOSION DE ENCHAPE	4 días	mié 15/11/23	sáb 18/11/23	16	100%
18		1.2.15 REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA	5 días	lun 20/11/23	vie 24/11/23	17	100%
19		**1.3 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**6 días**	**sáb 25/11/23**	**vie 1/12/23**		**100%**
20		1.3.1 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO	4 días	sáb 25/11/23	mié 29/11/23	18;	100%
21		1.3.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	2 días	jue 30/11/23	vie 1/12/23	20	100%
22		**1.4 3. CIMENTACIÓN**	**3 días**	**sáb 2/12/23**	**mar 5/12/23**		**100%**
23		1.4.1 CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE	3 días	sáb 2/12/23	mar 5/12/23	21	100%
24		**1.5 4. ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**34 días**	**mar 31/10/23**	**mar 12/12/23**		**100%**
25		1.5.1 CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI.	5 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	23;	100%
26		1.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO	4 días	mié 29/11/23	sáb 2/12/23		100%
27		1.5.3 CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO DE	7 días	mar 31/10/23	mié 8/11/23		100%
28		**1.6 5. MAMPOSTERIA**	**7 días**	**vie 10/11/23**	**sáb 18/11/23**		**100%**
29		1.6.1 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5	2 días	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	6	100%
30		1.6.2 CONSTRUCCIÓN DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15	3 días	mar 14/11/23	jue 16/11/23	29	100%
31		1.6.3 CONSTRUCCIÓN DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE	5 días	mar 14/11/23	sáb 18/11/23	29	100%
32		**1.7 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**11 días**	**vie 17/11/23**	**mié 29/11/23**		**100%**
33		1.7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 8",	3 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	30	100%
34		1.7.2 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS.	4 días	vie 17/11/23	mar 21/11/23	30	100%
35		1.7.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø	5 días	mar 21/11/23	sáb 25/11/23	33	100%
36		1.7.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE	3 días	lun 27/11/23	mié 29/11/23	35	100%
37		1.7.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE	5 días	mié 22/11/23	lun 27/11/23	34	100%
38		**1.8 7. INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL**	**19 días**	**jue 30/11/23**	**vie 22/12/23**		**100%**
39		1.8.1 TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2"	5 días	jue 30/11/23	mar 5/12/23	36	100%
40		1.8.2 VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC)	1 día	mié 6/12/23	mié 6/12/23	39	100%
41		1.8.3 PUNTO DE GAS 1/2"	2 días	jue 21/12/23	vie 22/12/23	40	100%
42		1.9 8. INSTALACIONES ELECTRICAS	11 días	lun 18/12/23	sáb 30/12/23		93%
43		1.9.1 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE	5 días	lun 18/12/23	vie 22/12/23		100%
44		1.9.2 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA	10 días	mar 19/12/23	sáb 30/12/23	43	90%
45		**1.10 9. PAÑETES**	**3 días**	**jue 30/11/23**	**sáb 2/12/23**		**100%**
46		1.10.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM.	3 días	jue 30/11/23	sáb 2/12/23	34	100%
47		1.11 10. CIELO RASO	52 días	jue 14/12/23	jue 15/02/24		25%
48		1.11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM	52 días	jue 14/12/23	jue 15/02/24	70	25%
49		1.12 11. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	69 días	mar 21/11/23	mar 13/02/24		54%
50		1.12.1 ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS	10 días	mar 21/11/23	vie 1/12/23		100%
51		1.12.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA GRANO DE	16 días	sáb 2/12/23	jue 21/12/23		100%
52		1.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANO DE	5 días	vie 22/12/23	jue 28/12/23	51	100%
53		1.12.4 DESTRONCADA, SELLADA, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA	45 días	lun 18/12/23	sáb 10/02/24	50	22%
54		1.12.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN EPÓXICA EN 3	3 días	sáb 10/02/24	mar 13/02/24	53	67%
55		1.13 12. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	26 días	mar 12/12/23	sáb 13/01/24		54%
56		1.13.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3	26 días	mar 12/12/23	sáb 13/01/24	46	58%
57		1.13.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE	15 días	mar 19/12/23	sáb 6/01/24		60%
58		1.13.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	20 días	mar 19/12/23	sáb 13/01/24		45%
59		1.14 13. CARPINTERIA METALICA	43 días	vie 15/12/23	mar 6/02/24		32%
60		1.14.1 PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA	20 días	lun 15/01/24	mar 6/02/24	58	20%
61		1.14.2 DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 PARA CAMPANA	30 días	vie 15/12/23	lun 22/01/24		40%
62		1.15 14. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	15 días	lun 15/01/24	mié 31/01/24		7%
63		1.15.1 VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO	15 días	lun 15/01/24	mié 31/01/24		7%
64		1.15.2 VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO CON MALLA	15 días	lun 15/01/24	mié 31/01/24		7%
65		1.16 15. CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE	20 días	jue 14/12/23	mar 9/01/24		65%
66		1.16.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 0,60 MTS EN ACERO	20 días	jue 14/12/23	mar 9/01/24		65%
67		1.17 16. CUBIERTAS	36 días	vie 1/12/23	mar 16/01/24		79%
68		1.17.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO	22 días	sáb 2/12/23	vie 29/12/23		77%
69		1.17.2 TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN	7 días	mar 9/01/24	mar 16/01/24	68	57%
70		1.17.3 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TEJA CANALETA METALICA	10 días	vie 1/12/23	mié 13/12/23	9	100%
71		**1.18 17. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**3 días**	**lun 11/12/23**	**mié 13/12/23**		**100%**
72		1.18.1 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	3 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23		100%
73		1.19 18. EQUIPOS	35 días	jue 14/12/23	vie 26/01/24		35%
74		1.19.1 Suministro e instalación de campana extractora en acero	30 días	mié 20/12/23	vie 26/01/24		27%
75		1.19.2 Suministro e instalación de línea autoservicio de acuerdo a	30 días	jue 14/12/23	sáb 20/01/24		43%
76		**1.20 19. ITEM NO PREVISTOS**	**33 días**	**mar 21/11/23**	**sáb 30/12/23**		**92%**
77		1.20.1 INDEPENDIZAR AGUAS NEGRAS - TRAMPA DE GRASA	6 días	mar 21/11/23	lun 27/11/23		100%
78		1.20.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA GRANO DE	6 días	sáb 23/12/23	sáb 30/12/23	51	83%
79		1.21 FIN	87 días	mar 31/10/23	jue 15/02/24		55%



Proyecto: PROGRAMACION PR
Fecha: mar 19/12/23

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

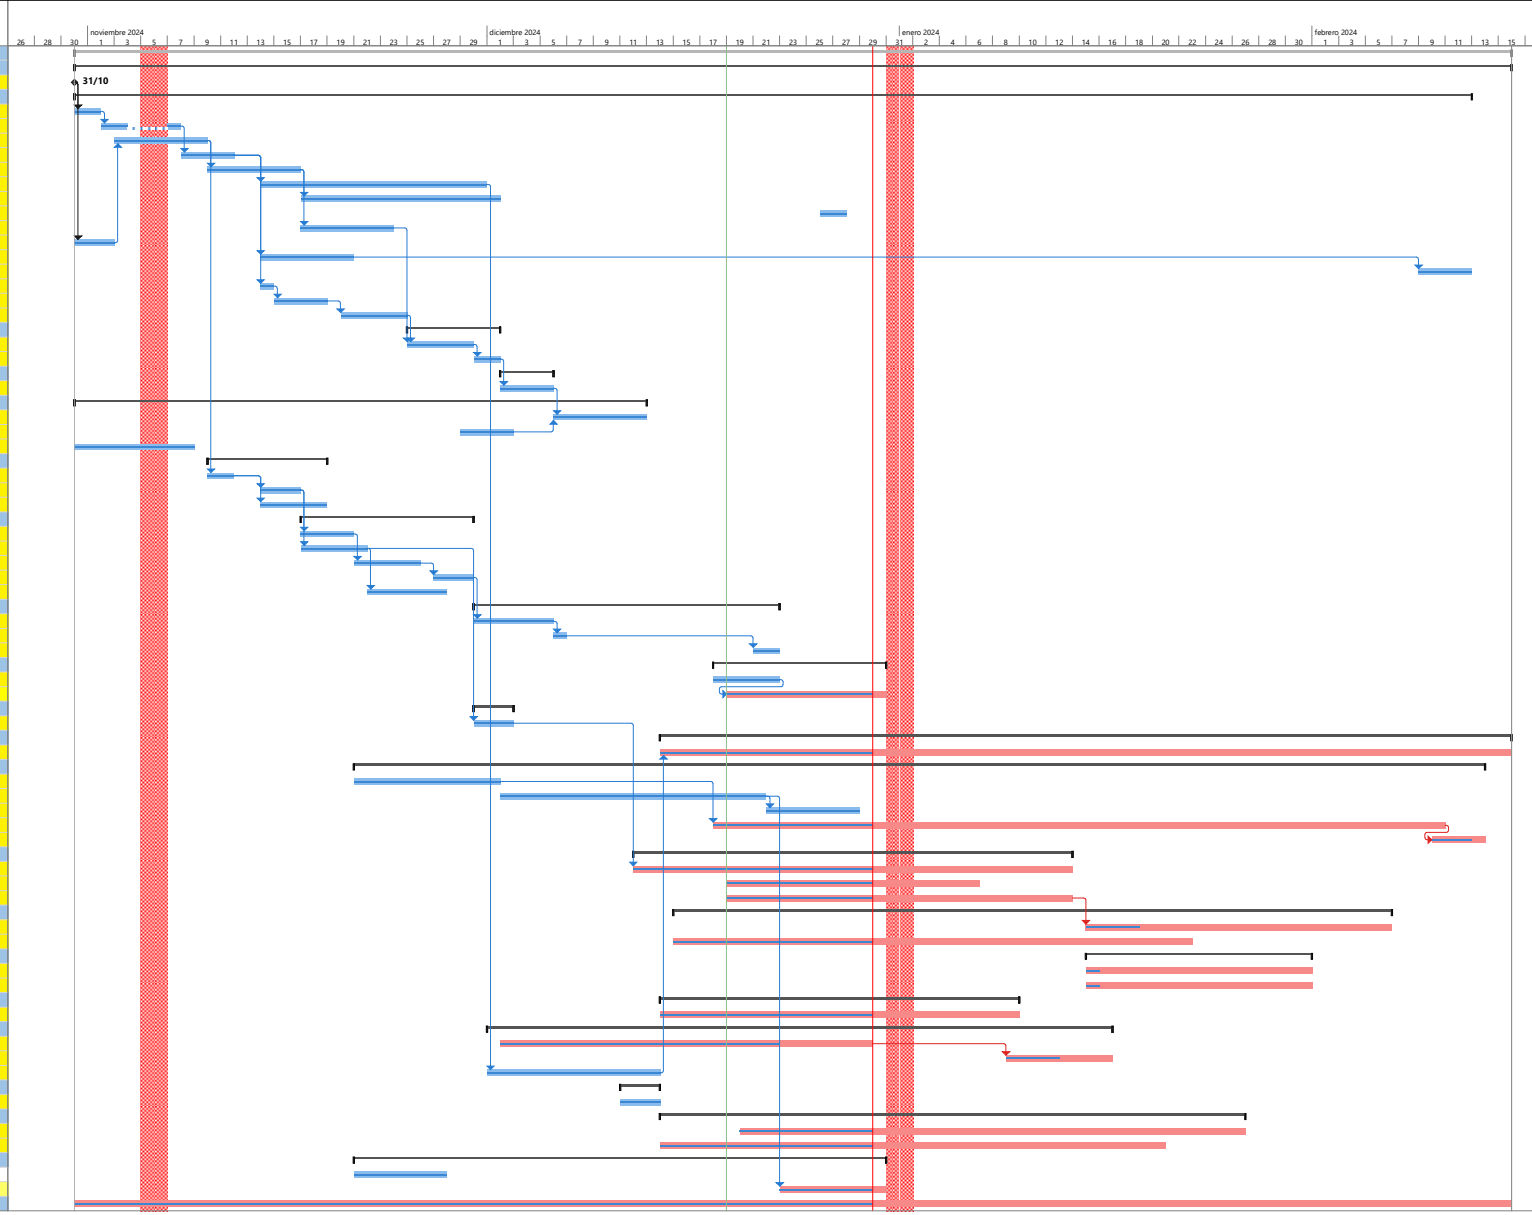

Proyecto: PROGRAMACION PR
Fecha: mar 19/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
