


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**ITEM**	**INICIO**	**6 días**	**mar 19/12/23**	**mar 26/12/23**
2	**CAP 1**	**MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS #1, CACOM 4**	**5 días**	**mar 19/12/23**	**lun 25/12/23**
3	**1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mar 19/12/23**	**mar 19/12/23**
4	1.1	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
5	1.2	REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
6	1.3	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
7	1.4	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
8	**2**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**1 día**	**mié 20/12/23**	**mié 20/12/23**
9	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
10	2.2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
11	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
12	**3**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**1 día**	**jue 21/12/23**	**jue 21/12/23**
13	3.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23
14	3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23
15	3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.)	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23

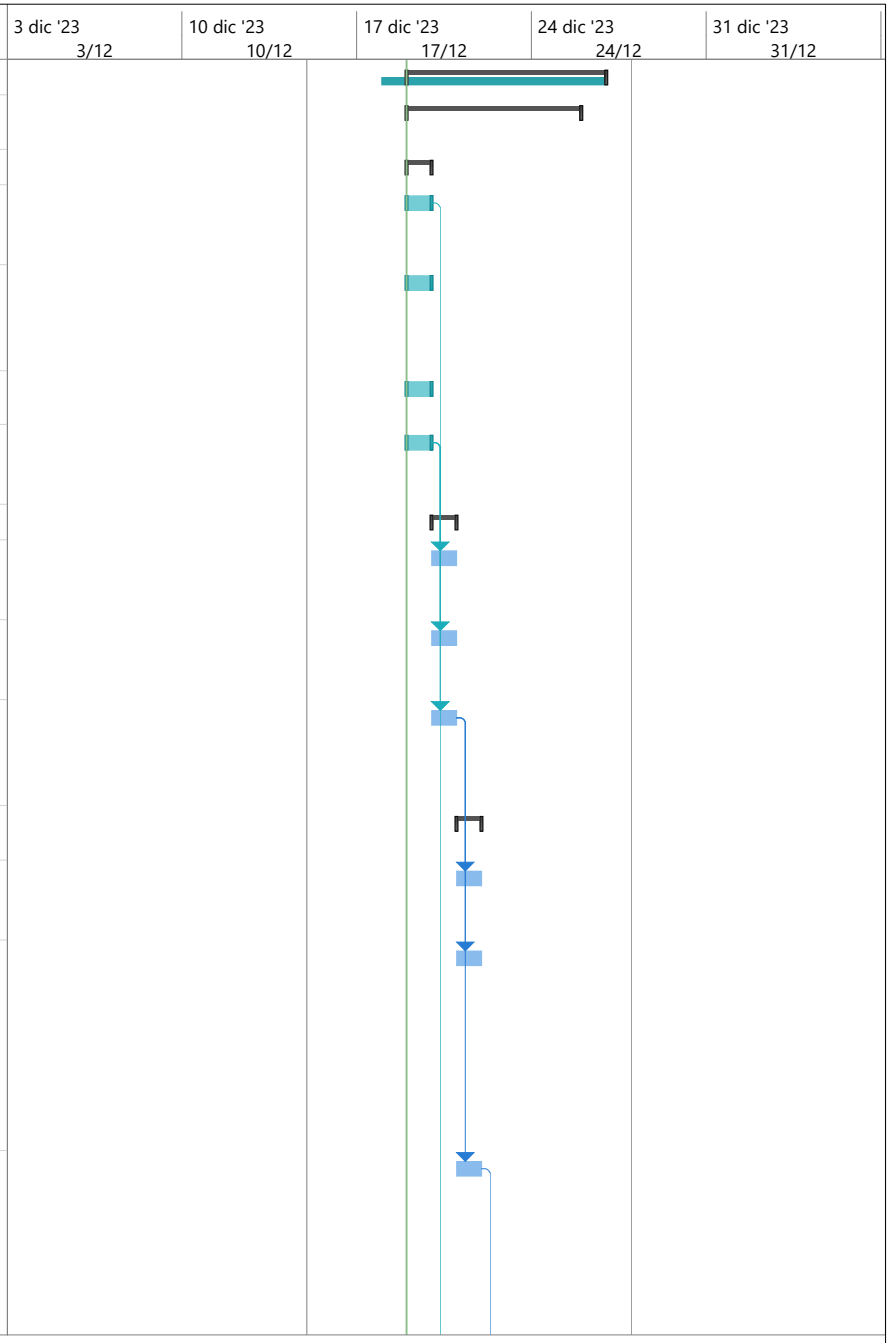


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
16	**4**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**1 día**	**mar 19/12/23**	**mar 19/12/23**
17	4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
18	**5**	**CARPINTERIA METALICA**	**1 día**	**mié 20/12/23**	**mié 20/12/23**
19	5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
20	**6**	**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**	**1 día**	**vie 22/12/23**	**vie 22/12/23**
21	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE DIVISIONES DE ORINAL, ELABORADOS EN LAMINADO COMPACTO DE ALTA PRESION 12 MM INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE.	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23
22	**7**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**1 día**	**lun 25/12/23**	**lun 25/12/23**
23	7.1	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL, ENTRADA SUPERIOR REF: CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
24	7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE CUADRADA SSB O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
25	7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
26	**8**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**5 días**	**mar 19/12/23**	**lun 25/12/23**
27	8.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
28	8.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23

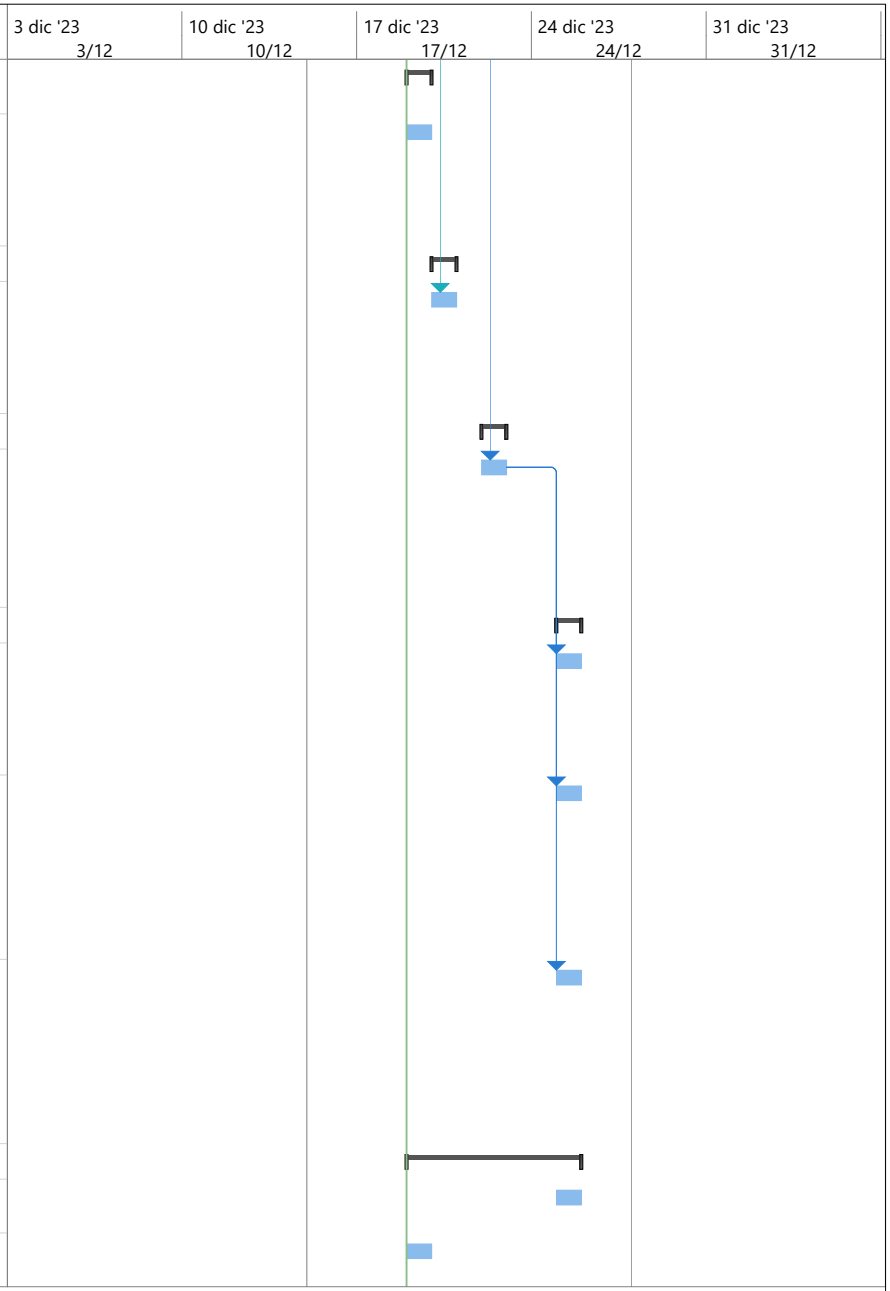


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
29		**MANTENIMIENTO BARRACAS SOLDADOS No. 3, CACOM 4**	**3 días**	**sáb 23/12/23**	**mar 26/12/23**
30	**1**	**PRELIMINARES**	**6 días**	**mar 19/12/23**	**mar 26/12/23**
31	1.1	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
32	1.2	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CERCHA METALICA , INCLUYE ANTICORROSIVO , PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
33	1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
34	1.4	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
35	1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
36	1.6	REGATA DE 3" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
37	1.7	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINA/BAÑOS MEDIA ALTURA INCLUYE ENTREGA AL ALMACÉN	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
38	1.8	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
39	1.9	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
40	**2**	**ESTRUCTURA**	**1 día**	**jue 21/12/23**	**jue 21/12/23**
41	2.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23
42	2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EN ACERO CORRUGADO DE DIÁMETROS 3/8" A 3/4" LONG 25 CM, EN ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE EPOXICO TIPO SIKA ANCHORFIX 4 O SIMILAR, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23

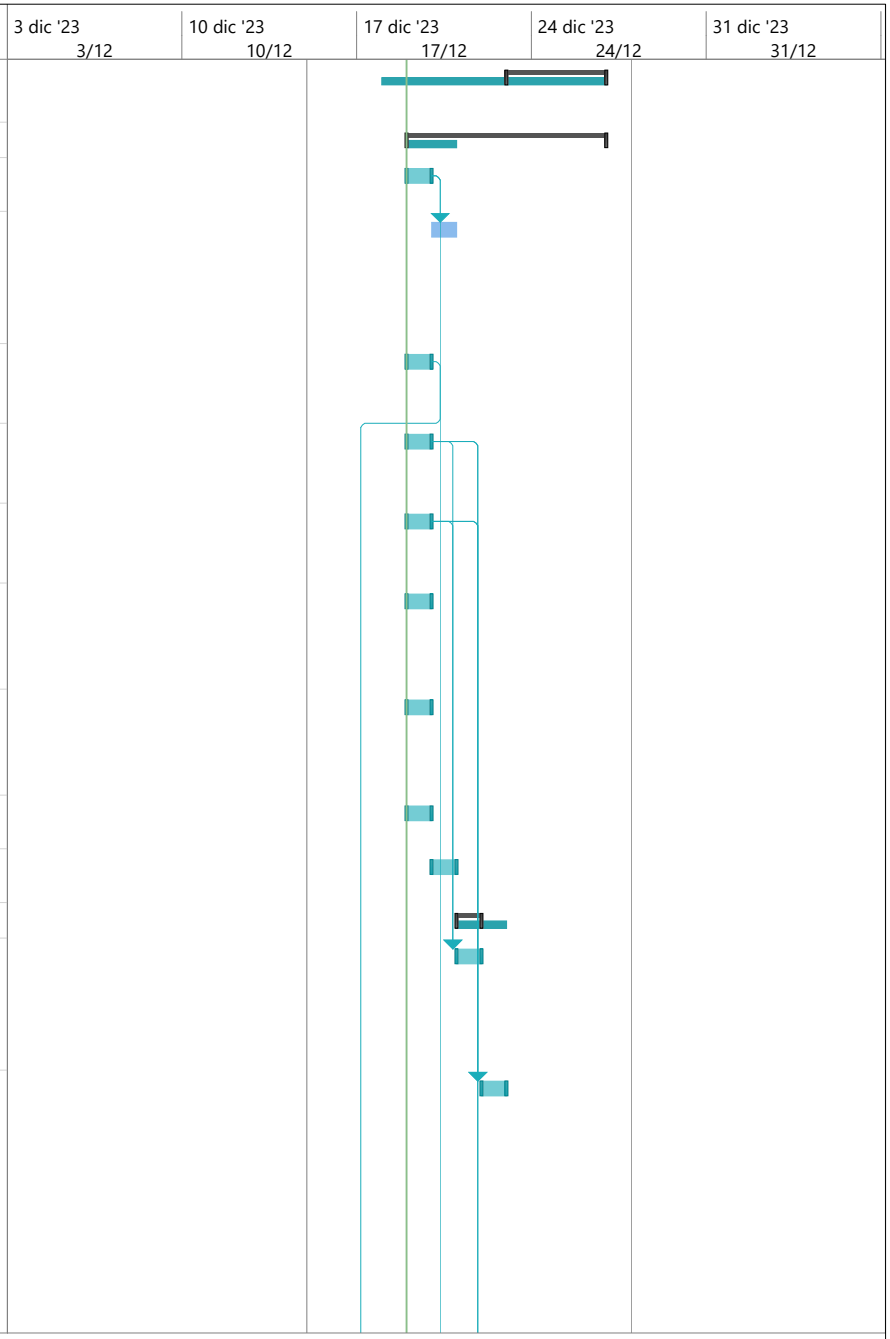


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
43	2.3	CONSTRUCCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23
44	**3**	**MAMPOSTERIA**	**1 día**	**jue 21/12/23**	**jue 21/12/23**
45	3.1	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS.	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23
46	**4**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**3 días**	**mar 19/12/23**	**jue 21/12/23**
47	4.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
48	4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
49	4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
50	4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
51	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**3 días**	**mié 20/12/23**	**vie 22/12/23**
52	5.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDA	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
53	5.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23

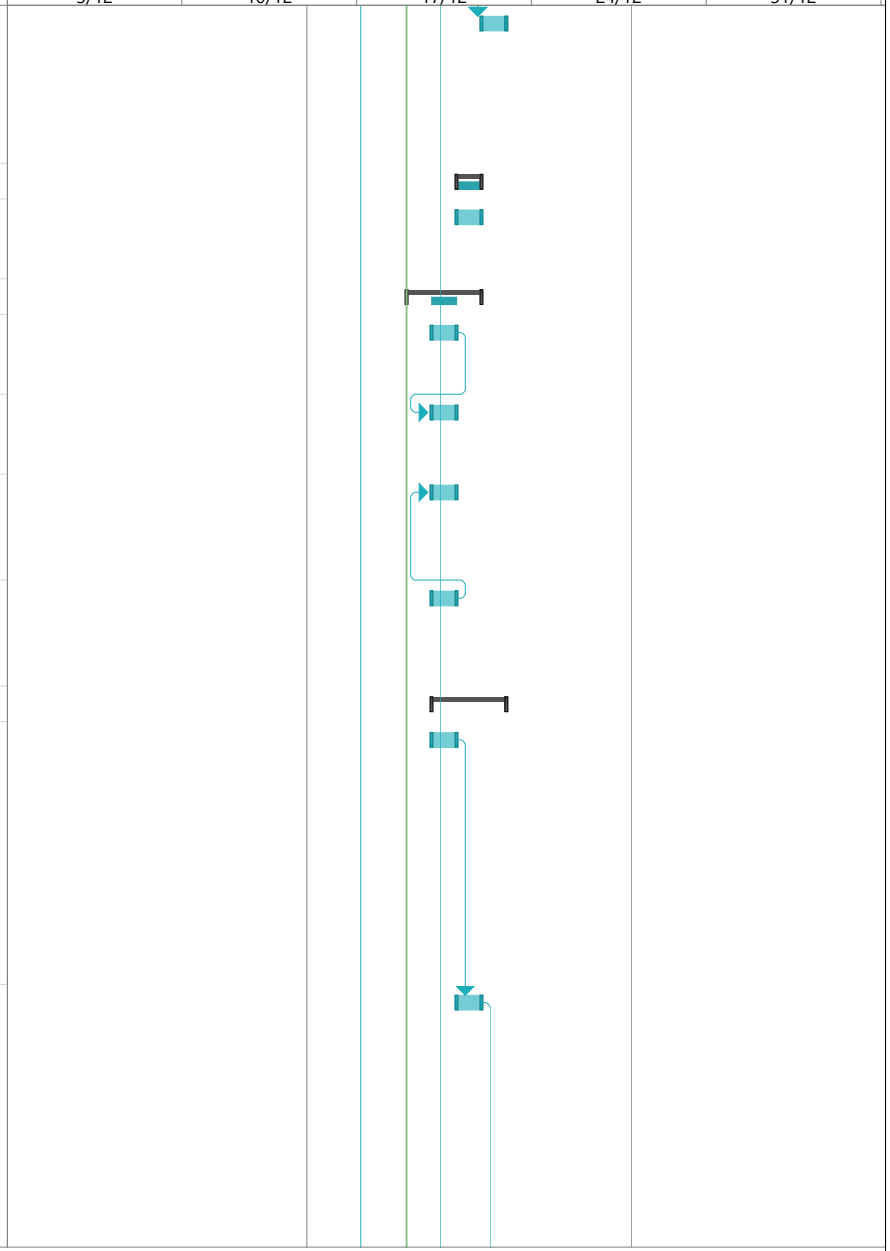


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
54	5.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23
55	**6**	**PAÑETES**	**1 día**	**mar 19/12/23**	**mar 19/12/23**
56	6.1	PAÑETE 1:4 FILOS Y DILATACIONES	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
57	**7**	**CIELO RASO**	**2 días**	**lun 25/12/23**	**mar 26/12/23**
58	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	3 días	lun 18/12/23	mié 20/12/23
59	**8**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**3 días**	**vie 22/12/23**	**mar 26/12/23**
60	8.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23
61	8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BAÑOS, CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA.	2 días	jue 21/12/23	vie 22/12/23
62	8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A	3 días	jue 21/12/23	lun 25/12/23
63	**9**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**2 días**	**mar 19/12/23**	**mié 20/12/23**
64	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	2 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23

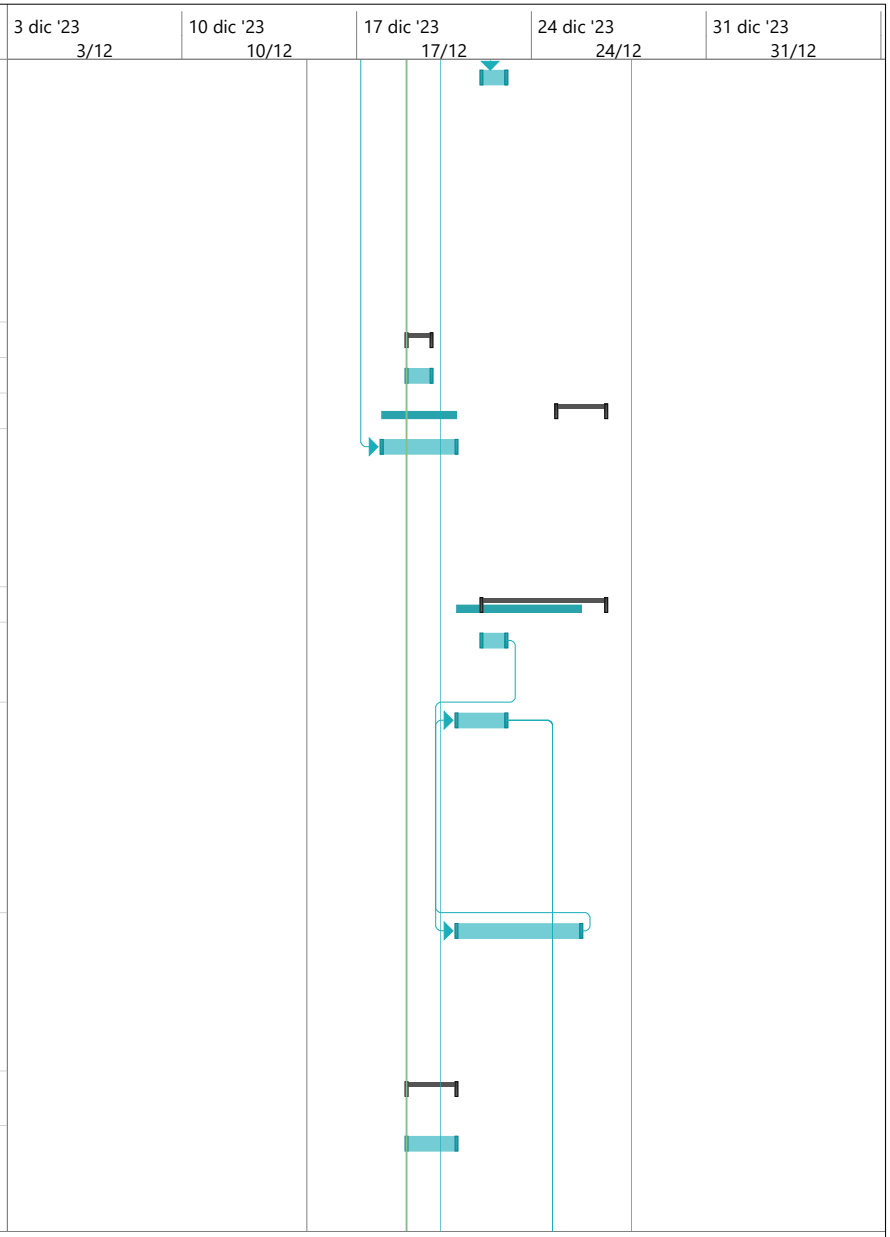


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
65	9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	2 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23
66	**10**	**CARPINTERIA METALICA**	**5 días**	**mié 20/12/23**	**mar 26/12/23**
67	10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	5 días	mié 20/12/23	mar 26/12/23
68	**11**	**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**	**5 días**	**mié 20/12/23**	**mar 26/12/23**
69	11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE DIVISIONES DE ORINAL, ELABORADOS EN LAMINADO COMPACTO DE ALTA PRESION 12 MM INCLUYE HERRAJES EN ACERO	5 días	mié 20/12/23	mar 26/12/23
70	**12**	**CUBIERTAS**	**2 días**	**mié 20/12/23**	**jue 21/12/23**
71	12.1	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALA	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23
72	**13**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**1 día**	**lun 25/12/23**	**lun 25/12/23**
73	13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
74	13.2	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL, ENTRADA SUPERIOR REF: CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23

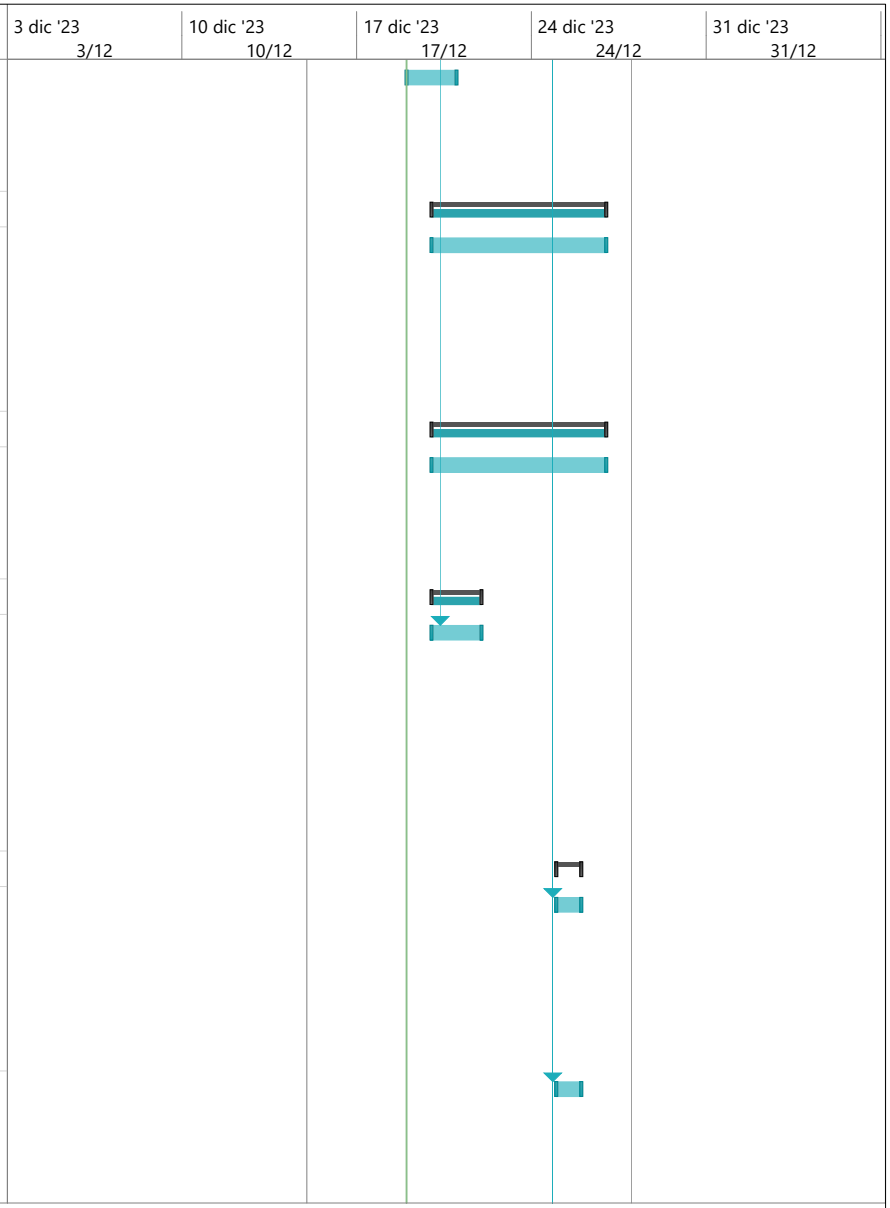


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
75	13.3	LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
76	13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE CUADRADA SSB O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
77	**14**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**1 día**	**lun 25/12/23**	**lun 25/12/23**
78	14.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
79	**15**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**1 día**	**lun 25/12/23**	**lun 25/12/23**
80	15.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
81	15.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
82		**MANTENIMIENTO KIOSCO TÁCTICO SOLDADOS CACOM 4**	**6 días**	**mar 19/12/23**	**mar 26/12/23**
83	**1**	**PRELIMINARES**	**2 días**	**mar 19/12/23**	**mié 20/12/23**
84	1.1	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
85	1.2	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	2 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23
86	**2**	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**1 día**	**mar 19/12/23**	**mar 19/12/23**
87	2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
88	**3**	**ESTRUCTURA**	**1 día**	**jue 21/12/23**	**jue 21/12/23**
89	3.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23
90	**4**	**MAMPOSTERIA**	**2 días**	**mié 20/12/23**	**jue 21/12/23**
91	4.1	CONSTRUCCIÓN DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23

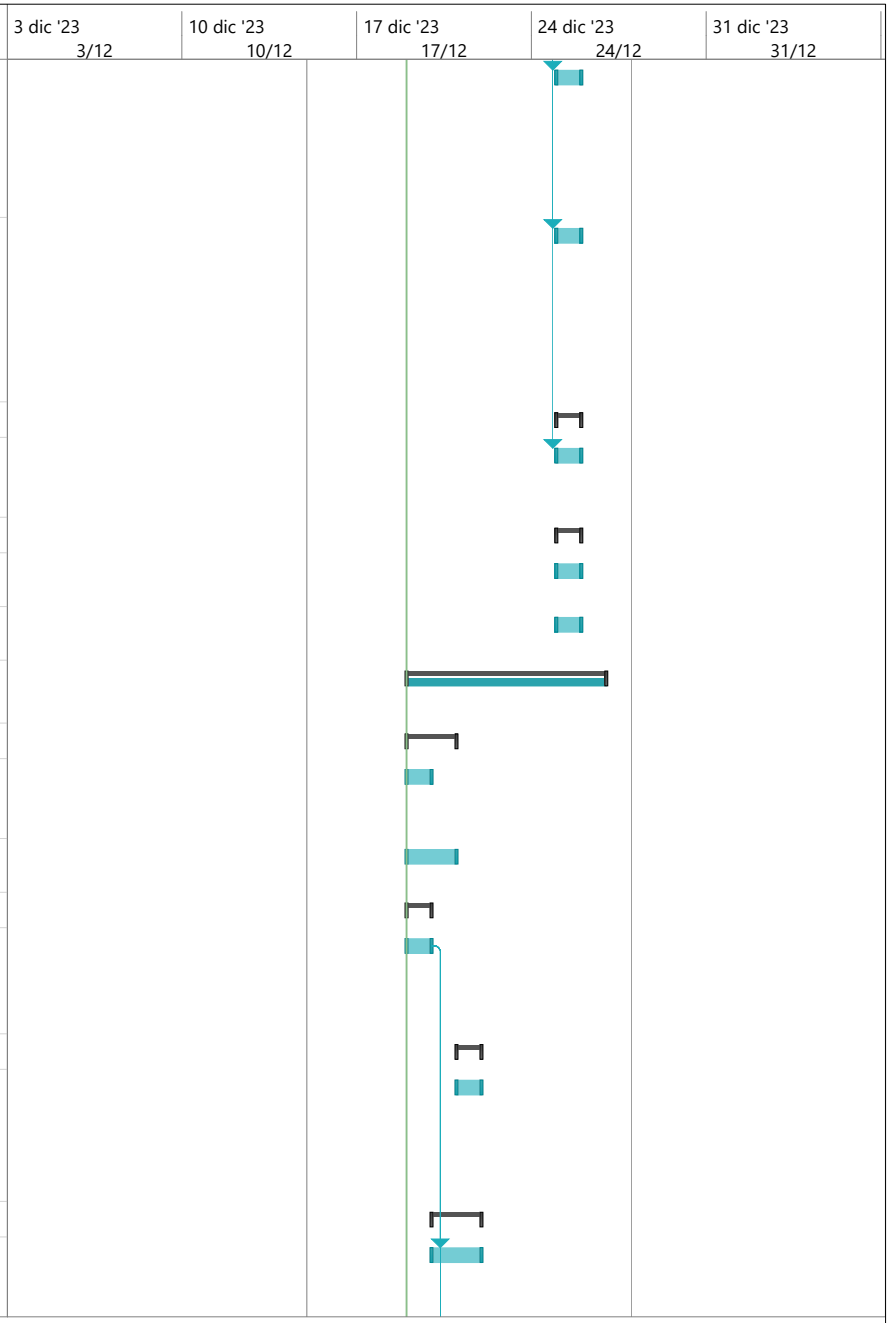


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
92	4.2	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23
93	4.3	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23
94	4.4	CONSTRUCCION DE MURO SUPERBOARD 8MM INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA)	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23
95	**5**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**1 día**	**mié 20/12/23**	**mié 20/12/23**
96	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
97	5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
98	5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
99	5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
100	**6**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**1 día**	**lun 25/12/23**	**lun 25/12/23**
101	6.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23

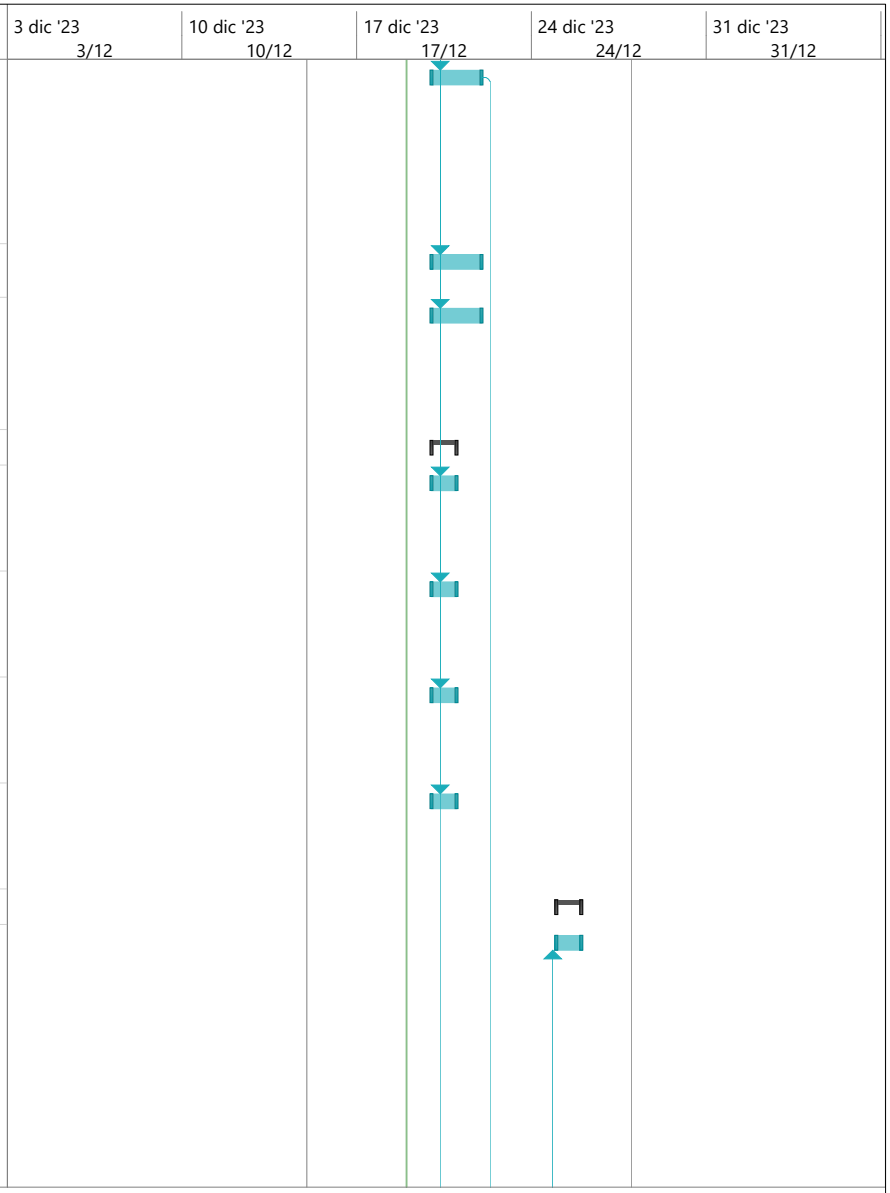


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
102	6.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDA	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
103	6.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
104	**7**	**PAÑETES**	**1 día**	**vie 22/12/23**	**vie 22/12/23**
105	7.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23
106	**8**	**CIELO RASO**	**1 día**	**lun 25/12/23**	**lun 25/12/23**
107	8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
108	**9**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**3 días**	**mar 19/12/23**	**jue 21/12/23**
109	9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
110	9.2	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
111	**10**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**1 día**	**lun 25/12/23**	**lun 25/12/23**
112	10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA GRANIPLAST.	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23

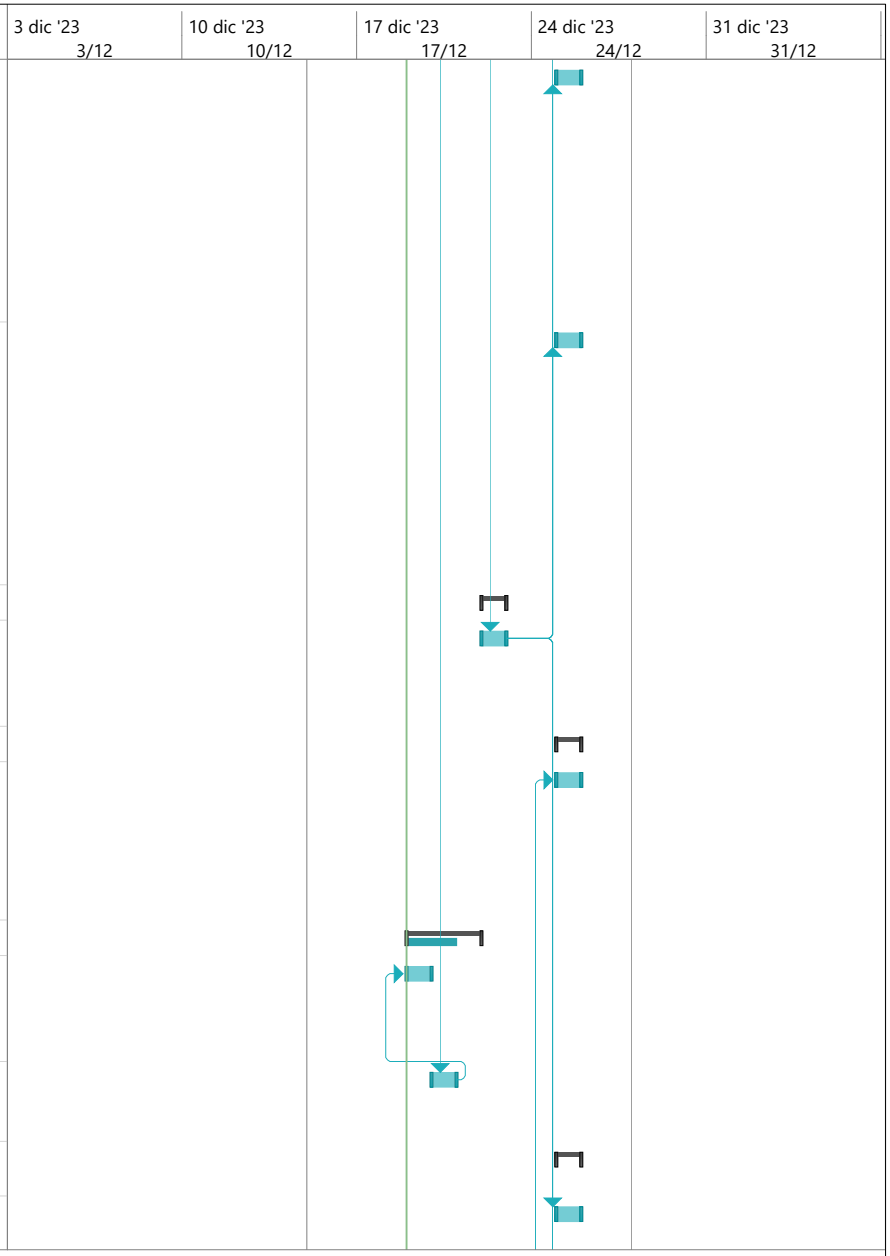


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
113	10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
114	10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
115	**11**	**CARPINTERIA METALICA**	**1 día**	**mar 26/12/23**	**mar 26/12/23**
116	11.1	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CON MALLA EXPANDIDA EXR 12 MM CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
117	11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
118	**12**	**CUBIERTAS**	**2 días**	**lun 25/12/23**	**mar 26/12/23**
119	12.1	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALA	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
120	12.2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
121	**13**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**0 días**	**dom 24/12/23**	**dom 24/12/23**
122	13.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	1 día	dom 24/12/23	dom 24/12/23
123	13.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	1 día	dom 24/12/23	dom 24/12/23

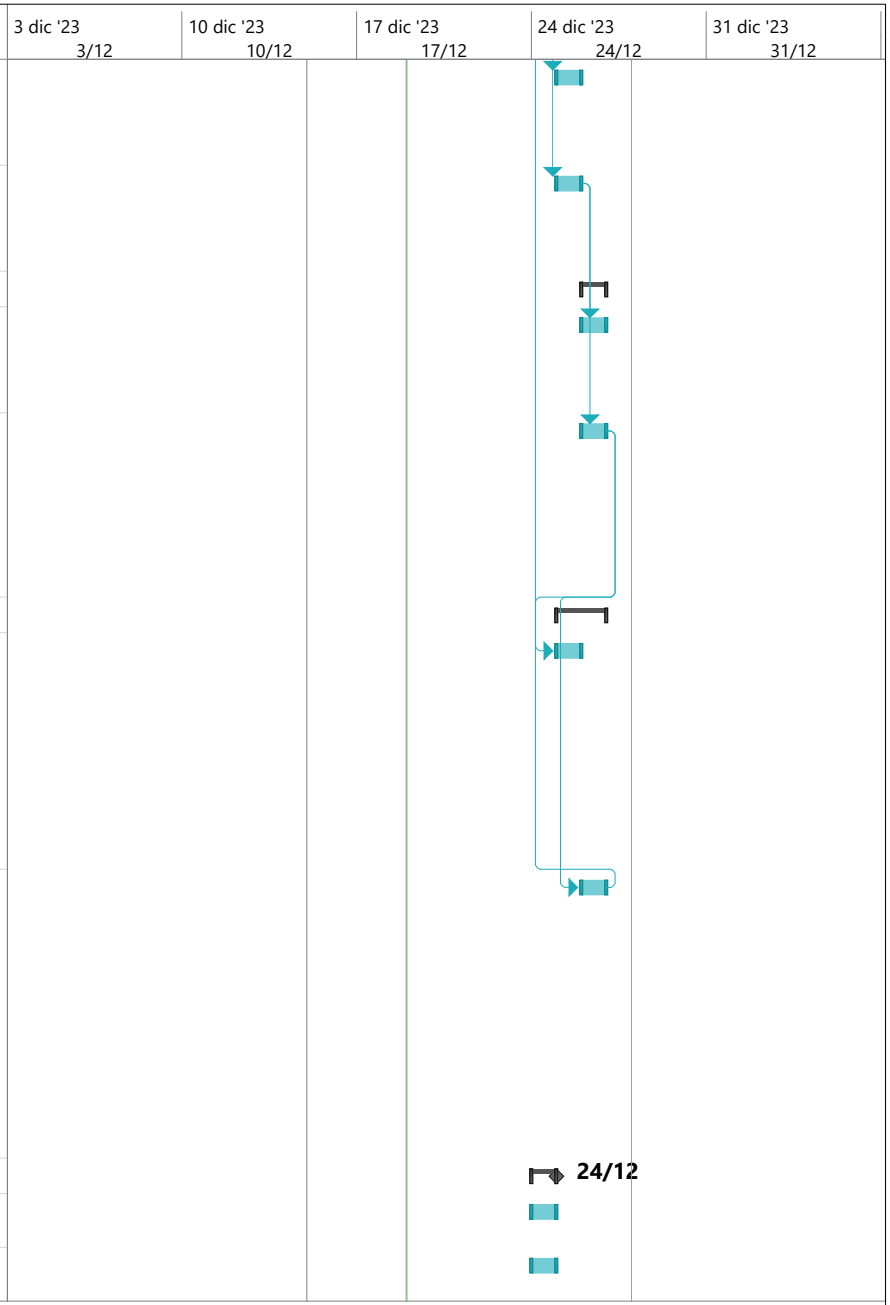


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
124		**MANTENIMIENTO RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, CACOM 4**	**6 días**	**mar 19/12/23**	**mar 26/12/23**
125	**1**	**PRELIMINARES**	**2 días**	**mar 19/12/23**	**mié 20/12/23**
126	1.1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
127	1.2	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	2 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23
128	1.3	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
129	1.4	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
130	1.5	RETIRO DE GRANIPLAST EN FACHADA (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
131	1.6	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CERCHA METALICA , INCLUYE ANTICORROSIVO , PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
132	1.7	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
133	**2**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**2 días**	**jue 21/12/23**	**vie 22/12/23**
134	2.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23
135	2.2	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23
136	2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23
137	**3**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**1 día**	**vie 22/12/23**	**sáb 23/12/23**
138	3.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23

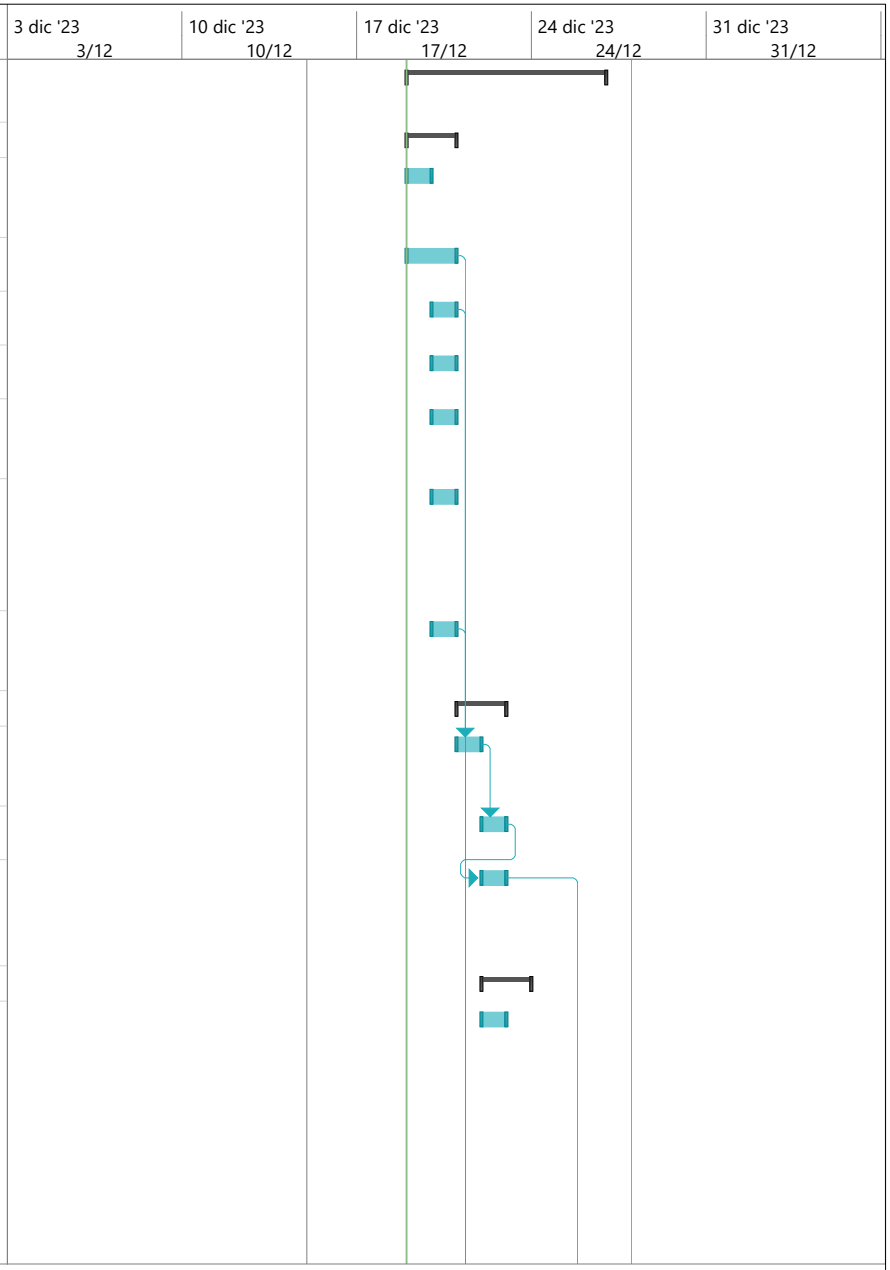


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
139	3.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA	1 día	sáb 23/12/23	sáb 23/12/23
140	3.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A	1 día	sáb 23/12/23	sáb 23/12/23
141	3.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDA	1 día	sáb 23/12/23	sáb 23/12/23
142	3.5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	1 día	sáb 23/12/23	sáb 23/12/23
143	**4**	**PAÑETES**	**1 día**	**lun 25/12/23**	**lun 25/12/23**
144	4.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
145	4.2	PAÑETE 1:4 FILOS Y DILATACIONES	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
146	**5**	**CIELO RASO**	**1 día**	**jue 21/12/23**	**jue 21/12/23**

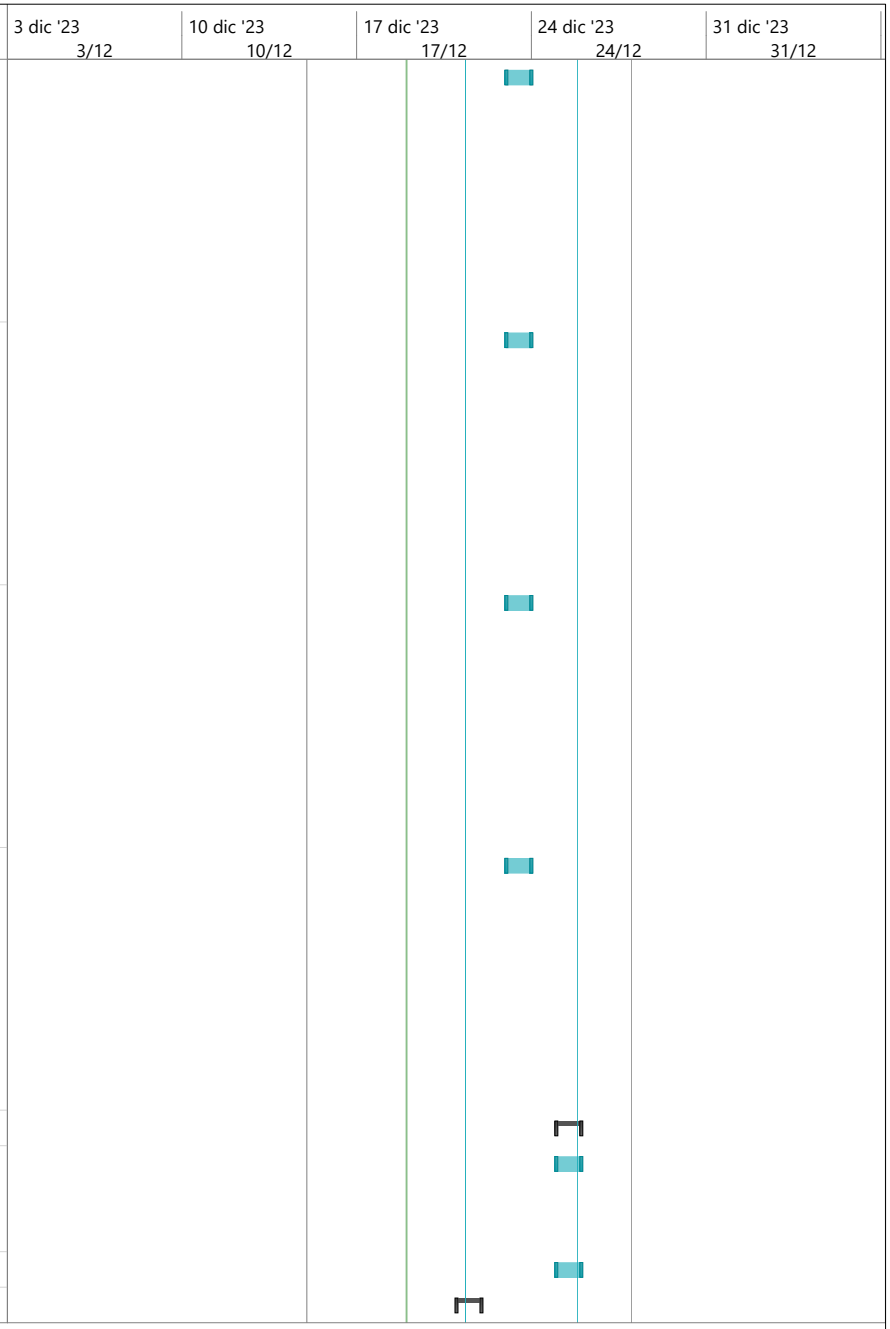


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
147	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23
148	**6**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**1 día**	**mar 26/12/23**	**mar 26/12/23**
149	6.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
150	6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
151	6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
152	6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
153	**7**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**1 día**	**mar 19/12/23**	**mar 19/12/23**
154	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
155	7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA GRANIPLAST.	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
156	**8**	**CUBIERTAS**	**4 días**	**mar 19/12/23**	**vie 22/12/23**
157	8.1	LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL 20 PARA TRAMPA DE GRASAS. INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA, MARCO METALICO DE SOPORTE, ACCESORIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23

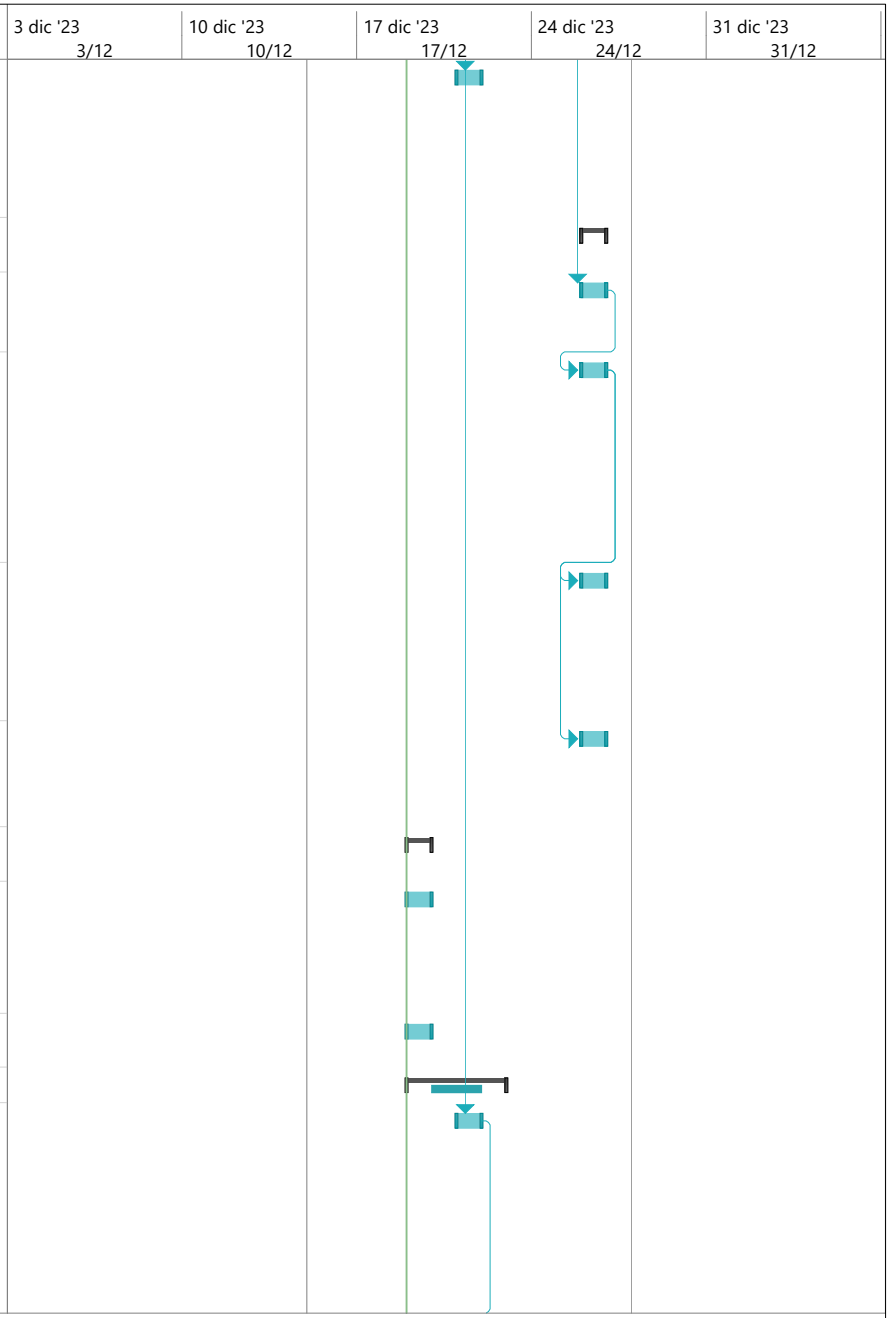


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
158	8.2	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALA	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23
159	**9**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**1 día**	**mar 26/12/23**	**mar 26/12/23**
160	9.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
161	9.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
162		**MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA CAMPO ENTRENAMIENTO ESCUELA FLANDES**	**4 días**	**jue 21/12/23**	**mar 26/12/23**
163	**1**	**PRELIMINARES**	**3 días**	**jue 21/12/23**	**lun 25/12/23**
164	1.1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23
165	1.2	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
166	1.3	DESMONTE DE BARANDAS METÁLICAS, INCLUYE RETIRO	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
167	1.4	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
168	**2**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**1 día**	**mar 26/12/23**	**mar 26/12/23**
169	2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23

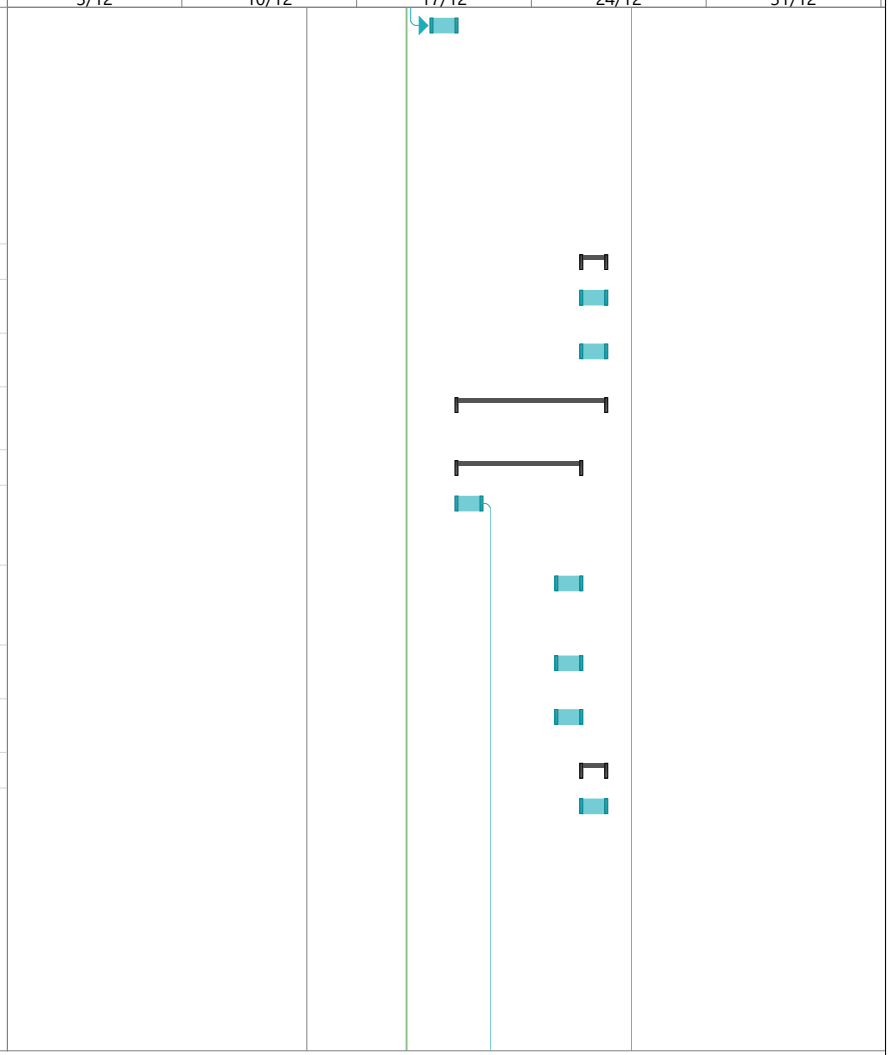


Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
170	2.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
171	2.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
172	**3**	**PAÑETES**	**3 días**	**vie 22/12/23**	**mar 26/12/23**
173	3.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
174	**4**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**2 días**	**vie 22/12/23**	**lun 25/12/23**
175	4.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23
176	4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23
177	4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23

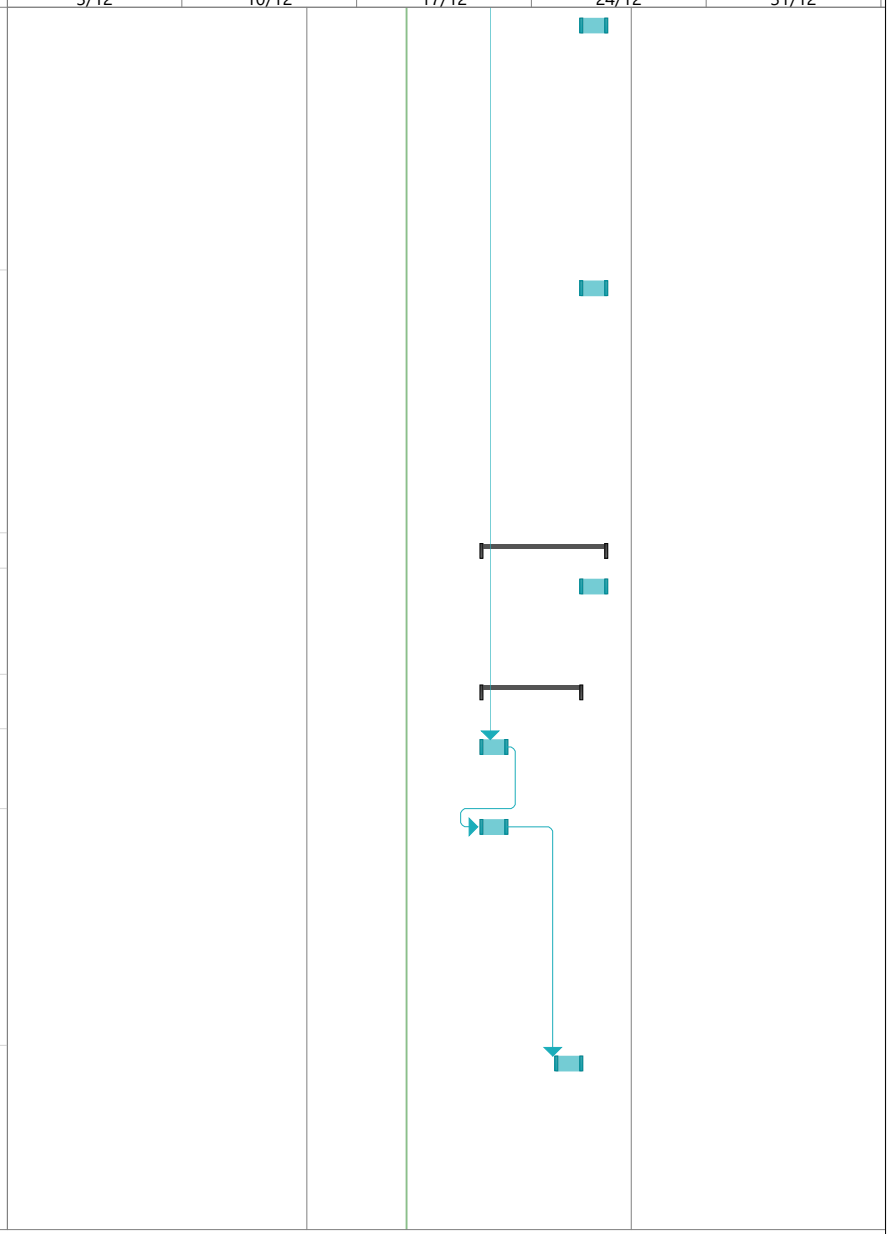

Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
178	4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
179	**5**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**1 día**	**mar 26/12/23**	**mar 26/12/23**
180	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
181	5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
182	5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
183	**6**	**CARPINTERIA METALICA**	**1 día**	**mar 26/12/23**	**mar 26/12/23**
184	6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
185	**7**	**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**	**1 día**	**mar 26/12/23**	**mar 26/12/23**
186	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
187	**8**	**CUBIERTAS**	**1 día**	**mar 26/12/23**	**mar 26/12/23**

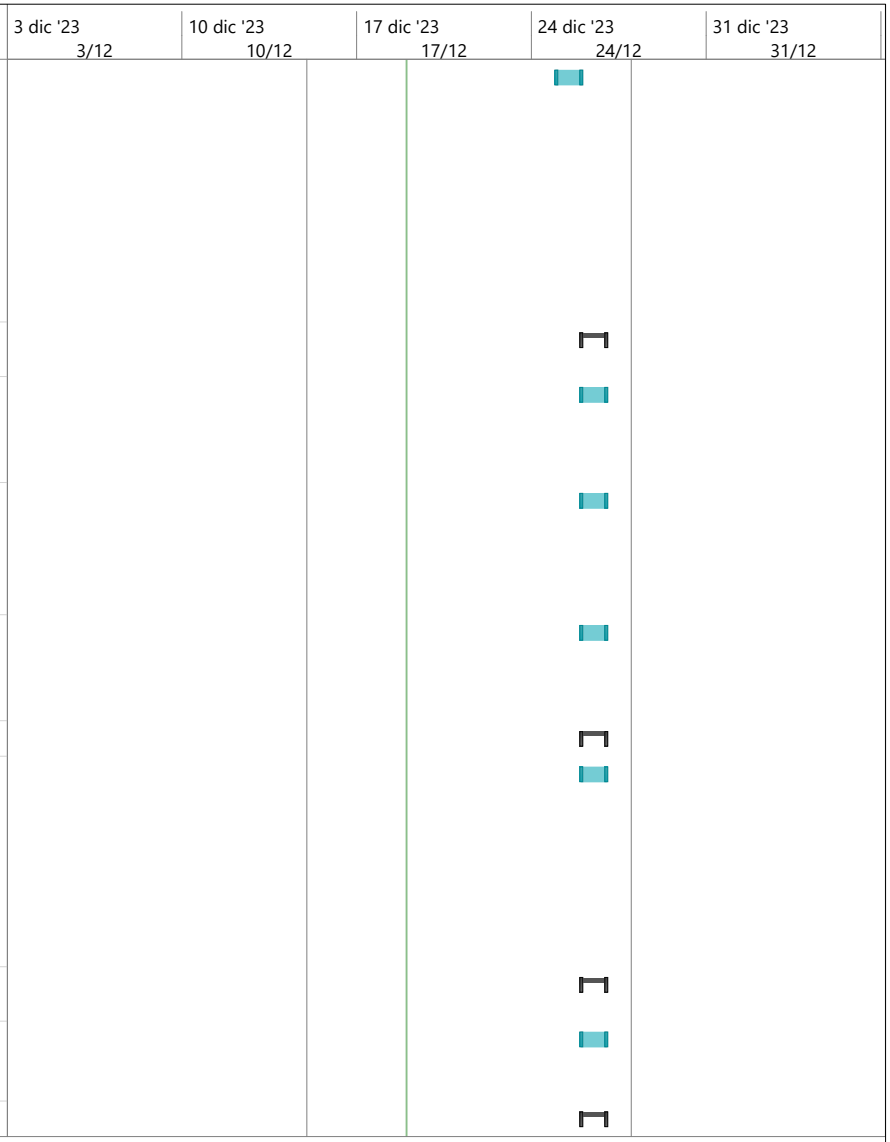

Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
188	8.1	MANTENIMIENTO A CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS DE SUJECCION DE TEJA EN LAMINA ONDULADA EN MAL ESTADO Y COLOCACION DE TORNILLO AUTOPERFORANTE TRAXX 3 CON ARANDELA DE GOMA, ALINEACION DE TEJAS CORRIDAS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y APLI	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
189	**9**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**1 día**	**mar 26/12/23**	**mar 26/12/23**
190	9.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
191	9.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
192		**MANTENIMIENTO RANCHO Y COMEDOR CERRO LA MARIA**	**6 días**	**mar 19/12/23**	**mar 26/12/23**
193	**1**	**PRELIMINARES**			
194	1.1	CAMPAMENTO DE 18 M2	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
195	1.2	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
196	1.3	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	1 día	lun 25/12/23	lun 25/12/23
197	1.4	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
198	1.5	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
199	**2**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**			
200	2.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
201	2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO POLIURETANO CEMENTO SIKAFLOOR PURCEM GLOSSY 210 GRIS CLARO EN 4 MM DE ESPESOR CON ESMALTE URETANO RECUBRIMIENTO DE URETANO (POLIURETANO) BRILLANTE, CON PARTÍCULAS ANTIDESLIZANTES	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
202	2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23

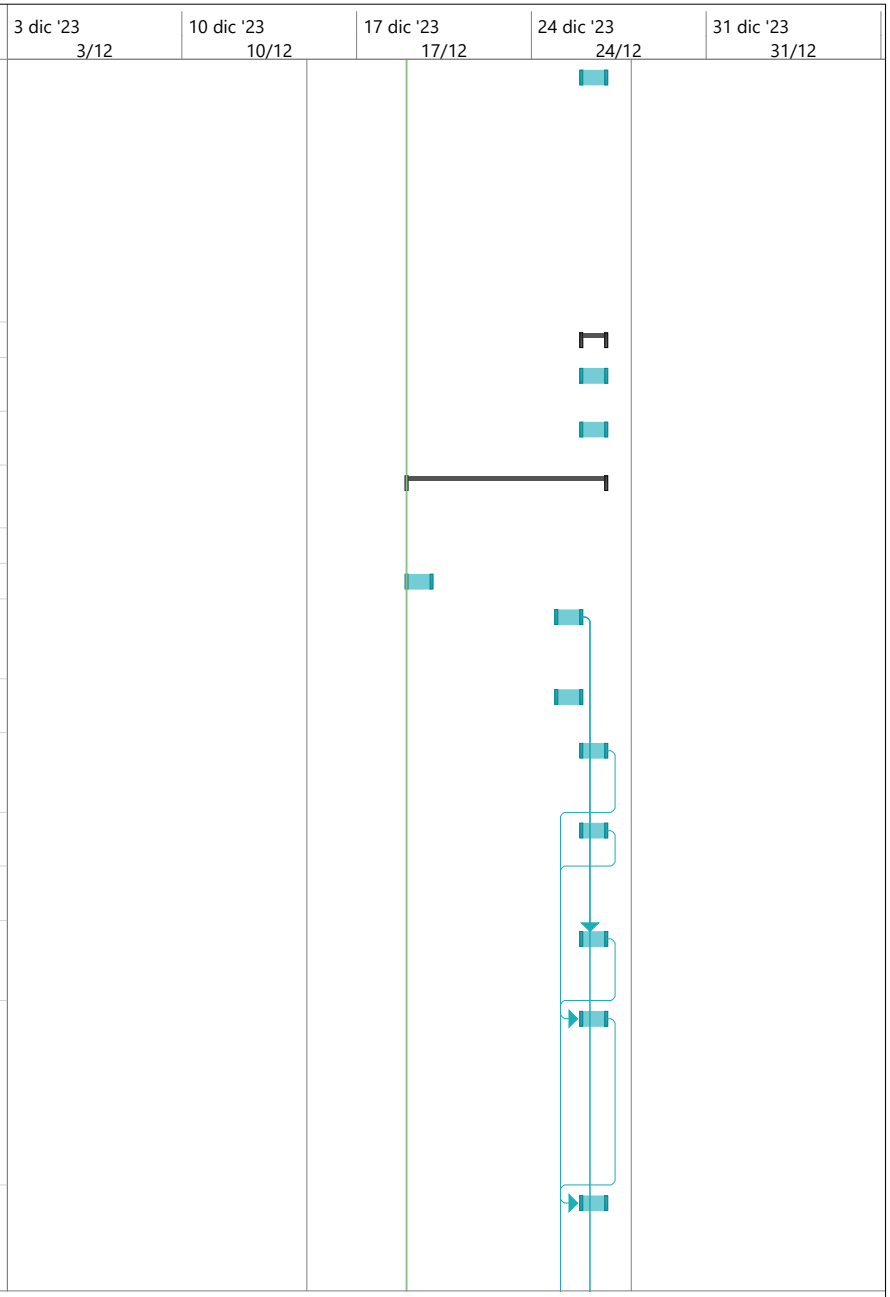

Id	Texto13	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
203	2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR.)	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
204	2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y MUROS CON CIELORASO.	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
205	**3**	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**			
206	3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
207	**4**	**CARPINTERIA METALICA**			
208	4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
209	**5**	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**			
210	5.1	VENTANA EN ALUMINIO CRUDO Y VIDRIO AZUL LAKE DE 6MM DE CORREDERA	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
211	**6**	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**			
212	6.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23
213	6.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23

