9.12. ACTA DE NO. 1

Carrera 12 # 21 – 94 B/ El Dean
Cel: 3106362578
Correo Electrónico

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800031077 9 de octubre de 2023	**OBJETO:** REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	
		PLAZO INCIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBREN 2023
		PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 18 DEDICIEMBRE 2023
		ACTA DE INICIO:	10 de octubre de 2023
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 75.400.000	MODIFICATORIO No.1	28 de noviembre de 2023
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $37.700.000	SUSPENSIÓN No. 1	
	VALOR TOTAL CONTRATADO: 113.100.000		
CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	**DISP. PRESUPUESTAL No.1 :** 2023.CEN.01.5078 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	REINICIO No. 1	
	DISP. PRESUPUESTAL No.2 : 2023.CEN.01.7343 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.		
	REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023 C3N.01.6770 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023	MODIFICATORIO No.2	
SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.:** 2023 CEN.01.8918 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023		

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
12 DE DICIEMBRE DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,1	Recorrido de cubierta en teja de fibrocemento para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	m2		$ 9.324,39	$ -	32,44	$ (302.483,34)	2164,63	$ 20.183.862,85	2132,19	$ 19.881.379,51	2.132,19	$ 19.881.379,51
1,2	Recorrido de cubierta en teja termoacustica para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	m2		$ 14.096,55	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,3	Recorrido de cubierta en teja de barro para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	m2		$ 10.120,17	$ -	0,00	$ -	251,32	$ 2.543.400,29	251,32	$ 2.543.400,29	251,32	$ 2.543.400,29
2,1	Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes	Und		$ 52.951,50	$ -	0,00	$ -	212,00	$ 11.225.718,00	212,00	$ 11.225.718,00	212,00	$ 11.225.718,00
2,2	Suministro e instalación de teja de barro incluye reemplazo de elementos para su normal funcionamiento y desmonte de tejas existentes.	m2		$ 83.632,55	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	Suministro e instalación de teja termoacustica, incluye elementos para su normal funcionamiento y desmonte de teja existente	Und		$ 479.252,11	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,4	Suministro e instalación de teja claraboya en perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye vidrio y desmonte de tejas existentes	Und		$ 114.602,45	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 458.409,82	4,00	$ 458.409,82	4,00	$ 458.409,82
3,1	Limpieza de canales de cubierta y bajantes h=5m	m		$ 7.807,39	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800031077 9 de octubre de 2023	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	CRONOLOGIA DEL CONTRATO	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 12 DE DICIEMBRE DE 2023
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 75.400.000	PLAZO INCIAL: HASTA EL 30 DE NOVIEMBREN 2023 PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 18 DEDICIEMBRE 2023 ACTA DE INICIO: 10 de octubre de 2023 MODIFICATORIO No.1 28 de noviembre de 2023	
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $37.700.000 VALOR TOTAL CONTRATADO: 113.100.000	SUSPENSIÓN No. 1	
CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	DISP. PRESUPUESTAL No.1 : 2023.CEN.01.5076 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. DISP. PRESUPUESTAL No.2 : 2023.CEN.01.7343 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	REINICIO No. 1	
	REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023 C3N.01.6770 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023	MODIFICATORIO No.2	
SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2023 CEN.01.8918 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023		

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3,2	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=7m	m		$ 8.442,89	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m	m		$ 9.713,89	$ -	0,00	$ -	241,00	$ 2.341.048,44	241,00	$ 2.341.048,44	241,00	$ 2.341.048,44
4,1	Resane de cielo raso en mortero 1:3, incluye malla para adherencia	m2		$ 23.368,14	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 34 de ancho 30 cm.	m		$ 18.053,67	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,1	Disposición de materiales en sitio autorizado	m3		$ 4.391,35	$ -	0,50	$ (2.195,67)	6,26	$ 27.489,84	5,76	$ 25.294,17	5,76	$ 25.294,17
7,1	Transporte de material proveniente de excavación, explanación, canales y escombros. Incluye Cargue a mano	m3-km		$ 20.684,50	$ -	123,13	$ (2.546.882,49)	146,17	$ 3.023.453,37	23,04	$ 476.570,88	23,04	$ 476.570,88
NO PREVISTOS					$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
NP 1	Suministro e instalación de teja de zinc (No.6) área 2.438*0.8 cal 35, incluye desmonte de tejas existentes	Und		49.845,47	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 348.918,29	7,00	$ 348.918,29	7,00	$ 348.918,29
NP 2	Recorrido de cubierta en teja de zinc, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	m2		11.636,69	$ -	0,00	$ -	19,14	$ 222.726,25	19,14	$ 222.726,25	19,14	$ 222.726,25
NP 3	Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.8) área útil 2.01m2, incluye desmonte de tejas existentes	Und		93.200,42	$ -	0,00	$ -	78,00	$ 7.269.632,76	78,00	$ 7.269.632,76	78,00	$ 7.269.632,76

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800031077 9 de octubre de 2023	**OBJETO:** REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO** PLAZO INCIAL: HASTA EL 30 DE NOVIEMBREN 2023 PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 18 DEDICIEMBRE 2023 ACTA DE INICIO: 10 de octubre de 2023 MODIFICATORIO No.1 28 de noviembre de 2023 SUSPENSIÓN No. 1 REINICIO No. 1 MODIFICATORIO No.2	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1** 12 DE DICIEMBRE DE 2023
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 75.400.000 VALOR CONTRATO ADICIONAL: $37.700.000 VALOR TOTAL CONTRATADO: 113.100.000		
CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	**DISP. PRESUPUESTAL No.1 :** 2023.CEN.01.5078 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. **DISP. PRESUPUESTAL No.2 :** 2023.CEN.01.7343 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.		
	REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023 C3N.01.6770 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023		
SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.:** 2023 CEN.01.8918 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023		

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP 4	Instalación Y reparacion de canal lamina, incluye el desmonte de canal existente.	m		13.326,69	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 66.633,45	5,00	$ 66.633,45	5,00	$ 66.633,45
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	m		28.217,43	$ -	0,00	$ -	10,05	$ 283.585,17	10,05	$ 283.585,17	10,05	$ 283.585,17
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	m		42.477,35	$ -	0,00	$ -	13,75	$ 584.063,56	13,75	$ 584.063,56	13,75	$ 584.063,56
NP 7	SUMINISTRO E INTALACION DE CABALLETE FIJO P7	Und		52.219,06	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 313.314,36	6,00	$ 313.314,36	6,00	$ 313.314,36
NP 8	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -2MM C.14	ML		74.182,00	$ -	0,00	$ -	47,68	$ 3.536.997,76	47,68	$ 3.536.997,76	47,68	$ 3.536.997,76
NP 9	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML		233.265,00	$ -	0,00	$ -	9,68	$ 2.258.005,20	9,68	$ 2.258.005,20	9,68	$ 2.258.005,20
NP 10	DESM CIELO FALSO	M2		8.235,15	$ -	0,00	$ 0,05	34,32	$ 282.630,30	34,32	$ 282.630,35	34,32	$ 282.630,35
NP 11	INSTALACION CIELO FALSO EXISTENTE	M2		10.913,00	$ -	0,00	$ -	14,76	$ 161.075,88	14,76	$ 161.075,88	14,76	$ 161.075,88
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CIELO FALSO ICOPOR POLIESTIRENO	M2		36.496,00	$ -	0,00	$ -	19,56	$ 713.861,76	19,56	$ 713.861,76	19,56	$ 713.861,76
NP 13	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6	ML		54.620,00	$ -	0,00	$ -	2,44	$ 133.272,80	2,44	$ 133.272,80	2,44	$ 133.272,80

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800031077 9 de octubre de 2023	**OBJETO:** REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	
		PLAZO INCIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBREN 2023
		PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 18 DEDICIEMBRE 2023
		ACTA DE INICIO:	10 de octubre de 2023
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 75.400.000	MODIFICATORIO No.1	28 de noviembre de 2023
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $37.700.000	SUSPENSIÓN No. 1	
	VALOR TOTAL CONTRATADO: 113.100.000		
CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	**DISP. PRESUPUESTAL No.1 :** 2023.CEN.01.5078 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	REINICIO No. 1	
	DISP. PRESUPUESTAL No.2 : 2023.CEN.01.7343 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.		
	REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023 C3N.01.6770 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023	MODIFICATORIO No.2	
SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.:** 2023 CEN.01.8918 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023		

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
12 DE DICIEMBRE DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP 14	C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO	M2		74.813,00	$ -	0,00	$ -	3,81	$ 285.037,53	3,81	$ 285.037,53	3,81	$ 285.037,53
NP 15	CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"	UND		133.133,03	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 532.532,12	4,00	$ 532.532,12	4,00	$ 532.532,12
NP 16	DESM.CUBIERTA EN POLICARBONATO	M2		13.967,00	$ -	36,21	$ (505.686,71)	171,93	$ 2.401.357,79	135,73	$ 1.895.671,08	135,73	$ 1.895.671,08
NP 17	Suministro e Instalacion Teja Policarbonato Ajonit Cristal No. 10	M2		97.644,00	$ -	36,21	$ (3.535.281,30)	171,93	$ 16.788.013,20	135,73	$ 13.252.731,90	135,73	$ 13.252.731,90
NP 18	TUBO ESTRUCTURAL 1/ 1/2 X 1,5 mm	ML		60.073,00	$ -	27,92	$ (1.677.032,01)	161,42	$ 9.696.777,51	133,50	$ 8.019.745,50	133,50	$ 8.019.745,50
	COSTO TOTAL				$ -		$ (8.569.561)		$ 85.681.818		$ 77.112.257		$ 77.112.257
	ADMINISTRACIÓN (25%)	25%			$ -		$ (2.142.390)		$ 21.420.455		$ 19.278.064		$ 19.278.064
	IMPREVISTOS (2%)	2%			$ -		$ (171.391)		$ 1.713.636		$ 1.542.245		$ 1.542.245
	UTILIDAD (5%)	5%			$ -		$ (428.478)		$ 4.284.091		$ 3.855.613		$ 3.855.613
	COSTO TOTAL				$ -		$ (11.311.821)		$ 113.100.000		$ 101.788.179		$ 101.788.179

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800031077 9 de octubre de 2023	**OBJETO:** REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO** PLAZO INCIAL: HASTA EL 30 DE NOVIEMBREN 2023 PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 18 DEDICIEMBRE 2023 ACTA DE INICIO: 10 de octubre de 2023 MODIFICATORIO No.1 28 de noviembre de 2023 SUSPENSIÓN No. 1 REINICIO No. 1 MODIFICATORIO No.2	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1** 12 DE DICIEMBRE DE 2023
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 75.400.000		
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $37.700.000 VALOR TOTAL CONTRATADO: 113.100.000		
CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	**DISP. PRESUPUESTAL No.1 :** 2023.CEN.01.5076 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. **DISP. PRESUPUESTAL No.2 :** 2023.CEN.01.7343 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.		
	REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023 C3N.01.6770 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023		
SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.:** 2023 CEN.01.8918 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023		

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO:			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 75.400.000,00	VALOR ANTICIPO		$ 0	VALOR RETEGARANTIA 10%		*$0
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ 37.700.000,00	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0		ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ 0	
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 113.100.000,00	AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA	$ 0		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 101.788.179		SALDO POR AMORTIZAR	$ 0		SALDO RETEGARANTIA	$ 0	
SALDO POR EJECUTAR	$ 11.311.821							
SUMAS IGUALES $	**$ 113.100.000**	**$ 113.100.000,00**	**SUMAS IGUALES $**	**$ 0**	**$ 0**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0**	$ 0

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**$ 101.788.179**
SON: CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.	

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE
FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
FIRMA:

60

ALCALDÍA DE POPAYÁN

OFICINA ASESORA JURIDICA

ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800031077 9 de octubre de 2023	**OBJETO:** REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		**ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 1 21 DE NOVIEMBRE DE 2023**
		PLAZO INCIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBREN 2023	
		PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 18 DEDICIEMBRE 2023	
		ACTA DE INICIO:	10 de octubre de 2023	
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 75.400.000	MODIFICATORIO No.1	28 de noviembre de 2023	
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $37.700.000	SUSPENSIÓN No. 1		
	VALOR TOTAL CONTRATADO: 113.100.000			
CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	**DISP. PRESUPUESTAL No.1 :** 2023.CEN.01.5078 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	REINICIO No. 1		
	DISP. PRESUPUESTAL No.2 : 2023.CEN.01.7343 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.			
	REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023 C3N.01.6770 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023	MODIFICATORIO No.2		
SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.:** 2023 CEN.01.8918 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023			

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**
1,1	Recorrido de cubierta en teja de fibrocemento para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	m2		$ 9.324,39	$ -	2.164,63	$ 20.183.862,85	2164,63	$ 20.183.862,85
1,2	Recorrido de cubierta en teja termoacustica para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	m2		$ 14.096,55	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,3	Recorrido de cubierta en teja de barro para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	m2		$ 10.120,17	$ -	251,32	$ 2.543.400,29	251,32	$ 2.543.400,29
2,1	Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes	Und		$ 52.951,50	$ -	212,00	$ 11.225.718,00	212,00	$ 11.225.718,00
2,2	Suministro e instalación de teja de barro incluye reemplazo de elementos para su normal funcionamiento y desmonte de tejas existentes.	m2		$ 83.632,55	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	Suministro e instalación de teja termoacustica, incluye elementos para su normal funcionamiento y desmonte de teja existente	Und		$ 479.252,11	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,4	Suministro e instalación de teja claraboya en perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye vidrio y desmonte de tejas existentes	Und		$ 114.602,45	$ -	4,00	$ 458.409,82	4,00	$ 458.409,82

ALCALDÍA DE POPAYÁN

OFICINA ASESORA JURIDICA

ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800031077 9 de octubre de 2023	**OBJETO:** REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		**ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 1** **21 DE NOVIEMBRE DE 2023**
		PLAZO INCIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBREN 2023	
		PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 18 DEDICIEMBRE 2023	
		ACTA DE INICIO:	10 de octubre de 2023	
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 75.400.000	MODIFICATORIO No.1	28 de noviembre de 2023	
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $37.700.000	SUSPENSIÓN No. 1		
	VALOR TOTAL CONTRATADO: 113.100.000			
CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	**DISP. PRESUPUESTAL No.1 :** 2023.CEN.01.5078 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	REINICIO No. 1		
	DISP. PRESUPUESTAL No.2 : 2023.CEN.01.7343 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.			
	REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023 C3N.01.6770 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023	MODIFICATORIO No.2		
SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.:** 2023 CEN.01.8918 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023			

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3,1	Limpieza de canales de cubierta y bajantes h=5m	m		$ 7.807,39	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,2	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=7m	m		$ 8.442,89	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m	m		$ 9.713,89	$ -	241,00	$ 2.341.048,44	241,00	$ 2.341.048,44
4,1	Resane de cielo raso en mortero 1:3, incluye malla para adherencia	m2		$ 23.368,14	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 34 de ancho 30 cm.	m		$ 18.053,67	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,1	Disposición de materiales en sitio autorizado	m3		$ 4.391,35	$ -	6,26	$ 27.489,84	6,26	$ 27.489,84
7,1	Transporte de material proveniente de excavación, explanación, canales y escombros. Incluye Cargue a mano	m3-km		$ 20.684,50	$ -	146,17	$ 3.023.453,37	146,17	$ 3.023.453,37
NO PREVISTOS							$ -		
NP 1	Suministro e instalación de teja de zinc (No.6) área 2.438*0.8 cal 35, incluye desmonte de tejas existentes	Und		$ 49.845,47	$ -	7,00	$ 348.918,29	7,00	$ 348.918,29
NP 2	Recorrido de cubierta en teja de zinc, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	m2		$ 11.636,69	$ -	19,14	$ 222.726,25	19,14	$ 222.726,25
NP 3	Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.8) área útil 2.01m2, incluye desmonte de tejas existentes	Und		$ 93.200,42	$ -	78,00	$ 7.269.632,76	78,00	$ 7.269.632,76

ALCALDÍA DE POPAYÁN

OFICINA ASESORA JURIDICA

ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**OBJETO:** REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800031077 9 de octubre de 2023		PLAZO INCIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBREN 2023
		PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 18 DEDICIEMBRE 2023
		ACTA DE INICIO:	10 de octubre de 2023
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 75.400.000	MODIFICATORIO No.1	28 de noviembre de 2023
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $37.700.000	SUSPENSIÓN No. 1	
	VALOR TOTAL CONTRATADO: 113.100.000		
CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	**DISP. PRESUPUESTAL No.1 :** 2023.CEN.01.5078 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	REINICIO No. 1	
	DISP. PRESUPUESTAL No.2 : 2023.CEN.01.7343 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.		
	REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023 C3N.01.6770 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023	MODIFICATORIO No.2	
SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.:** 2023 CEN.01.8918 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023		

ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 1
21 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 4	Instalación Y reparacion de canal lamina, incluye el desmonte de canal existente.	m		$ 13.326,69	$ -	5,00	$ 66.633,45	5,00	$ 66.633,45
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	m		$ 28.217,43	$ -	10,05	$ 283.585,17	10,05	$ 283.585,17
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	m		$ 42.477,35	$ -	13,75	$ 584.063,56	13,75	$ 584.063,56
NP 7	SUMINISTRO E INTALACION DE CABALLETE FIJO P7	Und		$ 52.219,06	$ -	6,00	$ 313.314,36	6,00	$ 313.314,36
NP 8	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -2MM C.14	ML		$ 74.182,00	$ -	47,68	$ 3.536.997,76	47,68	$ 3.536.997,76
NP 9	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML		$ 233.265,00	$ -	9,68	$ 2.258.005,20	9,68	$ 2.258.005,20
NP 10	DESM CIELO FALSO	M2		$ 8.235,15	$ -	34,32	282.630,30	34,32	282.630,30
NP 11	INSTALACION CIELO FALSO EXISTENTE	M2		$ 10.913,00	$ -	14,76	$ 161.075,88	14,76	$ 161.075,88
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CIELO FALSO ICOPOR POLIESTIRENO	M2		$ 36.496,00	$ -	19,56	$ 713.861,76	19,56	$ 713.861,76
NP 13	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6	ML		$ 54.620,00	$ -	2,44	$ 133.272,80	2,44	$ 133.272,80
NP 14	C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO	M2		$ 74.813,00	$ -	3,81	$ 285.037,53	3,81	$ 285.037,53
NP 15	CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"	UND		$ 133.133,03	$ -	4,00	$ 532.532,12	4,00	$ 532.532,12
NP 16	DESM.CUBIERTA EN POLICARBONATO	M2		$ 13.967,00	$ -	171,93	$ 2.401.357,79	171,93	$ 2.401.357,79

ALCALDÍA DE POPAYÁN

OFICINA ASESORA JURIDICA

ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800031077 9 de octubre de 2023	**OBJETO:** REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	
		PLAZO INCIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBREN 2023
		PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 18 DEDICIEMBRE 2023
		ACTA DE INICIO:	10 de octubre de 2023
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 75.400.000	MODIFICATORIO No.1	28 de noviembre de 2023
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $37.700.000	SUSPENSIÓN No. 1	
	VALOR TOTAL CONTRATADO: 113.100.000		
CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	**DISP. PRESUPUESTAL No.1 :** 2023.CEN.01.5078 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	REINICIO No. 1	
	DISP. PRESUPUESTAL No.2 : 2023.CEN.01.7343 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.		
	REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023 C3N.01.6770 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023	MODIFICATORIO No.2	
SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.:** 2023 CEN.01.8918 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023		

ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No. 1
21 DE NOVIEMBRE DE 2023

				CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 17	Suministro e Instalacion Teja Policarbonato Ajonit Cristal No. 10	M2		$ 97.644,00	$ -		171,93	$ 16.788.013,20	171,93	$ 16.788.013,20
NP 18	TUBO ESTRUCTURAL 1/ 1/2 X 1,5 mm	ML		$ 60.073,00	$ -		161,42	$ 9.696.777,51	161,42	$ 9.696.777,51
	COSTO TOTAL				$ 57.121.212,09			$ 85.681.818		$ 85.681.818
	ADMINISTRACIÓN (25%)	25%			$ 14.280.303			$ 21.420.455		$ 21.420.455
	IMPREVISTOS (2%)	2%			$ 1.142.424			$ 1.713.636		$ 1.713.636
	UTILIDAD (5%)	5%			$ 2.856.061			$ 4.284.091		$ 4.284.091
	COSTO TOTAL				$ 75.400.000,00			$ 113.100.000,00		$ 113.100.000,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE
FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
FIRMA:

50

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

MORTERO 1:4 — **Unidad: M3** — **ITEM: BASICO**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ARENA FINA	M3	1,05		71.686,00	75.270,30
AGUA	LTS	185		36,00	6.660,00
CEMENTO GRIS	KLS	360		643,00	231.480,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**313.410,30**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	105.073,00	170%	178.624	3,8462	46.441,68
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**46.441,68**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		46.441,68	2.322,08
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.322,08**
			COSTO DIRECTO	362.174,06	**362.174,06**

MORTERO 1:3 — **Unidad: M3** — **ITEM: BASICO**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AGUA	LTS	220		36,00	7.920,00
ARENA MEDIANA	M3	1		71.686,00	71.686,00
CEMENTO GRIS	KLS	450		643,00	289.350,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**368.956,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	105.073,00	170%	178.624	4,0000	44.656,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**44.656,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		44.656,00	2.232,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.232,80**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	415.844,80	**415.844,80**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Recorrido de cubierta en teja de fibrocemento para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación					**UNIDAD: m2** **ITEM: 1,1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AMARRAS PARA TEJA ASBESTO	UND	4	0	239,00	956,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**956,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA	52.612,00	170%	89.440	11,7770	7.594,47
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.594,47**
EQUIPO					
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,3		1.314,00	394,20
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		7.594,47	379,72
				SUBTOTAL EQUIPO	**773,92**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 9.324,39	**9.324,39**

Recorrido de cubierta en teja termoacustica para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación					**UNIDAD: m2** **ITEM: 1,2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TORN AVELLA .1/2x 8	UND	2	0	83,00	166,00
TORN AUTOPE .3/4x .3/16	UND	2	0	301,00	602,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**768,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	173.793,00	170%	295.448	23,6210	12.507,86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**12.507,86**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		12.507,86	625,39
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		1.314,00	131,40
TABLONES DE 3 MTS	DIA	0,1		639,00	63,90
				SUBTOTAL EQUIPO	**820,69**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 14.096,55	**14.096,55**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Recorrido de cubierta en teja de barro para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación — **UNIDAD: m2** — **ITEM: 1,3**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MORTERO 1:3	M3	0,002		415.844,80	831,68
				SUBTOTAL MATERIALES	**831,68**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	121.256,00	170%	206.135	23,3021	8.846,19
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**8.846,19**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		8.846,19	442,30
				SUBTOTAL EQUIPO	442,30
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	10.120,17	**10.120,17**

Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes — **UNIDAD: Und** — **ITEM: 2,1**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AMARRAS PARA TEJA ASBESTO	UND	4	0	239,00	956,00
TEJA ASB.CEMENTO P 7 # 6	UND	1	0	32.999,00	32.999,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**33.955,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE-1 OFI	136.428,00	170%	231.927	13,0159	17.818,77
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**17.818,77**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		17.818,77	890,93
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,2		1.314,00	262,80
CRUCETA ANDAMIO	DIA	0,2		120,00	24,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.177,73**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	52.951,50	**52.951,50**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Suministro e instalación de teja de barro incluye reemplazo de elementos para su normal funcionamiento y desmonte de tejas existentes.					**UNIDAD: m2**
					ITEM: 2,2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TEJA BARRO COMUN 15X35CM	UND	20		956,00	19.120,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**19.120,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	121.256,00	170%	206.135	3,3663	61.235,67
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**61.235,67**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		61.235,67	3.061,78
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,15		1.314,00	197,10
CRUCETA ANDAMIO	DIA	0,15		120,00	18,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.276,88**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	83.632,55	**83.632,55**

Suministro e instalación de teja termoacustica, incluye elementos para su normal funcionamiento y desmonte de teja existente					**UNIDAD: Und**
					ITEM: 2,3
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TORN.LAMINA AUT.1/2-14X3/4 CABEZA HEXAGONAL	UND	12		610,00	7.320,00
TORN P/LAM AUT.1/4-14X7/8	UND	6		848,00	5.088,00
TEJA TERMOACUSTICA	UND	1		359.980,00	359.980,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**372.388,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	173.793,00	170%	295.448	2,9226	101.092,49
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**101.092,49**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		101.092,49	5.054,62
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,5		1.314,00	657,00
CRUCETA ANDAMIO	DIA	0,5		120,00	60,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**5.771,62**
OTROS					
			COSTO DIRECTO	479.252,11	**479.252,11**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Suministro e instalación de teja claraboya en perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye vidrio y desmonte de tejas existentes					**UNIDAD: Und**
					ITEM: 2,4
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TEJA CLARABOYA # 6	UND	1	0	69.297,00	69.297,00
				SUBTOTAL MATERIALES	69.297,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	145.506,00	170%	247.360	5,7328	43.148,05
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	43.148,05
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		43.148,05	2.157,40
				SUBTOTAL EQUIPO	2.157,40
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 114.602,45	**114.602,45**

Limpieza de canales de cubierta y bajantes h=5m					**UNIDAD: m**
					ITEM: 3,1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	121.256,00	170%	206.135	27,7227	7.435,61
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.435,61**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		7.435,61	371,78
				SUBTOTAL EQUIPO	**371,78**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 7.807,39	**7.807,39**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=7m					**UNIDAD: m**
					ITEM: 3,2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	121.256,00	170%	206.135	25,6360	8.040,85
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**8.040,85**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		8.040,85	402,04
				SUBTOTAL EQUIPO	**402,04**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 8.442,89	**8.442,89**

Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m					**UNIDAD: m**
					ITEM: 3,3
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	52.536,00	170%	89.311	9,6538	9.251,33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**9.251,33**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		9.251,33	462,56
				SUBTOTAL EQUIPO	**462,56**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 9.713,89	**9.713,89**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Resane de cielo raso en mortero 1:3, incluye malla para adherencia					**UNIDAD: m2**
					ITEM: 4,1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MORTERO 1:3	M3	0,006		415.844,80	2.495,06
				SUBTOTAL MATERIALES	**2.495,06**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	121.256,00	170%	206.135	10,4351	19.753,99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**19.753,99**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		19.753,99	987,69
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		1.314,00	131,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.119,09**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 23.368,14	**23.368,14**

Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 34 de ancho 30 cm.					**UNIDAD: m**
					ITEM: 5,1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUNTILLA 2 AC	UND	0,1		5.078,00	507,80
LAM.ALUMINIO 1.7 MM	M2	0,3	0,02	25.258,00	7.578,91
				SUBTOTAL MATERIALES	**8.086,71**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	121.256,00	170%	206.135	22,3593	9.219,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**9.219,20**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		9.219,20	460,96
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,2		1.314,00	262,80
CRUCETA ANDAMIO	DIA	0,2		120,00	24,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**747,76**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 18.053,67	**18.053,67**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Disposición de materiales en sitio autorizado — **UNIDAD: m3** — **ITEM: 6,1**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	52.536,00	170%	89.311	47,4981	1.880,30
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.880,30**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		1.880,30	94,01
RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-51O	HRS	0,02		120.852,00	2.417,04
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.511,05**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 4.391,35	**4.391,35**

Transporte de material proveniente de excavación, explanación, canales y escombros. Incluye Cargue a mano — **UNIDAD: m3-km** — **ITEM: 7,1**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
EQUIPO					
CAMION TRANSPORTE CARGA 5-10 TONELADAS	VJE	7,21		2.868,00	20.684,50
				SUBTOTAL EQUIPO	**20.684,50**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 20.684,50	**20.684,50**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Suministro e instalación de teja de zinc (No.6) área 2.438*0.8 cal 35, incluye desmonte de tejas existentes — **Unidad: UND** — **ITEM: NP1**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TEJA ZINC OND 800X2438 C34	UND	1		38.151,00	38.151,00
AMARRAS PARA TEJA ASBESTO	UND	6		239,00	1.434,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**39.585,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI	128.842,00	170%	219.031	21,9053	9.998,99
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**9.998,99**
EQUIPO					
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,199		1.314,00	261,48
				SUBTOTAL EQUIPO	**261,48**
				COSTO DIRECTO 49.845,47	**49.845,47**

Recorrido de cubierta en teja de zinc, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación — **Unidad: M2** — **ITEM: NP2**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI	128.842,00	170%	219.031	20,2202	10.832,28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**10.832,28**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		10.832,28	541,61
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,2		1.314,00	262,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**804,41**
				COSTO DIRECTO 11.636,69	**11.636,69**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.8) área útil 2.01m2, incluye desmonte de tejas existentes — **Unidad:UND** — **ITEM: NP 3**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TEJA ASB.CEMENTO P 7 # 8	UND	1	0	57.500,00	57.500,00
AMARRAS PARA TEJA ASBESTO	UND	4	0	239,00	956,00
CAPUCHONES Y GANCHOS METALICOS	UND	1,5	0	7.000,00	10.500,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**68.956,00**

MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	121.256,00	170%	206.135	9,0074	22.885,07
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**22.885,07**

EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		22.885,07	1.144,25
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,15		1.314,00	197,10
CRUCETA ANDAMIO	DIA	0,15		120,00	18,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.359,35**
			COSTO DIRECTO	93.200,42	**93.200,42**

Instalación Y reparacion de canal lamina, incluye el desmonte de canal existente. — **Unidad: ML** — **ITEM: NP4**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOLDADURA 6011 x 1/8 0.12	KLS	0,09	5	15.810,00	1.494,04
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.494,04**

MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	121.256,00	170%	206.135	18,4973	11.144,05
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**11.144,05**

EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		11.144,05	557,20
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		1.314,00	131,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**688,60**
			COSTO DIRECTO	13.326,69	**13.326,69**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" — **Unidad: ML** — **ITEM: NP5**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN	UND	0,004		102.632,00	410,52
TUBO VENT-LLV. PVC 3	ML	1	0,02	17.898,00	17.901,57
CODO SAN PVC 3 x90 CxC	UND	1	0	4.898,00	4.898,00
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL	UND	0,004		51.614,00	206,45
				SUBTOTAL MATERIALES	**23.416,54**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI	128.842,00	170%	219.031	47,9041	4.572,28
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**4.572,28**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		4.572,28	228,61
				SUBTOTAL EQUIPO	**228,61**
				COSTO DIRECTO 28.217,43	**28.217,43**

SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 — **Unidad: ML** — **ITEM: NP6**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN	UND	0,004		102.632,00	410,52
TUBO VENT-LLV. PVC 4	ML	1	0,02	19.983,00	19.986,99
CODO SAN PVC 4 x90 CxC	UND	1	0	12.760,00	12.760,00
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL	UND	0,004		51.614,00	206,45
				SUBTOTAL MATERIALES	**33.363,96**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	185.656,00	170%	315.615	36,3636	8.679,42
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**8.679,42**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		8.679,42	433,97
				SUBTOTAL EQUIPO	**433,97**
				COSTO DIRECTO 42.477,35	**42.477,35**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SUMINISTRO E INTALACION DE CABALLETE FIJO P7 — **Unidad: ML** — **ITEM: NP 7**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABALLETE FIJO ASBESTO CEM	UND	1	0	36.859,00	36.859,00
MORTERO 1:4	M3	0,02		362.174,06	7.243,48
				SUBTOTAL MATERIALES	**44.102,48**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	121.256,00	170%	206.135	26,6666	7.730,08
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.730,08**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		7.730,08	386,50
				SUBTOTAL EQUIPO	**386,50**
			COSTO DIRECTO	52.219,06	**52.219,06**

PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -2,0MM C.14 — **Unidad: ML** — **ITEM: NP 8**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PERFIL AG C160mmx 60mm* 2MM	UND	0,17		283.900,00	48.263,00
SOLDADURA 6013 x 1/8	KLS	0,05		14.020,00	701,00
DISOLVENTE	GLN	0,03		53.765,00	1.612,95
ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0,05	0,04	47.194,00	2.360,64
				SUBTOTAL MATERIALES	**52.937,59**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	105.073,00	170%	178.624	80,0112	2.232,48
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI	128.842,00	170%	219.031	18,0000	12.168,38
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	128.842,00	170%	219.031	90,9996	2.406,94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**16.807,80**
EQUIPO					
PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0,02		31.064,00	621,28
SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0,05		56.871,00	2.843,55
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		16.807,80	840,39
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		1.314,00	131,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**4.436,62**
OTROS					
			COSTO DIRECTO	74.182,00	**74.182,00**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 — **Unidad: ML** — **ITEM: NP9**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ESMALTE SINTETICO MATE	GLS	0,1		71.566,00	7.156,60
LAM.GALVANIZADA C.22 100x200 CM	UND	0,9	5	118.500,00	111.982,50
SOLDADURA ESTAÑO	LBS	0,05	1	182.801,00	9.231,45
PLATINA 1/ 8x1 x6M	UND	0,165		15.744,00	2.597,76
				SUBTOTAL MATERIALES	**130.968,31**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	128.842,00	170%	219.031	13,3332	16.427,48
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	105.073,00	170%	178.624	10,8572	16.452,12
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI	128.842,00	170%	219.031	3,4286	63.883,50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**96.763,10**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		96.763,10	4.838,15
TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS	DIA	0,5		76,00	38,00
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,5		1.314,00	657,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**5.533,15**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	233.264,56	**233.265,00**

DESM CIELO FALSO — **Unidad: M2** — **ITEM: NP10**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	105.073,00	170%	178.624	23,3334	7.655,29
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.655,29**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		7.655,29	382,76
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,15		1.314,00	197,10
				SUBTOTAL EQUIPO	**579,86**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	8.235,15	**8.235,15**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

INSTALACION CIELO FALSO EXISTENTE — **Unidad: M2** — **ITEM: NP 11**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI	136.428,00	170%	231.927	22,6121	10.256,77
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**10.256,77**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		10.256,77	512,83
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		1.314,00	131,40
CRUCETA ANDAMIO	DIA	0,1		120,00	12,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**656,23**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	10.913,00	**10.913,00**

INSTALACION LAMINA CIELO FALSO ICOPOR POLIESTIRENO — **Unidad: M2** — **ITEM: NP 12**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AGUA	LTS	0,013		36,00	0,46
LAM.ICOPOR 5CM	UND	1	0	26.942,00	26.942,00
VINILO TIPO 1	GLN	0,03		63.323,00	1.899,69
RODILLO FELPA	UND	0,01		11.720,00	117,20
BROCHA CERDA MONA 4	UND	0,01		14.337,00	143,37
				SUBTOTAL MATERIALES	**29.102,72**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	52.536,00	170%	89.311	17,8622	5.000,00
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	128.842,00	170%	219.031	114,2854	1.916,52
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**6.916,52**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		6.916,52	345,82
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		1.314,00	131,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**477,22**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	36.496,46	**36.496,00**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6 — **Unidad: ML** — **ITEM: NP 13**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN	UND	0,006		102.632,00	615,79
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL	UND	0,006		51.614,00	309,68
TUBO SAN 6" PVC"	ML	1		41.267,00	41.267,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**42.192,47**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.	185.656,00	170%	315.615	26,6666	11.835,59
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**11.835,59**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		11.835,59	591,77
				SUBTOTAL EQUIPO	**591,77**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
				COSTO DIRECTO 54.619,83	**54.620,00**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO — **Unidad: M2** — **ITEM: NP14**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ALAMBRE GALVANIZADO # 10	KLS	0,05		6.332,00	316,60
ESTUCO PLASTICO PASTA	KLS	0,1		4.868,00	486,80
ANGULO 29x29x2440MM C.26	UND	0,1		3.585,00	358,50
MASILLA PANEL-ESTUCO	KLS	1		1.502,00	1.502,00
TORN AUTOPE 6 x 1	UND	20		136,00	2.720,00
PERFIL D OMEGA 60 244-C26	UND	0,8		12.164,00	9.731,20
PUNTILLA .1/2 CC	LBS	0,8		3.704,00	2.963,20
TORN P/LAM .3/4x 8	UND	20		67,00	1.340,00
CINTA MALLA F VIDRIO 60MM	UND	0,015		12.844,00	192,66
PASTA MASTIQUE(PANEL-YESO)	GLN	0,05		11.828,00	591,40
PARAL 39 GUIA L.GALV 2.44M	UND	0,2		15.295,00	3.059,00
CHAZO EXPANDIBLE 3/8"	UND	0,1		596,00	59,60
PLACA BOARD 8MM	UND	0,335	5	85.339,00	30.017,99
MASILLA JUNTA INVIS.BOARD	CUN	0,02		208.965,00	4.179,30
VINILO TIPO 2	GLN	0,11		30.323,00	3.335,53
				SUBTOTAL MATERIALES	**60.853,78**

MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
MANO OBRA PANELERIA 1 OFICIAL-1AYUDANTE	121.256,00	170%	206.135	20,0000	10.306,75
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	128.842,00	170%	219.031	79,9998	2.737,89
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**13.044,64**

EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		13.044,64	652,23
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,2		1.314,00	262,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**915,03**

OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	74.813,45	**74.813,00**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"					Unidad: UND ITEM: INP 15
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN	UND	0,006	0	102.632,00	615,79
CODO SAN PVC 6 x90 CxC	UND	1		116.900,00	116.900,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**117.515,79**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	52.536,00	170%	89.311,00	6,0000	14.885,16
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**14.885,16**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		14.885,16	744,25
				SUBTOTAL EQUIPO	**744,25**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 133.145,03	**133.145,03**

DESM.CUBIERTA EN POLICARBONATO					Unidad: M2 ITEM: NP16
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	173.793,00	170%	295.448	22,8572	12.925,81
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**12.925,81**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		12.925,81	646,29
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		3.314,00	331,40
TABLONES DE 3 MTS	DIA	0,1		639,00	63,90
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.041,59**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO 13.967,40	**13.967,00**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Suministro e Instalacion Teja Policarbonato Ajonit Cristal No. 10 — **Unidad: M2** — **ITEM: NP17**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TORN.LAMINA AUT.1/2-14X3/4 CABEZA HEXAGONAL	UND	2,25		710,00	1.597,50
SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0,08	0	35.723,00	2.857,84
TORN P/LAM AUT.1/4-14X7/8	UND	1,5		948,00	1.422,00
Teja Policarbonato Ajonit Cristal No. 10	UND	1		72.411,00	72.411,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**78.288,34**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	121.256,00	170%	206.135	13,4325	15.345,98
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**15.345,98**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		15.345,98	767,29
TABLONES DE 3 MTS	DIA	4		639,00	2.556,00
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,2		3.314,00	662,80
CRUCETA ANDAMIO	DIA	0,2		120,00	24,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**4.010,09**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	97.644,41	**97.644,00**

RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2 1,5 MM — **Unidad: ML** — **ITEM: NP18**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DISOLVENTE	GLN	0,1		53.765,00	5.376,50
PINTURA ESMALTE	GLN	0,1	0	61.914,00	6.191,40
ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,05		51.973,00	2.598,65
SOLDADURA 6011 x 1/8"	KLS	0,05		14.332,00	716,60
TUBO ESTRUC. 1 1/2 1,5MM	UND	0,17	5	115.959,00	20.698,68
				SUBTOTAL MATERIALES	**35.581,83**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	105.073,00	170%	178.624,00	18,1234	9.855,98
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI	128.842,00	170%	219.031	41,3266	5.300,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**15.155,98**
EQUIPO					
PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0,03		31.064,00	931,92
SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0,05		56.871,00	2.843,55
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		15.155,98	757,79
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0,06		57.947,00	3.476,82
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,4		3.314,00	1.325,60
				SUBTOTAL EQUIPO	**9.335,68**
OTROS					
				SUBTOTAL TRANSPORTE	-
			COSTO DIRECTO	60.073,49	**60.073,00**

ING RICHARD OSWALDO ROSERO

9.13. PREACTA DE OBRA NO.1

Carrera 12 # 21 – 94 B/ El Dean
Cel: 3106362578
Correo Electrónico

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	1,1	UNIDAD:	m2	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	2.132,19

DESCRIPCIÓN: Recorrido de cubierta en teja de fibrocemento para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	ÁREA ÚTIL	U	TOTAL
1	GALERIA CALLE 13					
2	Teja de fibrocemento #6			1,48	350,00	518,00
3	GALERIA LAS PALMAS					
4	Teja de fibrocemento #6			1,48	70,00	103,60
5	Área aferente canal 1	32,00	3,02		1,00	96,64
6	Área aferente canal 2	32,00	3,02		1,00	96,64
7	Área aferente canal 3	30,00	1,51		1,00	45,30
8	GALERIA BELLOHORIZONTE					
9	Teja de fibrocemento #6			1,48	320,00	473,60
10	Teja de fibrocemento #8			2,01	50,00	100,50
11	Área aferente canal 1	47,00	3,02		1,00	141,94
12	Área aferente canal 2	20,00	3,02		1,00	60,40
13	Área aferente canal 3	16,00	3,02		1,00	48,32
14	Área aferente canal 4	64,00	3,02		1,00	193,28
15	PUEBLITO PATOJO					
16	seccion 1	2,70	2,50		1,00	6,75
17		1,50	3,00		1,00	4,50
18		2,30	1,70		1,00	3,91
19	seccion 2	3,50	2,60		1,00	9,10
20		2,40	1,80		1,00	4,32
21		2,00	1,70		1,00	3,40
22		2,30	2,00		1,00	4,60
23		4,00	1,20		1,00	4,80
24	seccion 3	3,50	1,20		1,00	4,20
25		3,20	1,00		1,00	3,20
26		3,40	1,50		1,00	5,10
27		4,20	1,80		1,00	7,56
28	seccion 4	3,40	4,20		1,00	14,28
29		2,50	3,40		1,00	8,50
30	CASA DE LA JUSTICIA					
31	Teja de fibrocemento #6			1,48	40,00	59,20
32	Teja de fibrocemento #8			2,01	55,00	110,55
33						
34						
35						
36						
	TOTAL					**2.132,19**

ELABORÓ: INGº RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

50

	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
		Contrato Nº	20231800031077
		Acta Parcial #	1
		Código	
		Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL	CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM Nº	1,3	UNIDAD:	m2	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	251,32

DESCRIPCIÓN: Recorrido de cubierta en teja de barro para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	ÁREA ÚTIL	U	TOTAL
1	PUEBLITO PATOJO					
2	seccion 1	2,70	2,50		1,00	6,75
3		1,50	3,00		1,00	4,50
4		2,30	1,70		1,00	3,91
5	seccion 2	3,50	2,60		1,00	9,10
6		2,40	1,80		1,00	4,32
7		2,00	1,70		1,00	3,40
8		2,30	2,00		1,00	4,60
9		4,00	1,20		1,00	4,80
10	seccion 3	3,50	1,20		1,00	4,20
11		3,20	1,00		1,00	3,20
12		3,40	1,50		1,00	5,10
13		4,20	1,80		1,00	7,56
14	seccion 4	3,40	4,20		1,00	14,28
15		2,50	3,40		1,00	8,50
16	CASA DE LA JUSTICIA					
17				1,48	45,00	66,60
18				2,01	50,00	100,50
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
	TOTAL					251,32

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

50

	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
		Contrato N°	20231800031077
		Acta Parcial #	1
		Código	
		Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL	CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	2,1	UNIDAD:	Und	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	212,00

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	GALERIA CALLE 13					
2	Teja de fibrocemento #6				122,00	122,00
3						
4	GALERIA LAS PALMAS					
5	Teja de fibrocemento #6				15,00	15,00
6						
7	GALERIA BELLOHORIZONTE					
8	Teja de fibrocemento #6				63,00	63,00
9						0,00
10						0,00
11	PUEBLITO PATOJO					0,00
12	Teja de fibrocemento #6				8,00	8,00
13						0,00
14						0,00
15	CASA DE LA JUSTICIA					0,00
16	Teja de fibrocemento #6				4,00	4,00
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					212,00

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL


CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	2,4	UNIDAD:	Und	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	4,00

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de teja claraboya en perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye vidrio y desmonte de tejas existentes

LOCALIZACIÓN

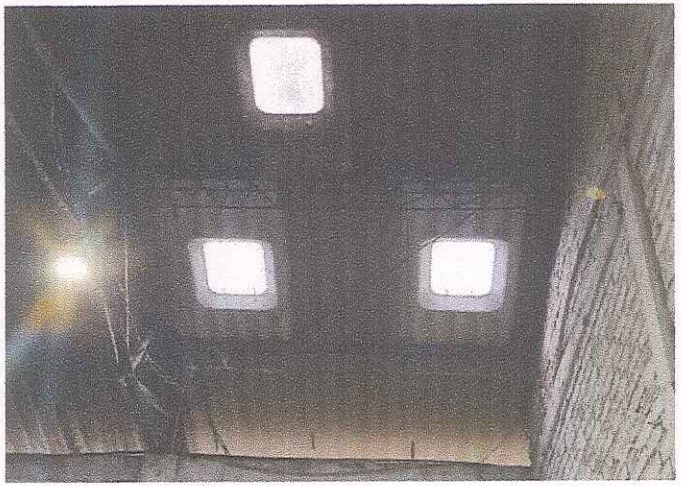

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	GALERIA BELLOHORIZONTE					
2	Teja Claraboya #6				4,00	4,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**4,00**

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL


CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	3,3	UNIDAD:	m	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	241,00

DESCRIPCIÓN: Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m

LOCALIZACIÓN

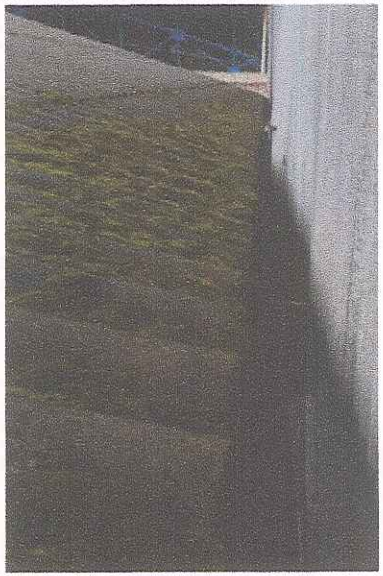

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	GALERIA LAS PALMAS					
2	Canal 1	32,00				32,00
3	Canal 2	32,00				32,00
4	Canal 3	30,00				30,00
5						
6						
7	GALERIA BELLOHORIZONTE					
8	Canal 1	47,00				47,00
9	Canal 2	20,00				20,00
10	Canal 3	16,00				16,00
11	Canal 4	64,00				64,00
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					241,00

EL ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

FD

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)		30/11/2023
Contrato N°		20231800031077
Acta Parcial #		1
Código		
Versión		

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	6,1	UNIDAD:	m3	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA		5,76

DESCRIPCIÓN: Disposición de materiales en sitio autorizado

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	UNIDAD	F.E	ESPESOR	TOTAL
1								
2								
3	GALERIA LAS PALMAS							
4	Canal 1	32,00	0,20	0,05		1,20		0,38
5	Canal 2	32,00	0,20	0,05		1,20		0,38
6	Canal 3	30,00	0,20	0,05		1,20		0,36
7								
8								
9	GALERIA BELLOHORIZONTE							
10	Canal 1	47,00	0,20	0,05		1,20		0,56
11	Canal 2	20,00	0,20	0,05		1,20		0,24
12	Canal 3	16,00	0,20	0,05		1,20		0,19
13	Canal 4	64,00	0,20	0,05		1,20		0,77
14								
15	RESIDUOS DE TEJAS #6	1,83	0,92		160,00	1,35	0,01	2,00
16								
17	RESIDUOS DE TEJAS #8	2,44	0,92		52,00	1,35	0,01	0,87
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
	TOTAL							5,76

ELABORÓ: ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	7,1	UNIDAD:	m3-km	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	23,04

DESCRIPCIÓN: Transporte de material proveniente de excavación, explanación, canales y escombros. Incluye Cargue a mano

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3	KM	H	U	TOTAL
1						
2						
3	GALERIA LAS PALMAS					
4	Canal 1	0,38	4,00			1,54
5	Canal 2	0,38	4,00			1,54
6	Canal 3	0,36	4,00			1,44
7						
8						
9	GALERIA BELLOHORIZONTE					
10	Canal 1	0,56	4,00			2,26
11	Canal 2	0,24	4,00			0,96
12	Canal 3	0,19	4,00			0,77
13	Canal 4	0,77	4,00			3,07
14						
15						
16	RESIDUOS DE TEJAS #6	2,00	4,00			8,00
17						
18	RESIDUOS DE TEJAS #8	0,87	4,00			3,47
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					23,04

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

50

	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
		Contrato N°	20231800031077
		Acta Parcial #	1
		Código	
		Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL	CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 1	UNIDAD:	Und	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	7,00

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de teja de zinc (No.6) área 2.438*0.8 cal 35, incluye desmonte de tejas existentes

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	GALERIA LAS PALMAS					
2	Teja de Zinc #6				7,00	7,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					7,00

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 2	UNIDAD:	m2	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	19,14

DESCRIPCIÓN: Recorrido de cubierta en teja de zinc, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	ÁREA ÚTIL	U	TOTAL
1	GALERIA LAS PALMAS					
2	Teja de Zinc #6	2,44	0,79	1,91	10,00	19,14
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**19,14**

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 3	UNIDAD:	Und	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	78,00

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.8) área útil 2.01m2, incluye desmonte de tejas existentes

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	GALERIA BELLOHORIZONTE					
2	Teja de fibrocemento #8				52,00	52,00
3						
4	CASA DE LA JUSTICIA					0,00
5	Teja de fibrocemento #8				26,00	26,00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**78,00**

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

60

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL	CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 4	UNIDAD:	m	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	5,00

DESCRIPCIÓN: Instalación Y reparacion de canal lamina, incluye el desmonte de canal existente.

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	GALERIA BELLOHORIZONTE					
2	Canal Cal. 18	5,00				5,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					5,00

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

50

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 5	UNIDAD:	m	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	10,05

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	GALERIA BELLOHORIZONTE					
2	Tubería de 3"	10,05				10,05
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**10,05**

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
		Contrato N°	20231800031077
		Acta Parcial #	1
		Código	
		Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL	CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 6	UNIDAD:	m	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	13,75

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	GALERIA BELLOHORIZONTE					
2	Tubería de 4"	13,75				13,75
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					13,75

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

50

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 7	UNIDAD:	Und	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	6,00

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INTALACION DE CABALLETE FIJO P7

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	GALERIA BELLOHORIZONTE					
2	Caballete en Fibrocemento				3,00	3,00
3						
4	GALERIA CALLE 13					
5	Caballete en Fibrocemento				3,00	3,00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**6,00**

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL


CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 8	UNIDAD:	ML	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	47,68

DESCRIPCIÓN: PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -2MM C.14

LOCALIZACIÓN

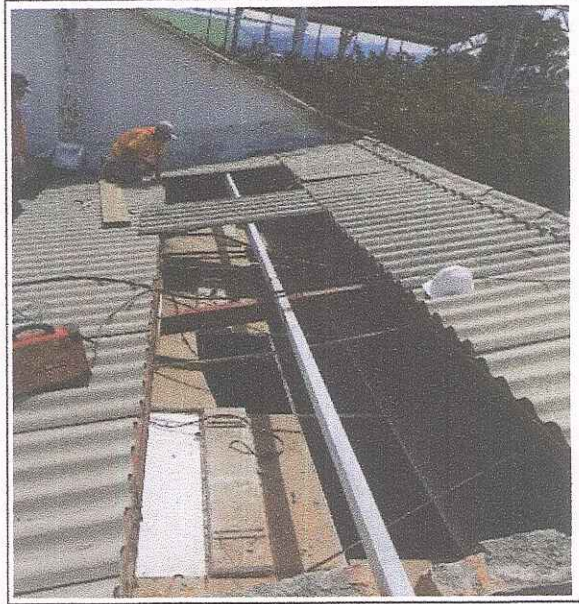

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	CASA DE LA JUSTICIA					
2	TECHO	11,92			4,00	47,68
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					47,68

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 9	UNIDAD:	ML	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	9,68

DESCRIPCIÓN: CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	ÁREA ÚTIL	U	TOTAL
1	CASA DE LA JUSTICIA					
2	CANAL	9,68			1,00	9,68
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**9,68**

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

50

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL


CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 10	UNIDAD:	M2	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	34,32

DESCRIPCIÓN: DESM CIELO FALSO

LOCALIZACIÓN

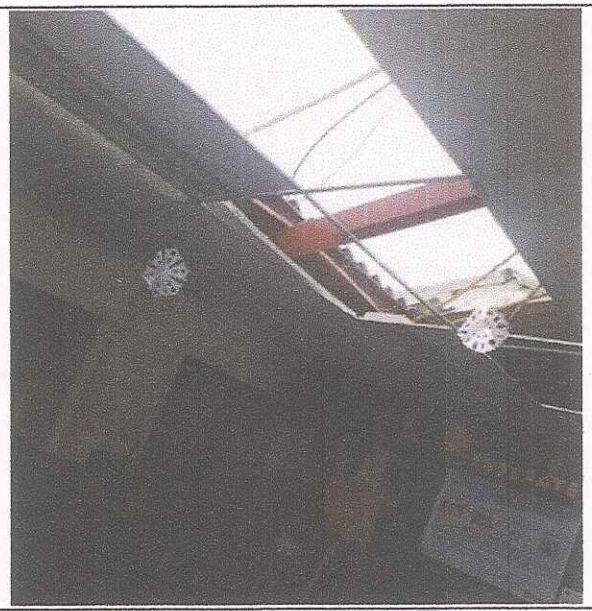

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	CASA DE LA JUSTICIA					
2	CIELO FALSO	1,20	0,60		20,00	14,40
3		0,60	0,60		1,00	0,36
4		1,20	0,60		26,00	18,72
5		0,45	0,47		4,00	0,84
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					34,32

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

60

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 11	UNIDAD:	M2	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	14,76

DESCRIPCIÓN: INSTALACION CIELO FALSO EXISTENTE

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	CASA DE LA JUSTICIA					
2	CIELO FALSO	1,20	0,60		20,00	14,40
3		0,60	0,60		1,00	0,36
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**14,76**

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

50

	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
		Contrato N°	20231800031077
		Acta Parcial #	1
		Código	
		Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL	**CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE**	**OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**ITEM N°**	**NP 12**	**UNIDAD:**	**M2**	**CANTIDAD PRESUPUESTO**		**CANTIDAD EJECUTADA**	19,56

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CIELO FALSO ICOPOR POLIESTIRENO

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	CASA DE LA JUSTICIA					
2	CIELO	1,20	0,60		26,00	18,72
3		0,45	0,47		4,00	0,84
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**19,56**

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 13	UNIDAD:	ML	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	2,44

DESCRIPCIÓN: BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	CASA DE LA JUSTICIA					
2	Bajante	2,44			1,00	2,44
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					2,44

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 14	UNIDAD:	M2	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	3,81

DESCRIPCIÓN: C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	ÁREA ÚTIL	U	TOTAL
1	CASA DE LA JUSTICIA					
2	Teja de Zinc #6	1,30	2,44		1,00	3,17
3		0,40	0,40		4,00	0,64
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**3,81**

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO


MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
	Contrato N°	20231800031077
	Acta Parcial #	1
	Código	
	Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL	**CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE**	**OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 15	UNIDAD:	UND	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	4,00

DESCRIPCIÓN: CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"

LOCALIZACIÓN

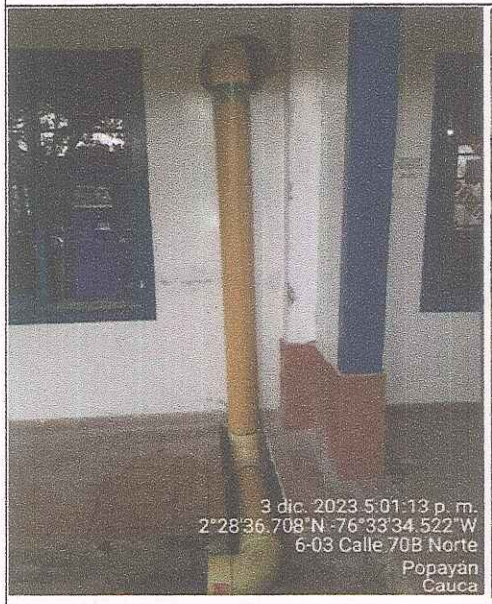



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	CASA DE LA JUSTICIA					
2	bajante				4,00	4,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					4,00

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

60

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 16	UNIDAD:	M2	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	135,73

DESCRIPCIÓN: DESM.CUBIERTA EN POLICARBONATO

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	EMPEDRADO	6,10	22,25		1,00	135,73
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
TOTAL						**135,73**

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

50

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
Contrato N°	20231800031077
Acta Parcial #	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL


CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 17	UNIDAD:	M2	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	135,73

DESCRIPCIÓN: Suministro e Instalacion Teja Policarbonato Ajonit Cristal No. 10

LOCALIZACIÓN

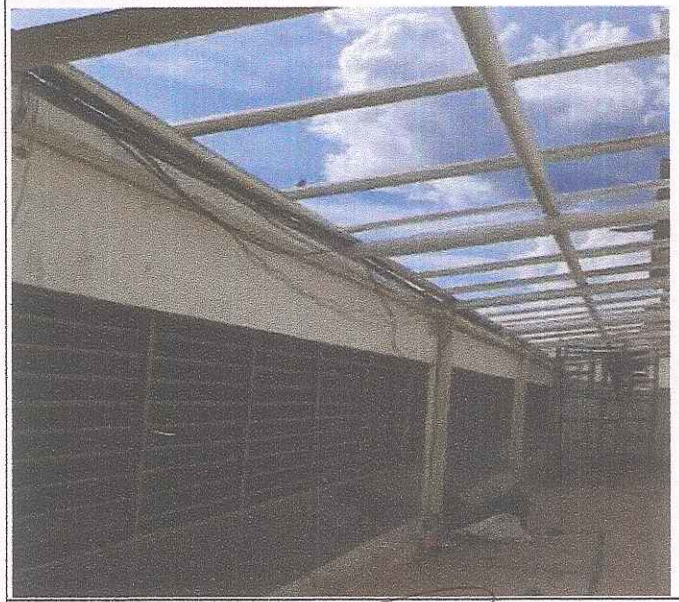

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	EMPEDRADO	6,10	22,25	0,00	1,00	135,73
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
TOTAL						135,73

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

50


	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	Fecha (dd/mm/aa)	30/11/2023
		Contrato N°	20231800031077
		Acta Parcial #	1
		Código	
		Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL	CONTRATISTA : RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE	OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS CUBIERTAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ITEM N°	NP 18	UNIDAD:	ML	CANTIDAD PRESUPUESTO		CANTIDAD EJECUTADA	133,50

DESCRIPCIÓN: TUBO ESTRUCTURAL 1/ 1/2 X 1,5 mm

LOCALIZACIÓN

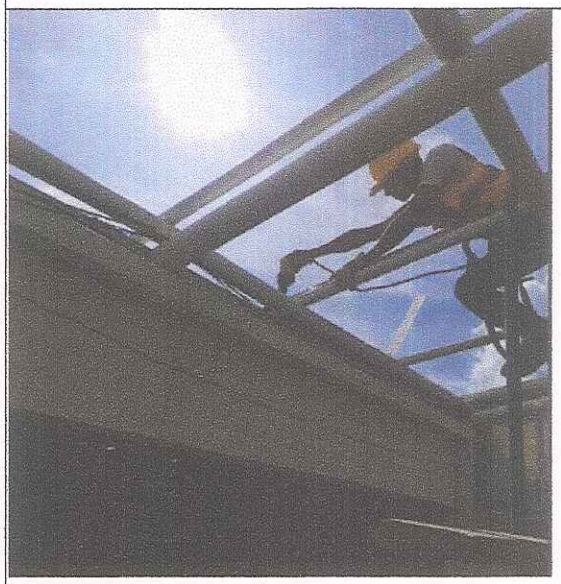

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1	EMPEDRADO					
2		22,25			6,00	133,50
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					133,50

ELABORÓ ING. RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE

APROBÓ ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

50

9.14. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

Carrera 12 # 21 – 94 B/ El Dean
Cel: 3106362578
Correo Electrónico

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061721358
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			RICHARD ROSERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 12 #21-94	TELÉFONO:	8363512
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7900582863		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		268874219

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
SUBTOTALES:			$ 23.200	$ 0	$ 23.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CON	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061721358	ROSERO CERTUCHE RICHARD OSWALDO	INDEPEND		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0	SCCF14-COMFACAUCA	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 353.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061721358
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICHARD ROSERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 12 #21-94	TELÉFONO:	8363912
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7904104285			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	282397921

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
SUBTOTALES:			$ 23.200	$ 0	$ 23.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061721358		ROSERO CERTUCHE RICHARD OSWALDO	A - 200 O MÁS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 1 A E 18 18	POPAYAN-CAUCA	3106362578	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	316048568	9459965110	E	2023/11/16	2023/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	18	$866,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	10549875	BURBANO PAZ AIMER	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF14	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
2	PT	5932613	CALDERA CASTRO YEDICKSON ALEJANDRO	230301	21	$812,000	$130,000	EPS005	21	$812,000	$32,500	CCF14	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
3	CC	1058970403	GOMEZ VELASCO JANER ALBERTO	230301	22	$850,667	$136,200	ESSC18	22	$850,667	$34,100	CCF14	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
4	CC	1061821001	ILES QUINTERO JOHAN SEBASTIAN	230301	6	$232,000	$37,200	EPS005	6	$232,000	$9,300	CCF14	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
5	CC	1061690946	DINO ALEGRIA TITO	230301	2	$77,334	$12,400	ESSC18	2	$77,334	$3,100	CCF14	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
6	CC	1060870723	REBOLLEDO MAJIN GILBER ALONSO	230301	18	$696,000	$111,400	EPSIC3	18	$696,000	$27,900	CCF14	18	$696,000	$27,900	14-11	18	$696,000	$48,500	18	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$2,745,335	$439,600			$2,745,335	$110,000			$2,745,335	$110,000			$2,745,335	$191,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$439,600	$7,900	$0	$447,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$439,600	$7,900	$0	$447,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$191,400	$3,500	$0	$194,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$191,400	$3,500	$0	$194,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$110,000	$2,000	$0	$112,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$110,000	$2,000	$0	$112,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$110,000	$2,100	$0	$112,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$27,900	$500	$0	$28,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$37,200	$700	$0	$37,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$3,100	$100	$0	$3,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$41,800	$800	$0	$42,600
TOTAL				6	$851,000	$15,500	$0	$866,500

2023/12/14 02:45 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061721358		ROSERO CERTUCHE RICHARD OSWALDO	A - 200 O MÁS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 1 A E 18 18	POPAYAN-CAUCA	3106362578	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	316059597	9459612062	E	2023/12/15	2023/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,520,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	PT	5932613	CALDERA CASTRO YEDICKSON ALEJANDRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1058970403	GOMEZ VELASCO JANER ALBERTO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1061821001	ILES QUINTERO JOHAN SEBASTIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	75083872	PEREZ OLGUIN NELSON	230201	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF14	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
5	CC	1060870723	REBOLLEDO MAJIN GILBER ALONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$4,910,667	$785,800			$4,910,667	$196,500			$4,910,667	$196,500			$4,910,667	$342,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$785,800	$0	$0	$785,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$0	$0	$742,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$43,400	$0	$0	$43,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$342,100	$0	$0	$342,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$342,100	$0	$0	$342,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$196,500	$0	$0	$196,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	$196,500	$0	$0	$196,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$196,500	$0	$0	$196,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$103,700	$0	$0	$103,700
TOTAL				5	$1,520,900	$0	$0	$1,520,900

2023/12/14 02:44 AM
