CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 12
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 12
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 14

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**23001012 H3 DE 2023**
Nombre del Contratista:	**G&M CORPORATION S.A.S**
Periodo informe:	**14 DE SEPTIEMBRE AL 14 NOVIEMBRE DE 2023**
Nombre de Supervisor:	**ETIENNE H. RODRIGUEZ VELEZ**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**SOPORTE TECNICO**

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL MÓVIL DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

1. Mantenimiento preventivo, lavado general de la torre portátil y su sistema de elevación.








2. Mantenimiento preventivo, aplicar desoxidante a toda la superficie de la torre portátil.



3. Mantenimiento preventivo, aplicar anticorrosivo tipo marino a toda la superficie de la torre. portátil.

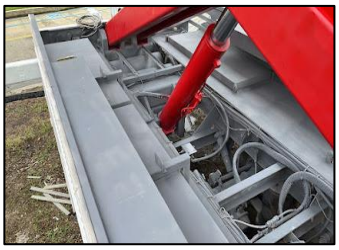

4. Mantenimiento preventivo, aplicar pintura epóxica tipo marino a toda la superficie de la torre portátil.













5. Mantenimiento preventivo, aplicar impermeabilizante, tela y pintura impermeabilizantes tipo marino.









6. Mantenimiento preventivo, aplicar silicona tipo industrial a la ventanería de la torre portátil.




7. Mantenimiento preventivo, cambio cielo falso torre portátil.










8. Mantenimiento preventivo, cambio iluminación interior.







9. Mantenimiento preventivo, organización cableado interno RF y alimentación.









10. Mantenimiento preventivo, cambio de cableado interior de RF de antenas.





11. Mantenimiento preve antenas.

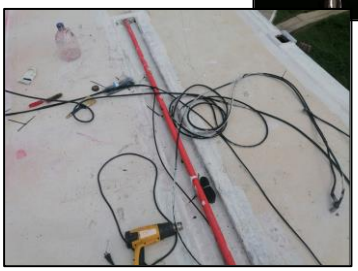

12. Mantenimiento de antenas.










13. Suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado tipo SLIM, de 24000 BTU.













14. Mantenimiento preventivo sistema de elevación, cambio del hidráulico, engrase de los cilindros, mantenimiento de los motores.












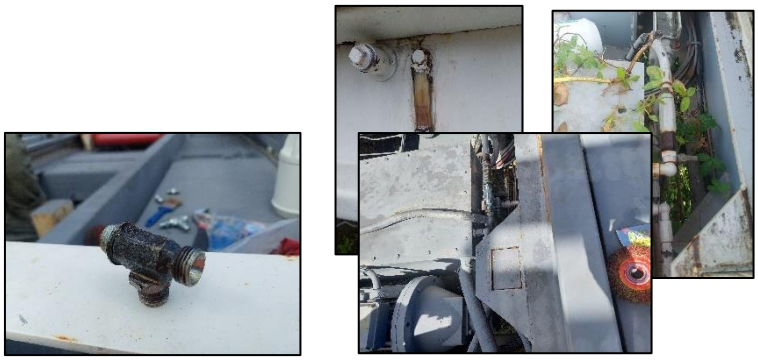15. Mantenimiento preventivo sistema de consolas de comunicaciones VHF.





16. Mantenimiento preventivo sistema de estación meteorológica local.





3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 18 OCTUBRE AL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE AÑO 2023		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Mantenimiento preventivo, lavado general de la torre portátil y su sistema de elevación.	**1. REALIZADO.**	**1. TORRE MOVIL SKPV**
2. Mantenimiento preventivo, aplicar desoxidante a toda la superficie de la torre portátil.	**2. REALIZADO.**	**2. TORRE MOVIL SKPV**
3. Mantenimiento preventivo, aplicar anticorrosivo tipo marino a toda la superficie de la torre. portátil.	**3. REALIZADO.**	**3. TORRE MOVIL SKPV**
4. Mantenimiento preventivo, aplicar pintura epóxica tipo marino a toda la superficie de la torre portátil.	**4. REALIZADO.**	**4. TORRE MOVIL SKPV**
5. Mantenimiento preventivo, aplicar impermeabilizante, tela y pintura impermeabilizantes tipo marino.	**5. REALIZADO.**	**5. TORRE MOVIL SKPV**
6. Mantenimiento preventivo, aplicar silicona tipo industrial a la ventanería de la torre portátil.	**6. REALIZADO.**	**6. TORRE MOVIL SKPV**
7. Mantenimiento preventivo, cambio cielo falso torre portátil.	**7. REALIZADO.**	**7. TORRE MOVIL SKPV**

8. Mantenimiento preventivo, cambio iluminación interior. **9. Mantenimiento preventivo, organización cableado interno RF y alimentación.** **10. Mantenimiento preventivo, cambio de cableado interior de RF de antenas.** **11. Mantenimiento preventivo, cambio de cableado exterior de RF de antenas.** **12. Mantenimiento de antenas.** **13. Suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado tipo SLIM, de 24000 BTU.** **14. Mantenimiento preventivo sistema de elevación, cambio del hidráulico, engrase de los cilindros, mantenimiento de los motores.** **15. Mantenimiento preventivo sistema de consolas de comunicaciones VHF.** **16. Mantenimiento preventivo sistema de estación meteorológica local.**	**8. REALIZADO.** **9. REALIZADO.** **10. REALIZADO.** **11. REALIZADO.** **12. REALIZADO.** **13. REALIZADO.** **14. REALIZADO.** **15. REALIZADO.** **16. REALIZADO.**	**8. TORRE MOVIL SKPV** **9. TORRE MOVIL SKPV** **10. TORRE MOVIL SKPV** **11. TORRE MOVIL SKPV** **12. TORRE MOVIL SKPV** **13. TORRE MOVIL SKPV** **14. TORRE MOVIL SKPV** **15. TORRE MOVIL SKPV** **16. TORRE MOVIL SKPV**
		1.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Todas las obligaciones fueron cumplidas

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
1. Mantenimiento preventivo, lavado general de la torre portátil y su sistema de elevación.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	SI X	NO
2. Mantenimiento preventivo, aplicar desoxidante a toda la superficie de la torre portátil.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
3. Mantenimiento preventivo, aplicar anticorrosivo tipo marino a toda la superficie de la torre. portátil	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
4. Mantenimiento preventivo, aplicar pintura epóxica tipo marino a toda la superficie de la torre portátil.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
5. Mantenimiento preventivo, aplicar impermeabilizante, tela y pintura impermeabilizantes tipo marino.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
6. Mantenimiento preventivo, aplicar silicona tipo industrial a la ventanería de la torre portátil.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
7. Mantenimiento preventivo, cambio cielo falso torre portátil	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
8. Mantenimiento preventivo, cambio iluminación interior.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	

9. Mantenimiento preventivo, organización cableado interno RF y alimentación.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
10. Mantenimiento preventivo, cambio de cableado interior de RF de antenas.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
11. Mantenimiento preventivo, cambio de cableado exterior de RF de antenas.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
12. Mantenimiento de antenas.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
13. Suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado tipo SLIM, de 24000 BTU.	2	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
14. Mantenimiento preventivo sistema de elevación, cambio del hidráulico, engrase de los cilindros, mantenimiento de los motores.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
15. Mantenimiento preventivo sistema de consolas de comunicaciones VHF.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	
16. Mantenimiento preventivo sistema de estación meteorológica local.	1	NOVIEMBRE 14 DE 2023	X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO HAY

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO HAY

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI
2	Tipo de riesgo	Riesgos Financieros (RF):
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	Demora en la entrega del servicio por una inadecuada evaluación del sitio de entrega.
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	Seguimiento al cronograma durante la ejecución del contrato
5	¿Fue oportuna la mitigación?	SI
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		X

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Este será el primer y último pago. (100%)

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

100 %

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ETIENNE H. RODRIGUEZ VELEZ
TÉCNICO AERONÁUTICO ATSEP VI
SUPERVISOR
