ACTA DE PAGO PARCIAL CANCHA DE LA ESPERANZA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META														
1	PRELIMINARES													
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	13,799.17	$ 5,457.00	$ 75,302,071.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12,675.94	$ 69,172,605.00	12,675.94	$ 69,172,605.00	91.86%
	SUBTOTAL				$ 75,302,071.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 69,172,605.00		$ 69,172,605.00	
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES													
2.1	DEMOLICION GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	145.62	$ 215,958.00	$ 31,447,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	142.00	$ 30,666,036.00	142.00	$ 30,666,036.00	97.51%
2.2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	285.18	$ 14,700.00	$ 4,192,146.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	51.75	$ 760,725.00	51.75	$ 760,725.00	18.15%
2.3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	977.76	$ 33,199.00	$ 32,460,654.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	176.76	$ 5,868,255.00	176.76	$ 5,868,255.00	18.08%
	SUBTOTAL				$ 68,100,604.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 37,295,016.00		$ 37,295,016.00	
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	6,943.97	$ 38,640.00	$ 268,315,001.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6,936.71	$ 268,034,474.00	6,936.71	$ 268,034,474.00	99.90%
3.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	662.84	$ 76,585.00	$ 50,763,601.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	75.79	$ 5,804,377.00	75.79	$ 5,804,377.00	11.43%
3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL. CON EQUIPO LIVIANO.	M3	406.71	$ 63,830.00	$ 25,960,299.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	403.92	$ 25,782,214.00	403.92	$ 25,782,214.00	99.31%
	SUBTOTAL				$ 345,038,901.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 299,621,065.00		$ 299,621,065.00	
4	CIMENTACION													
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	19.79	$ 643,591.00	$ 12,736,666.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.74	$ 9,486,531.00	14.74	$ 9,486,531.00	74.48%
4.2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	47.84	$ 2,338,652.00	$ 111,881,112.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	106.30	$ 939,801.00	$ 99,900,846.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	43.21	$ 1,012,044.00	$ 43,730,421.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	62.30	$ 651,075.00	$ 40,561,973.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	31,903.76	$ 8,544.00	$ 272,585,725.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	136.49	$ 824,636.00	$ 112,554,568.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				$ 693,951,311.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 9,486,531.00		$ 9,486,531.00	
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO													

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032

ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023	a	30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:			MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:			$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°			001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:			CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:			consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:			N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°			N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:			13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	878.02	$ 128,878.00	$ 113,157,462.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA.	M3	205.79	$ 677,128.00	$ 139,346,171.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6.85	$ 921,222.00	$ 6,310,371.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 258,814,004.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
6	**ESTRUCTURAS EN ACERO**													
6.1	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	311,037.58	$ 25,899.00	$ 8,055,562,284.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4,427.06	$ 9,991.00	$ 44,230,756.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 8,099,793,040.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
7	**CUBIERTA Y FACHADA**													
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``	M2	1,577.32	$ 255,278.00	$ 402,655,095.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte.)	M2	636.00	$ 1,064,060.00	$ 676,742,160.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	90.00	$ 136,546.00	$ 12,289,140.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 1,091,686,395.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
8	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**													
8.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	1,432.46	$ 53,902.00	$ 77,212,459.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	16.35	$ 1,343,430.00	$ 21,965,081.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	22.23	$ 1,382,134.00	$ 30,724,839.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10.59	$ 1,012,044.00	$ 10,717,546.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.07	$ 1,811,652.00	$ 3,750,120.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2.73	$ 1,996,272.00	$ 5,449,823.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	13.63	$ 142,694.00	$ 1,944,919.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,604.48	$ 26,628.00	$ 69,352,093.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	482.96	$ 36,215.00	$ 17,490,396.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2,677.50054293333	$ 8,544.00	$ 22,876,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 261,483,841.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													
9.1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	48.00	$ 1,416,495.00	$ 67,991,760.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	3.00	$ 903,966.00	$ 2,711,898.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	19.00	$ 957,101.00	$ 18,184,919.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	36.00	$ 506,457.00	$ 18,232,452.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	24.00	$ 162,556.00	$ 3,901,344.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	3.00	$ 329,093.00	$ 987,279.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	16.59	$ 156,736.00	$ 2,600,250.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	36.00	$ 388,578.00	$ 13,988,808.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 128,598,710.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
10	**CARPINTERIA METALICA**													
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UND	4.00	$ 530,305.00	$ 2,121,220.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	145.73	$ 722,824.00	$ 105,337,142.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	61.06	$ 324,441.00	$ 19,810,367.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	281.56	$ 311,411.00	$ 87,680,881.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	230.63	$ 1,597,087.00	$ 368,336,175.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	101.37	$ 586,760.00	$ 59,479,861.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 642,765,646.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
11	**OBRAS EXTERIORES**													
11.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	184.43	$ 63,830.00	$ 11,772,167.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	172.23	$ 10,993,441.00	172.23	$ 10,993,441.00	93.39%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
11.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	287.05	$ 132,727.00	$ 38,099,285.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.3	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 4.0 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	91.86	$ 1,096,869.00	$ 100,758,386.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.4	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	268.20	$ 4,716.00	$ 1,264,831.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.5	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 20MM 750GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	531.00	$ 98,128.00	$ 52,105,968.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.6	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	114.22	$ 131,566.00	$ 15,027,469.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 219,028,106.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 10,993,441.00**		**$ 10,993,441.00**	
12	**PISOS Y ENCAPES**													
12.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	1,284.69	$ 48,283.00	$ 62,028,687.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
12.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	1,284.69	$ 204,130.00	$ 262,243,770.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
12.3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	971.55	$ 52,732.00	$ 51,231,775.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
12.4	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	429.52	$ 136,174.00	$ 58,489,456.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 433,993,688.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
13	**ACABADOS**													
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2,172.26	$ 12,171.00	$ 26,438,576.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	482.96	$ 13,992.00	$ 6,757,576.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.3	ESTUCO PLASTICO	M2	2,172.26	$ 17,849.00	$ 38,772,669.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
13.4	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA	M2	969.03	$ 131,515.00	$ 127,441,980.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 199,410,801.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
14	**CANCHA CESPED SINTETICO**													
	CIMENTACION													
14.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	104.46	$ 76,585.00	$ 8,000,069.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1,794.00	$ 38,650.00	$ 69,338,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1,773.78	$ 68,556,597.00	1,773.78	$ 68,556,597.00	98.87%
14.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1,794.00	$ 132,727.00	$ 238,112,238.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	CESPED SINTETICO													
14.4	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	380.00	$ 135,332.00	$ 51,426,160.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.5	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8,970.00	$ 12,776.00	$ 114,600,720.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7,920.00	$ 101,185,920.00	7,920.00	$ 101,185,920.00	88.29%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023	a	30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.		
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
14.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN MICRONIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN GRAVA TAM 3/4" PARA CONFORMACIÓN SOPORTE SUPERFICIE DEPORTIVA	M3	1,794.00	$ 310,674.00	$ 557,349,156.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYETAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UND	5.00	$ 722,490.00	$ 3,612,450.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.8	SUMINISTRO, E INST. DE GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) BICOLOR, ALTURA DE FIBRA 50 MM, PROTECCIÓN UV, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 300 MICRONES, DTEX MAYOR O IGUAL A 14000, CON UNA CANTIDAD DE PUNTADAS SUPERIOR O IGUAL A 7500 POR M², BACKING DOBLE O MAYOR CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO O LÁTEX. INCLUYE: RELLENO DE ARENA SILICE FINA, CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15KG/M2 CON UNA GRADACION ENTRE 0.2mm Y 1.0mm, Y CAUCHO GRANULADO (SRB RECICLADO DE LLANTAS) DE GRANULOMETRIA FINA CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15 KG/M2. LA GRAMA SINTETICA SERA AVALADA POR PREFERRED FIFA,	M2	8,970.00	$ 326,818.00	$ 2,931,557,460.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.9	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	386.00	$ 131,566.00	$ 50,784,476.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.10	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18.72	$ 1,012,044.00	$ 18,945,464.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.11	POSTE METALICO DE 12X510 KG	UND	60.00	$ 744,544.00	$ 44,672,640.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.12	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	1,404.00	$ 48,913.00	$ 68,673,852.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS PROFESIONALES DE FÚTBOL EN ALUMINIO (INCLUYE MALLAS Y BANDERINES)	UN	1.00	$ 39,280,853.00	$ 39,280,853.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 4,196,353,638.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 169,742,517.00**		**$ 169,742,517.00**	
15	**TANQUE SUBTERRANEO Y CUARTO DE MAQUINAS**													
15.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	162.56	$ 5,457.00	$ 887,090.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	587.94	$ 38,640.00	$ 22,718,002.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	9.09	$ 643,591.00	$ 5,850,242.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
15.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	65.03	$ 1,082,950.00	$ 70,424,239.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	56.25	$ 64,244.00	$ 3,613,725.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.6	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA MUROS, ELAB. OBRA, ELEVACIONES h<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)	M3	92.04	$ 1,465,859.00	$ 134,917,662.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.7	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.40 M EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	153.56	$ 301,244.00	$ 46,259,029.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.8	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	14,600.92	$ 8,544.00	$ 124,750,260.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	CUARTO DE MAQUINAS													
15.9	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	23.69	$ 53,902.00	$ 1,276,938.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.10	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23.69	$ 26,628.00	$ 630,817.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	23.69	$ 36,215.00	$ 857,933.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.12	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.34	$ 1,382,134.00	$ 469,926.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.13	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.41	$ 1,343,430.00	$ 550,806.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	113.28	$ 8,544.00	$ 967,864.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	7.65	$ 722,824.00	$ 5,529,604.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	13.20	$ 228,360.00	$ 3,014,352.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.17	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	23.69	$ 12,171.00	$ 288,331.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
15.18	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	23.69	$ 13,992.00	$ 331,470.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 423,338,290.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
16	**REDES ELECTRICAS**													
16.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	50.00	$ 181,398.00	$ 9,069,900.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.2	TRANSFORMADOR TIPO SECO PEDESTAL 225 KVA	UN	1.00	$ 73,560,340.00	$ 73,560,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.3	CELDA DE PROTECCION DE 15KV	UN	1.00	$ 13,392,297.00	$ 13,392,297.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
16.4	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 300A, A 208 V	UN	1.00	$ 20,430,730.00	$ 20,430,730.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.5	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	2.00	$ 16,799,368.00	$ 33,598,736.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.6	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1.00	$ 184,257,770.00	$ 184,257,770.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.7	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT`S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	3.00	$ 11,397,065.00	$ 34,191,195.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.8	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS EN COFRE DE 2100*1000*450 CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 165 AMPERIOS, LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 2 DE 3X70A, 1 DE 3X63A, 2 DE 3X50A, 2 DE 3X30, 2 DE 2X20A, 1 DPS 230 V-CLASE 1, ONDA DE PRUEBA 10/350USG, 50 KA.	UN	1.00	$ 11,200,643.00	$ 11,200,643.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.9	TABLERO GENERAL DE ILUMINACION CANCHA EN COFRE DE 1800*800*450 CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 265 AMPERIOS, LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 4 DE 3X63A, 1 DE 3X70A, 1 DPS 230 V-CLASE 1, ONDA DE PRUEBA 10/350USG, 50 KA.	UN	1.00	$ 9,345,039.00	$ 9,345,039.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.10	TABLERO DE MEDIDORES DE 24 CUENTAS CON TOTALIZADOR DE 3X100A, EQUIPADO CON 20 CUENTAS BIFASICAS DE 20A Y MEDIDOR PARA MEDIDA DIRECTA DE 63A.	UN	1.00	$ 9,318,849.00	$ 9,318,849.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.11	MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 25M PARA SOPORTAR 17 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE CANASTILLA , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA.	UN	4.00	$ 49,322,731.00	$ 197,290,924.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.12	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ SEN GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	9.00	$ 4,158,299.00	$ 37,424,691.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.13	PROYECTOR H-BAY 960W, 30°, 60° Y 15° APERTURA.	UN	68.00	$ 10,647,898.00	$ 724,057,064.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
16.14	LUMINARIA TIPO BALA DE 13W	UN	51.00	$ 259,043.00	$ 13,211,193.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.15	LUMINARIA TIPO BALA DE 16W	UN	14.00	$ 294,260.00	$ 4,119,640.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.16	LUMINARIA TIPO BALA DE 22W	UN	31.00	$ 355,968.00	$ 11,035,008.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.17	LUMINARIA HERMETICA 40W	UN	126.00	$ 250,317.00	$ 31,539,942.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.18	LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CM, 40W	UN	15.00	$ 348,488.00	$ 5,227,320.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.19	LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CM, 50W	UN	5.00	$ 364,071.00	$ 1,820,355.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.20	BATERIA DE EMERGENCIA 22-45W IP40 90 MINUTOS DE AUTONOMIA 120- 277V.	UN	21.00	$ 421,727.00	$ 8,856,267.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.21	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS RALED II 32LED POTENCIA: 55W.	UN	10.00	$ 1,737,008.00	$ 17,370,080.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.22	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS RALED II 128LED POTENCIA: 57W.	UN	6.00	$ 1,586,430.00	$ 9,518,580.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.23	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	4.00	$ 3,451,551.00	$ 13,806,204.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.24	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	101.00	$ 116,698.00	$ 11,786,498.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.25	SALIDA TOMA BIFASICO (2NO 10+ 1NO 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9.00	$ 189,729.00	$ 1,707,561.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.26	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 887,204.00	$ 887,204.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.27	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,055,439.00	$ 2,110,878.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.28	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24.00	$ 439,833.00	$ 10,555,992.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.29	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 570,146.00	$ 570,146.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.30	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 480,306.00	$ 1,921,224.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	255.00	$ 262,533.00	$ 66,945,915.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4F+1X4N+X4TAWG THHN	ML	88.00	$ 103,651.00	$ 9,121,288.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8F+1X8N+8T AWG THHN	ML	830.00	$ 68,275.00	$ 56,668,250.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+6T AWG THHN	ML	308.00	$ 83,835.00	$ 25,821,180.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2F+1X2N+X2T AWG THHN	ML	88.00	$ 132,071.00	$ 11,622,248.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 10F+10N+X10T AWG THHN	ML	1,385.00	$ 30,554.00	$ 42,317,290.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2"	ML	553.00	$ 21,498.00	$ 11,888,394.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.38	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 1/2" PVC	ML	562.00	$ 45,120.00	$ 25,357,440.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.39	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 1" PVC	ML	501.00	$ 51,717.00	$ 25,910,217.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.40	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	187.839	$ 38,640.00	$ 7,258,099.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.41	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	11.518206	$ 192,794.00	$ 2,220,641.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°**	001 de 2023
NIT:	901666597-1	**INTERVENTORÍA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISIÓN:**	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°**	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
16.42	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	1.152	$ 643,591.00	$ 741,417.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.43	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3.375	$ 1,382,134.00	$ 4,664,702.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	M3	157.50	$ 53,592.00	$ 8,440,740.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.45	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1,582.88	$ 8,544.00	$ 13,524,127.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.46	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11.52	$ 939,801.00	$ 10,826,508.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.47	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	96.9888	$ 34,444.00	$ 3,340,682.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.48	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	16.00	$ 606,586.00	$ 9,705,376.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.49	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	11.00	$ 1,156,397.00	$ 12,720,367.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.50	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2.00	$ 1,934,552.00	$ 3,869,104.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	116.00	$ 73,301.00	$ 8,502,916.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4.00	$ 439,157.00	$ 1,756,628.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	20.00	$ 59,832.00	$ 1,196,640.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.54	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ TRIPLE PRO. GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	1.00	$ 4,476,217.00	$ 4,476,217.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.55	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ DOB GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	2.00	$ 4,377,081.00	$ 8,754,162.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
16.56	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	1.00	$ 9,344,578.00	$ 9,344,578.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 1,890,177,396.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
17	**RED DE SUMINISTRO**													
	PRELIMINARES													
17.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	446.25	$ 5,542.00	$ 2,473,118.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 2,473,118.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	EXCAVACIONES													
17.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	156.1875	$ 68,927.00	$ 10,765,536.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33.840625	$ 248,800.00	$ 8,419,548.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023	a	30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023		
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.		
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL				**$ 19,185,084.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	RELLENOS Y BASES													
17.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	44.625	$ 120,260.00	$ 5,366,603.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	111.5625	$ 63,830.00	$ 7,121,034.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 12,487,637.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
17.6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	220.76	$ 112,216.00	$ 24,772,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26.47	$ 38,486.00	$ 1,018,724.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56.81	$ 27,820.00	$ 1,580,454.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.9	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	93.04	$ 19,147.00	$ 1,781,437.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	49.17	$ 16,230.00	$ 798,029.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.11	TUBERÍA PVCP RDE 11 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	132.90	$ 13,335.00	$ 1,772,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.12	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	95.00	$ 58,609.00	$ 5,567,855.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17.00	$ 70,543.00	$ 1,199,231.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49.00	$ 80,521.00	$ 3,945,529.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.15	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 329,549.00	$ 2,306,843.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 140,295.00	$ 420,885.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.17	VALVULA CHEQUE CORTINA 3/4 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18.00	$ 101,736.00	$ 1,831,248.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	9.00	$ 270,505.00	$ 2,434,545.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC Ø4" UM	UN	2.00	$ 180,291.00	$ 360,582.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.20	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 23,548.00	$ 117,740.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.21	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	59.00	$ 11,595.00	$ 684,105.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	27.00	$ 6,038.00	$ 163,026.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 3,781.00	$ 75,620.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	20.00	$ 43,830.00	$ 876,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
17.25	SISTEMA DE PRESION DIFERENCIAL - 50 GPM – 60 PSI	UN	2.00	$ 40,231,433.00	$ 80,462,866.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 132,170,345.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	TOTAL RED SUMINISTRO				**$ 166,316,184.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
18	**RED SANITARIA**													
	PRELIMINARES													

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
18.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	418.21	$ 5,542.00	$ 2,317,720.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 2,317,720.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	EXCAVACIONES													
18.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	237.30	$ 68,927.00	$ 16,356,377.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	51.42	$ 248,800.00	$ 12,793,296.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 29,149,673.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	RELLENOS Y BASES													
18.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	48.96	$ 120,260.00	$ 5,887,930.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	183.34	$ 63,830.00	$ 11,702,592.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 17,590,522.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO													
18.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	35.72	$ 101,390.00	$ 3,621,651.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	80.26	$ 97,184.00	$ 7,799,988.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	211.87	$ 47,055.00	$ 9,969,543.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	9.96	$ 38,469.00	$ 383,151.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	80.40	$ 26,191.00	$ 2,105,756.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	325.00	$ 36,633.00	$ 11,905,725.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30.00	$ 21,249.00	$ 637,470.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	73.00	$ 11,935.00	$ 871,255.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	48.00	$ 88,703.00	$ 4,257,744.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20.00	$ 69,525.00	$ 1,390,500.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	30.00	$ 70,518.00	$ 2,115,540.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	17.00	$ 86,037.00	$ 1,462,629.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49.00	$ 86,965.00	$ 4,261,285.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 50,782,237.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
18.19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5.00	$ 551,503.00	$ 2,757,515.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
18.20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6.00	$ 709,055.00	$ 4,254,330.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
18.21	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2.00	$ 871,930.00	$ 1,743,860.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 8,755,705.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	TOTAL RED SUMINISTRO				**$ 108,595,857.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
19	**RED DE AGUAS LLUVIAS**													
19.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1,216.31	$ 5,542.00	$ 6,740,790.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 6,740,790.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	EXCAVACIONES													
19.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	156.13	$ 68,927.00	$ 10,761,573.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33.83	$ 248,800.00	$ 8,416,904.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 19,178,477.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	RELLENOS Y BASES													
19.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	39.11	$ 120,260.00	$ 4,703,369.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	6.2208	$ 63,830.00	$ 397,074.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 5,100,443.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
19.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	25.92	$ 312,236.00	$ 8,093,157.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	359.22	$ 219,723.00	$ 78,928,896.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR TIPO ADS 12"X1	ML	831.17	$ 197,323.00	$ 164,008,958.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 251,031,011.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
19.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4.00	$ 709,055.00	$ 2,836,220.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.10	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	90.70	$ 201,753.00	$ 18,298,997.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
19.11	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	90.70	$ 27,276.00	$ 2,473,933.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL				**$ 23,609,150.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	TOTAL RED DE AGUAS LLUVIAS				**$ 305,659,871.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
20	**RED CONTRAINCENDIOS**													
	PRELIMINARES													
20.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351.36	$ 5,542.00	$ 1,947,237.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 1,947,237.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	EXCAVACIONES													
20.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155.02	$ 68,927.00	$ 10,685,064.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33.59	$ 248,800.00	$ 8,357,192.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 19,042,256.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	RELLENOS Y BASES													
20.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60.31	$ 120,260.00	$ 7,252,881.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161.14	$ 63,830.00	$ 10,285,566.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 17,538,447.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
20.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228.88	$ 130,229.00	$ 29,806,814.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78.48	$ 64,779.00	$ 5,083,856.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32.00	$ 91,375.00	$ 2,924,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4.48	$ 65,587.00	$ 293,830.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12.00	$ 34,400.00	$ 412,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 2,467,874.00	$ 9,871,496.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28.00	$ 23,110.00	$ 647,080.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 14,638.00	$ 58,552.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 11,636.00	$ 93,088.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.15	SISTEMA CONTRA INCENDIO NACIONAL CON CERTIFICACION RETIE Y MOTOR UL CERTIFICADO	UN	2.00	$ 130,763,945.00	$ 261,527,890.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	SUBTOTAL				**$ 310,719,406.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	TOTAL RED CONTRAINCENDIOS				**$ 349,247,346.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE LA ESPERANZA INCLUYE AIU(31%)				**$ 19,957,655,700.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 596,311,175.00**		**$ 596,311,175.00**	**2.99%**

CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS, ESPERANZA									
CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA	$3,000,000.00								
CERTFICACION E INSPECCION DE TRANSFORMADOR	$949,266.00								
PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION	$2,975,000.00								

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	01	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de marzo de 2023 a 30 de septiembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.806.464.729.00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 20.323.002.580.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901666597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	13 de diciembre de 2023

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	RETIE USO FINAL				$7,735,000.00									
	CERTIFICACION RETILAP				$9,496,200.00									
	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA				$2,793,954.00									
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$338,397,460.00									
	TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESPERANZA				$ 365,346,880.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	
	ADMINISTRACIÓN (%)	26.00%												
	IMPREVISTOS (%)	1.00%												
	UTILIDAD (%)	4.00%												
	VALOR COSTOS INDIRECTOS													
	VALOR TOTAL OBRA				$20,323,002,580.00		$0.00		$0.00	2.93%	$596,311,175.00	2.93%	$596,311,175.00	

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 20,323,002,580.00
VALOR ADICIONAL		$ 0.00
VALOR TOTAL		$ 20,323,002,580.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 0.00
ANTICIPO	30.00%	$ 6,096,900,774.00
PRESENTE ACTA		$ 596,311,175.00
ACUMULADO		$ 596,311,175.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
	RELACIÓN DE ACTAS	AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
PRESENTE AC	$ 596,311,175.00	$ 178,893,352.50	$ 417,417,822.50
ACTA 1	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ACTA 2	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ACTA 3	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTALES	$ 596,311,175.00	$ 178,893,352.50	$ 417,417,822.50

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 596,311,175.00	2.93%
POR EJECUTAR	$ 19,726,691,405.00	97.07%
POR AMORTIZAR	$ 5,918,007,421.50	97.07%
TOTALES	$ 20,323,002,580.00	100.00%

RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO N° 963-2022				
CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
ANTICIPO	$ 6,096,900,774.00			$ 6,096,900,774.00
PRESENTE ACTA PARCIAL 01	$ 596,311,175.00	$ 178,893,352.50	$ 417,417,822.50	$ 6,514,318,596.50
-	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,514,318,596.50
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 19,726,691,405.00			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado con el NIT 901666597-1 cumplió con la clausula Séptima forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°963-2022 representado legalmente por la Unión Temporal o Consorcio ESPACIOS DEPORTIVOS , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO X.
5. En la presente acta se adjunta el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para pago, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **13 de diciembre de 2023**

Firma

JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R/L CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA OBRA

Firma

ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
No. De matricula profesional A25072000-79650147

Firma

HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORÍA

Firma

ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
No. De matricula profesional 25202-090337 CND

MEMORIA DE CANTIDADES Y REGISTRO FOTOGRAFICO

CANCHA DE LA ESPERANZA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ÁREA	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
AREAS					
GRADERIAS	12.00		75.00	1.00	900.00
CANCHA	70.11		110.00	1.00	7712.10
PARQUEADERO		1254.50		1.00	1254.50
ESPACIO PUBLICO ORIENTAL	18.59		19.24	1.00	357.67
ESPACIO PUBLICO SUR	22.20		98.03	1.00	2176.27
MURO CONTENCIÓN	3.00		91.80	1.00	275.40
VIENEN:				SUBTOTAL	12675.94
PASAN:				TOTAL	12675.94

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

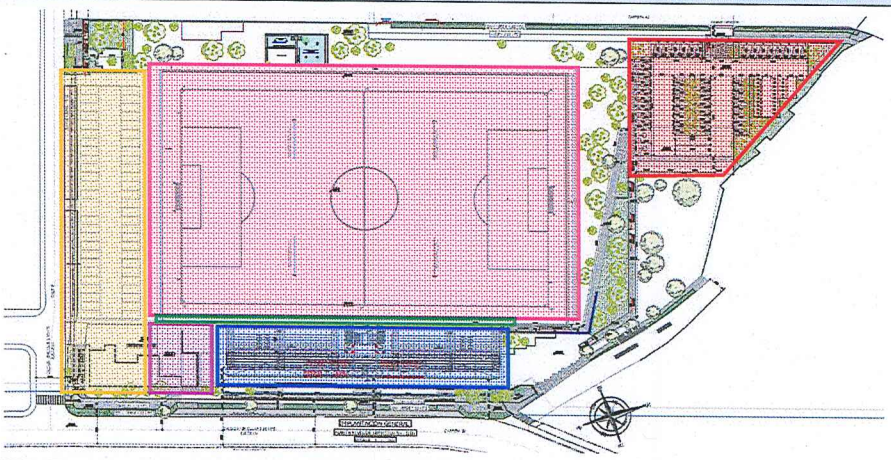

OBSERVACION: VER PLANO IMPLANTACIÓN GENERAL NUEVA CANCHA ESPERANZA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

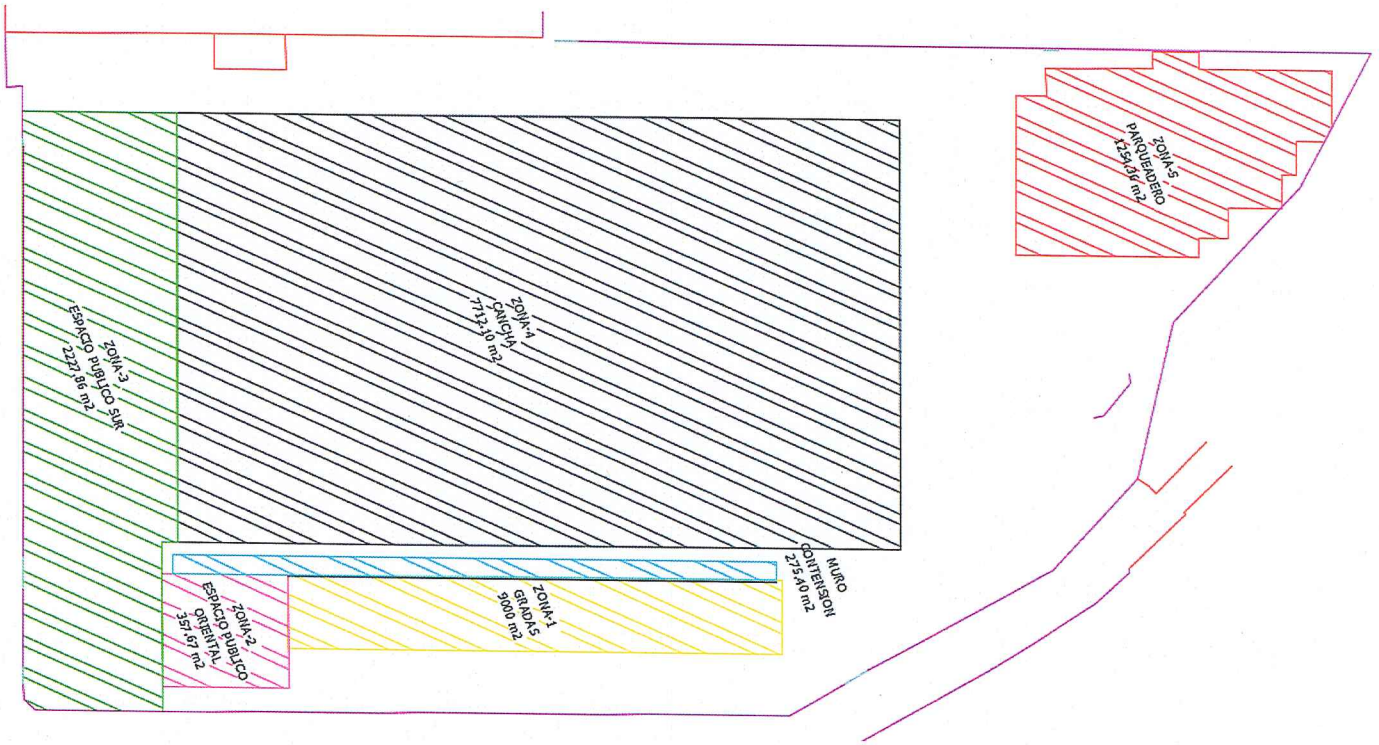

OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	PRELIMINARES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 252025090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

Carrera 33 #38B-10 Barrio La Grama
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
2.1	DEMOLICION GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICIONES M.GAVIONES					
GAVION 1	2.00	1.00	1.00	17.00	**34.00**
GAVION 2	2.00	1.00	2.00	27.00	**108.00**
VIENEN:				SUBTOTAL	142.00
PASAN:				TOTAL	**142.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

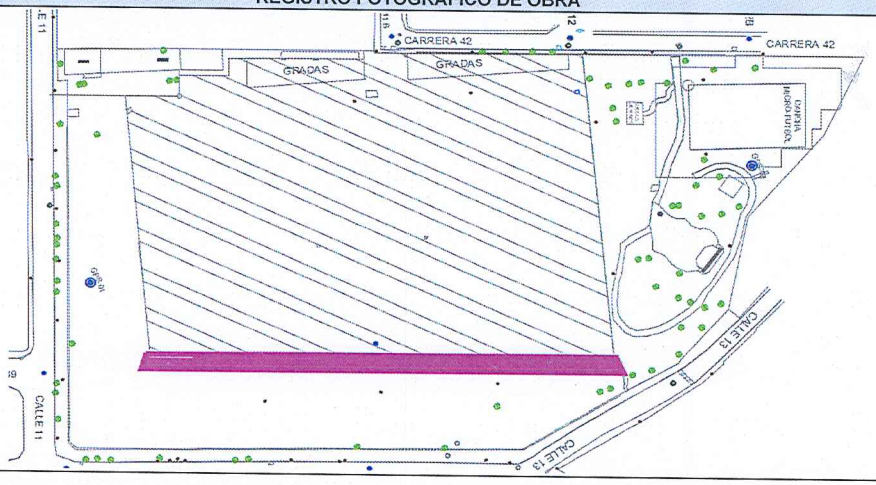

OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
2.1	DEMOLICION GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

GAVION 1





17 GAVIONES

GAVION 2 28 GAVIONES



GAVION 3 21 GAVIONES



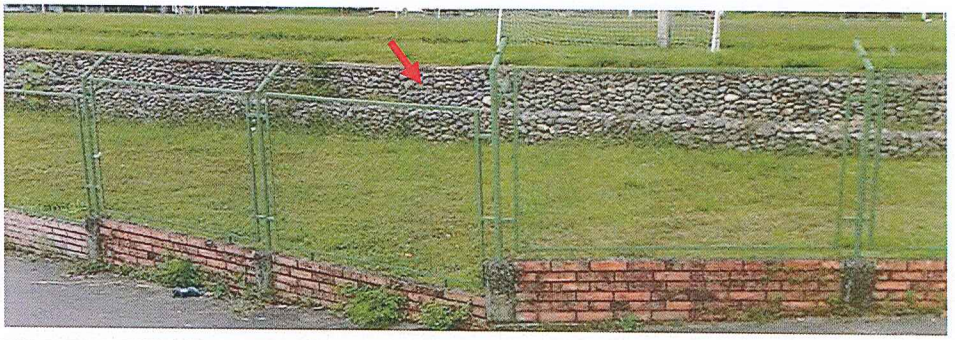

OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
2.1	DEMOLICION GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-890337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
2.2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MURO CERRAMIENTO					
CERRAMIENTO ZONA NORTE CANCHA	2.30	0.50		41.00	**47.15**
CERRAMIENTO ZONA SUR	2.30	0.50		4.00	**4.60**
VIENEN:				SUBTOTAL	51.75
PASAN:				TOTAL	**51.75**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

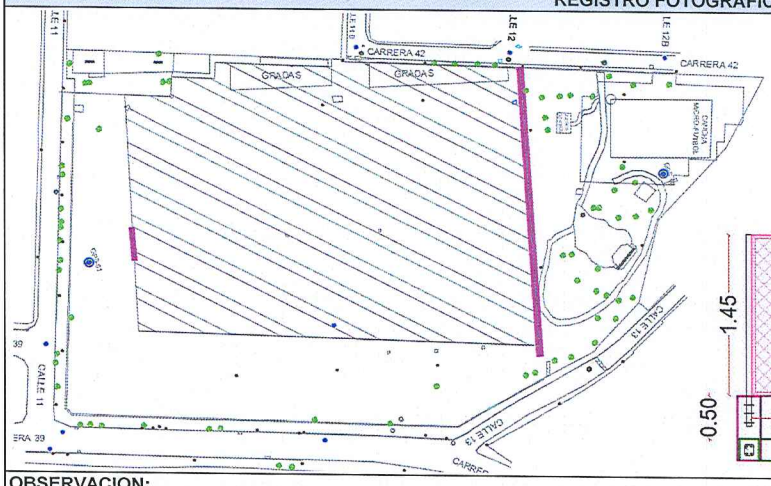



OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
2.2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



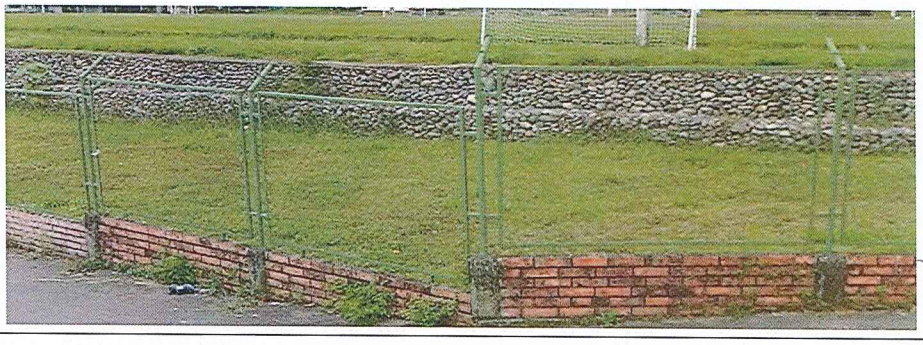

OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
2.3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MURO CERRAMIENTO					
CERRAMIENTO ZONA NORTE CANCHA	2.30	1.45		41.00	**136.74**
CERRAMIENTO ZONA SUR	2.30	1.45		12.00	**40.02**
VIENEN:				SUBTOTAL	176.76
PASAN:				TOTAL	**176.76**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

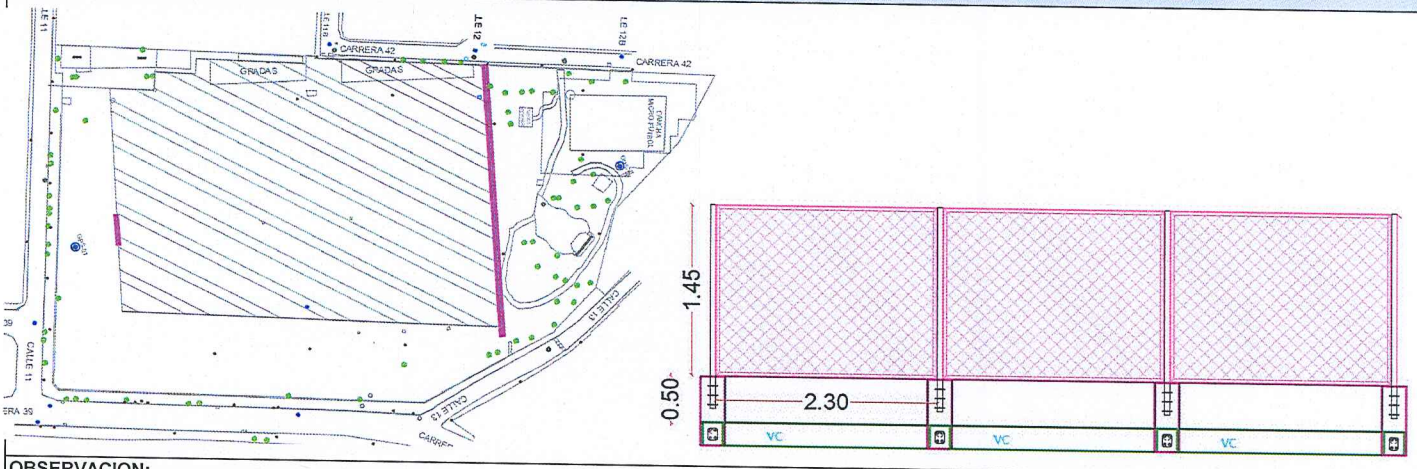

OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	


OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
2.3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

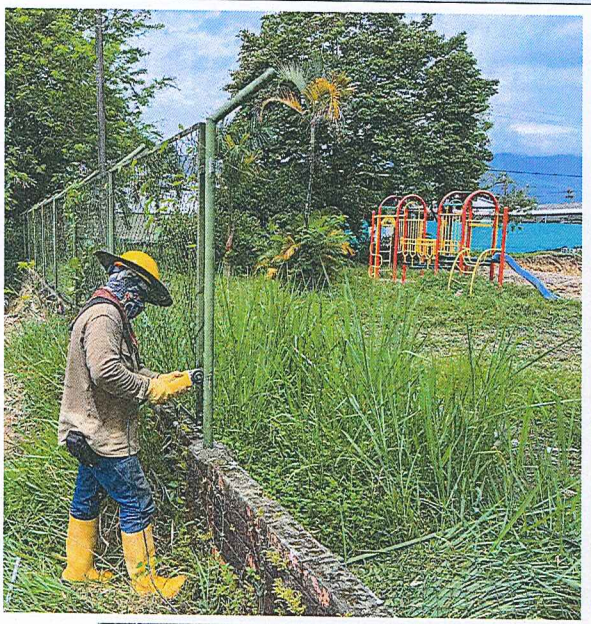



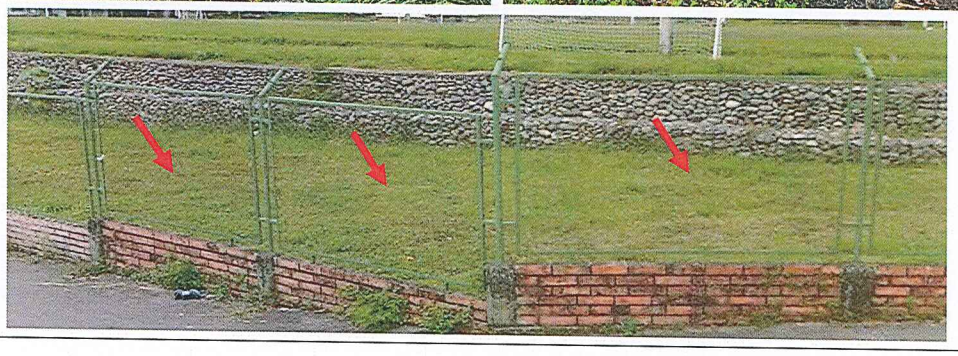

OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA					
ZONA DE GRADAS	20.32	1.55	76.13	1.00	2397.79 ✓
ZONA DE PARQUEADERO	26.19	1.03	47.90	1.00	1292.14 ✓
ESPACIO PUBLICO ORIENTAL	18.59	1.80	19.24	1.00	643.81 ✓
ESPACIO PUBLICO SUR	22.20	0.92	98.03	1.00	2002.16 ✓
CIMENTACIÓN GRADERIAS					
EJE 1´ ZAPATAS (1.50 X 1.50)	4.91	1.50	2.50	4.00	73.65
EJE 2 ZAPATAS (2.60 X 2.60)	3.60	1.00	3.60	12.00	155.52
	2.60	0.75	2.60	12.00	60.84
EJE 3 ZAPATAS (3.00 X 3.00)	4.00	1.00	4.00	12.00	192.00
	3.00	1.10	3.00	12.00	118.80
VIENEN:				SUBTOTAL	6936.71
PASAN:				TOTAL	**6936.71**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

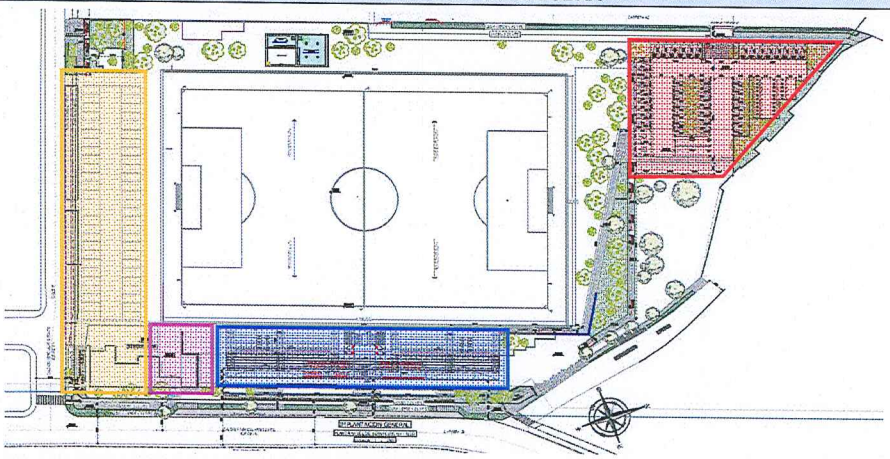

OBSERVACION: VER PLANO IMPLANTACIÓN GENERAL NUEVA CANCHA ESPERANZA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

EXCAVACION				
ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+000	38,29			
K0+010	35,57	10,00	369,3	369,3
K0+020	32,55	10,00	340,6	709,9
K0+030	32,75	10,00	214,85	924,75
K0+040	32,94	10,00	328,45	1253,2
K0+050	30,65	10,00	317,95	1571,15
K0+060	31,72	10,00	311,85	1883
K0+070	30,84	10,00	312,8	2195,8
K0+076	35,06	6,13	201,98	2397,79
			TOTAL	**2397,79**
				m3

VOLUMEN ZONA-1 GRADAS

CONSOLIDADO ACTUALIZADO		
EXCAVACION	**2397,79**	m3

Topografo: Juan Antonio Barbosa
M.P: 01-0401 C.P.N.T

FANNY BARRERA

VoBo. Interventoria

EXCAVACION				
ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+000	27,39			
K0+005	29,08	5,00	141,175	141,175
K0+010	30,94	5,00	150,05	291,225
K0+015	32,26	5,00	214,85	506,075
K0+019	32,71	4,24	137,7364	643,811

TOTAL	**643,81**
	m3

VOLUMEN ZONA-2 ORIENTAL

CONSOLIDADO ACTUALIZADO		
EXCAVACION	**643,81**	m3

Topografo: Juan Antonio Barbosa
M.P: 01-0401 C.P.N.T

FANNY BARRERA

VoBo. Interventoria

EXCAVACION				
ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+000	1,3			
K0+005	16,17	5,00	43,675	43,68
K0+010	14,17	5,00	75,85	119,53
K0+020	25,16	10,00	196,65	316,18
K0+030	33,78	10,00	294,7	610,89
K0+040	33,34	10,00	335,6	946,49
K0+050	29,41	10,00	313,75	1260,24
K0+060	22,38	10,00	258,95	1519,19
K0+070	16,88	10,00	196,3	1715,49
K0+080	10,93	10,00	139,05	1854,54
K0+090	6,84	10,00	88,85	1943,39
K0+098	8,77	7,53	58,772	2002,16
			TOTAL	**2002,16**
				m3

VOLUMEN ZONA-3 SUR

CONSOLIDADO ACTUALIZADO		
EXCAVACION	**2002,16**	m3

Topografo: Juan Antonio Barbosa
M.P: 01-0401 C.P.N.T

FANNY BARRERA

VoBo. Interventoria

EXCAVACION				
ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+000	12,16			
K0+005	17,19	5,00	73,38	73,38
K0+010	18,88	5,00	90,18	163,55
K0+015	23,5	5,00	214,85	378,40
K0+020	30,11	5,00	134,03	512,43
K0+025	30,11	5,00	150,55	662,98
K0+030	28,12	5,00	145,58	808,55
K0+035	30,1	5,00	145,55	954,10
K0+040	28,41	5,00	146,28	1100,38
K0+045	22,78	5,00	127,98	1228,35
K0+048	21,21	2,90	63,79	1292,14
			TOTAL	**1292,14**
				m3

VOLUMEN ZONA-5 PARQUEADERO

CONSOLIDADO ACTUALIZADO		
EXCAVACION	**1292,14**	m3

Topografo: Juan Antonio Barbosa
M.P: 01-0401 C.P.N.T

FANNY BARRERA

VoBo. Interventoria

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CICLOPEOS GRADERIAS					
CICLOPEO D4	3.00	0.20	3.00	12.00	21.60
CICLOPEO D3	2.60	0.20	2.60	12.00	16.22
CICLOPEO D2	1.50	0.20	1.50	4.00	1.80
CICLOPEO D1	2.30	0.20	2.30	12.00	12.70
MURO DE CONTENCIÓN					0.00
DENTELLON TRAMO 1	0.50	0.50	34.55	1.00	8.64
DENTELLON TRAMO 2	0.50	0.50	33.55	1.00	8.39
DENTELLON TRAMO 3	0.50	0.50	6.00	1.00	1.50
DENTELLON TRAMO 4	0.50	0.50	19.78	1.00	4.95
VIENEN:				SUBTOTAL	75.79
PASAN:				TOTAL	**75.79**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

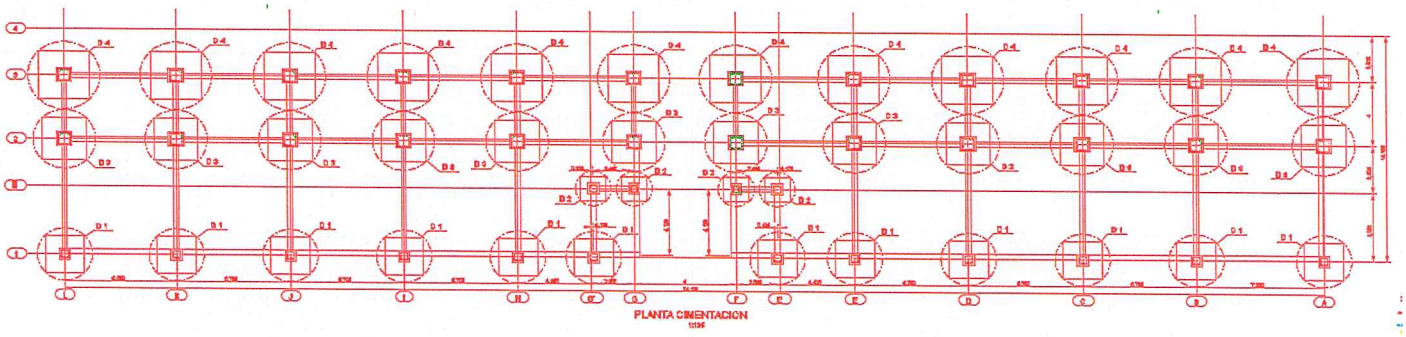

OBSERVACION: VER PLANO EST-ESPER-01. ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN ZAPATAS,DETALLES Y DESPIECES. CANCHA LA ESPERANZA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



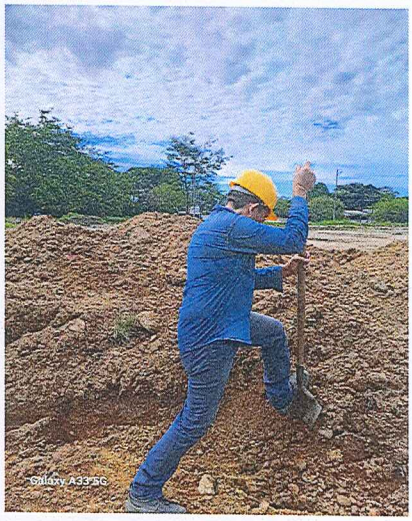





OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO DE 2"					
RELLENO CANCHA	72.00	0.051	110.00	1.00	403.92
VIENEN:				SUBTOTAL	403.92
PASAN:				TOTAL	**403.92**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

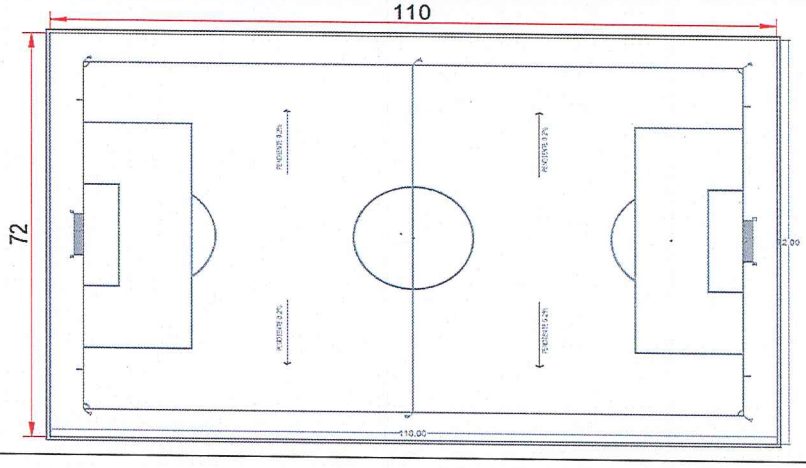

OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

RELLENO				
ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+000	3,672			
K0+010	3,672	10,00	36,72	36,72
K0+020	3,672	10,00	36,72	73,44
K0+030	3,672	10,00	36,72	110,16
K0+040	3,672	10,00	36,72	146,88
K0+050	3,672	10,00	36,72	183,6
K0+060	3,672	10,00	36,72	220,32
K0+070	3,672	10,00	36,72	257,04
K0+080	3,672	10,00	36,72	293,76
K0+090	3,672	10,00	36,72	330,48
K0+100	3,672	10,00	36,72	367,20
K0+110	3,672	10,00	36,72	403,92
			TOTAL	**403,92**
				m3

VOLUMEN ZONA-4 DE CANCHA

CONSOLIDADO ACTUALIZADO		
EXCAVACION	**403,92**	m3

Topografo: Juan Antonio Barbosa
M.P: 01-0401 C.P.N.T

FANNY BARRERA

V°Bo. Interventoria

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	CIMENTACIÓN	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VIGAS DE CIMENTACIÓN					
VIGA VF-7	0.40	0.05	6.85	1.00	0.14
VIGA VF-8	0.40	0.05	6.05	6.00	0.73
VIGA VF-9	0.40	0.05	3.90	1.00	0.08
VIIGA VF-10	0.40	0.05	2.41	1.00	0.05
VIIGA VF-11	0.40	0.05	3.81	1.00	0.08
VIIGA VF-12	0.40	0.05	5.95	1.00	0.12
VIGA VF-25	0.40	0.05	2.41	1.00	0.05
VIGA VF-15	0.40	0.05	6.60	2.00	0.26
VIGA VF-16	0.40	0.05	5.80	12.00	1.39
VIGA VF-17	0.40	0.05	6.06	2.00	0.24
VIGA VF-18	0.40	0.05	5.97	2.00	0.24
VIGA VF-19	0.40	0.05	5.70	2.00	0.23
VIGA VF-1	0.40	0.05	6.42	10.00	1.28
VIGA VF-2	0.40	0.05	3.10	10.00	0.62
VIGA VF-4	0.40	0.05	2.13	2.00	0.09
VIGA VF-5	0.40	0.05	3.94	2.00	0.16
VIGA VF-6	0.40	0.05	3.65	2.00	0.15
VIGA VF-22	0.40	0.05	1.70	10.00	0.34
SOLADO ZARPA MURO TRAMO 1	2.50	0.05	34.55	1.00	4.32
SOLA ZARPA MURO TRAMO 2	2.50	0.05	33.55	1.00	4.19
VIENEN:				**SUBTOTAL**	14.74
PASAN:				**TOTAL**	**14.74**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



OBSERVACION: VER PLANO EST-ESPER-02. ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN VIGAS, DETALLES Y DESPIECES. CANCHA DE LA ESPERANZA.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	CIMENTACIÓN	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
11.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
NIVELACIÓN PARQUEADERO		0.15	1148.19	1.00	172.23
VIENEN:				SUBTOTAL	172.23
PASAN:				TOTAL	172.23

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

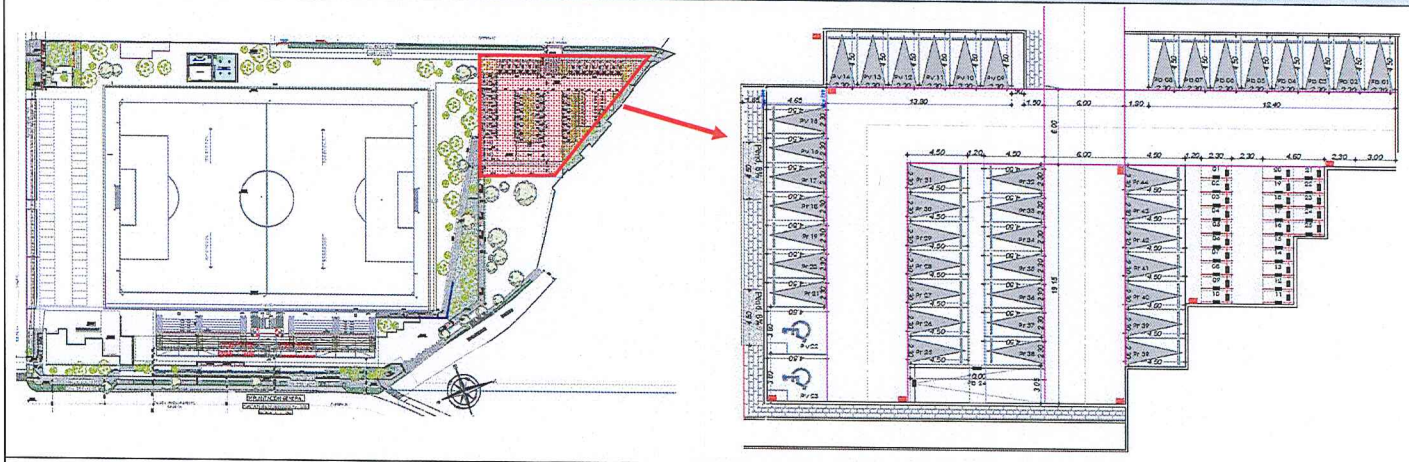

OBSERVACION: VER PLANO IMPLANTACIÓN GENERAL NUEVA CANCHA ESPERANZA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
11.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

RELLENO				
ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+000	1,771			
K0+005	2,503	5,00	10,69	10,69
K0+010	2,750	5,00	13,13	23,82
K0+015	3,422	5,00	15,43	39,25
K0+020	4,385	5,00	19,52	58,77
K0+025	4,385	5,00	21,92	80,69
K0+030	4,095	5,00	21,20	101,89
K0+035	4,383	5,00	21,20	123,09
K0+040	4,137	5,00	21,30	144,39
K0+045	3,317	5,00	18,64	163,03
K0+048	3,030	2,90	9,20	172,23
			TOTAL	**172,23**
	E=0,15m			m3

VOLUMEN ZONA-5 PARQUEADERO

CONSOLIDADO ACTUALIZADO		
EXCAVACION	**172,23**	m3

Topografo: Juan Antonio Barbosa
M.P: 01-0401 C.P.N.T

FANNY BARRERA

VoBo. Interventoria

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	CANCHA CESPED SINTETICO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
14.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACIÓN MECANICA					
CANCHA LA ESPERANZA	70.11	0.23	110.00	1.00	1773.78
VIENEN:				SUBTOTAL	1773.78
PASAN:				TOTAL	1773.78

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

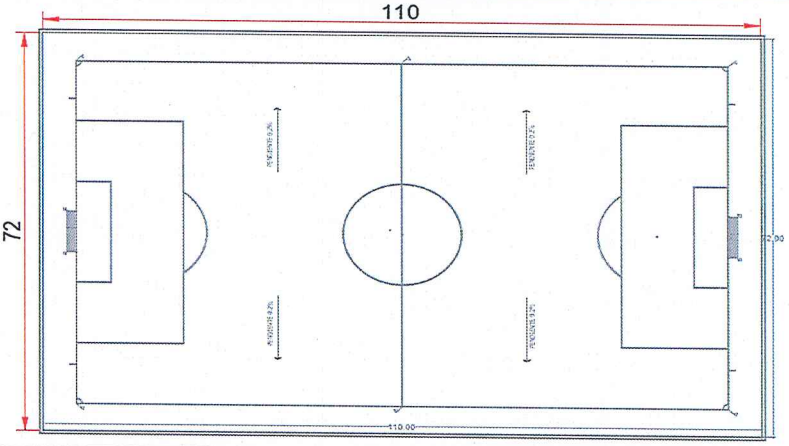

OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma:
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	CANCHA CESPED SINTETICO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
14,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

EXCAVACION

ABSCISA	AREA	DISTANCIA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
K0+000	14,27			
K0+010	14,77	10,00	145,2	145,2
K0+020	15,58	10,00	151,75	296,95
K0+030	15,23	10,00	214,85	511,8
K0+040	15,86	10,00	155,45	667,26
K0+050	14,93	10,00	153,95	821,22
K0+060	15,8	10,00	153,65	974,88
K0+070	14,83	10,00	153,15	1128,03
K0+080	13,84	10,00	143,35	1271,38
K0+090	15,82	10,00	148,30	1419,68
K0+100	17,2	10,00	165,10	1584,78
K0+110	20,6	10,00	189,00	1773,78

TOTAL	1773,78

m3

VOLUMEN ZONA-4 DE CANCHA

CONSOLIDADO ACTUALIZADO

EXCAVACION	1773,78	m3

Topografo: Juan Antonio Barbosa
M.P: 01-0401 C.P.N.T

FANNY BARRERA

VoBo. Interventoria

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500032
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	CANCHA CESPED SINTETICO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
14.5	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EXTENDIDO DE GEOTEXTIL 2100					
CANCHA LA ESPERANZA	72.00		110.00	1.00	7920.00
VIENEN:				SUBTOTAL	7920.00
PASAN:				TOTAL	7920.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

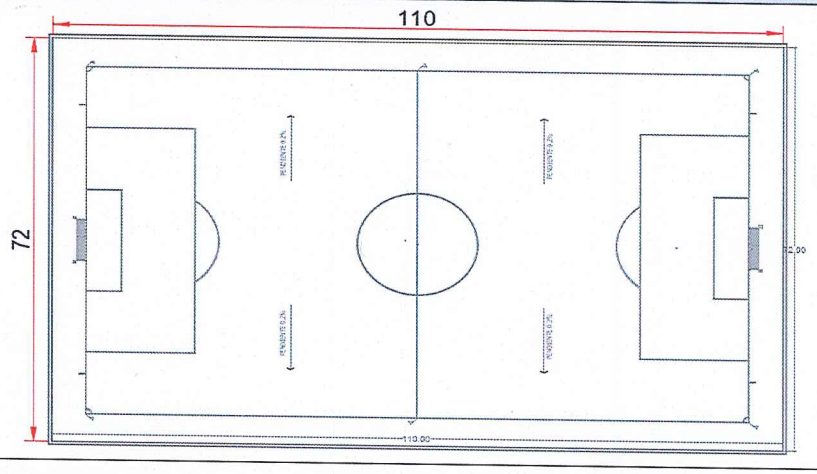

OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 29/02/2024	

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	ACTA PARCIAL No. 1	
CAPITULO:	CANCHA CESPED SINTETICO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2
14.5	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





OBSERVACION:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 13 de diciembre de 2023

Firma

Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: **LUZ MARINA OSPITIA**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: **AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 19202-82149 CAU
