CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META



INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1

PERIODO DEL 1 DE MARZO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INTRODUCCION

Este informe de Interventoría detalla las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato de obra No 963 de 2022 y que tiene por objeto "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÒN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META" entre el 01 de marzo al 30 de septiembre de 2023. El presente informe se enfoca que las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante este periodo de tiempo.

El Instituto De Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA realizó la selección de oferentes mediante el concurso de méritos abiertos CM-002 de 2022, cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÒN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META" la cual fue adjudicada a CONSORCIO INTERDEPORTIVO registrada con el número de NIT: 901.669.685-5 representada legalmente por el señor HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES identificado con la cedula de ciudadanía 1.119.892.860 de Cumaral.

El contrato de interventoría N° 001 de 2023 adjudicado hace referencia al seguimiento y control del contrato de obra pública No. 963 de 2022 cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÒN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META" el cual fue adjudicado al CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS registrada con el número de NIT:901.666.597-1 firma representada legalmente por el señor JUAN CARLOS LOZANO LEON.

El contrato de obra fue suscrito el 29 de diciembre de 2022 y el contrato de interventoría fue suscrito el 17 de enero de 2023. El acta de inicio del contrato de interventoría fue suscrita el 27 de febrero de 2023 y el acta de inicio de obra fue suscrita el 1 de marzo de 2023, este último se denominada "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÒN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", y está identificado bajo el número 2022005500032 y 2022005500071 respectivamente; este proyecto se articula con el plan de desarrollo departamental 2020 a 2023 "Hagamos grande al Meta", por esta razón el deporte, la recreación, la actividad y la educación física es concebida como uno de los principales elementos dinamizadores de la política social en el departamento.

DESCRIPCION DE PROYECTO

El proyecto 2022005500071 cuyo objeto es ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANY DEL MUNCIPIO DE VILLAVICENCIO, META dentro del desarrollo departamental 2020 a 2023 "Hagamos grande al Meta" enmarca las políticas y los objetivos que se tiene en materia de deporte y recreación para este cuatrienio, el planteamiento contiene los siguientes lineamientos:

DIMENSIÓN 3. Hagamos Grande Al Meta en lo Social
SECTOR 43. Deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre
PROGRAMA 4301. Haciendo Grande al Meta fomento a la recreación, la actividad física y el deporte al Servicio de la gente
COMPONENTE CONSTITUTIVO DEL PROGRAMA: Infraestructura en parques recreativos y/o espacios lúdicos META PRODUCTO: Adecuar los espacios recreativos del parque Sikuany y cancha la Esperanza.

El espacio del Parque Sikuany, donde históricamente se han construido edificaciones para la práctica masiva del deporte, se convierte en el sitio adecuado para plantear la adecuación e intervención de los espacios deportivos que actualmente no cumplen integralmente con los requerimientos que demandan las prácticas deportivas que allí tienen lugar, en términos de normas y reglamentos establecidos para cada una de las disciplinas, además de complementar y consolidar este lugar como el Complejo Deportivo de Tenis más importante en el departamento.

El parque Sikuany fue inaugurado en el 2002. Ese año fue escenario de seis partidos de la Copa Davis de Tenis y en los que Colombia enfrentó a Cuba y Uruguay, escenario escogido históricamente por el equipo colombiano de tenis por sus canchas en polvo de ladrillo.

También ha sido centro de encuentro de torneos de tenis a nivel nacional de ligas departamentales y regionales, para lo cual se exigen los más altos estándares de calidad y que los escenarios se encuentren con toda la reglamentación exigida por la ITF (Federación Internacional de Tenis, organismo rector mundial del tenis).

El Departamento debe aprovechar el sector turismo del deporte para esto debe garantizar escenarios idóneos, con el fin de convertir el parque Sikuany en un escenario icónico para la práctica del tenis en el departamento y ser catalogado por la federación Colombiana de tenis como un escenario de talla mundial para albergar grandes torneos e incentivar el crecimiento del turismo de acuerdo al "plan del desarrollo integral de la presente ordenanza, los documentos que contienen el Plan de Desarrollo Económico y Social "HAGAMOS GRANDE AL META" vigencia 2020-2023" se busca tener un escenario avalado por la ITF.

La ejecución física del proyecto será de 12 meses. En síntesis, la intervención en el parque Sikuany consiste en la construcción de 3 canchas sintéticas de futbol 5, 3 canchas cubiertas de baloncesto, 4 canchas de tenis (2 cubiertas y 2 abiertas).

El proyecto 2022005500032 cuyo objeto es EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA presenta problemáticas avanzadas en cuanto a espacios para la comunidad, teniendo en cuenta que este sector está dividido en 8 etapas y para éstas solo hay un escenario deportivo, donde no cuenta con una cancha de futbol 11 en buenas condiciones, así mismo, las instalaciones y servicios de la cancha no son las adecuadas para su uso cotidiano por parte de la comunidad. En el territorio los espacios públicos para las prácticas deportivas son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Los escenarios deportivos que están en buenas condiciones no son de uso público. El predio cuenta con un área bastante extensa

de zonas verdes, sin embargo, el mismo presenta una morfología bastante pronunciada entre el nivel de la Carrera 39 y el lote, crea una corriente de agua al llover que afecta directamente los andenes que lo conforman y la calzada.

En el proyecto de la cancha de la Esperanza, se va a construir áreas de urbanismo perimetrales, zonas de parqueadero, se va a reconstruir completamente toda la cancha de futbol, y se construirá una edificación doble propósito consistente en un sector de gradas en el nivel superior y bajo estas funcionará un área administrativa y de servicios comerciales.

INFORME: PAGO PARCIAL N°1.

CONTRATO N°	001-2023	PROYECTO N°	2022005500032-2022005500071

Fecha de Presentación: 18/12/2023

Periodo informado	Desde	1 / Marzo / 2023	Hasta	30 / Septiembre/ 2023

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS (2.894.087.592,11).
VALOR ACTUALIZADO:	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS (2.894.087.592,11).
OBJETO PROYECTO:	• INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. • INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR DEL PROYECTO:	• MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS (1.513.555.374,03). • MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (1.380.532.218,08).

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORIA	
VALOR ADICIONAL:	N.A.
VALOR ACTUALIZADO:	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS (2.894.087.592,11).
CORREO ELECTRÓNICO:	consorciointerdeportivo1@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	27/02/2023
PRORROGA:	N.A.
SUSPENSIÓN:	N.A.
TIEMPO:	N.A.
REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	26/02/2024
Meses: DOCE (12)	Días: CERO (0)

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	27/02/2023
PRORROGA:	N.A.
SUSPENSIÓN:	N.A.
TIEMPO:	N.A.
REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	26/02/2024
Meses: DOCE (12)	Días: CERO (0)

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	023-2023/062-2023/220-2023/282-2023.
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUNNA PINEDA SIERRA - FABIAN A. SAAVEDRA RIOS - MILDRED Y. ROA - PAULA A. VALLEJO.

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA	
NUMERO DEL CONTRATO:	963 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL INICIAL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VENTINUEVE PESOS ($45.806.464.729).
OBJETO PROYECTO:	• ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. • MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR DEL PROYECTO:	• SIKUANI; VEINTICINCO MIL MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($25.483.462.149.00) • ESPERANZA; VEINTE MIL TRECIENTOS VEINTITRES MILLONES DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. ($ 20.323.002.580.00)
VALOR ADICIONAL:	N.A.
VALOR ACTUALIZADO:	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VENTINUEVE PESOS ($45.806.464.729).
CORREO ELECTRÓNICO:	consorciointerdeportivo1@gmail.com

UBICACIÓN

Los proyectos objeto del presente informe, se encuentran ubicados en la República de Colombia, casco urbano del municipio de Villavicencio en el departamento del Meta.

La cancha de futbol, se encuentra ubicada en la comuna 7, del barrio La Esperanza, ubicado por la carrera 39 calle 11 con carrera 42 calle12B, limita al norte con el caño Buque, y al occidente con viviendas del barrio la esperanza.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	BARRIO:	LA ESPERANZA
COMUNA:	Comuna 7, Carrera 39, calle 11, carrera 42, calle12B.		
COORDENADAS:	Latitud 4°8'12" N – Longitud 73°37'15 W		

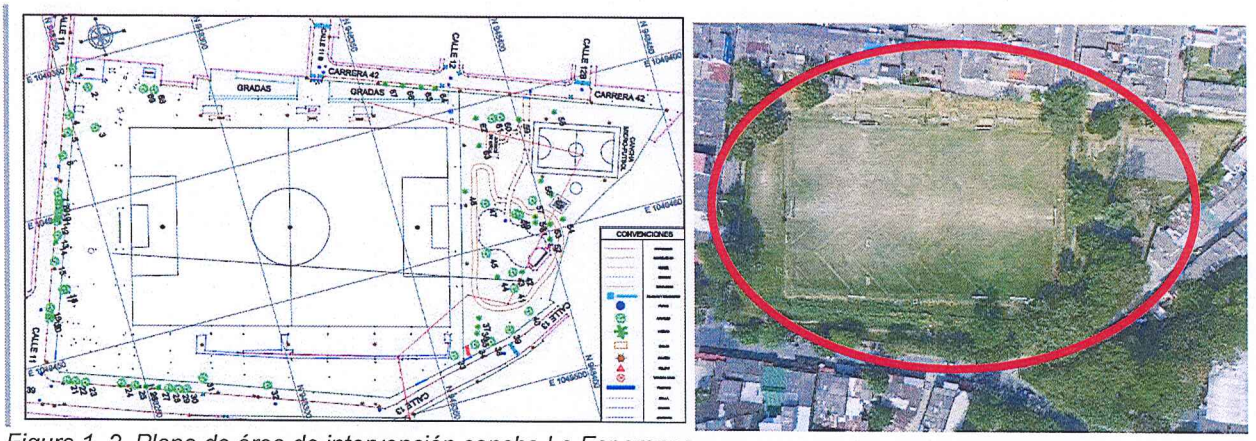


Figura 1, 2. Plano de área de intervención cancha La Esperanza.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	BARRIO:	CATATUMBO
COMUNA:	Comuna 5, Carrera 19 No. 21-22		
COORDENADAS:	Latitud 4°07'41.51 N – Longitud 73°37'54.74 W		

El parque Sikuany se encuentra ubicado en la comuna 5, carrera 19 No. 21 – 122, limita con el barrio Catatumbo, Bello Horizonte, Cantarrana.


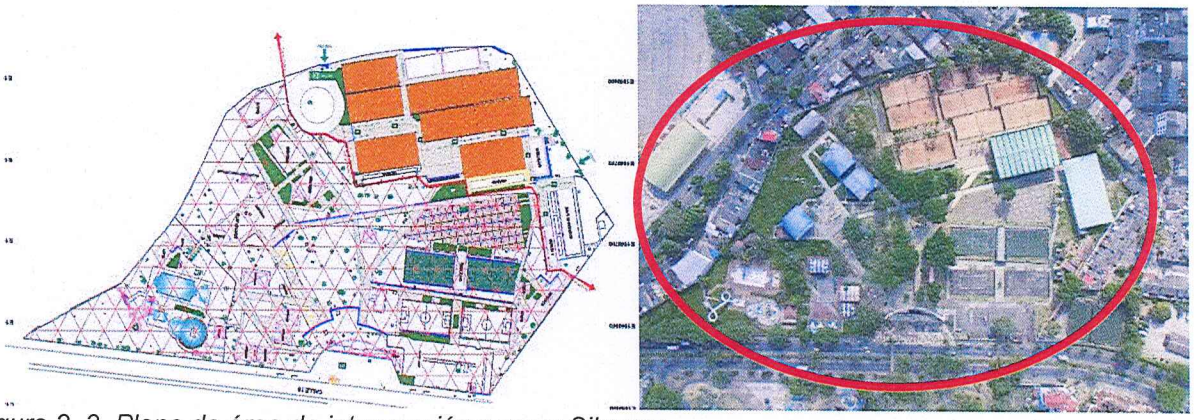


Figura 2, 3. Plano de área de intervención parque Sikuany

A. INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

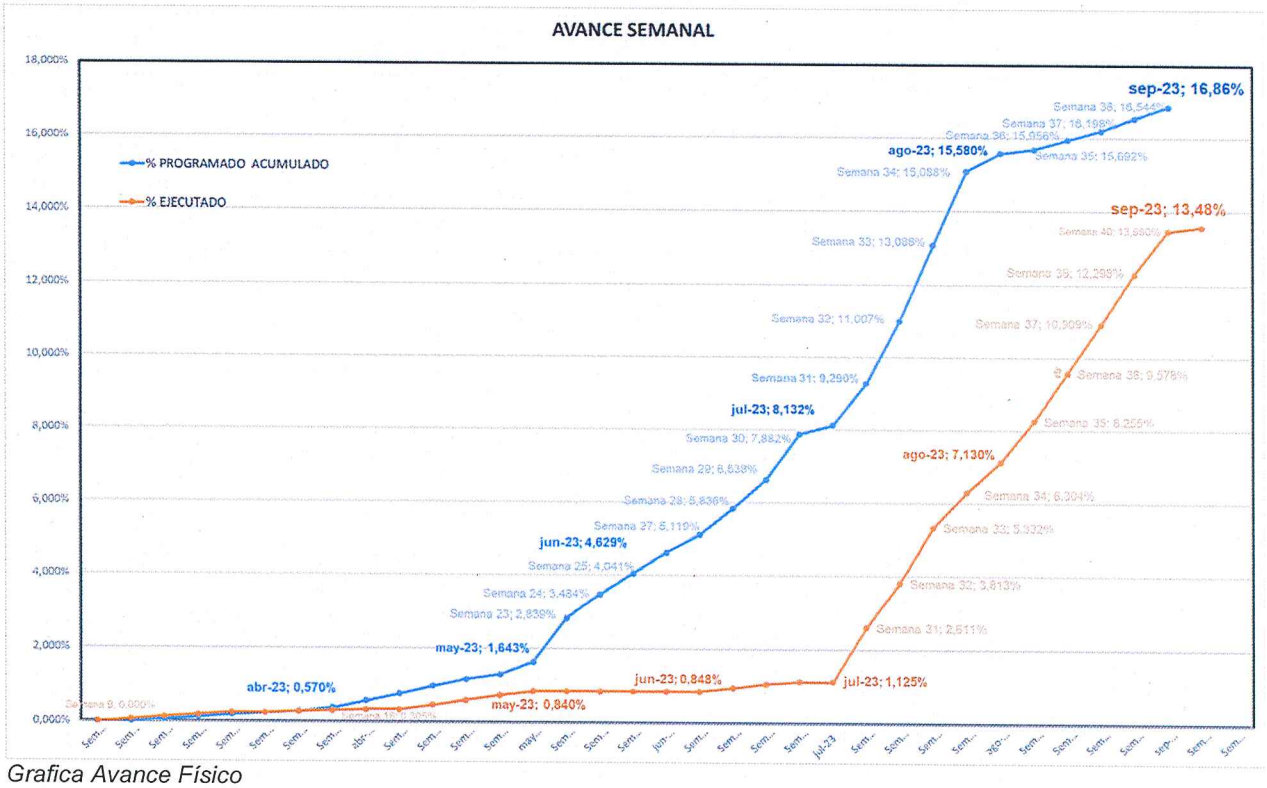

Grafica Avance Físico

OBSERVACIONES CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA:

Como se puede observar durante el periodo de tiempo comprendido entre marzo a octubre se tiene un avance ejecutado acumulado de 13.48% frente a un programado del 16.86%, teniendo una atraso de 3.38%, atraso que se ha visto reflejado en factores tales como las lluvias, mayores y nuevas actividades que están siendo sujeto de trámite de modificación y que no se ven reflejadas en esta acta de cobro parcial, además si se analiza la gráfica de avance desde el mes de julio a septiembre se presenta un avance positivo sostenido del 6.18%.

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

CORRESPONDENCIA ENVIADA MARZO 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
02/03/2023	CNT 07 - 2023	Entrega de documentación Contrato de Obra No. 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
02/03/2023	CNT 08 - 2023	Relación de obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
02/03/2023	CNT 09 - 2023	Requerimiento actualización de pólizas de acuerdo con acta de inicio de obra del 01 de marzo del 2023	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
03/03/2023	CNT 10 - 2023	Solicitud acta de inicio en SECOP II	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
03/03/2023	CNT 11 - 2023	Se envía formatos remitidos por IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
03/03/2023	CNT 12 - 2023	Comité de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
10/03/2023	CNT 13 - 2023	Homologación de personal	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
13/03/2023	CNT 14 - 2023	Actualización de pólizas Interventoría y Obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
13/03/2023	CNT 15 - 2023	Documentación para anticipo	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
15/02/2023	CNT 16 - 2023	Cumplimiento requisitos contractuales	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
16/02/2023	CNT 17 - 2023	Suspensión actividades de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
23/03/2023	CNT 18 - 2023	Actualización de pólizas Interventoría	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA MARZO 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
02/03/2023	Correo Electrónico	Solicitud acta de inicio	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
03/03/2023	Correo Electrónico	Aprobación de formatos de actas de vecindad	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
06/03/2023	CE-CVO-004-2023	Solicitud de modificación de contrato	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
06/03/2023	PL-120-101	Remisión Registro Presupuestal	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
08/03/2023	Correo Electrónico	Solicitud de diseño Valla Informativa	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
10/03/2023	CE-CVO-004-2023	Envió de pólizas actualizadas. Póliza de cumplimiento N° SGPL-7157897-1 y de responsabilidad civil N° LBCO-71580652-1 del contrato de obra No. 963 de 2022	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
16/03/2023	Correo Electrónico	Remisión formatos de contratación actualizados para trámites administrativos de obra e interventoría	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
16/03/2023	PL-120-121	Oficio No. CNT-14-2023 del 13 de marzo de 2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
27/03/2023	CE-CVO-007-2023	Contestación a su requerimiento con consecutivo CNT-16- 2023	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
28/03/2023	CE-CVO-008-2023	Contestación a su requerimiento con consecutivo CNT-16- 2023	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

CORRESPONDENCIA ENVIADA ABRIL 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
10/04/2023	CNT 21 - 2023	Respuesta conforme al oficio CE-CVO-015--2023	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
12/04/2023	CNT 22 - 2023	Correcciones al informe mes de marzo	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
15/04/2023	CNT 23 - 2023	Disposición final de residuos en frentes de trabajo contrato de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
21/04/2023	CNT 24 - 2023	Desarrollo a la fecha de compromisos adquiridos en el comité celebrado el 12/04/2023	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
21/04/2023	CNT 25 - 2023	Desarrollo a la fecha de compromisos adquiridos en el comité celebrado el 12/04/2023	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
22/04/2023	CNT 26 – 2023	Plan de contingencia contrato de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
22/04/2023	CNT 27 - 2023	Respuesta oficio PPL-120-173	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
26/04/2023	CNT 28 – 2023	Entrega informe número uno con correcciones	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
28/04/2023	CNT 29 – 2023	Solicitud entrega informe de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
28/04/2023	CNT 30 - 2023	Incumplimiento obligaciones del contrato de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
28/04/2023	CNT 31 - 2023	Solicitud lineamientos para informe de gestión de interventoría	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
28/04/2023	CORRESPONDENCIA	Notificación cambio de Representación Legal	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA ABRIL 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
04/04/2023	CE-CVO-015-2023	Contestación a su requerimiento con consecutivo CNT – 20-2023	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
04/04/2023	OF – 17 - 2023	Cumplimiento formato 12	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
04/04/2023	CE-CVO-016-2023	Plan de manejo integral de residuos sólidos	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
10/04/2023	PL-120-146	Comité de seguimiento	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
11/04/2023	PL-120-156	Notificación acta de aprobación cambio de personal	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
13/04/2023	CE-CVO-019-2023	Revisión de diseño estructural	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
13/04/2023	CE-CVO-020-2023	Tramites empresa Llanogas S.S. E.S.P.	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
13/04/2023	CE-CVO-022-2023	Tramites electrificadora del Meta S.A. E.S.P.	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
14/04/2023	CE-CVO-023-2023	Entrega hojas de vida personal ofertado	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/04/2023	CE-CVO-024-2023	Entrega informe del mes de marzo corregido	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/04/2023	CE-CVO-025-2023	Solicitud de visita	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
17/04/2023	CE-CVO-026-2023	Cumplimiento de los aportes parafiscales	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/04/2023	PL-120-173	Obligaciones contrato de interventoría	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/04/2023	CE-CVO-027-2023	Entrega plan de inversión del anticipo	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
26/04/2023	DG 100 – 168	Seguimiento de cumplimiento de obligaciones contrato de interventoría	DIRECTOR IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
26/04/2023	CE-CVO-028-2023	Entrega plan de inversión del anticipo	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
26/04/2023	CE-CVO-029-2023	Entrega de ajustes a los diseños hidráulicos, eléctricos, topografía y PMT parque Sikuany y cancha de la Esperanza	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/04/2023	CIRCULAR N° 002 DE 2023	Adopción formatos implementados de la agencia para la infraestructura del Meta "AIM" para tramites precontractuales, contractuales, y poscontractuales en el Idermeta	OFICINA ASESORA DE PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
28/04/2023	CIRCULAR N° 011 DE 2023	Capacitación marco legal en los procesos de contratación del personal de obra. En lo que corresponde al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/04/2023	CE-CVO-030-2023	Afiliación personal	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/04/2023	CE-CVO-031-2023	Trazabilidad de servicios públicos y plan de manejo de transito PMT	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/04/2023	CE-CVO-032-2023	Entrega APU´S	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/04/2023	CE-CVO-033-2023	Información retraso de actividades de obra	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/04/2023	CE-CVO-034-2023	Entrega de documentación para pago de anticipo	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
03/05/2023	CNT 32-2023	Programación de obra.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
03/05/2023	CNT 33-2023	Respuesta oficio DG 100-18.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
04/05/2023	CNT 34-2023	Entrega de documentación necesaria para pago anticipo contrato de obra No.963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
04/05/2023	CNT 35-2023	Entrega informe de gestión. Interventoría No. 1	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
09/05/2023	CNT 36-2023	Concepto revisión estructural	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS
09/05/2023	CNT 37-2023	Comité mensual seguimiento de actividades de oba	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS
09/05/2023	CNT 38–2023	Obligaciones contrato de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
09/05/2023	CNT 39-2023	Aprobación de giros y manejo de recursos del anticipo, contrato de obra. 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
10/05/2023	CNT 40–2023	Entrega informe No. 2	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
10/06/2023	CNT 41–2023	Entrega de informe de gestión de interventoría No. 2	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
15/05/2023	CNT 42-2023	Información documentos radicados	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
16/05/2023	CNT 43-2023	Comité obra e interventoría	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
16/05/2023	CNT 44-2023	Entrega programación físico	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
16/05/2023	CNT 45-2023	Respuesta oficio CE-CVO-040-2023 radica por consorcio espacios deportivos	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
19/05/2023	CNT 46-2023	Anticipo de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
23/05/2023	CNT 47-2023	Concepto revisión estructural modulo graderías basquetbol	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
24/05/2023	CNT 48-2023	Concepto revisión hidráulico	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
27/05/2023	CNT 49–2023	Seguimiento a compromisos del contrato de obra No. 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
30/05/2023	CNT 50-2023	Correcciones informes mensuales según	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		E-mail del 18 de mayo de 2023		
30/05/2023	CNT 51-2023	Homologación director de interventoría	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA MAYO 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
03/05/2023	PL-120-205	Solicitud aclaración predio cancha la esperanza	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
04/05/2023	PL – 120 - 206	Oficina S/N del 28 de abril de 2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
09/05/2023	CE-CVO-039M-2023	Entrega de documentación plan de manejo de tránsito	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
10/05/2023	CE-CVO-040-2023	Solicitud de disponibilidad del servicio de energía eléctrica en la cancha de la esperanza	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
10/05/2023	CE-CVO-041-2023	Solicitud traslado de red sanitaria cancha de la esperanza	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
11/05/2023	CE-CVO-042-2023	Reubicación línea de alcantarillado en el predio de la	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		cancha de futbol barrio la esperanza		
17/05/2023	CE-CVO-043 - 2023	Solicitud aprovechamiento forestal	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
17/05/2023	PL – 120 - 229	Respuesta radicado 876 del 04 de mayo de 2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
18/05/2023	PL-120-231	Respuesta oficio CE-CVO-41-2023 del 10 de mayo de 2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
18/05/2023	PL-120-230	Respuesta oficio CNT 42-2023 del 15 de mayo de 2023.	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
19/05/2023	CE-CVO-44M-2023	Entrega anexo del plan de inversión Anticipo	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
23/05/2023	CVO-046-2023	Documentación ZODME	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
25/05/2023	PL-120-239	Remisión oficio GD-202340001473441	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
26/05/2023	CE-CVO-047M-2023	Solicitud entrega del inmueble Spa.	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	PLANEACIÓN IDERMETA
27/05/2023	CE-CVO-049M-2023	Entrega APU'S. correspondientes a la modificatoria de obra No.1	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
29/05/2023	CE-CVO-050M-2023	Cambio director de proyecto	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
29/05/2023	CE-CVO-051M-2023	Respuesta oficio CNT 49-2023. Seguimiento al contrato	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
30/05/2023	PL-120-241	Derecho de petición, remisión 111-07-01-199 del 10 de mayo de 2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
30/05/2023	CE-CVO-052-2023	Entrega diseño cancha sintética futbol 5	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
30/05/2023	CE-CVO-053-2023	Entrega de diseños cancha la esperanza y parqueadero	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
30/05/2023	CE-CVO-054-2023	Entrega diseño parqueadero en concreto hidráulico	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

CORRESPONDENCIA ENVIADA JUNIO 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/06/2023	CNT 52 - 2023	Obligaciones específicas del contratista- contrato de obra 963 - 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
02/06/2023	CNT 53 - 2023	Entrega de viabilidad plan de manejo de transito del parque Sikuany y cancha de la Esperanza	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
05/06/2023	CNT 54 - 2023	Respuesta derecho petición PL – 120 - 241	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
06/06/2023	CNT 55 – 2023	Correcciones diseños y cumplimientos, compromisos adquiridos	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
07/06/2023	CNT 56 - 2023	Entrega de Informe de Interventoría con correcciones	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
07/06/2023	CNT 57 – 2023	Entrega de Informe de Gestión de Interventoría con correcciones	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
07/06/2023	CNT 58 - 2023	Solicitud de informes	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
09/06/2023	CNT 59 – 2023	Respuesta al oficio PL – 120 – 258 Entrega del Informe	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
09/06/2023	CNT 60 – 2023	Revisión y autorización de orden de giro N° 1	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
09/06/2023	CNT 61 - 2023	Revisión y autorización de orden de giro ZODME	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
09/06/2023	CNT 62 – 2023	Solicitud actas de vecindad	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
20/06/2023	CNT 63 – 2023	Solicitud actas de vecindad adicionales	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
20/06/2023	CNT 64 – 2023	Lista de chequeo tramite de modificación	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
22/06/2023	CNT 65 – 2023	Entrega de informes de gestión de interventoría	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
22/06/2023	CNT 66 – 2023	Entrega de informe de interventoría	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
22/06/2023	CNT 67 – 2023	Entrega de informe de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
22/06/2023	CNT 68 – 2023	Concepto de revisión Eléctrico	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
22/06/2023	CNT 69 – 2023	Revisión diseños estructural	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
22/06/2023	CNT 70 – 2023	Respuesta al oficio No. PL – 120 – 252	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
22/06/2023	CNT 71 – 2023	Estado de tramite actualización de licencia y revisión de diseños	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
23/06/2023	CNT 72 – 2023	Entrega hoja de vida director de interventoría-Cambio	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
29/06/2023	CNT 72A – 2023	Autorización ingreso de personal de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
29/06/2023	CNT 73 – 2023	Solicitud mesa de trabajo jurídica	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
30/06/2023	CNT 74 – 2023	Limpieza vías aledañas frente la Esperanza	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
30/06/2023	CNT 75 – 2023	Solicitud retiro material sobrante	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA JUNIO 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
02/06/2023	CE-CVO-057M-2023	Entrega diseño cancha de tenis	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
05/06/2023	PL-120-252	Comité de Obra	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
07/06/2023	PL 120 – 258	Solicitud de informe	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
07/06/2023	PL 120 – 259	Respuesta radicada 1326 del 30 de mayo de 2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
07/06/2023	PL-120-260	Respuesta radicados 1260 y 1268 del 29 de mayo de 2023 referencia: oficio CE-CVO-047M-2023 del 10 de mayo	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
08/06/2023	CVO-060-2023	Plan de Manejo Ambiental	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
09/06/2023	CVO-062-2023	Orden de giros de fiducia	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
15/06/2023	CE-CVO-061-2023	Respuesta oficio CNT 58-2023	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
20/06/2023	CE-CVO-067M-2023	Lista de chequeo	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
21/06/2023	CE-CVO-063-2023	Informe mes de mayo	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
22/06/2023	PL – 120-252	Oficio CNT – 64 – 2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
22/06/2023	PL – 120 – 278	Obligación contractual – Informes mensuales de obra y de gestión de interventoría.	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
23/06/2023	PL- 120-281	Respuesta radicado N° 1325 del 30 de mayo de 2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
23/06/2023	PL -120- 282	Información y control de comunicaciones y oficios	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
23/06/2023	PL - 120 - 284	Solicitud de informes del mes de mayo	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
23/06/2023	PL - 120- 285	Solicitud información para revisión de informes de interventoría	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
28/06/2023	CVO-068-2023	Giros de fiducia	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/06/2023	CVO-069-2023	Giros de fiducia	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/06/2023	CVO-070-2023	Actas de vecindad	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
29/06/2023	PL- 120 – 296	Respuesta radicada 1716 del 26 de junio de 2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
29/06/2023	DG-100-263	Solicitud modificación del contrato y autorización para subcontratar	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
04/07/2023	CNT 76-2023	PAQUETE MODIFICACIÓN N°1	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
04/07/2023	CNT 77-2023	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
04/07/2023	CNT 78-2023	OFICIO ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
06/07/2023	CNT 79-2023	CONCEPTO REVISIÓN HIDRÁULICO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
11/07/2023	CNT 80-2023	LIMPIEZA DE VIAS ALEDAÑAS FRENTE DE TRABAJO CANCHA LA ESPERANZA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
14/07/2023	CNT 81-2023	CORRECCIÓN INFORME GESTION DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
15/07/2023	CNT 82-2023	OBLIGACIONES CONTRACTUALES MANEJO PMT	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
17/07/2023	CNT 83-2023	DISEÑO DE MURO CERRAMIENTO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
17/07/2023	CNT 84-2023	OBSERVACIONES INFORME DE INTERVENTORIA MARZO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
18/07/2023	CNT 85-2023	CONCEPTO REVISIÓN ESTRUCTURAL MODULO CUBIERTA BASQUETBALL	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
18/07/2023	CNT 86-2023	AJUSTE LICENCIA DE CONSTRUCCION PARQUE SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
19/07/2023	CNT 87-2023	MANEJO DEL ANTICIPO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
21/07/2023	CNT 88-2023	CORRECCIÓN PAQUETE MODIFICACIÓN Nº1	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
25/07/2023	CNT 89-2023	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN PL120-336	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
24/07/2023	CNT 90-2023	REQUISICIÓN DE DOCUMENTOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
25/07/2023	CNT 91-2023	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE CANTIDADES CANCHA LA ESPERANZA Y PARQUE SIKUANI	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
25/07/2023	CNT 92-2023	RESPUESTA OFICIO PL-120-336	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
25/07/2023	CNT 93-2023	INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
26/07/2023	CNT 94-2023	ENTREGA DE INFORME DE GESTION DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
26/07/2023	CNT 95-2023	ENTREGA DE INFORME	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		MENSUAL DE INTERVENTORÍA		
26/07/2023	CNT 96-2023	SOLICITUD PLAN DE CONTIGENCIA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
31/07/2023	CNT 97-2023	SOLICTUD DE INFORME OBRA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA JULIO 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
05/07/2023	CE-CVO-076M-2023	ENTREGA DE IMPLANTACIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
05/07/2023	CE-CVO-077M-2023	ENTREGA DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAS EDIFICACIONES	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
05/07/2023	CE-CVO-078M-2023	ENTREGA GESTIÓN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
05/07/2023	PL-120-303	COMITÉ DE OBRA	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
07/07/2023	CE-CVO-079-2023	ENTREGA DISEÑOS Y PLANIMETRÍA PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
07/07/2023	CE-CVO-080-2023	EVIDENCIA DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DEL PMT PARA INCLUIR A ZODME GUATIQUIA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
12/07/2023	PL-120-321	CONCEPTO 05/2023-CONSORCIO BORRERO MARTIN ABOGADOS	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
13/07/2023	CE-CVO-082-2023	GIROS DE FIDUCIA. GUÍA N° 9	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
14/07/2023	PL-120-326	TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
14/07/2023	PL-120-331	RESPUESTA OFICIO CE-CVO-83-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
15/07/2023	CE-CVO-084-2023	SOLICITUD DISEÑO DE MURO CERRAMIENTO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/07/2023	CE-CVO-085-2023	INFORME MES DE JUNIO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/07/2023	CE-CVO-85-2023	ENTREGA DE LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/07/2023	CE-CVO-086-2023	ENTREGA DISEÑOS DE MEZCLA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/07/2023	CE-CVO-087-2023	RESPUESTA AL OFICIO N° S/N DEL 11/07/2023	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/07/2023	PL-120-336	MANEJO DEL ANTICIPO	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/07/2023	PL-120-337	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
17/07/2023	PL-120-338	EJERCICIO DE LAS OBLIGACIONES DE INTERVENTORÍA	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
18/07/2023	CE-CVO-082-2023	GIROS FIDUCIA N° 9 (CORRECCIÓN)	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
19/07/2023	CE-CVO-088-2023	ENTREGA DE PERMISOS DE EXPLOTACIÓN MINERA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
21/07/2023	PL-120-357	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA Y VISITA DE OBRA	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
25/07/2023	CE-CVO-090-2023	INFORME DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
25/07/2023	CE-CVO-091-2023	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
25/07/2023	CE-CVO-092-2023	ENTREGA DE CORRECCIONES REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ACTA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NUEVOS Y ADICIÓN DE RECURSOS	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
25/07/2023	CE-CVO-093-2023	PROTOCOLO LIMPIEZA VIAL	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
26/07/2023	CE-CVO-094-2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/07/2023	CE-CVO-095-2023	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/07/2023	CVO-097-2023	GIROS DE FIDUCIA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/07/2023	CVO-100-2023	DOCUMENTO ACTIVIDAD DE COMPENSACION	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
31/07/2023	CVO-101-2023	PROCEDIMIENTO PODA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
31/07/2023	CVO-102-2023	ALCANCE AL OFICIO CVO-101-2023 CON RADICADO 31/07/2023 HOREA: 11:33 AM, TALA RAZA DE INDIVIDUOS ARBOREOS DEL PARQUE SIKUANI	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
31/07/2023	CE-CVO-103-2023	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

CORRESPONDENCIA ENVIADA AGOSTO 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/08/2023	CNT 98 -2023	ENTREGA PAQUETE MODIFICACION N° 1	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
01/08/2023	CNT 99 -2023	DIRECTRICES Y CUMPLIMIENTO PARAMETROS SST	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
03/08/2023	CNT 100 -2023	RESPUESTA OFICIO PL-120-375 (01/08/2023) Y ENTREGA INFORMES MES DE MARZO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
02/08/2023	CNT 101 -2023	SOLICITUD ENTREGA INFORME MENSUAL	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
09/08/2023	CNT 102 -2023	COMITÉ DE OBRA SIKUANI	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
09/08/2023	CNT 103-2023	COMITÉ DE OBRA ESPERANZA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
10/08/2023	CNT 104 -2023	SOLICITUD DE APALAZAMIENTO COMITÉ TECNICO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
10/08/2023	CORRESPONDENCIA	DEVOLUCION INFORME FINANCIERO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
10/08/2023	CNT 105 -2023	RESPUESTA OFICIO PL-120-399 CERTIFICACION	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		BANCARIA PARA ANTICIPO Y PL-120-336 MANEJO DEL ANTICIPO		PLANEACION IDERMETA
11/08/2023	CNT 106-2023	DEVOLUCION INFORMES DE OBRA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
15/08/2023	CNT 107 -2023	ENTREGA INFORME FINANCIERO INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANECION IDERMETA
15/08/2023	CNT 108 -2023	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
16/08/2023	CNT 109 -2023	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
16/08/2023	CNT 110 -2023	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
17/08/2023	CNT 111 -2023	ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
17/08/2023	CNT 112 -2023	ATENCION ANTE EVENTO SISMICO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
26/08/2023	CNT 113 -2023	CONCEPTO REVISION ESTRUCTURAL MODULO TANQUE	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
28/08/2023	CNT 114 -2023	RESPUESTA INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ANTICIPO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
28/08/2023	CNT 115 -2023	RESPUESTA AL OFICIO PL-120-423 OBSERVACIONES DE LA MODIFICATORIA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
28/08/2023	CNT 116 -2023	RESPUESTA DERECHO DE PETICION	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	MARIA YOLANDA FLORES JIMENEZ
29/08/2023	CNT 117 -2023	SOLICITUD APROBACION INFORMES MARZO Y ABRIL COMUNICADOS RADICADOS CNT 100 -2023 DEL 09 DE AGOSTO, CNT 108 -2023 Y CNT 109 -2023 DEL 16 DE AGOSTO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
29/08/2023	CNT 118 – 2023	SOLICITUD LISTA DE CHEQUEO PARA MODIFICATORIA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
29/08/2023	CNT 119 -2023	COMPROMISOS PACTADOS EN COMITES DEL MES DE AGOSTO	CONSORCIO INTEDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
29/08/2023	CNT 120 -2023	REQUERIMIENTOS TECNICOS OBRA PARQUE SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
30/08/2023	CNT 121 -2023	SOLICITUD RADICACION INFORMES SEGUIMIENTO PMT SEGÚN VIABOILIDAD RADICADA N° 003216 DE 17 DE MARZO Y VIABILIDAD RADICADA n°. 003217 DE 17 DE MARZO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
30/08/2023	CNT 122 -2023	OBSERVACIONES TECNICAS A LA SOLICITUD DE MODIFICATORIA DE OBRA N° 1	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
30/08/2023	CNT 123 -2023	SOLICITUD DOCUMENTACION DE RETIRO PERSONAL A LA FECHA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA AGOSTO 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/08/2023	PL-120-373	RESPUESTA AL OFICIO CNT 93-2023 DEL 25/07/2023	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
01/08/2023	PL-120-374	RESPUESTA RADICADO N°. 2202 2201 DEL 25 DE JULIO DE 2023 INFORMES DE INTERVENTORIA	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		DEL MES DE EJECUCION DE JUNIO DE 2023		
01/08/2023	PL-120-375	RESPUESTA AL RADICADO N° 2060 DEL 14 DE JULIO 2023 Y 2078 DEL 17 DE JULIO DE 2023 INFORMES DE INTERVENTORIA DEL MES DE EJECUCION DE MARZO DE 2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
01/08/2023	CE-CVO-099-2023	APROBACION SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
01/08/2023	CE-CVO-104-2023	ENTREGA DE CORRECIONES REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE SOLICITUD DE APROBACION DEL ACTA MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NUEVOS Y ADICION DE RECURSOS	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
02/08/2023	PL-120-378	RESPUESTA OFICIO N° CNT 92 – 2023 DEL 25/07/2023	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
03/08/2023	PL-120-379	RESPUESTA RADICADO N° 1682, 1683 Y 1684 DEL 22 DE JUNIO DE 2023 INFORMES DE INTERVENTORIA Y DE OBRA DEL MES DE EJECUCION DE MAYO DE 2023	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
03/08/2023	CE-CVO-105-2023	SOLICITUD DE INFORMACION ASCTAS DE VECINDAD	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
03/08/2023	CE-CVO-0106M-2023	CORRECCIONES DEL INFORME DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
03/08/2023	CE-CVO-0107M-2023	INFORME N°. 2 DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
03/08/2023	CE-CVO-108-2023	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
04/08/2023	CE-CVO-0109M-2023	ENTREGA INFORMES MES DE JULIO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
08/08/2023	CE-CVO-110-2023	RESPUESTA AL OFICIO N°. S/N DEL 18/07/2023	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
09/08/2023	PL-120-381	RESPUESTA AL OFICIO 2180 DEL 25 DE JULIO DE 2023	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
09/08/2023	PL-120-399	REMISION CERTIFICACION BANCARIA PARA ANTICIPO RECURSOS ASIGNACIONES DIRECTAS	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
09/08/2023	CE-CVO-111-2023	RESPUESTA OFICIO CNT 96-2023. SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
10/08/2023	PL-120-405	SOPORTE DE PAGO MODIFICACION LIC. SIKUANI	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
11/08/2023	PL-120-401	CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
14/08/2023	PL-120-408	REPROGRAMACION COMITÉ DE OBRA	PLANEACION IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
16/08/2023	CVO-114-2023	GIROS FIDUCIA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
23/08/2023	CE-CVO-117-2023	PAGO DE TRANSPORTES EN RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LA EXCAVASION	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
25/08/2023	CE-CVO-117-2023	IMPREVISTOS DE OBRA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
26/08/2023	CE-CVO-118-2023	IMPREVISTOS DE OBRA N° 1	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
26/08/2023	CE-CVO-119-2023	IMPREVISTOS DE OBRA Y PLAN DE TRABAJO PERIODO DEL 22-08-2023 AL 26-08-2023	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/08/2023	PL-120-423	OBSERVACIONES TECNICAS A LA SOLICITUD DE MODIFICATORIA DE OBRA N°. 1, RADICADO N° 2277 DEL 01 DE AGOSTO DE 2023	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/08/2023	CE-CVO-120-2023	IMPREVISTOS DE OBRA N°2	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
29/08/2023	CVO-121-2023	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
30/08/2023	CE-CVO-122-2023	REQUERIMIENTOS TECNICOS CNT 120-2023	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
04/09/2023	CNT 124 -2023	OBSERVACIONES INFORME MES DE MARZO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
04/09/2023	CNT 125 -2023	RESPUESTA OFICIO PL-120-436 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
08/09/2023	CNT 126 -2023	ENTREGA INFORMES MES DE MAYO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
08/09/2023	CNT 127 -2023	ENTREGA INFORME MENSUAL N° 1 (MARZO DE 2023) – CORRECCIONES	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
11/09/2023	CNT 128 -2023	SOLICITUD ACTAS DE RETIRO DE ELEMENTOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
12/09/2023	CNT 129-2023	MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA N°. 963 DE 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
12/09/2023	CNT 130 -2023	CONCEPTO REVISION HIDRAULICO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
12/09/2023	CNT 131 -2023	OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTAL Y SST DEL INFORME DE OBRA DEL MES DE JUNIO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
13/09/2023	CNT 132 -2023	RESPUESTA OFICIO CVO-121-2023 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
13/09/2023	CNT 133-2023	DEVOLUCION INFORMES DE JULIO CON OBSERVACIONES	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
13/09/2023	CNT 134 -2023	DEVOLUCION INFORME FINANCIERO CON OBSERVACIONES	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
15/09/2023	CNT 135 -2023	ACLARACION DISEÑOS PLUVIALES	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
18/09/2023	CNT 136 -2023	INSTALACION Y ACABADOS SARDINEL PREFABRICADO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
25/09/2023	CNT 137 -2023	CONCEPTO REVISIÓN ESTRUCTURAL MODULO CUBIERTA TENIS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
25/09/2023	CNT 138 -2023	GESTIÓN TRÁMITE MODIFICATORIA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
26/09/2023	CNT 139 -2023	ENTREGA INFORME FINANCIERO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA
26/09/2023	CNT 140 -2023	CONTESTACION OFICIO CONTRATISTA N° CE-CVO-139-2023	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
27/09/2023	CNT 141 -2023	RESPUESTA AL OFICIO N°. [DG- 100 - 374 DEL 18/09/2023] TRAMITE MODIFICATORIO DE OBRA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
27/09/2023	CNT 142 -2023	MODULO MURO DE CONTENCION	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
27/09/2023	CNT 143 -2023	CONTESTACION OFICIO CONTRATISTA N°. CE-CVO-146-2023	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
27/09/2023	CNT 144 -2023	PROCESOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
28/09/2023	CNT 145 -2023	DEVOLUCION INFORME DE JUNIO CON OBSERVACIONES	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA SEPTIEMBRE 2023

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/09/2023	PL-120-434	RESPUESTA AL RADICADO N° 2380 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
01/09/2023	PL-120-436	RESPUESTA AL RADICADO N° 2590 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
01/09/2023	DG-100-355	RESPUESTA AL RADICADO N° 2588 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023	DIRECTOR IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
02/09/2023	CE-CVO-124-2023	ENTREGA INFORME DE OBRA MES DE JULIO CORREGIDO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
05/09/2023	PL-120-442	RESPUESTA AL RADICADO N° 2460 DEL 16 DE AGOSTO DE 2023	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
07/09/2023	PL-120-443	RESPUESTA AL OFICIO N° CNT 114-2023 CON RADICADO 2587 DEL 29/08/2023	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
07/09/2023	CE-CVO-128-2023	ENVIO INFORME MENSUAL N° 1 (MARZO DE 2023) CORRECCIONES	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
07/09/2023	CE-CVO-129-2023	ENVIO INFORME MENSUAL N° 1 (MAYO DE 2023) CORRECCIONES	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
07/09/2023	CE-CVO-136-2023	ENVIO INFORME PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO N°. 3 (AGOSTO 2023)	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
08/09/2023	CE-CVO-130-2023	ENVIO INFORME MENSUAL N° 6	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
11/09/2023	DG-100-367	MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA N° 963 DE 2022	DIRECTOR IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
12/09/2023	CORREO	REUNION PLANEACION DEPARTAMENTAL	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
13/09/2023	CVO-131-2023	PRESUPUESTO AMBIENTAL CANCHA DE FUTBOL LA ESPERANZA Y PARQUE SIKUANI	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
15/09/2023	CE-CVO-132-2023	ENVIO CORRECCIONBES INFORMES FINANCIEROS DE JUNIO Y JULIO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
18/09/2023	CE-CVO-133-2023	GIROS DE FIDUCIA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
18/09/2023	CE-CVO-134-2023	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
18/09/2023	CE-CVO-135-2023	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS, CRONOGRAMA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
20/09/2023	PL-120-455	INFORMACION GENERAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICATORIA DE CONTRATO DE OBRA	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
20/09/2023	PL-120-459	RESPUESTA AL RADICADO N° 2461 Y 2462 DEL 16 DE AGOSTO DE 2023	PLANEACIÓN IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
21/09/2023	CE-CVO-137-2023	ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		SOCIAL AGOSTO – SEPTIEMBRE DE 2023		
21/09/2023	CVO-138-2023	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PRESUPUESTO AMBIENTAL CANCHA DE FUTBOL ESPERANZA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
25/09/2023	CE-CVO-139-2023	ENVIO DE INFORMACION Y SOLICITUD	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
25/09/2023	CE-CVO-141-2023	ENTREGA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
25/09/2023	CE-CVO-142-2023	ENTREGA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
26/09/2023	CE-CVO-144-2023	INSUMOS COMPONENTE ELECTRICO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
26/09/2023	CVO-145-2023	PLAN DE MANEJO AMBIUENTAL ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
27/09/2023	CE-CVO-146-2023	ENTREGA DOCUMENTOS MODIFICATORIA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
28/09/2023	CE-CVO-147-2023	CONTESTACION A SU OFICIO CNT-142-2023	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/09/2023	CE-CVO-148-2023	GIROS DE FIDUCIA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/09/2023	CE-CVO-149-2023	ENTREGA APUS ELECTRICOS SIKUANI	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/09/2023	CVO-149-2023	PRESUPUESTO AMBIENTAL	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/09/2023	CE-CVO-150-2023	ENTREGA DOCUMENTOS SOPORTE MODIFICATORIA DE OBRA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
28/09/2023	DG-100-388	RESPUESTA AL RADICADO 3062, OFICIO N°. CNT 141-2023 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DIRECTOR IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
29/09/2023	CE-CVO-151-2023	ENTREGA INFORMES JUNIO Y JULIO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
29/09/2023	CE-CVO-151-2023	ENTREGA INFORMES JUNIO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
29/09/2023	CE-CVO-152-2023	ENTREGA INFORMES JULIO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
29/09/2023	CE-CVO-153-2023	ENTREGA DOCUMETOS SOPORTE MODIFICATORIA DE OBRA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
29/09/2023	CE-CVO-154-2023	ENTREGA INFORME DE AGOSTO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
29/09/2023	CE-CVO-155-2023	ENTREGA INFORMES MENSUALES IMPLEMENTCION AMBIENTAL	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTAS DE COMITE

FECHA	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/03/2023	Acta de Comité técnico para Entrega de documentación	Entrega de documentación (planos, presupuesto y memorias de cálculo)	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
01/03/2023	Acta de Socialización del proyecto de Obra	Socialización del proyecto: aspectos generales, técnicos, ambientales y gestión social.	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	PLANEACION IDERMETA
