FECHA	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/03/2023	Acta de Aprobación Personal de Obra	Revisión y aprobación de las hojas de vida del personal de obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
06/03/2023	Acta de Reunión para Entrega de los escenarios parque Sikuany	Entrega de los escenarios parque Sikuany Contrato de Obra No. 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
06/03/2023	Acta de Reunión para Entrega de los escenarios cancha de la Esperanza	Entrega de los escenarios cancha de la Esperanza Contrato de Obra No. 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
08/03/2023	Acta Modificatoria N°1 del Contrato de Consultoría N°001 de 2023	Modificatoria de la Clausula octava (8ª) del contrato de consultoría N°001 de 2023.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
12/04/2023	Acta de comité técnico	Comité de seguimiento	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
19/04/2023	Acta de comité técnico	Revisión y actualización de los diseños estructurales	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
26/04/2023	Acta de Reunión para entrega de materiales	Entrega de juegos del parque sikuany,	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
03/05/2023	Acta de comité técnico	Comité técnico obra e interventoría	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
11/05/2023	Acta de comité técnico	Comité técnico seguimiento proyecto Sikuany y cancha La Esperanza	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
17/05/2023	Acta de comité técnico	Comité técnico interventoría y obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
24//05/2023	Acta de comité técnico	Seguimiento obra Sikuany y cancha Esperanza	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
26/05/2023	Acta de comité técnico	Comité técnico provisional eléctrica y mantenimiento de transformador Sikuany	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
08/06/2023	Acta de comité técnico	Comité técnico seguimiento proyecto Sikuany y cancha La Esperanza	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
15/06/2023	Acta de comité técnico	Comité técnico obra e interventoría	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
29/06/2023	Acta de comité técnico	Comité técnico seguimiento proyecto Sikuany y cancha La Esperanza	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
10/07/2023	Acta de Comité técnico de seguimiento	Seguimiento técnico a diversos aspectos de la obra (Generalidades, avance, modificaciones, entre otros)	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
24/07/2023	Acta de Comité técnico de verificación de avances de obra	Recorrido para verificar avance en los dos frentes de obra.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

FECHA	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
26/07/2023	Acta de Comité técnico de revisión aspectos contractuales	Revisión preliminar de diseños, documentos, aspectos técnicos, legales y modificaciones del contrato.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
16/08/2023	Acta de Comité técnico de seguimiento del contrato	Seguimiento técnico a diversos aspectos de la obra (Avance, modificatoria, gestión ambiental y SST)	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA Y CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
19/08/2023	Acta de Comité técnico de avances de obra	Revisión de aspectos técnicos, ambientales y SST del contrato de obra 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
06/09/2023	Acta de Comité técnico de seguimiento del contrato	Seguimiento técnico a gestión administrativa	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	PLANEACION IDERMETA

3. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Asesor electricista	Durante este periodo de tiempo se realizaron revisiones a los diseños entregados, las revisiones se basaron en las necesidades propias del proyecto, a las disposiciones del ministerio del deporte de acuerdo a cada escenario y a los lineamientos técnicos del RETIE y RETILAP, resultado de esta gestión se anexan el compilado de los informes emitidos en el periodo que abarca el presente documento. Es importante señalar que también se realizó la revisión de los APU´s y memorias de calculo que se entregaron para aprobación de modificación, para que de esta manera dichos documentos estuviesen acorde a cada procedimiento constructivo.
Asesor estructural	Durante este periodo de tiempo se realizaron revisiones a los diseños entregados (Sikuany), las revisiones se basaron en los planteamientos arquitectónicos de los diseños, estos fueron revisados y observados acorde a los lineamientos requerimientos estipulados en la NSR-10, se realizaron ajustes acordes a las condiciones de cada edificación y acordes a los planteamientos en sitio, resultado de esta gestión se anexan el compilado de los informes emitidos en el periodo que abarca el presente documento. Es importante señalar que también se realizó la revisión de los APU´s y memorias de calculo que se entregaron para aprobación de modificación, para que de esta manera dichos documentos estuviesen acorde a cada procedimiento constructivo.
Asesor en hidráulica	Durante este periodo de tiempo se realizaron revisiones a los diseños entregados y visitas de campo para evidenciar y corroborar que los planteamientos realizados mediante los diseños fueron acordes a las necesidades de los proyectos, ya que en el caso de Sikuany se presentan problemas con el manejo de aguasen temporada de lluvias y en el caso de la esperanza se encontraron redes de alcantarillado antiguas que afectaban los trabajos de construcción de las cancha de la esperanza, ante situaciones como estas y similares se emitieron observaciones y se realizaron las respectivas aprobaciones de los diseños de redes en ambos proyectos, de lo cual se anexan el compilado de los informes emitidos en el periodo que abarca el presente documento, así como el documento de aprobación de diseños. Es importante señalar que también se realizó la revisión de los APU´s y memorias de calculo que se entregaron para aprobación de modificación, para que de esta manera dichos documentos estuviesen acorde a cada procedimiento constructivo.
Asesor en salud ocupacional	Durante este periodo de tiempo se realizaron los seguimientos en campo sobre todas las actividades que se ejecutaron, verificando en tiempo real que todas esta se desarrollaran salvaguardando la integridad de los trabajadores verificando que los espacios de trabajo fueran seguras respecto a señalizaciones y que el personal tuviera las formaciones técnica para el desarrollo de cada actividad, así como la dotación y herramientas necesarias para cada trabajo, también se verifico que el personal estuviese amparado en cuanto a S.S. y que los protocolos documentales estuviesen ejecutándose y fueran acordes a las dinámicas de cada proyecto, de esto se anexa compilado de informes que se emitieron durante el periodo de tiempo del presente documento.
Asesor ambiental	Durante este periodo de tiempo se realizo seguimiento al plan de manejo ambiental entregado por la entidad, al mismo tiempo se trabajo conjuntamente con el constructor en el ajuste del plan de manejo ambiental que se radicara, ya que en el inicial o entregado por la entidad, existen muchas ambigüedades y procedimientos que no están acordes a los requerimientos reales de los proyectos y que dificultan un adecuado control de las actividades respecto al tema ambiental. De esto se anexa compilado de informes que se emitieron durante el periodo de tiempo del presente documento.

1. ESTADO DEL TIEMPO Afectación por lluvias

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	MARZO DE 2023																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	19,0	19,0	19,0	20,5	24,0	21,5	20,0	19,0	20,0	19,5	19,0	24,0	19,0	19,0	21,5	20,0	22,0	20,5	24,0	24,0	20,0	21,5	20,0	21,5	20,0	24,0	20,5	21,5	21,0	22,0	21,5	648
Lluvias moderadas	5,0	5,0	5,0	3,5	0,0	2,5	4,0	5,0	4,0	4,5	5,0	0,0	5,0	5,0	2,5	4,0	2,0	3,5	0,0	0,0	4,0	2,5	4,0	2,5	4,0	0,0	3,5	2,5	3,0	2,0	2,5	96
Lluvias intensas																																0
Total	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	ABRIL DE 2023																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	20,0	x	24,0	24,0	22,0	x	x	21,0	x	21,0	22,0	21,5	24,0	24,0	24,0	x	22,0	22,0	22,0	22,0	21,5	24,0	x	21,0	22,0	22,0	21,0	21,5	22,0	x		510,5
Lluvias moderadas	4,0	x	0,0	0,0	2,0	x	x	3,0	x	3,0	2,0	2,5	0,0	0,0	0,0	x	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	0,0	x	3,0	2,0	2,0	3,0	2,5	2,0	x		41,5
Lluvias intensas																																0
Total	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0		552

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Clase de tiempo	MAYO DE 2023																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	X	20,0	24,0	24,0	24,0	24,0	X	19,0	20,0	20,5	24,0	24,0	24,0	X	24,0	24,0	24,0	24,0	21,5	24,0	X	X	24,0	24,0	20,5	21,5	24,0	X	20,0	21,5	20,5	565,0
Lluvias moderadas	X	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	5,0	4,0	3,5	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	X	X	0,0	0,0	3,5	2,5	0,0	X	4,0	2,5	3,5	35
Lluvias intensas																																0
Total	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	600

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	JUNIO DE 2023																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	22,0	20,0	24,0	X	21,0	22,0	24,0	20,0	20,5	21,0	X	X	24,0	21,0	24,0	22,0	24,0	X	X	20,5	21,0	24,0	21,0	20,0	X	22,5	22,0	24,0	20,0	20,5		525,0
Lluvias moderadas	2,0	4,0	0,0	X	3,0	2,0	0,0	4,0	3,5	3,0	X	X	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	X	X	3,5	3,0	0,0	3,0	4,0	X	1,5	2,0	0,0	4,0	3,5		51
Lluvias intensas																																0
Total	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0		576

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	JULIO DE 2023																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24,0	X	X	19,5	20,5	22,0	20,0	21,0	X	19,5	22,0	22,5	22,0	21,5	23,0	X	21,0	21,5	20,0	X	20,0	22,5	X	22,0	22,5	22,0	20,0	24,0	22,0	X	22,5	517,5
Lluvias moderadas	0,0	X	X	4,5	3,5	2,0	4,0	3,0	X	4,5	2,0	1,5	2,0	2,5	1,0	X	3,0	2,5	4,0	X	4,0	1,5	X	2,0	1,5	2,0	4,0	0,0	2,0	X	1,5	58,5
Lluvias intensas																																0
Total	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	576

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	AGOSTO DE 2023																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24,0	22,0	24,0	24,0	24,0	X	X	24,0	21,0	23,0	22,5	21,5	X	24,0	X	24,0	24,0	24,0	24,0	X	X	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	X	24,0	24,0	24,0	24,0	566,0
Lluvias moderadas	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	3,0	1,0	1,5	2,5	X	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	10
Lluvias intensas																																0
Total	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	576

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	SEPTIEMBRE DE 2023																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24,0	24,0	X	21,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	X	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	X	22,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	X	24,0	24,0	22,5	24,0	24,0	24,0		617,5
Lluvias moderadas	0,0	0,0	X	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0		6,5
Lluvias intensas																																0
Total	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0		624

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES
De acuerdo a la tabla de seguimiento, durante este periodo de tiempo se presentaron afectaciones por lluvias en 100 días, es importante destacar que las afectaciones a la ejecución del contrato no se da únicamente durante el acaecimiento de las lluvias en sí, se debe tener presente que en obra se debe disponer de la logística tanto en equipos como de personal para mitigar esta afectación para el manejo de bombas y la evacuación de las aguas que afectan el proyecto, también se debe tener presenta que por esta afectación se afecta el suministro de material granular, pues el proveedor debe esperar a que su principal fuente de explote como lo son los ríos, disminuyan su caudal para poder realizar el respectivo explote.

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DÍAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2. GARANTÍAS: (INTERVENTORIA)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	0
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	24 de marzo 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/01/2023	17/05/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/01/2023	17/01/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	17/01/2023	17/01/2024	464.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	17/01/2023	17/01/2024	464.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	17/01/2023	17/01/2024	464.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	1
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	24 de marzo 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA	

	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/01/2023	17/05/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/01/2023	17/01/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	17/01/2023	17/01/2024	464.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	17/01/2023	17/01/2024	464.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	17/01/2023	17/01/2024	464.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	2
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	2
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	24 de marzo 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	26/02/2024	17/05/2024	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/01/2023	17/05/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/01/2023	17/01/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	17/01/2023	17/01/2024	464.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	17/01/2023	17/01/2024	464.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	17/01/2023	17/01/2024	464.000.000,00

- **GARANTÍAS: (OBRA)**

POLIZAS PREVIAS A ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**SGPL-71578097-1**
ANEXO N°	**0, 1 ,2, 3**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**LBCO-71580652-1**
ANEXO N°	**0, 1, 2**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**24 de febrero de 2023**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.**

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/12/2022	23/04/2024	$ 9.161.292.945,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	23/12/2022	23/04/2024	$ 13.741.939.418,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	23/12/2022	23/12/2026	$ 2.290.323.236,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	23/12/2022	23/12/2028	$ 13.741.939.418,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/12/2022	23/1/2023	$ 2.290.323.236,45

POLIZAS POSTERIORES A ACTA DE INCIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**SGPL-71578097-1**
ANEXO N°	**4**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**LBCO-71580652-1**
ANEXO N°	**3**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**15 DE MARZO DE 2023**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.**

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	30/06/2024	$ 9.161.292.945,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01/03/2023	30/06/2024	$ 13.741.939.418,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/03/2023	1/03/2027	$ 2.290.323.236,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29/02/2024	01/03/2029	$ 13.741.939.418,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/03/2023	29/02/2024	$ 2.290.323.236,45

C. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS, N/A

N° ACTA	N° EGRESO	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N.A.	N.A.	DD/MM/AAAA	N.A.	N.A.	N. A	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	DD/MM/AAAA	N.A.	N.A.	N. A	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	DD/MM/AAAA	N.A.	N.A.	N. A	N.A.	N.A.
TOTALES							

Se giro a manera de anticipo el 30% del valor del contrato equivalente a $ 13´054.842.418,70 el 25 de mayo de 2023.

3. DESARROLLO TECNICO

En este informe se presentan las actividades de obra ejecutadas y que hacen parte de los ítems contractuales que será objeto de pago, estas actividades fueron sujeto de seguimiento financiero, técnico, control de calidad y fueron cuantificadas para ser presentadas a la entidad.


MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.

PRELIMINARES

1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2


Esta actividad hace referencia a la localización de espacios tales como el urbanismo en general, las gradas y edificación que se construirá, la zona de parqueo y la cancha de futbol, esta actividad se realizó mediante equipo de topografía y fue revisada en campo por la topografía de la interventoría quien realizado una topografía inicial para poder generar el respectivo comparativo, también se revisaron y avalaron las carteras topográficas entregadas por constructor.

Vale la pena señalar que los trabajos de topografía no se han limitado únicamente a la localización, también se ha realizado seguimiento a las estructuras construidas.

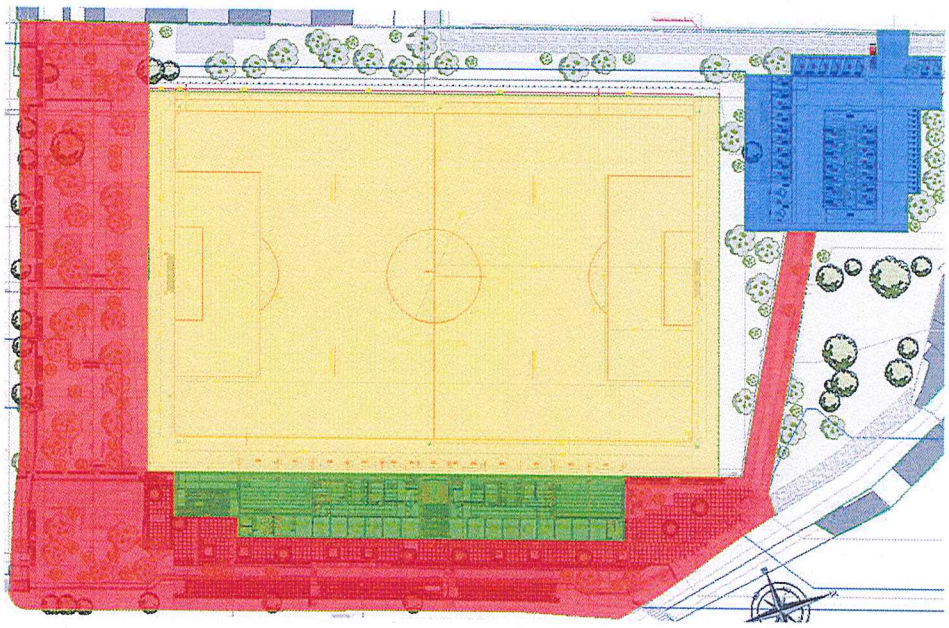


2,1	DEMOLICION GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3

Esta actividad se refiere a un tramo de gavión que se encontraba en un borde a la cancha de futbol y el cual fue necesario demoler, ya que en ese costado se construye las edificaciones y gradas del proyecto, esta demolición se realizó con maquinaria como retroexcavadora, debido a la sección que presentaba este elemento.

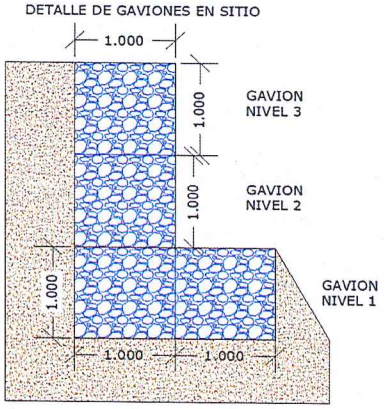


2,2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2

Esta actividad se refiere a los muros que conforman el cerramiento localizado en la parte posterior de la cancha de futbol, tanto para evitar que los balones salgan fuera del perímetro del complejo, así como para garantizar la seguridad y privacidad que tenía la cancha. Esta tenía una sección de 2.30 ML x 0.50M de alto.

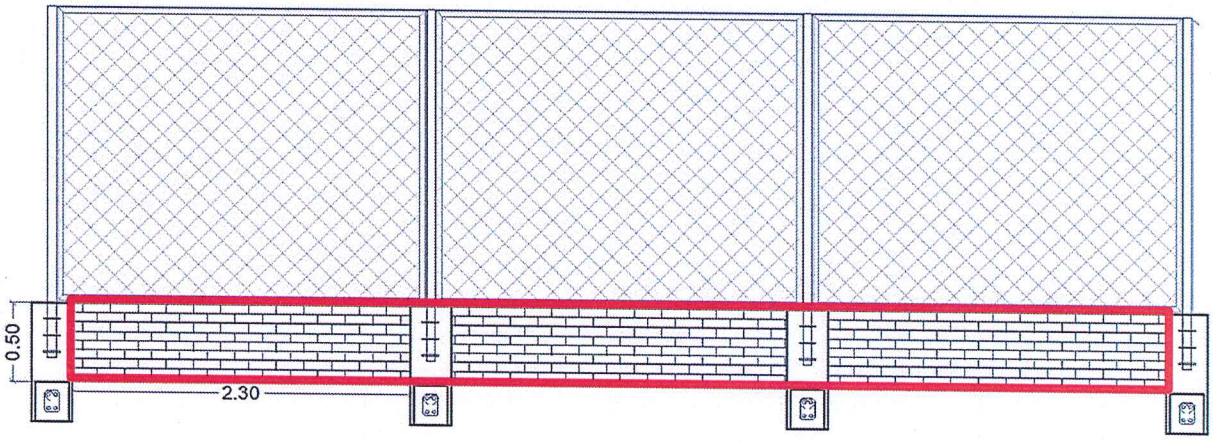


2,3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2

Esta actividad se refiere al retiro de las mallas eslabonadas que conformaban el cerramiento tanto de seguridad como del que se instalo para evitar que se salieran los balones del complejo.

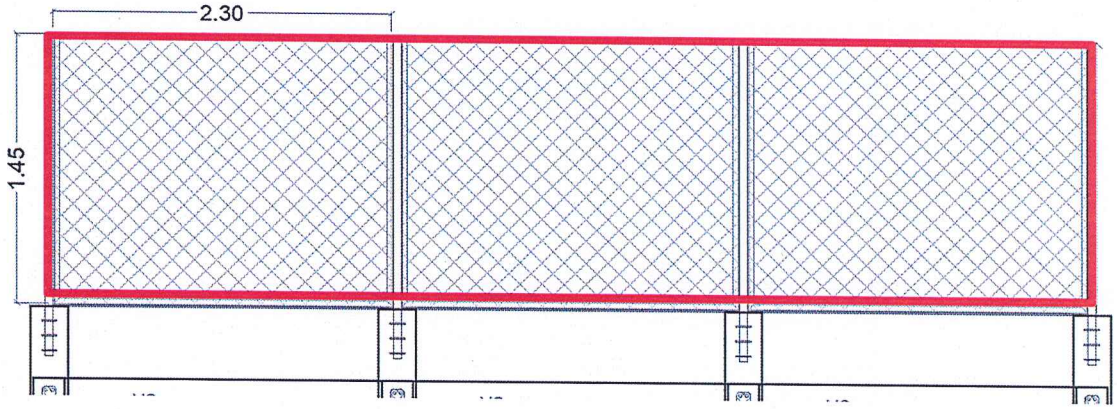


Cerramiento perimetral tipo 1

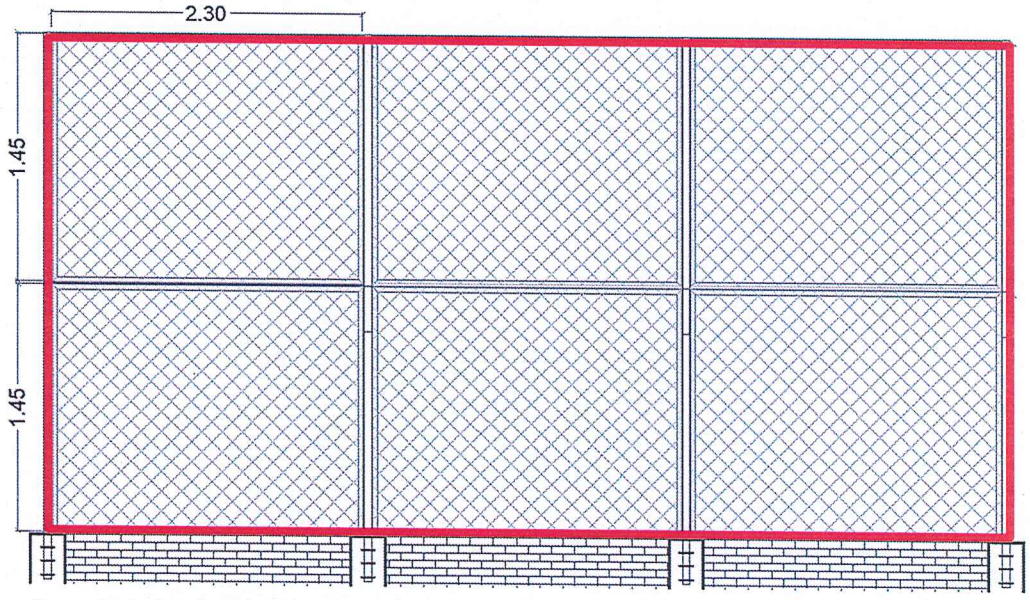


Cerramiento tipo 2, ataja balones.

3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3


Esta actividad se refiere a la excavación realizada para poder construir las zonas de urbanismo (Z1), las zonas construidas cubiertas (Z2), y el parqueadero (Z3), estas se realizaron con seguimiento constante de la topografía y se siguieron los lineamientos de la planimetría tanto estructura como arquitectónica. Las cantidades de estas excavaciones se cuantificaron y se anexaron en las carteras topográficas entregadas por el constructor y revisadas por la interventoría, las cuales acompañan el paquete de la presente parcial.

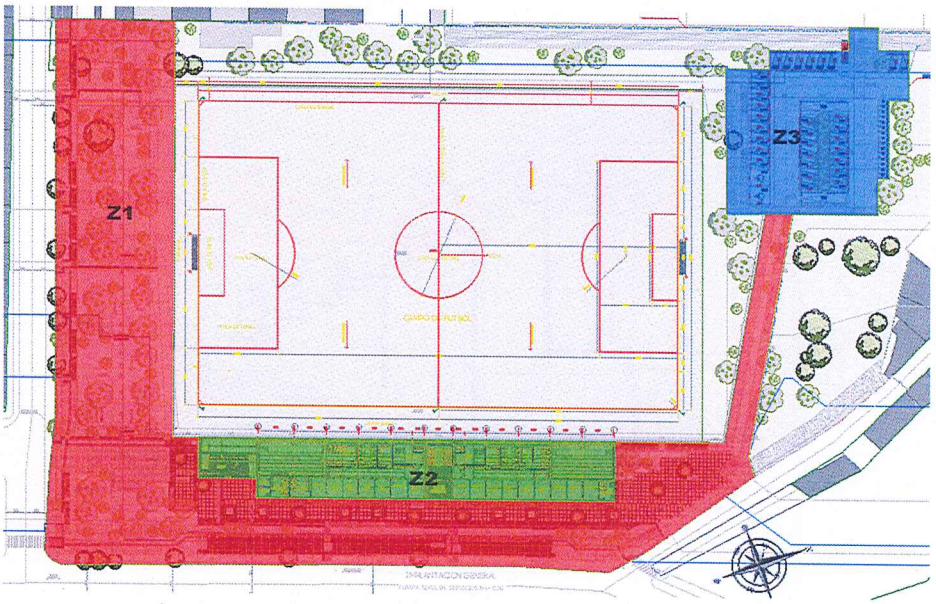


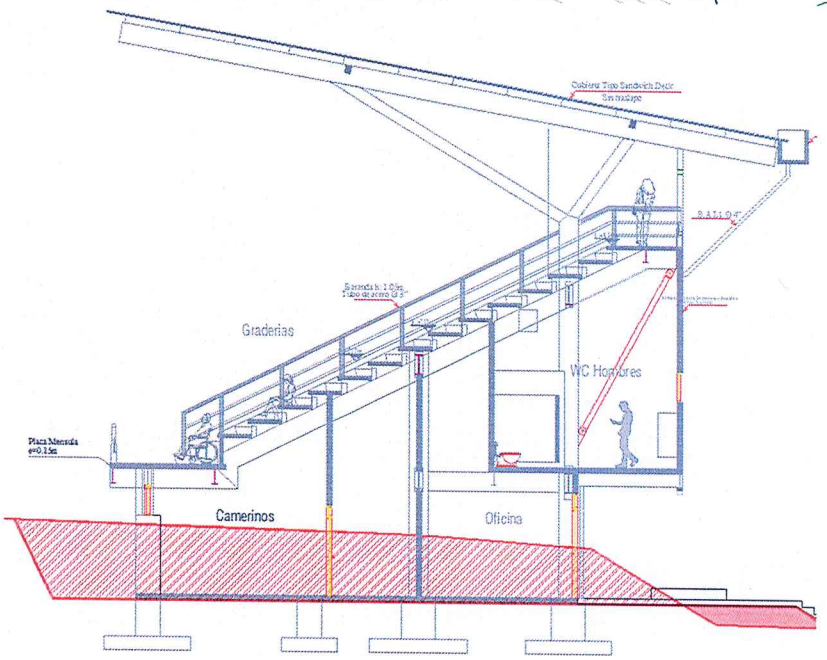

3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

Esta actividad se refiere al perfilamiento que se realiza para las excavaciones en general, pero es mas representativo en las excavaciones de las cimentaciones y demás estructuras tales como dentellón del muro, esta realiza con la finalidad de perfilar alcanzando la sección indicada en los planos.

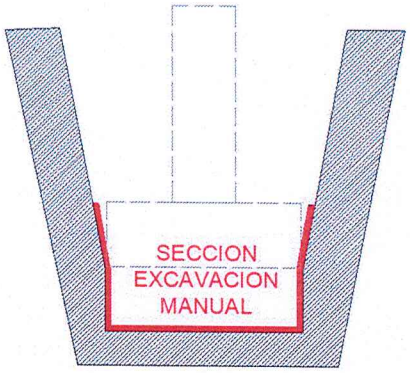


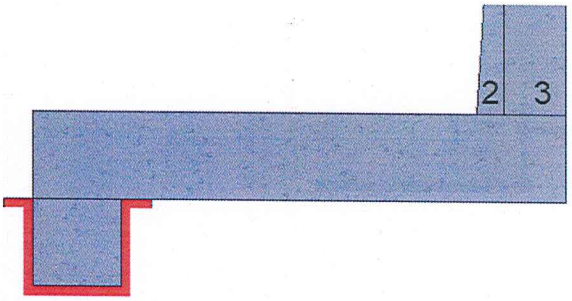

EXCAVACION DENTELLON


3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3

Esta actividad se refiere al relleno aplicado a las excavaciones de la cancha de futbol, las estructuras de cimentación y en el parqueadero, esta actividad tuvo seguimiento por parte de la topografía, quien entregaba los niveles de terminación de cada relleno, de esta actividad se anexa documento de cantidades revisado por la topografía de la interventoría.

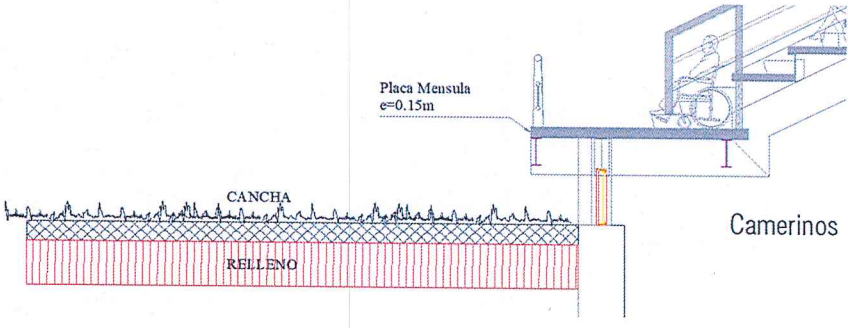


4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3

Esta actividad se refiere al solado de limpieza construido previo a la instalación del acero de refuerzo y construcción de los concretos de elementos tales como vigas de cimentación, zarpa de muro y dentellón.

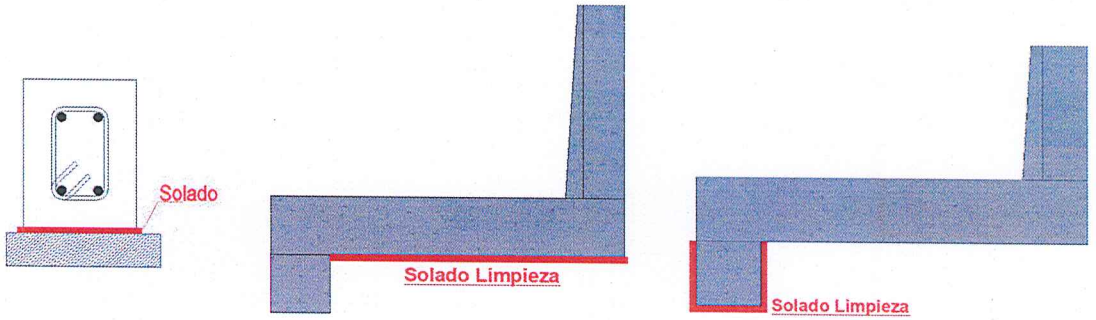


11,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3


Esta actividad se refiere al relleno aplicado en la zona donde se va a construir el parqueadero con una altura de 15 cms, es importante señalar que el espesor es mayor pero debido a que no se ha legalizado la modificación la cual incluye la cantidad real, solo se puede cobrar esta sección.

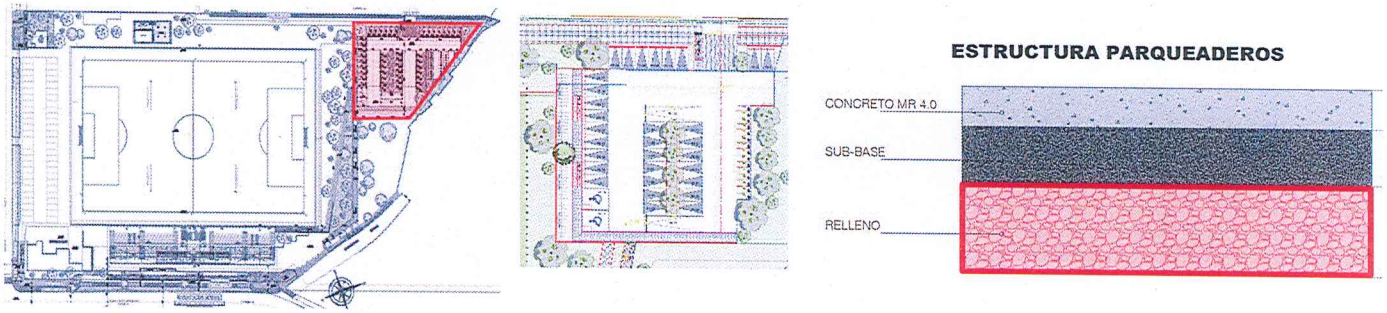

14,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3


Esta actividad se refiere a la excavación realizada para la construcción de la cancha de futbol, se realiza para de esta manera constituir la estructura de soporte en material granular, esto para la cancha de futbol, se cajea con retroexcavadora toda el área de la cancha con una profundidad de 15 cms para este cobro, pero se aclara que es mayor, pero por cuestiones de cantidad actuales o vigentes solo se puede cobrar esta sección hasta que se legalice la modificación que está en trámite.

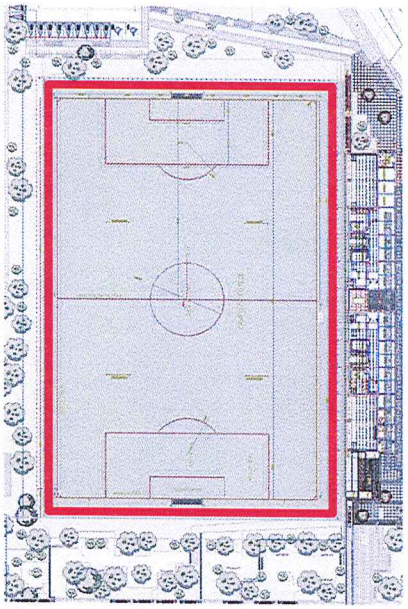

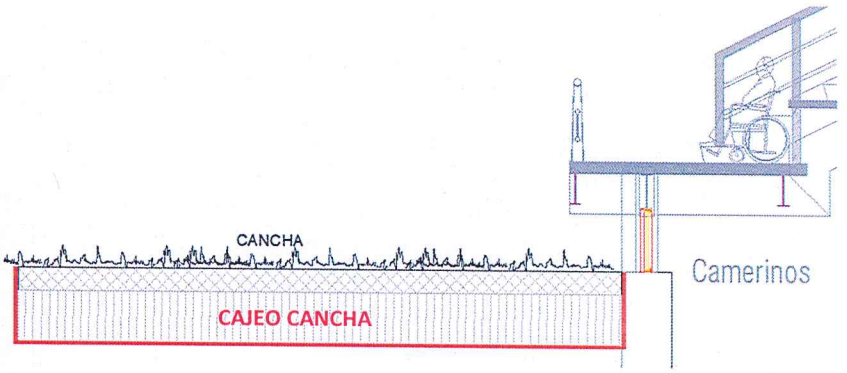

14,5	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2

Esta actividad se refiere a la instalación de este elemento o textil sintético de acuerdo al diseño con la finalidad de proteger y separar el material granular aplicado del terreno natural, este se instala traslapando cada capa en promedio 50 cms debido a la sección promedio de 3.85 ms del textil, con la finalidad de garantizar su función separadora y aislante de la estructura de soporte de la cancha.




ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

PRELIMINARES

1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2

Esta actividad hace referencia a la localización con equipos de topografía de las canchas de Tenis, basketbol y Futbol, esta localización se realiza tanto a diseño arquitectónico como a las estructuras de cimentación tales como zapatas y demás elementos necesarios para cumplir con la meta física.

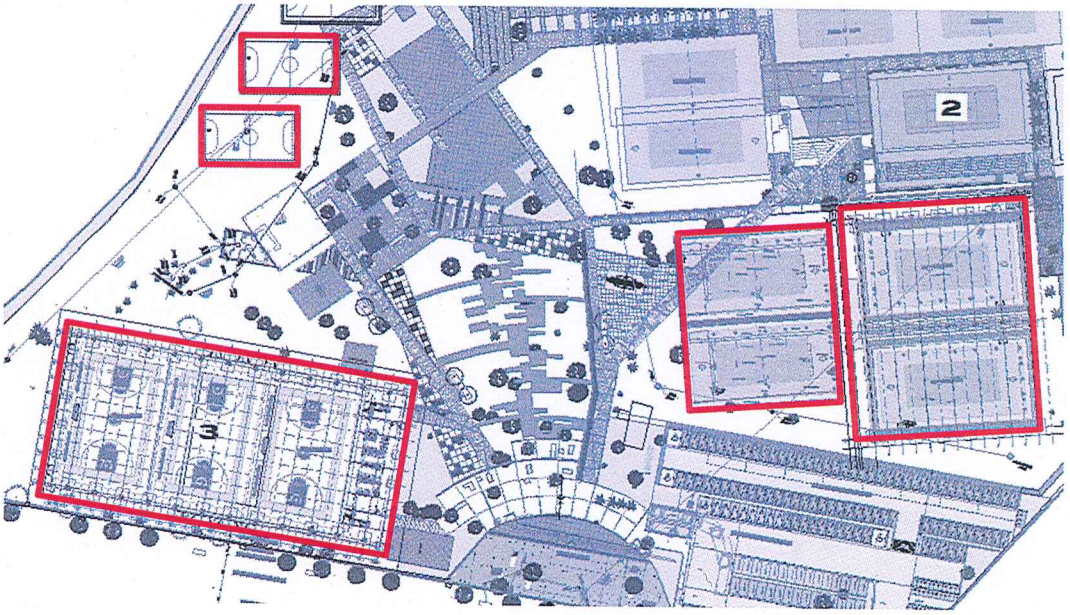

DESMONTE Y DEMOLICIONES

2,1	DEMOLICIÓN GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3


Esta actividad se refiere a la demolición de las placas de piso donde estaban ubicados los juegos y de las zonas peatonales y de servicios de las canchas de futbol del parque.



2,2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2

Esta actividad se refiere al desmonte que se realizo a las estructuras metálicas de soporte de las cubiertas de los juegos y de la cafetería que se localizaba en la zona de construcción de la cancha de Basketball.




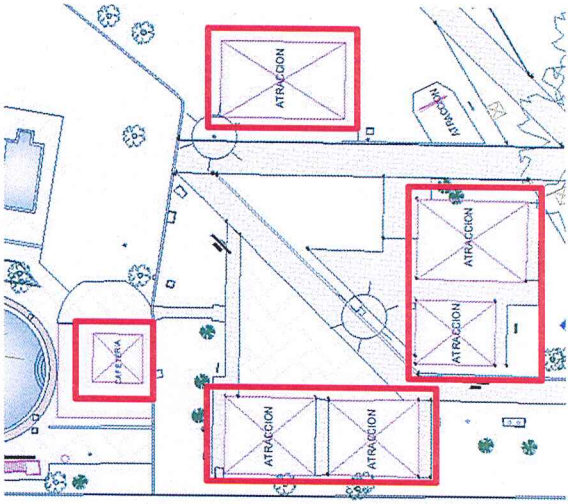

2,3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2

Esta actividad se refiere al desmonte que se ejecutó a las cubiertas de la cafetería que se encontraba en la zona donde se construye la cancha de Basketball y de las tejas de una unidad sanitaria donde se


construye la cancha de tenis, esta última edificación se intervino ya que la nueva cancha de tenis afectaba esta edificación.

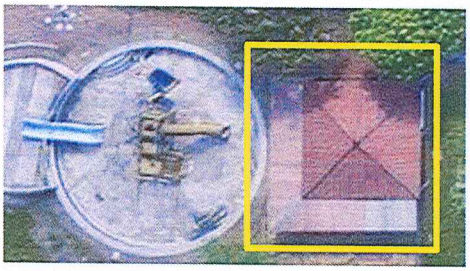



2,4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3

Esta actividad se refiere a la demolición que se realizo a la placa de las canchas de futbol 5 y de microfutbol, existente cerca al actual parqueadero, estas debieron ser demolidas ya que, según el replanteo, estas se afectaban por la nueva cancha de tenis.

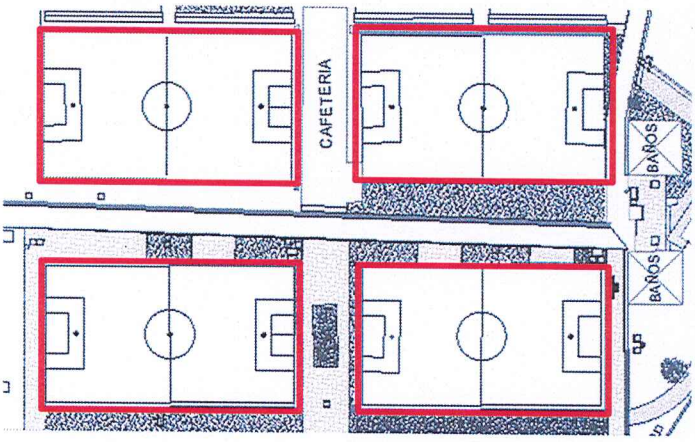





CANCHA DE BASKETBALL

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3


Esta actividad se refiere a las excavaciones realizadas para la construcción de las estructuras de cimentación según diseño, ser realizo con retroexcavadora y de acuerdo a los niveles entregados por la topografía. Vale la pena señalar que se realizaron dos tipos de excavaciones, unas se realizaron para las zapatas grandes, luego se realizaron excavaciones incluyendo las zapatas pequeñas, debido a su cercanía.

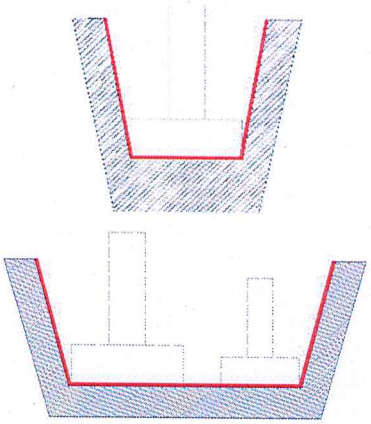


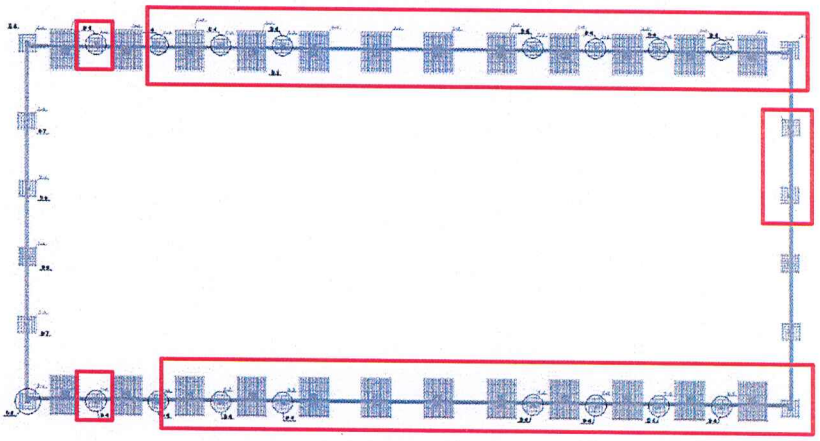

3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3

Esta actividad se refiere al relleno instalado como mejoramiento del suelo portantes para las zapatas grandes, este tiene una sección de 40 cms para zapatas grandes y de 30 cms para las zapatas pequeñas, para este relleno compactado en capas de 20 cms, se le requirió al constructor que se tomaran densidades y que el resultado de estas fueron como mínimo el 95% del Proctor modificado.

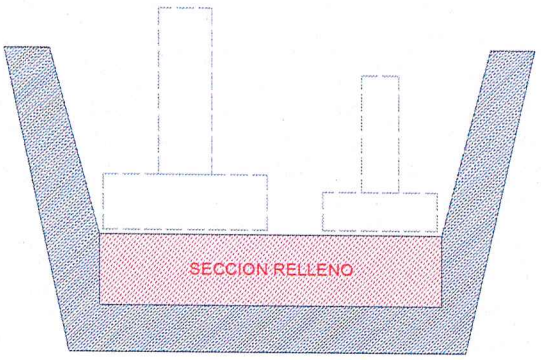


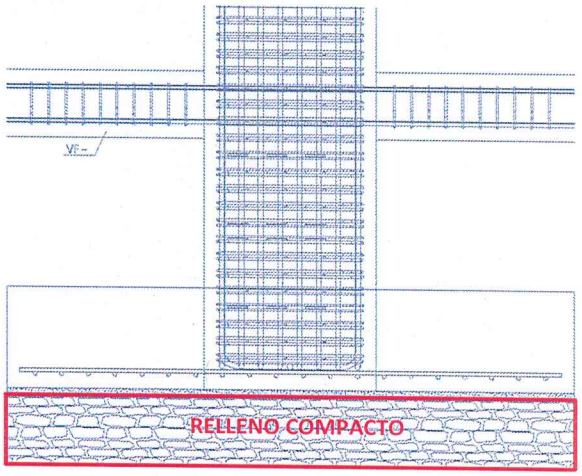

CIMENTACIÓN

4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3

Esta actividad se refiere a la construcción in situ de los solados para las zapatas y vigas de cimentación, esto con la finalidad de tener una superficie limpia y homogénea para disponer de las canastas y parrillas de las estructuras en concreto reforzado a construir.

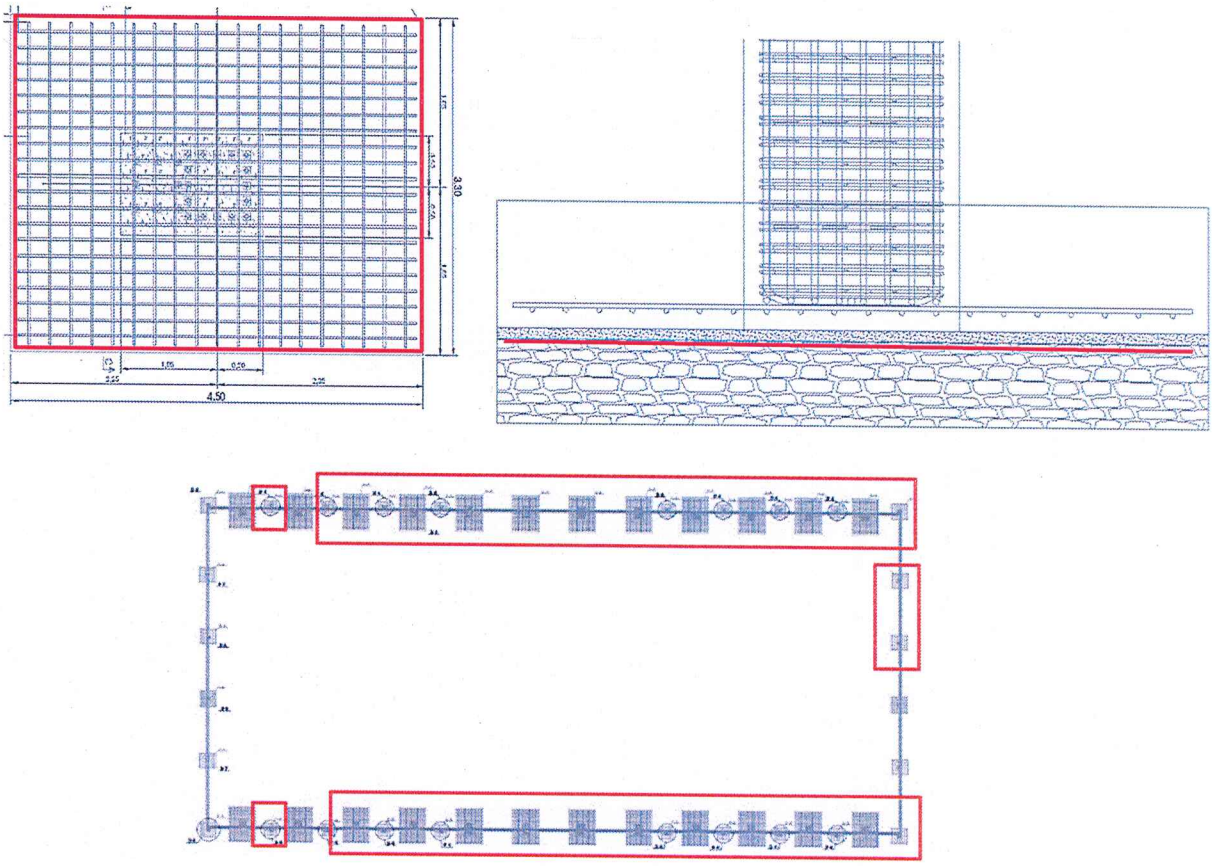



CUBIERTA DE TENNIS

EXCAVACIONES Y RELLENOS

14,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3


Esta actividad se refiere a las excavaciones realizadas para la construcción de las estructuras de cimentación según diseño, ser realizo con retroexcavadora y de acuerdo a los niveles entregados por la topografía. Es importante señalar que algunas excavaciones tienen una sección mas grande debido a unos trabajos de adecuación que se realizaron, estos tienen que ver con redes de servicios públicos que se reubicaron y que se veían afectados por las estructuras de cimentación.

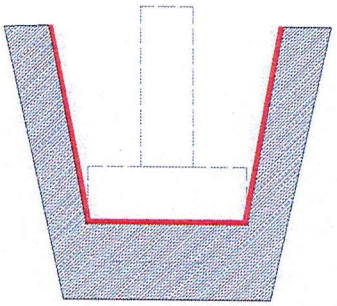


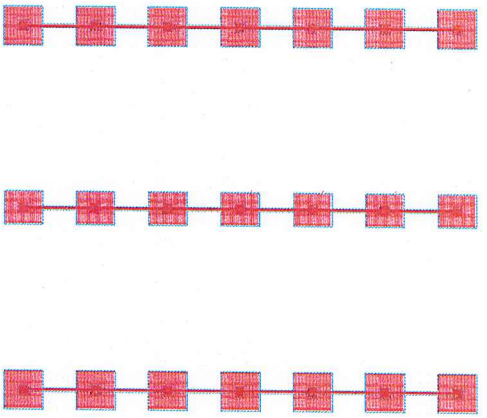

14,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3

Esta actividad se refiere al relleno aplicado una vez construidas las estructuras de cimentación, también se aplicó relleno como mejoramiento del suelo portantes para los dos tipos de zapatas grandes, este tiene una sección de 40 cms, para este relleno compactado en capas de 20 cms, se le requirió al constructor que se tomaran densidades y que el resultado de estas fueron como mínimo el 95% del Proctor modificado.

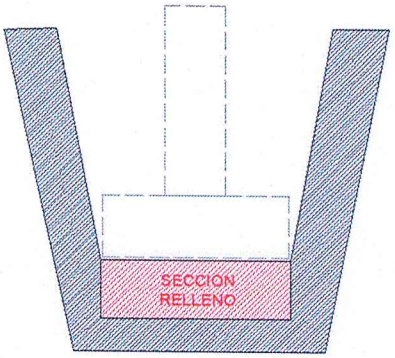

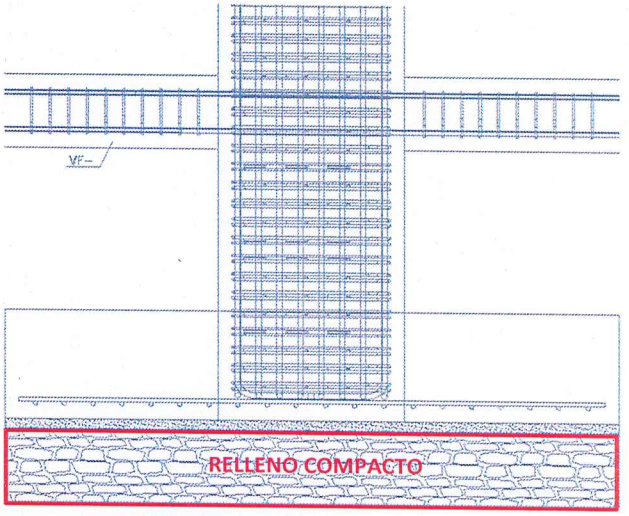





CIMENTACIÓN

15,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3

Esta actividad se refiere a la construcción in situ de los solados para las zapatas y vigas de cimentación, esto con la finalidad de tener una superficie limpia y homogénea para disponer de las canastas y parrillas de las estructuras en concreto reforzado a construir.

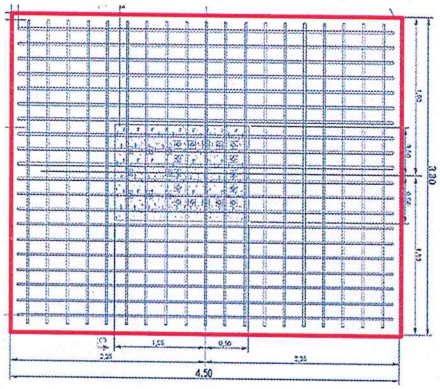

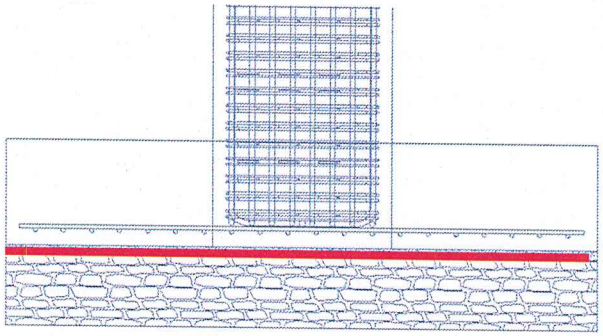



D. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

COMENTARIO

- El presente informe presenta las cantidades de obra ejecutadas y que se encuentran contempladas dentro de las actividades contractuales vigentes a la fecha, pero se debe tener claro que durante el proceso de medición y cuantificación se evidencio que hay mayores cantidades de obra en algunos de los ítems que se están cobrando en la presente acta de pago parcial, pero no se están incluyendo en las memorias de cálculo, ya que se está a la espera de la legalización de la modificación N°1.

- Las cantidades de excavaciones y rellenos se tomaron conforme a las carteras topográficas entregadas por el constructor y validadas por la topografía de la interventoría, estas se basan en las mediciones realizadas por las cuadrillas de topografía tanto de obra como de interventoría. En los documentos anexos en la presente acta parcial se agregan las respectivas memorias y planos topográficos avalados y firmados por esta interventoría.

RECOMENDACIÓN

- De acuerdo a lo planteado en este informe se solicita a la entidad revisar y gestionar el respectivo trámite de legalización de la presente acta de pago parcial N°1 como parte del cumplimiento de la clausula 7, Forma de Pago.

CONCLUSION

De acuerdo a lo anterior la presente acta da como resultado un valor de $ 596.311.175,00 en el frente de obra de la esperanza, lo que equivale a un 2.99% respecto del valor de este proyecto, en el frente de obra del parque Sikuany el valor de la presente acta es de $ 248.538.737,00, lo que equivale a un 0.99% respecto del valor de este proyecto.

Lo anterior nos da un valor total a pagar de $ 844.849.912,00, lo que equivale al 1.84439%, respecto el valor total del proyecto.

E. ANEXOS

- Copia del registro presupuestal
- Copia del RUT
- Factura
- Certificado de cuenta bancaria
- Certificado del contador acreditando el cumplimiento de seguridad social y parafiscales

- Acta de pago parcial cancha la Esperanza
- Acta de pago parcial Parque Sikuany
- Informe de acta parcia N°1 Obra
- Memorias de cantidades y registro fotográfico

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Representante Legal
Consorcio Interdeportivo.
M. P CND 25202-369626 CND

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	EJECUTADO	%
		12.675,94 M2	91,86%





OBSERVACIONES:

localización de la cancha, áreas de urbanismo y estructuras de cimentación.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1	DEMOLICIÓN GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	EJECUTADO	%
		142,00 M3	97,51%







OBSERVACIONES: Se muestra el gavión existente y el proceso de demolición al que fue sometido para poder dar inicio a la edificación/gradas del proyecto.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.2	DEMOLICIÓN MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	EJECUTADO	%
		51,75 M2	18,15%



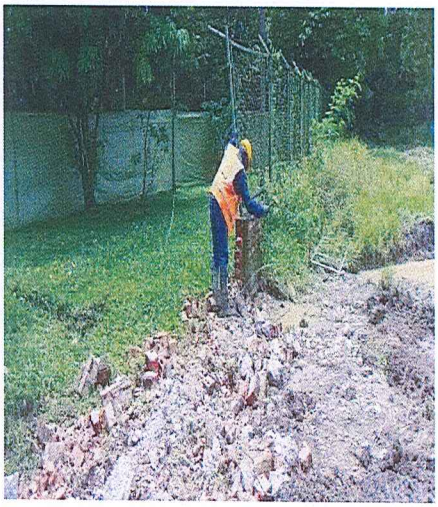

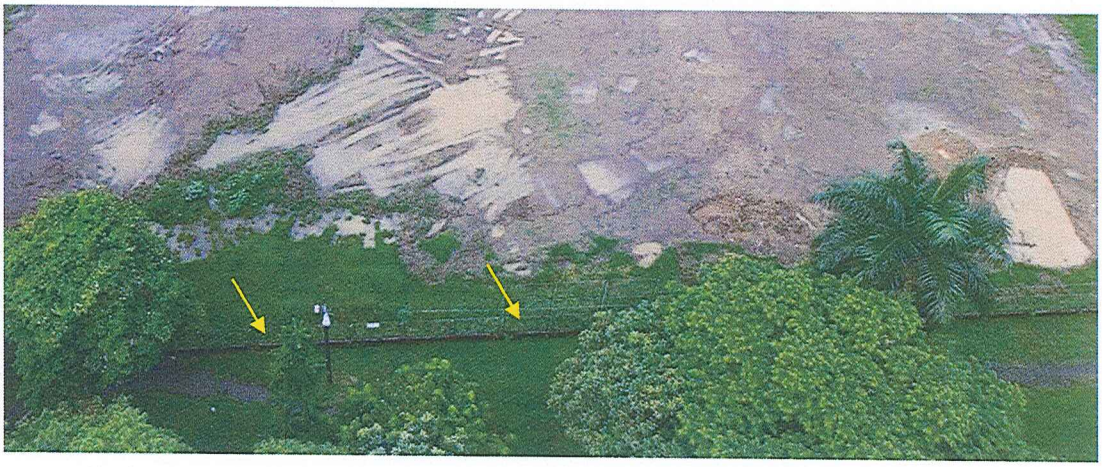

OBSERVACIONES: Esta actividad se llevó a cabo para os muros que se encontraban detrás de cada portería conformando una estructura de contención para los balones, también se incluye un muro de cerramiento que se encontraba detrás de la portería localizada cerca de la concha acústica y el parque infantil.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METÁLICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	EJECUTADO	%
		176,76 M2	18,08%





OBSERVACIONES: se retiran los módulos de cerramiento perimetral detrás de porterías, están localizados sobre los muros que se demolieron.


ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	EJECUTADO	%
		6.936,71 M3	99,90%





OBSERVACIONES: Se muestra la excavación de las zonas donde se construirá las gradas-edificación y zonas de urbanismo.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	EJECUTADO	%
		75,79 M3	11,43%

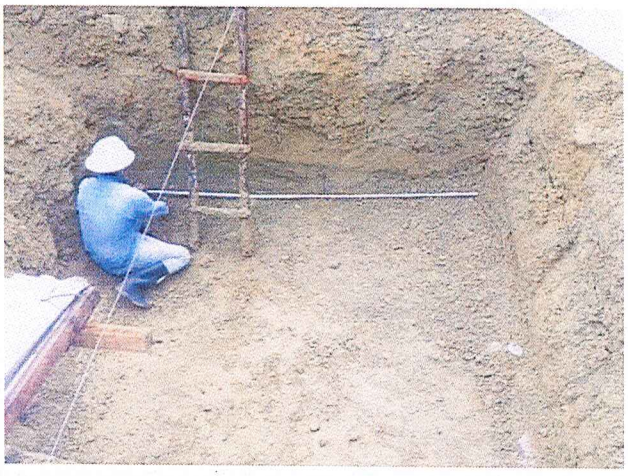



OBSERVACIONES: Se refiere a las excavaciones las cuales por tener una sección mínima la cual no se puede realzar con el balde de la retroexcavadora se debe realizar manualmente, dentro de este tipo de excavaciones se incluye el perfilamiento de las excavaciones para zapatas.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	EJECUTADO	%
		403.92	99.31%





OBSERVACIONES: se realiza relleno para la conformación e la estructura de la cancha de futbol, este material se aplica en capas una vez instalado el geotextil, se compacta mecánicamente.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	%
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	14.74 M3	74.48%





OBSERVACIONES: Se muestra los solados de piso construidos para las vigas de cimentación.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
11.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	EJECUTADO	%
		172.23 M3	93.39%





OBSERVACIONES: Se muestra el material de relleno que se aplica como estructura de pavimento del parqueadero que se esta construyendo, este se aplica por capas y se compacta mecánicamente.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
14.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	EJECUTADO	%
		1.773.78 M3	98.87%





OBSERVACIONES: aquí se muestra las excavaciones realizadas para la construcción de la cancha, se ve como se realiza el cajeo con maquinaria.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	EJECUTADO	%
		7.920,00 M3	88.29 %
14.5	 		
	OBSERVACIONES: aquí se observa como una vez realizada la "caja" de la cancha se procede a instalar el geotextil, para luego extender y compactar el relleno.		

PARQUE SIKUANY

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	EJECUTADO	%
		8.926.89 M2	85.42 %





OBSERVACIONES: se muestran trabajos de localización y replanteo, no solo de lo que se va a construir, sino que también se realizo un inventario de lo existente.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	EJECUTADO	%
		192.78 M3	97.56 %
2.1	 		
	OBSERVACIONES: se muestran las demoliciones realizadas a las placas existentes, sobre todo en la zona donde estaban los juegos y aledaños.		

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	EJECUTADO	%
		536.63 M2	100.00 %





OBSERVACIONES: se muestran las el desmonte realizado a las estructuras de soporte de las cubiertas de juegos y cafetería zona de piscinas.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	EJECUTADO	%
		100.53 M2	18.73 %





OBSERVACIONES: se muestran el desmonte realizado a las tejas de la cubierta de la cafetería existente en la zona donde se construirá la cancha de basket.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	EJECUTADO	%
		114.17 M3	99.57 %





OBSERVACIONES: se muestran la demolición realizada a la carpeta de asfalto con que se construyo la superficie de las canchas de microfutbol y sintética.


CANCHA DE BASKETBALL

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	EJECUTADO	%
		810.11 M3	99.24 %



OBSERVACIONES: se muestran los trabajos de excavaciones mecánicas para cimentación y adecuaciones varias.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	EJECUTADO	%
		104.99 M3	6.46 %
3.3	 		
	OBSERVACIONES: se muestran los trabajos de relleno y compactación aplicado antes de construir las estructuras de cimentación y aplicado para nivelación de la cancha.		

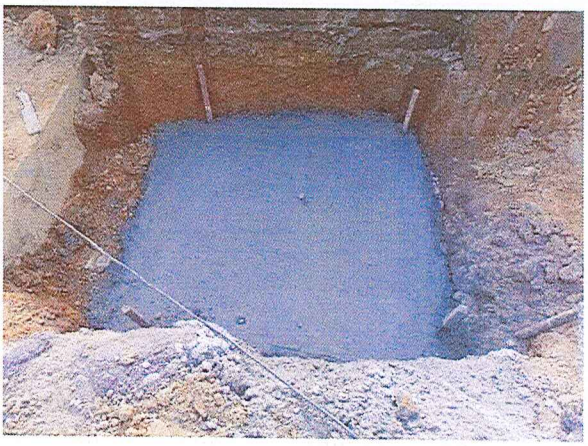ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	EJECUTADO	%
		17.50 M3	94.15 %
4.1	 		
	OBSERVACIONES: se muestran los solados de piso construidos para los distintos tipos de zapatas.		

TENIS

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
14.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	EJECUTADO	%
		572.11 M3	97.92 %





OBSERVACIONES: se muestran las excavaciones realizadas para las zapatas de tenis.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
14.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	EJECUTADO	%
		73.66 M3	5.12 %





OBSERVACIONES: se muestran los trabajos de relleno y compactación realizado antes de construir las estructuras de cimentación.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	%
15.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	10.64 M3	95.00 %





OBSERVACIONES: se muestran los solados construidos previo a la instalación del refuerzo de las zapatas.
