INFORME DE ACTA PARCIAL No. 01

Contrato de obra No 963 de 2022





MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
INFORME DE ACTA PARCIAL No. 01

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

01 de marzo 2023 – 30 de septiembre 2023
Fecha de Presentación: 13 de diciembre 2023

INFORMACIÓN BÁSICA DE OBRA	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (45'806'464.729.00)
OBJETO PROYECTO:	• MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. • ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR DEL PROYECTO:	• VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE TRES MILLONES DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. ($20.323.002.580.00) (2022005500032). • VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($25.483.462.149.00) (2022005500071).
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR ACTUALIZADO:	45'806'464.729.00
CONTRATISTA:	Consorcio Espacios Deportivos
CONTRATO DE OBRA:	963 de 2022
CORREO ELECTRÓNICO:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	001 de 2023
INTERVENTORÍA:	Consorcio Interdeportivo
CORREO ELECTRÓNICO:	consorciointerdeportivo1@gmail.com

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MARZO DE 2023
PRORROGA:	NO APLICA
SUSPENSIÓN No. 1:	12 de octubre de 2023
TIEMPO:	DOS (2) MESES
REINICIO:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2024
12 meses	0 días

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	VILLAVICENCIO	**BARRIO:**	LA ESPERANZA
COMUNA:	7		
COORDENADAS:	**GPS 1. Latitud:** 4°07' 41.51785" Longitud: 73° 37' 54,74995" **GPS 2. Latitud:** 4°07' 43,9178" Longitud: 73° 37		

ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	VILLAVICENCIO	**BARRIO:**	CATATUMBO
COMUNA:	6		
COORDENADAS:	4.1366 (latitud) y -73.6209 (longitud). Altura: 425 m.s.n.m. Coordenadas: **4°8'12"N, 73°37'15"W**		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

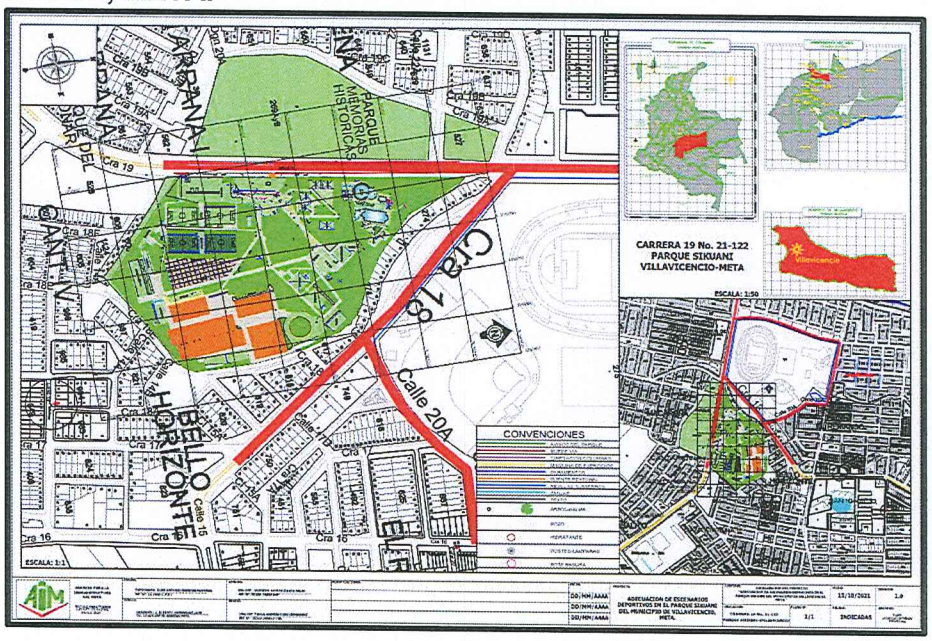
HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META



ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.



Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

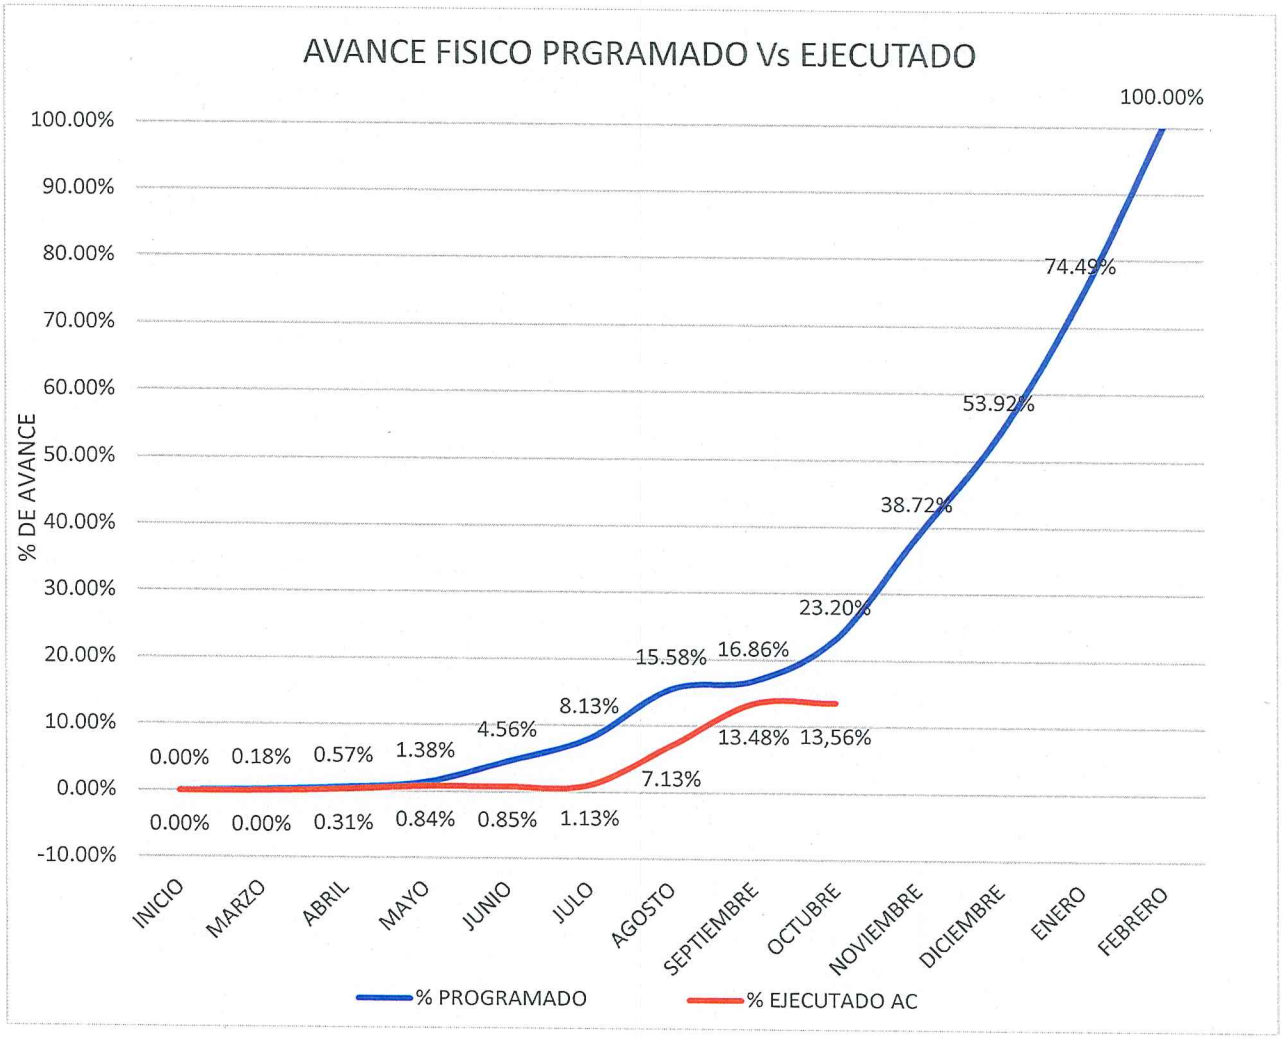
A. INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO
	ACUMULADO	ACUMULADO
01 de marzo de 2023 – 12 de octubre de 2023	18.83%	13.56%

Grafica Avance Físico



Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO

1. GARANTÍAS:

- PÓLIZAS PREVIAS A ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-71578097-1
ANEXO N°	0, 1 ,2, 3
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-71580652-1
ANEXO N°	0, 1, 2
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	24 de febrero de 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZÚRICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/12/2022	23/04/2024	$ 9.161.292.945,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	23/12/2022	23/04/2024	$ 13.741.939.418,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	23/12/2022	23/12/2026	$ 2.290.323.236,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	23/12/2022	23/12/2028	$ 13.741.939.418,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/12/2022	23/1/2023	$ 2.290.323.236,45

- PÓLIZAS POSTERIORES A ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-71578097-1
ANEXO N°	4
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-71580652-1
ANEXO N°	3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	15 DE MARZO DE 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	30/06/2024	$ 9.161.292.945,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01/03/2023	30/06/2024	$ 13.741.939.418,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/03/2023	1/03/2027	$ 2.290.323.236,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29/02/2024	01/03/2029	$ 13.741.939.418,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/03/2023	29/02/2024	$ 2.290.323.236,45

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

C. INFORME FINANCIERO

Hasta la fecha del periodo del presente informe (septiembre de 2023), no se han realizado pagos al contratista de obra.

1. ANTICIPO

El anticipo de obra, corresponde al 30% del valor total del contrato, y a continuación, se muestra los giros realizados a la Fiducia.

No.	EGRESO No.	FECHA	VALOR
01	01497	25/05/2023	$ 5.041.793.634,96
02	01498	25/05/2023	$ 646.138.075,04
03	01499	25/05/2023	$ 104.124.064,00
04	01500	25/05/2023	$ 929.891.860.47
05	01501	25/05/2023	$ 6.332.894.784.23
TOTALES			$ 13.054.842.418,70

1.1. ORDENES DE GIRO

ORDEN	FECHA DE PAGO	RUBRO	PROVEEDOR / CONTRATISTA	VALOR DEL PAGO
1	15/06/2023	Mano de Obra	Wilson Cárdenas Sabogal	$ 391,645,040.00
2	14/06/2023	Materiales y sub contratos de obra	Grupo Viarq Ltda	$ 347,184,967.00
3	14/06/2023	Transporte	Grupo Viarq Ltda	$ 261,096,848.00
4	14/06/2023	Alquiler	Magda Mendoza Vera	$ 36,000,000.00
5	15/06/2023	Materiales y sub contratos de obra	Grupo Soes SAS	$ 1,836,438,564.00
6	15/06/2023	Materiales y sub contratos de obra	Grupo Soes SAS	$ 373,943,639.00
7	29/06/2023	Materiales y sub contratos de obra	GYJ Ferretería SA	$ 476,911,575.00
8	30/06/2023	Materiales y sub contratos de obra	Industrias del Hierro SAS	$ 4,577,154,181.00
9	26/07/2023	Materiales y sub contratos de obra	Construcciones GMI SAS	$ 1,536,858,737.00
10	18/08/2023	Materiales y sub contratos de obra	Romval SAS	$ 1,073,981,271.00
11	20/09/2023	Materiales y sub contratos de obra	GYJ Ferretería SA	$ 81,169,900.00
TOTAL, GIRADO				$ 10,992,384,722.00

1.2. CUADRO DE RESUMEN ANTICIPO

VALOR DE CONTRATO	$ 45,806,464,729.00
VALOR ANTICIPO	$ 13,741,939,418.70
VALOR GIRADO	$ 10,992,384,722.00
SALDO FIDUCIA	$ 2,749,554,696.70

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 01/03/2023 AL 30/10/2023

Avance físico ejecutado: 13.66%

Avance financiero ejecutado 3.54%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

D. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	EJECUTADO	%
		12.675,94 M2	91,86%



OBSERVACIONES: Se realiza localización, trazado y replanteo del área que se intervino en este periodo (Cancha de futbol. Graderías, y parqueadero 1).

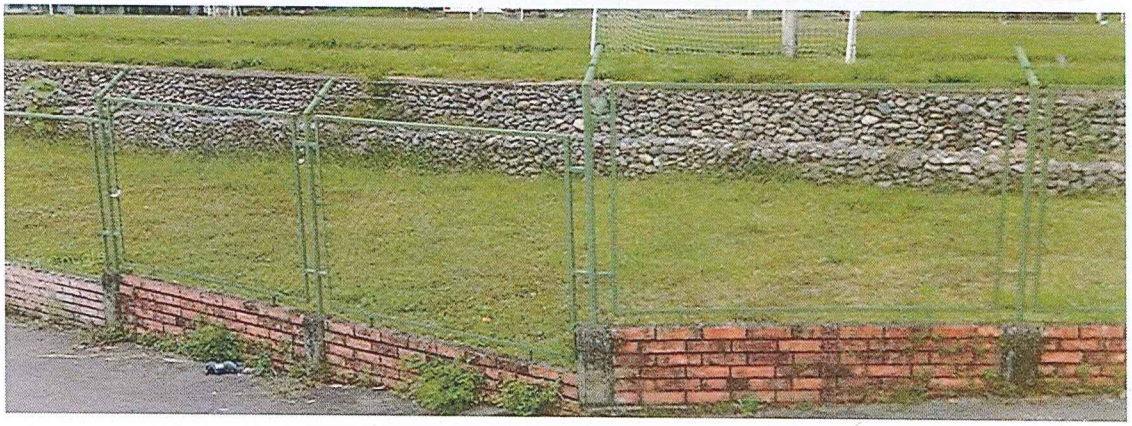
Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DEMOLICIÓN GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	EJECUTADO	%
		142,00 M3	97,51%
2.1	 		
	OBSERVACIONES: Se realiza demolición de gaviones de la cancha de futbol. Esta actividad se realiza con retroexcavador de llanta, y con mini cargador (para el acopio de la piedra).		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DEMOLICIÓN MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	EJECUTADO	%
		51,75 M2	18,15%
2.2	  		
	OBSERVACIONES: Esta actividad se realizó para La demolición de los muros cerramiento existente entre la cancha y el parqueadero existente.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METÁLICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	EJECUTADO	%
		176,76 M2	18,08%
2.3			
	OBSERVACIONES: Se realizó el desmonte de los módulos metálicos del cerramiento del parqueadero existente.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	EJECUTADO	%
		6.936,71 M3	99,90%

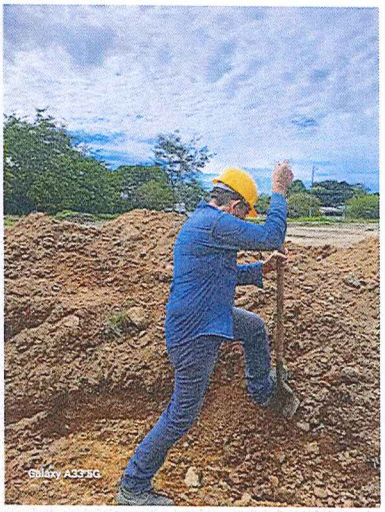




OBSERVACIONES: Se realizó excavación mecánica para la construcción de la cimentación de la estructura de la gradería.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	EJECUTADO	%
		75,79 M3	11,43%
3.2	   		

OBSERVACIONES: Se realizó excavación manual para perfilar la excavación donde se construyó la cimentación de la gradería. Así como también, se realizó excavación manual para la construcción del dentellón del muro de contención de la cancha de la Esperanza.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	%
3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	403,92 M3	99,31%





OBSERVACIONES: Se realizó esta actividad para rellenar y conformar la base de la cancha de futbol de la Esperanza.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	EJECUTADO	%
		14,74 M3	74,48%
4.1	 		
	OBSERVACIONES: Se realizó concreto solado para poder llevar a cabo la construcción de la cimentación del módulo de la gradería del escenario deportivo, y para la construcción del muro de contención de la cancha de la Esperanza.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	EJECUTADO	%
		172,23 M3	93,39%
11.1	 		
	OBSERVACIONES: Se realiza esta actividad para el relleno y nivelación del terreno donde se va a construir el parqueadero de la cancha de La Esperanza.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	EJECUTADO	%
		1.773,78 M3	98,87%
14,2	 		
	OBSERVACIONES: Se realiza la excavación mecánica en el área donde se construirá la cancha de futbol, nivelando el terreno, de acuerdo con las necesidades del proyecto.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	EJECUTADO	%
		7.920,00 M2	88,29%
14.5	 		
	OBSERVACIONES: Actividad ejecutada en el área del campo de futbol de cancha de la esperanza, geotextil que se instala después de haber compactado el terreno natural se extiende para aislar los materiales		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

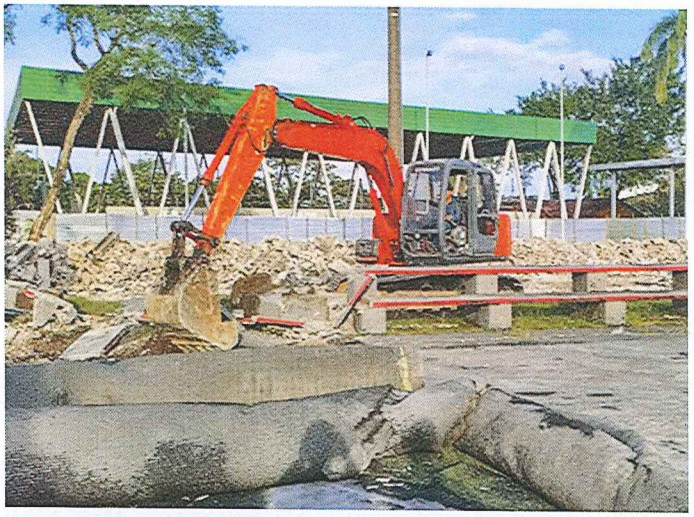
ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANI.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	EJECUTADO	%
		8.926,89 M2	85,42%
	 		
	OBSERVACIONES: Se realiza localización, trazado y replanteo de las estructuras que se construirán (parqueadero, escenario de basketbal nuevo, escenario de tenis nuevo, canchas de tenis y canchas de futbol 5)		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	%
2.1	DEMOLICIÓN MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	192,78 M3	97,56%





OBSERVACIONES: Este ítem considera la demolición de los andenes y placas de concreto existentes en las zonas que se van a intervenir en el parque Sikuani.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	EJECUTADO	%
		536,63 M2	100,00%





OBSERVACIONES: Se realizó el desmonte de la estructura metálica de la cubierta de los diferentes juegos existentes en el área de intervención.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	EJECUTADO	%
		100,53 M2	18,73%
2.3			
	OBSERVACIONES: Se realizó el desmonte de teja de fibrocemento de la cubierta de algunas estructuras existentes en el área de intervención.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	EJECUTADO	%
		114,17 M3	99,57%
2.4	 		
	OBSERVACIONES: Este ítem considera la demolición de las canchas múltiples existentes, las cuales estaban construidas en una placa de pavimento asfaltico.		

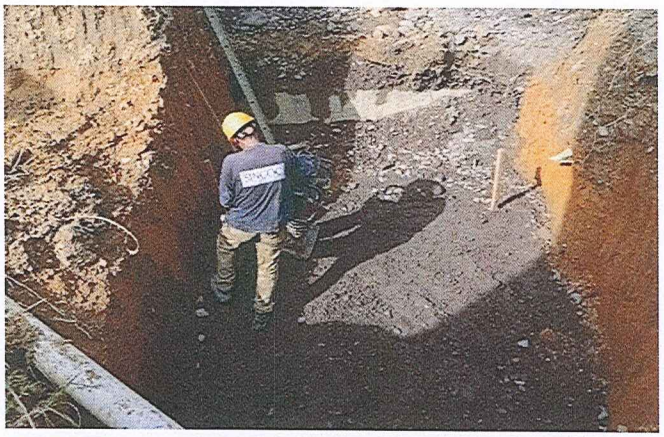
Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	EJECUTADO	%
		810,11 M3	99,24%
3.1	 		
	OBSERVACIONES: Se realizó la excavación mecánica para las cimentaciones de la cancha de baloncesto.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	EJECUTADO	%
		104.99 M3	6.46%
3.3	 		
	OBSERVACIONES: Se realizaron rellenos con material seleccionado, para la realización del mejoramiento de la zona donde se construyeron las zapatas de la cancha de Baloncesto.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	EJECUTADO	%
		17,50 M3	94,15%
4.1			
	OBSERVACIONES: Se realizó la fundida del solado, para las zapatas de la cancha de baloncesto. Cumpliendo las especificaciones técnicas para esta actividad.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	EJECUTADO	%
		572,11 M3	97,92%
14.1	 		
	OBSERVACIONES: Se realizó la excavación mecánica para la construcción de la cimentación de las canchas de tenis del parque Sikuani.		

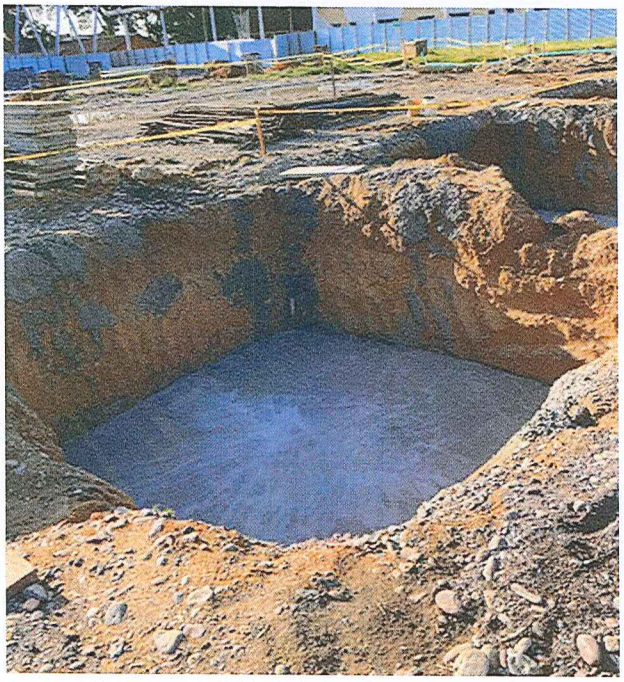
Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	EJECUTADO	%
		73.66 M3	5.12%
14.3	 		
	OBSERVACIONES: El material de relleno, se aplicó para el mejoramiento de la subrasante de los puntos, donde se construye la cimentación para el escenario de tenis.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		EJECUTADO	%
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	10,64 M3	95,00%
15.1	 		
	OBSERVACIONES: El concreto se usó para la construcción de pedestales, que soportarán la estructura y transmitirán el peso a la cimentación, del escenario de tenis.		

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

E. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

La presente acta parcial No.01 considera el cobro de actividades ejecutadas entre el período transcurrido desde el 01 de marzo de 2023 al 10 de septiembre 2023, el cual presenta un avance físico del 13.56%. Se presenta un cobro por un valor de $844,849,912.00, que equivale a un 1.84% con relación al presupuesto de obra.

Se hace claridad que, aunque el avance sea del 13.56%, no se cobra la totalidad de las actividades, toda vez que estas, aunque lleven avance significativo, solamente se realizará el cobro, cuando esté debidamente instalados y acabados, de acuerdo al requerimiento técnico.

El proyecto MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META presenta un cobro del 3.00%.

El proyecto ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META presenta un cobro del 0.98%.

RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 963 DE 2022			
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR**	**%**
ACTA PARCIAL No. 01	Mar/01/2022 - Sep/30/2023	$844,849,912.00	1.84%
EJECUTADO TOTAL	Mar/01/2022 - Sep/30/2023	$844,849,912.00	1.84%
SALDO A EJECUTAR	-	$ 44,961,614,413.00	98,16%
VALOR CONTRATO DE OBRA	-	**$ 45.806.448.251,00**	**100%**

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

F. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Memorias de cálculo de cantidades y registro fotográfico detallado.
- Copia de la bitácora de la obra.
- Manejo Ambiental
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 13 días del mes diciembre del 2023.



Firma. _____
Nombre: Juan Carlos Lozano León
Representante Legal Consorcio Espacios Deportivos

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META
