INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
ACTA FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:			CONTRATO DE OBRA N° 163 ACTA PAGO No 1	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		**CRONOLOGÍA DEL CONTRATO**	
CONTRATO DE OBRA N°:	163 DE 2023		PLAZO INICIAL:	36 DÍAS
CONTRATISTA:	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO		FECHA DE INICIACIÓN:	
CEDULA O NIT N°:	1,094,907,299		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
VALOR INICIAL:	$ 80,974,495.00	0	PLAZO PRORROGA:	
VALOR ANTICIPO:			FECHA DE REINICIACIÓN:	
VALOR ADICIONAL:	$ 40,345,368.00		FECHA DE TERMINACIÓN:	27/12/2023
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 121,319,863.00			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°				
REGISTRO PRESUPUESTAL N°				

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato				ACTA	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Mayores cantidades	Menores cantidades	Vr. Total	Cantidad	Vr. Pagado
1	**PRELIMINARES**										
1.01	Localización replanteo obra existente	M2	400.00	$ 3,100.00	$ 1,240,000.00	393.89	0.00	6.11	$ 1,221,059.00	393.89	$ 1,221,059.00
1.02	Desmonte de cielo raso, Incluye estructura	M2	270.00	$ 6,500.00	$ 1,755,000.00	89.30	0.00	180.70	$ 580,476.00	89.30	$ 580,476.00
1.03	Desmonte de aparatos sanitarios incluye grifería	UND	4.00	$ 30,244.00	$ 120,976.00	4.00	0.00	0.00	$ 120,976.00	4.00	$ 120,976.00
1.04	Desmonte Marco y Puerta en Madera	UND	1.00	$ 19,736.00	$ 19,736.00	1.00	0.00	0.00	$ 19,736.00	1.00	$ 19,736.00
1.05	Desmonte de lámpara existente	UND	20.00	$ 32,505.00	$ 650,100.00	35.00	15.00	0.00	$ 1,137,675.00	35.00	$ 1,137,675.00
1.06	Recorrido de cubierta	M2	400.00	$ 6,500.00	$ 2,600,000.00	393.89	0.00	6.11	$ 2,560,285.00	393.89	$ 2,560,285.00
2	**CUBIERTA Y CIELO RASO**										
2.01	Cielo Raso en Panel Yeso incluye estructura de soporte	M2	270.00	$ 63,000.00	$ 17,010,000.00	89.30	0.00	180.70	$ 5,626,152.00	89.30	$ 5,626,152.00
2.02	Impermeabilizacion viga canal Sika 1 mortero	ML	40.00	$ 20,500.00	$ 820,000.00	124.51	84.51	0.00	$ 2,552,455.00	124.51	$ 2,552,455.00
2.03	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	136.30	$ 35,000.00	$ 4,770,500.00	90.59	0.00	45.72	$ 3,170,475.00	90.59	$ 3,170,475.00
2.04	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	M2	270.00	$ 10,800.00	$ 2,916,000.00	552.51	282.51	0.00	$ 5,967,108.00	552.51	$ 5,967,108.00
2.05	Estuco Cielos Plastico	M2	270.00	$ 9,200.00	$ 2,484,000.00	89.30	0.00	180.70	$ 821,596.80	89.30	$ 821,596.80
2.06	Impermeabilización de placa de concreto, mediante mortero impermeabilizado y manto asfáltico. Incluye	M2	10.00	$ 250,000.00	$ 2,500,000.00	23.23	13.23	0.00	$ 5,806,500.00	23.23	$ 5,806,500.00
2.07	Limpieza de canales, incluye reacomedación de soportes	ML	100.00	$ 12,100.00	$ 1,210,000.00	124.51	24.51	0.00	$ 1,506,571.00	124.51	$ 1,506,571.00
2.08	Suministro e instalación de espuma expansiva	ML	20.00	$ 13,200.00	$ 264,000.00	20.00	0.00	0.00	$ 264,000.00	20.00	$ 264,000.00
3	**MUROS Y ACABADOS**										
3.01	Rasqueteada y lijada de muros	M2	450.00	$ 4,500.00	$ 2,025,000.00	256.08	0.00	193.92	$ 1,152,359.55	256.08	$ 1,152,359.55

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
ACTA FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:			CONTRATO DE OBRA N° 163	
			ACTA PAGO No 1	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		CRONOLOGÍA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA N°:	163 DE 2023		PLAZO INICIAL:	36 DÍAS
CONTRATISTA:	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO		FECHA DE INICIACIÓN:	
CEDULA O NIT N°:	1,094,907,299		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
VALOR INICIAL:	$ 80,974,495.00	0	PLAZO PRORROGA:	
VALOR ANTICIPO:			FECHA DE REINICIACIÓN:	
VALOR ADICIONAL:	$ 40,345,368.00		FECHA DE TERMINACIÓN:	27/12/2023
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 121,319,863.00			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°				
REGISTRO PRESUPUESTAL N°				

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato				ACTA	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Mayores cantidades	Menores cantidades	Vr. Total	Cantidad	Vr. Pagado
3.02	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	M2	400.00	$ 9,500.00	$ 3,800,000.00	69.20	0.00	330.80	$ 657,400.00	69.20	$ 657,400.00
3.03	Estuco plástico sobre muro	M2	150.00	$ 15,000.00	$ 2,250,000.00	256.08	106.08	0.00	$ 3,841,198.50	256.08	$ 3,841,198.50
3.04	Pintura con vinilo sobre muros tres manos	M2	450.00	$ 10,500.00	$ 4,725,000.00	904.10	454.10	0.00	$ 9,493,069.95	904.10	$ 9,493,069.95
3.05	Muro en Panel Yeso e= 1/2" a dos caras	M2	20.00	$ 82,865.00	$ 1,657,300.00	10.97	0.00	9.03	$ 909,360.51	10.97	$ 909,360.51
3.06	Estructura para muro en placa Liviana (Canal - Paral)	M2	20.00	$ 55,197.00	$ 1,103,940.00	5.49	0.00	14.51	$ 302,865.94	5.49	$ 302,865.94
3.07	Suministro e instal. De puerta en doble lámina llena Cal. 16 con refuerzo interno, incluye marco y bisagras antivandálicas	M2	1.00	$ 270,000.00	$ 270,000.00	0.00	0.00	1.00	$ 0.00	0.00	$ -
4	**REDES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN**										
4.01	Luminaria Tipo Panel Led 15 W	UND	20.00	$ 105,000.00	$ 2,100,000.00	0.00	0.00	20.00	$ 0.00	0.00	$ -
4.02	Punto eléctrico iluminación	UND	20.00	$ 64,500.00	$ 1,290,000.00	35.00	15.00	0.00	$ 2,257,500.00	35.00	$ 2,257,500.00
4.03	Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores	UND	10.00	$ 46,500.00	$ 465,000.00	6.00	0.00	4.00	$ 279,000.00	6.00	$ 279,000.00
4.04	Desmonte Y Retiro De Red Electrica Existente En Placa, Incluye Accesorios. (Area Aproximada De Desmonte 80 Mt²) Y Traslado Sitio Interno De Disposicion De Desmontes Y De Mas Elementos Necesarios Para La Ejecucion Del Item	GLB	1.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	1.00	0.00	0.00	$ 400,000.00	1.00	$ 400,000.00
4.05	Suministro e instalación de toma GFCI	UND	5.00	$ 95,000.00	$ 475,000.00	5.00	0.00	0.00	$ 475,000.00	5.00	$ 475,000.00
5	**REDES HIDROSANITARIAS**										
5.01	Revisión de Punto Hidráulico existente	UND	10.00	6,600.00	$ 66,000.00	10.00	0.00	0.00	$ 66,000.00	10.00	$ 66,000.00
5.02	Revisión aparato sanitario	UND	10.00	42,300.00	$ 423,000.00	10.00	0.00	0.00	$ 423,000.00	10.00	$ 423,000.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
ACTA FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:			CONTRATO DE OBRA N° 163 ACTA PAGO No 1	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		**CRONOLOGÍA DEL CONTRATO**	
CONTRATO DE OBRA N°:	163 DE 2023		PLAZO INICIAL:	36 DÍAS
CONTRATISTA:	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO		FECHA DE INICIACIÓN:	
CEDULA O NIT N°:	1,094,907,299		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
VALOR INICIAL:	$ 80,974,495.00	0	PLAZO PRORROGA:	
VALOR ANTICIPO:			FECHA DE REINICIACIÓN:	
VALOR ADICIONAL:	$ 40,345,368.00		FECHA DE TERMINACIÓN:	27/12/2023
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 121,319,863.00			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°				
REGISTRO PRESUPUESTAL N°				

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato				ACTA	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Mayores cantidades	Menores cantidades	Vr. Total	Cantidad	Vr. Pagado
5.03	Suministro e instalación orinal de pared	UND	3.00	385,000.00	$ 1,155,000.00	3.00	0.00	0.00	$ 1,155,000.00	3.00	$ 1,155,000.00
5.04	Suministro e instalación sanitario institucional	UND	1.00	580,000.00	$ 580,000.00	1.00	0.00	0.00	$ 580,000.00	1.00	$ 580,000.00
5.05	Desmonte de aparatos sanitarios incluye grifería	UND	2.00	30,244.00	$ 60,488.00	2.00	0.00	0.00	$ 60,488.00	2.00	$ 60,488.00
5.06	Suministro e instalación lavamanos institucional	UND	1.00	298,000.00	$ 298,000.00	1.00	0.00	0.00	$ 298,000.00	1.00	$ 298,000.00
6	**LIMPIEZA DE OBRA**										
6.01	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	14.00	51,131.00	$ 715,834.00	14.00	0.00	0.00	$ 715,834.00	14.00	$ 715,834.00
6.02	Limpieza general de espacios construidos	M2	400.00	3,000.00	$ 1,200,000.00	400.00	0.00	0.00	$ 1,200,000.00	400.00	$ 1,200,000.00
7	**OBRAS ADICIONALES**										
7.01	SELLO CON SIKAFLEX	ML		4,770.00		122.98	122.98	0.00	$ 586,614.60	122.98	$ 586,614.60
7.02	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS	M2		28,639.00		225.50	225.50	0.00	$ 6,458,148.91	225.50	$ 6,458,148.91
7.03	RESANE EN CIELO PLACA ARCHIVO	M2		32,630.00		69.20	69.20	0.00	$ 2,257,996.00	69.20	$ 2,257,996.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE	ML		57,139.00		50.40	50.40	0.00	$ 2,879,805.60	50.40	$ 2,879,805.60
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA	M2		80,024.00		108.00	108.00	0.00	$ 8,642,592.00	108.00	$ 8,642,592.00
7.06	TRATAMIENTO DE VIGA CANALES EN CONCRETO	ML		46,601.00		124.51	124.51	0.00	$ 5,802,290.51	124.51	$ 5,802,290.51
7.07	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA CIELO FALSO	M2		31,108.00		89.30	89.30	0.00	$ 2,778,068.83	89.30	$ 2,778,068.83
7.08	CONSTRUCCION DE CANALES RECOLECTORAS DE AGUA LLUVIA	ML		101,238.00		30.00	30.00	0.00	$ 3,037,140.00	30.00	$ 3,037,140.00
7.09	LIMPIEZA DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS	ML		35,126.00		45.10	45.10	0.00	$ 1,584,182.60	45.10	$ 1,584,182.60

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
ACTA FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:			CONTRATO DE OBRA N° 163 ACTA PAGO No 1	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		**CRONOLOGÍA DEL CONTRATO**	
CONTRATO DE OBRA N°:	163 DE 2023		PLAZO INICIAL:	36 DÍAS
CONTRATISTA:	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO		FECHA DE INICIACIÓN:	
CEDULA O NIT N°:	1,094,907,299		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
VALOR INICIAL:	$ 80,974,495.00	0	PLAZO PRORROGA:	
VALOR ANTICIPO:			FECHA DE REINICIACIÓN:	
VALOR ADICIONAL:	$ 40,345,368.00		FECHA DE TERMINACIÓN:	27/12/2023
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 121,319,863.00			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°				
REGISTRO PRESUPUESTAL N°				

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato				ACTA	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Mayores cantidades	Menores cantidades	Vr. Total	Cantidad	Vr. Pagado
7.10	LIMPIEZA DE LUCETAS	UND		12,706.00		41.00	41.00	0.00	$ 520,946.00	41.00	$ 520,946.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA ORINAL	UND		272,486.46		2.00	2.00	0.00	$ 544,972.93	2.00	$ 544,972.93
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS DE DESAGUES	UND		111,350.63		9.00	9.00	0.00	$ 1,002,155.65	9.00	$ 1,002,155.65
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 18W LED DE INCRUSTAR	UND		55,221.66		42.00	42.00	0.00	$ 2,319,309.80	42.00	$ 2,319,309.80
7.14	SUMINISTRO E INSTACIÓN PUERTA LAMINA CAL. 20 (0,65-1,3 *2) ANTI.+PINTURA+CHAPA+PASADOR+MARCO	UND		966,489.54		1.00	1.00	0.00	$ 966,489.54	1.00	$ 966,489.54
	COSTO DIRECTO:				**$ 63,419,874.00**				**$ 95,001,854.23**		**$ 95,001,854.23**
	ADMINISTRACIÓN:	23.68%			$ 15,017,826.00				$ 22,496,439.00		$ 22,496,439.00
	IMPREVISTOS:	1%			$ 634,199.00				$ 950,019.00		$ 950,019.00
	UTILIDAD:	3%			$ 1,902,596.00				$ 2,850,056.00		$ 2,850,056.00
	COSTO TOTAL:				**$ 80,974,495.00**				**$ 121,298,368.23**		**$ 121,298,368.23**

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$80,974,495.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$40,345,368.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$121,319,863.00**
VALOR DEL ANTICIPO	$0.00
ACTAS	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$121,298,368.23**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 1	**$121,298,368.23**

La Interventoría o la Supervisión, (según el caso) certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos parcialmente o finalmente por lo tanto APRUEBA la presenta acta para trámite de pago ante el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO.

SON:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
ACTA FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:			CONTRATO DE OBRA N° 163 / ACTA PAGO No 1	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		**CRONOLOGÍA DEL CONTRATO**	
CONTRATO DE OBRA N°:	163 DE 2023		PLAZO INICIAL:	36 DÍAS
CONTRATISTA:	CLAUDIA XIMENA DIAZ AREVALO		FECHA DE INICIACIÓN:	
CEDULA O NIT N°:	1,094,907,299		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
VALOR INICIAL:	$ 80,974,495.00	0	PLAZO PRORROGA:	
VALOR ANTICIPO:			FECHA DE REINICIACIÓN:	
VALOR ADICIONAL:	$ 40,345,368.00		FECHA DE TERMINACIÓN:	27/12/2023
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 121,319,863.00			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°				
REGISTRO PRESUPUESTAL N°				

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato				ACTA	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Mayores cantidades	Menores cantidades	Vr. Total	Cantidad	Vr. Pagado
	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 2				$0.00						
	(Insertar filas necesarias de acuerdo a las actas pagadas)										
	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ACTAS PARCIALES				$121,298,368.23						
	AMORTIZACIONES										
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN PRESENTE ACTA				$0.00						
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN ACTA No 1				$0.00						
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN ACTA No 2				$0.00						
	(Insertar filas necesarias de acuerdo a las actas pagadas)										
	TOTAL AMORTIZADO				$0						
	SALDOS										
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				$ 121,298,368.23						
	SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:				$ 21,494.77						
	SALDO POR AMORTIZAR:				$ -						
	SALDO POR LIBERAR:				$ 21,494.77						

Se firma la presente acta, a los 27 días del mes de diciembre del año 2023

JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES
Supervisor

Elaboró y aprobó:

CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO
Contratista

SELLO CON SIKAFLEX	**ML**			**$**	**4,770.00**
FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO TIPO SIKAROD O SIMILAR	ML	1.000	$ 1,615.00	$	1,615.00
SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO PARA PAVIMENTOS TIPO SIKAFLEX 401 PAVEMENT SL	GL	0.003	$ 421,976.50	$	1,266.00
CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 AYD)	H/C	0.050	$ 34,339.12	$	1,717.00
HERRAMIENTA MENOR	% H/C	0.100	$ 1,716.96	$	172.00

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS	**M2**			**$**	**28,639.00**
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CON POLIMEROS SINTETICOS	UN	0.400	$ 24,380.00	$	9,752.00
CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 AYD)	H/C	0.500	$ 34,339.12	$	17,170.00
HERRAMIENTA MENOR	% H/C	0.100	$ 17,170.00	$	1,717.00

RESANE EN CIELO PLACA ARCHIVO	**M2**			**$**	**32,630.00**
YESO DE PRIMERA	BUL	0.150	$ 43,700.00	$	6,555.00
ANDAMIO TUBULAR DE 1.5 M.(SECCION)	DIA	6.000	$ 1,021.00	$	6,126.00
CUADRILLA CC PINTURA (1PIN + 2 AYD)	H/C	0.500	$ 37,782.00	$	18,891.00
HERRAMIENTA MENOR	% H/C	0.100	$ 10,579.00	$	1,058.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE	**ML**			**$**	**57,139.00**
CABALLETE F.C. FIJO	UN	1.150	$ 37,275.00	$	42,866.00
AMARRA PLAST PARA TEJA FC	UN	4.000	$ 452.00	$	1,808.00
CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 AYD)	H/C	0.330	$ 34,339.12	$	11,332.00
HERRAMIENTA MENOR	% H/C	0.100	$ 11,332.00	$	1,133.00

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA	**M2**			**$**	**80,024.00**
TEJA PLASTICA TRASLUCIDA NO. 4-6	M2	1.100	$ 39,830.72	$	43,814.00
GANCHOS	UN	1.300	$ 954.50	$	1,241.00
AMARRA PLAST PARA TEJA FC	UN	4.000	$ 452.00	$	1,808.00
TAPAGOTERAS 1/8 GL	UN	0.500	$ 24,770.00	$	12,385.00
CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 AYD)	H/C	0.550	$ 34,339.12	$	18,887.00
HERRAMIENTA MENOR	% H/C	0.100	$ 18,887.00	$	1,889.00

TRATAMIENTO DE VIGA CANALES EN CONCRETO	**ML**			**$ 46,601.00**
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CON POLIMEROS SINTETICOS	UN	0.300	$ 24,380.00	$ 7,314.00
BRONCOELASTICO	GL	0.200	$ 102,000.00	$ 20,400.00
CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 AYD)	H/C	0.500	$ 34,339.12	$ 17,170.00
HERRAMIENTA MENOR	% H/C	0.100	$ 17,170.00	$ 1,717.00

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA CIELO FALSO	**M2**			**$ 31,108.00**
ANGULO PERIMETRAL CAL. 20 1" X 1"	UN	0.920	$ 3,267.50	$ 3,006.00
VIGUETA PRINCIPAL 2.44 M	UN	0.460	$ 6,820.00	$ 3,137.00
PERFIL OMEGA	UN	0.920	$ 5,320.80	$ 4,895.00
ANDAMIO TUBULAR DE 1.5 M.(SECCION)	DIA	0.600	$ 1,021.00	$ 613.00
TELERA EN MADERA	DIA	0.600	$ 1,398.50	$ 839.00
TORNILLO CHAZO PUNTILLA	UN	1.640	$ 188.50	$ 309.00
TORNILLO ESTRUCTURA 7X7X16	UN	15.000	$ 36.75	$ 551.00
CUADRILLA BB INSTALACIONES (1OFC INSTALADOR+2 AYD)	H/C	0.400	$ 37,782.00	$ 15,113.00
HERRAMIENTA MENOR	% H/C	0.100	$ 26,447.00	$ 2,645.00

CONSTRUCCION DE CANALES RECOLECTORAS DE AGUA LLUVIA	**ML**			**$ 101,238.00**
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0.100	$ 426,935.00	$ 42,694.00
PUNTILLA CON CABEZA	LBR	0.085	$ 4,950.00	$ 421.00
TRABILLAS 4*2CM 3M	UN	0.350	$ 3,400.00	$ 1,190.00
TABLA FORMALETA	UN	1.000	$ 17,100.00	$ 17,100.00
CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 AYD)	H/C	1.000	$ 34,339.12	$ 34,339.00
HERRAMIENTA MENOR	% H/C	0.100	$ 54,943.00	$ 5,494.00

LIMPIEZA DE BAJANTES DE AGUA LLUVIAS	**ML**			**$ 35,126.00**
ANDAMIO TUBULAR DE 1.5 M.(SECCION)	DIA	2.500	$ 1,021.00	$ 2,553.00
TELERA PARA ANDAMIO ALQUILER (3 POR CUERPO)	DIA	3.000	$ 4,791.00	$ 14,373.00
CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 AYD)	H/C	0.500	$ 34,339.12	$ 17,170.00
HERRAMIENTA MENOR	% H/C	0.150	$ 6,868.00	$ 1,030.00

LIMPIEZA DE LUCETAS	**UND**			**$ 12,706.00**
CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1OFC + 2 AYD)	H/C	0.350	$ 34,339.12	$ 12,019.00

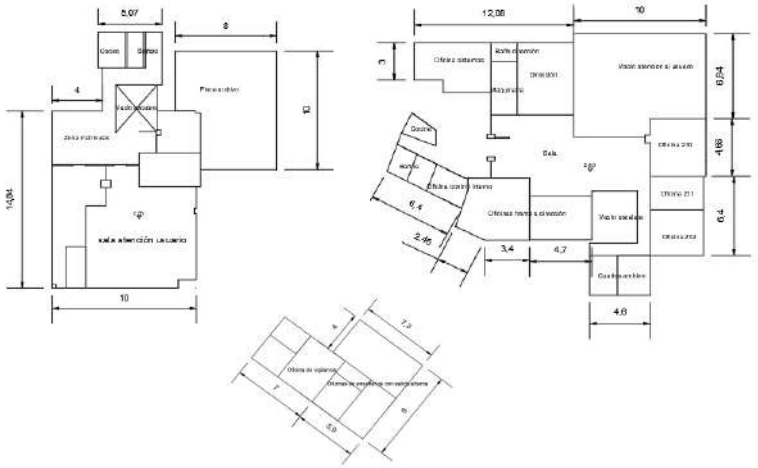
HERRAMIENTA MENOR	% H/C	0.100	$ 6,868.00	$ 687.00

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

1	PRELIMINARES		N° Acta	1.00
1.01	Ítem:	Localización replanteo obra existente	Valor Total	393.89

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA EXISTENTE CUBIERTA					393.89	393.89

Nota:


Firma			Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

1	PRELIMINARES		N° Acta	1.00
1.02	Ítem:	Desmonte de cielo raso, Incluye estructura	Valor Total	89.30

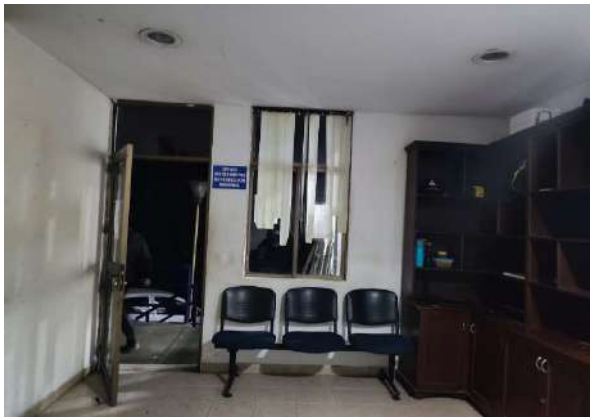
Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
	CIELO RASO ZONA ATENCIÓN AL USUARIO		1.22	2.44	5.00	14.88	14.88
 	CIELO RASO ESCALERA		1.22	2.44	1.00	2.98	17.86

 	CIELO RASO OFICINA 211 SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	20.84
	CIELO RASO SEGUNDO PISO, FRENTE A OFICINA 211	1.22	2.44	1.00	2.98	23.81
	CIELO RASO SEGUNDO PISO, PASILLO DE OFICINA 211 Y 212	1.22	2.44	2.00	5.95	29.77

	CIELO RASO SEGUNDO PISO, PASILLO DE BAÑOS	1.22	2.44	2.00	5.95	35.72
	CIELO RASO DE BAÑO SEGUNDO PISO	1.22	2.44	2.00	5.95	41.68
 	CIELO RASO OFICINA DE DIRECCIÓN SEGUNDO PISO	1.22	2.44	2.00	5.95	47.63

	CIELO RASO ENTRE OFICINA 205 Y BAÑOS SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	50.61
	CIELO RASO DE CORREDOR BAÑOS DE SEGUNDO PISO AL LADO DE CAMILLA	1.22	2.44	2.00	5.95	56.56
	CIELO RASO DE 2 BAÑOS SEGUNDO PISO, AL LADO DE CAMILLA	1.22	2.44	4.00	11.91	68.47

	CIELO RASO DE ZONA EXTERIOR A LA COCINA DEL SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	71.44
	CIELO RASO COCINA SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	74.42

	CIELO RASO AFUERA DE BAÑOS SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	77.40
	CIELO RASO OFICINA DE VIGILANCIA	1.22	2.44	2.00	5.95	83.35

	CIELO RASO BAÑO OFICINA DE VIGILANCIA		1.22	2.44	1.00	2.98	86.33
	CIELO RASO BAÑO EXTERIOR		1.22	2.44	1.00	2.98	89.30

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

1	PRELIMINARES		N° Acta	1.00
1.03	Ítem: Desmonte de aparatos sanitarios incluye grifería		Valor Total	4.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS				4.00		4.00

Nota:

Firma	Claudia Y.D.S.	Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA 2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

1	PRELIMINARES		N° Acta	1.00
1.04	Ítem:	Desmonte Marco y Puerta en Madera	Valor Total	1.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad:	UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula		Largo	Ancho	Cantidad	UND	
	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA EN MADERA					1.00		1.00

Nota:

Firma	Claudia Y.D.S.	Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA 2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

1	PRELIMINARES		N° Acta	1.00
1.05	Ítem: Desmonte de lámpara existente		Valor Total	35.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Alto	UND	
	LUMINARIA TIPO PANEL LED 15 W					35.00	35.00

Nota:

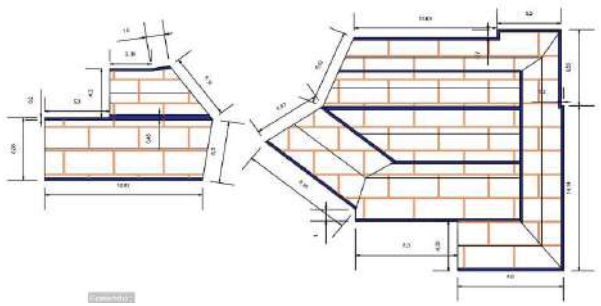
Firma	Claudia Y. D.		Firma				
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES			
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra			
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27	

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

1	PRELIMINARES		N° Acta	1.00
1.06	Ítem:	Recorrido de cubierta	Valor Total	393.89

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE RECORRIDO DE CUBIERTA					393.89	393.89

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

2	CUBIERTA Y CIELO RASO	N° Acta	1.00
2.01	Ítem: Cielo Raso en Panel Yeso incluye estructura de soporte	Valor Total	89.30

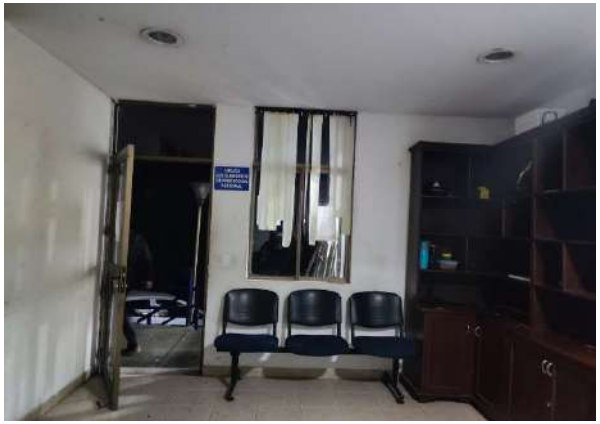
Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
	CIELO RASO ZONA ATENCIÓN AL USUARIO		1.22	2.44	5.00	14.88	14.88
 	CIELO RASO ESCALERA		1.22	2.44	1.00	2.98	17.86

 	CIELO RASO OFICINA 211 SEGUNDO PISO (NECESITA 1 PLACA 2X2)	1.22	2.44	1.00	2.98	20.84
	CIELO RASO SEGUNDO PISO, FRENTE A OFICINA 211	1.22	2.44	1.00	2.98	23.81
	CIELO RASO SEGUNDO PISO, PASILLO DE OFICINA 211 Y 212	1.22	2.44	2.00	5.95	29.77

	CIELO RASO SEGUNDO PISO, PASILLO DE BAÑOS	1.22	2.44	2.00	5.95	35.72
	CIELO RASO DE BAÑO SEGUNDO PISO	1.22	2.44	2.00	5.95	41.68
 	CIELO RASO OFICINA DE DIRECCIÓN SEGUNDO PISO	1.22	2.44	2.00	5.95	47.63

	CIELO RASO ENTRE OFICINA 205 Y BAÑOS SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	50.61
	CIELO RASO DE CORREDOR BAÑOS DE SEGUNDO PISO AL LADO DE CAMILLA	1.22	2.44	2.00	5.95	56.56
 	CIELO RASO DE 2 BAÑOS SEGUNDO PISO, AL LADO DE CAMILLA	1.22	2.44	4.00	11.91	68.47

	CIELO RASO DE ZONA EXTERIOR A LA COCINA DEL SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	71.44
	CIELO RASO COCINA SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	74.42

	CIELO RASO AFUERA DE BAÑOS SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	77.40
	CIELO RASO OFICINA DE VIGILANCIA	1.22	2.44	2.00	5.95	83.35

	CIELO RASO BAÑO OFICINA DE VIGILANCIA		1.22	2.44	1.00	2.98	86.33
	CIELO RASO BAÑO EXTERIOR		1.22	2.44	1.00	2.98	89.30

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES


Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

2	CUBIERTA Y CIELO RASO		N° Acta	1.00
2.02	Ítem:	Impermeabilizacion viga canal Sika 1 mortero	Valor Total	124.51

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: ML	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	ML	
	CANAL INTERNA DE 45 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 1		7.60			7.60	7.60

	CANAL PERIMETRAL DE 20 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 1		22.66			22.66	30.26
	CANAL INTERNA DE 31 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 2		19.20			19.20	49.46
	CANAL PERIMETRAL DE 20 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 2		75.05			75.05	124.51
Nota:							

Firma			Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

2	CUBIERTA Y CIELO RASO	N° Acta	1.00
2.03	Ítem: Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada	Valor Total	90.59

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
	TEJA DE FIBROCEMENTO		1.83	0.90	55.00	90.59	90.59

Nota:

Firma	Claudia Y. D. S.	Firma	
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra
Fecha	AA 2023	MM Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

2	CUBIERTA Y CIELO RASO		N° Acta	1.00
2.04	Ítem:	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	Valor Total	552.51

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
  	CIELO RASO PRIMER PISO, ZONA ENTRE ATENCIÓN AL USUARIO Y OFICINA DE DIVISIÓN CONTROL TRÁNSITO					18.00	18.00

	CIELO RASO ZONA ATENCIÓN AL USUARIO				70.00	88.00
 	CIELO RASO ESCALERA				11.99	99.99
 	CIELO RASO OFICINA 211 SEGUNDO PISO				9.80	109.79


	CIELO RASO SALA				60.00	169.79
	CIELO RASO SEGUNDO PISO, PASILLO DE OFICINA 211 Y 212				4.10	173.89
	CIELO RASO SEGUNDO PISO, PASILLO DE BAÑOS				4.60	178.49

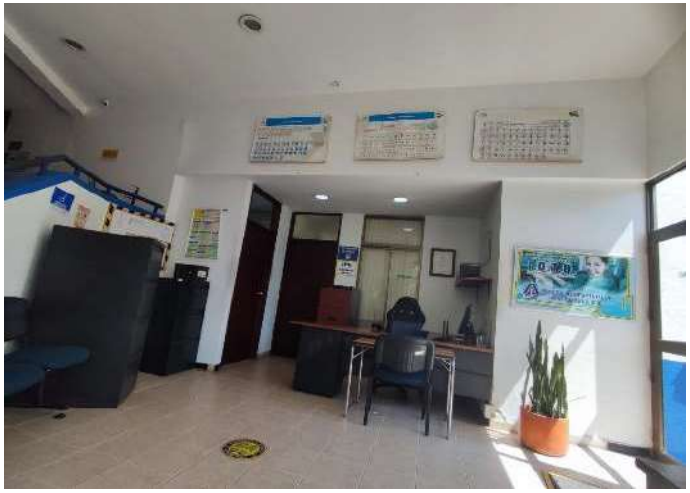
	CIELO RASO DE OFICINA DE ARCHIVO SEGUNDO PISO				6.72	185.21
	CIELO RASO OFICINA DE DIRECCIÓN SEGUNDO PISO				35.42	220.63
	CIELO RASO ENTRE OFICINA 205 Y BAÑOS SEGUNDO PISO INCLUYE CORREDOR BAÑOS				36.40	257.03

 	CIELO RASO DE 2 BAÑOS SEGUNDO PISO, AL LADO DE CAMILLA				7.73	264.76
	CIELO RASO COCINA SEGUNDO PISO				3.64	268.40


 	OFICINA 210				18.66	287.06
	OFICINA 212				14.80	301.86

	OFICINAS FRENTE A DIRECCIÒN (2)				41.14	343.00
	OFICINA CONTROL INTERNIO				6.64	349.64

	OFICINA DE SISTEMAS				21.00	370.64
	OFICINA VIGILANTES				22.60	393.24

	OFICINA DE ENSEÑANZA Y SALA				64.70	457.94
	DOS BAÑOS Y COCINA PRIMER PISO				10.14	468.08
	CORREDOR BAÑOS				8.83	476.91

	ZONA MATRICULAS				30.05	506.96
 	OFICINA 103 AL LADO DE ARCHIVO PRIMER PISO				12.23	519.19

	OFICINA ATENCIÒN AL USUARIO AL LADO DE 103					12.92	532.11
 	OFICINA DIVISIÓN CONTROL PRIMER PISO					20.40	552.51

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

2	CUBIERTA Y CIELO RASO	N° Acta	1.00
2.05	Ítem: Estuco Cielos Plastico	Valor Total	89.30

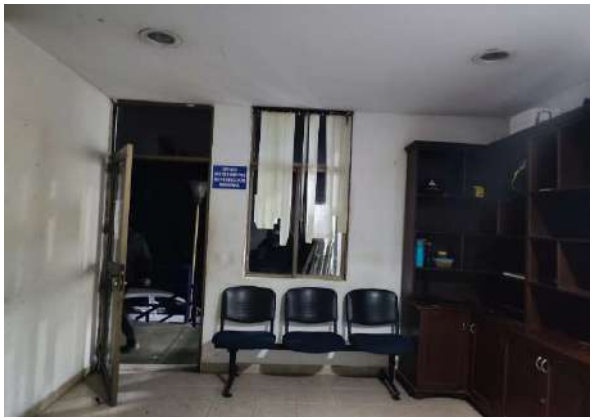
Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
	CIELO RASO ZONA ATENCIÓN AL USUARIO		1.22	2.44	5.00	14.88	14.88
 	CIELO RASO ESCALERA		1.22	2.44	1.00	2.98	17.86

 	CIELO RASO OFICINA 211 SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	20.84
	CIELO RASO SEGUNDO PISO, FRENTE A OFICINA 211	1.22	2.44	1.00	2.98	23.81
	CIELO RASO SEGUNDO PISO, PASILLO DE OFICINA 211 Y 212	1.22	2.44	2.00	5.95	29.77

	CIELO RASO SEGUNDO PISO, PASILLO DE BAÑOS	1.22	2.44	2.00	5.95	35.72
	CIELO RASO DE BAÑO SEGUNDO PISO	1.22	2.44	2.00	5.95	41.68
 	CIELO RASO OFICINA DE DIRECCIÓN SEGUNDO PISO	1.22	2.44	2.00	5.95	47.63

	CIELO RASO ENTRE OFICINA 205 Y BAÑOS SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	50.61
	CIELO RASO DE CORREDOR BAÑOS DE SEGUNDO PISO AL LADO DE CAMILLA	1.22	2.44	2.00	5.95	56.56
 	CIELO RASO DE 2 BAÑOS SEGUNDO PISO, AL LADO DE CAMILLA	1.22	2.44	4.00	11.91	68.47

	CIELO RASO DE ZONA EXTERIOR A LA COCINA DEL SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	71.44
	CIELO RASO COCINA SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	74.42

	CIELO RASO AFUERA DE BAÑOS SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	77.40
	CIELO RASO OFICINA DE VIGILANCIA	1.22	2.44	2.00	5.95	83.35

	CIELO RASO BAÑO OFICINA DE VIGILANCIA		1.22	2.44	1.00	2.98	86.33
	CIELO RASO BAÑO EXTERIOR		1.22	2.44	1.00	2.98	89.30

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

2	CUBIERTA Y CIELO RASO		N° Acta	1.00
2.06	Ítem:	Impermeabilización de placa de concreto, mediante mortero impermeabilizado y manto asfáltico. Incluye pintura.	Valor Total	23.23

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
	Impermeabilización de placa de concreto, mediante mortero impermeabilizado y manto asfáltico. Incluye pintura.		7.90	2.94	1.00	23.23	23.23

Nota:

Firma	Claudia Y.D.S.	Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA 2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES


Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

2	CUBIERTA Y CIELO RASO	N° Acta	1.00
2.07	Ítem: Limpieza de canales, incluye reacomedación de soportes	Valor Total	124.51

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: ML	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	ML	
	CANAL INTERNA DE 45 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 1		7.60			7.60	7.60

	CANAL PERIMETRAL DE 20 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 1		22.66			22.66	30.26
	CANAL INTERNA DE 31 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 2		19.20			19.20	49.46
	CANAL PERIMETRAL DE 20 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 2		75.05			75.05	124.51
Nota:							

Firma			Firma				
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES			
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra			
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27	

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

2	CUBIERTA Y CIELO RASO		N° Acta	1.00
2.08	Ítem: Suministro e instalación de espuma expansiva		Valor Total	20.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: ML	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	ML	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPUMA EXPANSIVA		20.00		1.00		20.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz	Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA 2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


3	MUROS Y ACABADOS			N° Acta	1.00
3.01	Ítem: Rasqueteada y lijada de muros			Valor Total	256.08



Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones				Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	M2	
	FALLAS EN PARED SUPERIOR OFINAS ENSEÑANZA			5.32	1.15	1.00	6.12	6.12

	FALLA EN PARED EXTERIOR COCINA SEGUNDO PISO		3.70	2.40	1.00	8.88	15.00
	HUMEDAD AL LADO DE VENTANA DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS		1.30	0.60	1.00	0.78	15.78
	OFICINA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS, 2 MUROS PARALELOS (SIN PUERTAS)		2.50	2.40	2.00	12.00	27.78
 	PARED INTERIOR FONDO EN LOS DOS BAÑOS SEGUNDO PISO		1.20	0.50	2.00	1.20	28.98
	PARED INTERIOR DE LOS DOS BAÑOS CON PUERTA SEGUNDO PISO		0.82	0.50	2.00	0.82	29.80
	PAREDES INTERIOR PARALELAS DOS BAÑOS SEGUNDO PISO		2.60	0.50	4.00	5.20	35.00

 	HUMEDAD EN VENTANA DE OFICINA DIVISIÓN DE TRÁNSITO		6.20	2.85	1.00	17.67	52.67
	2 VENTANAS EN OFICINA DE DIVISIÓN DE TRÁNSITO		0.96	-1.40	2.00	-2.69	49.98
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO					7.67	57.65
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO					15.52	73.17
	MURO CON VENTANA AL LADO DE MURO 1 (INCLUYE COLUMNA)		2.15	2.85	1.00	6.13	79.30

	VENTANA DE MURO 2		0.99	-2.10	1.00	-2.08	77.22
	MURO DE ENTRADA PRINCIPAL		10.00	6.07	1.00	60.70	137.92
	PUERTA DE MURO DE ENTRADA PRINCIPAL		2.74	-2.85	1.00	-7.81	130.11
	2 VENTANAS EN MURO DE ENTRADA PRINCIPAL		3.83	-5.00	1.00	-19.15	110.96
	MURO CON LETERO DE MATRICULAS		6.65	2.85	1.00	18.95	129.91
	2 VENTANAS EN MURO DE LETRERO DE MATRICULAS		0.80	-2.00	2.00	-3.20	126.71
	OFICINA 212		2.50	2.40	1.00	6.00	132.71
	VENTANA EN OFICINA 212		1.28	-2.00	1.00	-2.56	130.15
	MURO OFICINA 211		2.50	2.40	2.00	12.00	142.15

	VENTANA EN MURO OFICINA 211		1.28	-2.00	1.00	-2.56	139.59
	MURO OFICINA 210		4.82	2.40	2.00	23.14	162.73
	VENTANA EN MURO OFICINA 210		1.28	-2.00	1.00	-2.56	160.17
	MURO OFICINA DIRECCIÓN		4.10	2.40	1.00	9.84	170.01
	ESTANTE BIBLIOTECA MURO OFICINA DIRECCIÓN		1.60	-2.40	1.00	-3.84	166.17
	VENTANA EN MURO OFICINA DIRECCIÓN		1.94	-2.00	1.00	-3.88	162.29
	MURO DE OFICINA FRENTE A DIRECCIÓN		4.70	2.40	1.00	11.28	173.57
	DOS VENTANAS EN MURO DE OFICINA FRENTE A DIRECCIÓN		1.90	-2.00	2.00	-7.60	165.97
 	MURO DE OFICINA DIAGONAL A DIRECCIÓN		7.19	2.40	1.00	17.26	183.22
	DOS VENTANAS EN MURO DE OFICINA DIAGONAL A DIRECCIÓN		1.90	-2.00	2.00	-7.60	175.62

 	PARED DE OFICINA DE CONTROL INTERNO				1.70	177.32
	MURO PARALELO A LA PARED INTERNA (FONDO)		2.43	2.40	1.00	5.83	183.16
	VENTANA EN MURO 46		1.90	-2.00	1.00	-3.80	179.36
	MURO 47: PARADES PARALELAS FALTANTES OFICINA CONTROL INTERNO		2.60	2.40	2.00	12.48	191.84
	MURO DE OFICINA 205 SISTEMAS		5.15	2.40	1.00	12.36	204.20
	VENTANA EN MURO DE OFICINA 205 SISTEMAS		1.90	-2.00	1.00	-3.80	200.40
  	PARED CON PUERTA DE SALIDA INTERNA		4.64	3.70	1.00	17.17	217.56
	VENTANA EN MURO DE SALIDA INTERNA		1.55	-2.10	1.00	-3.26	214.31
	PUERTA EN MURO DE SALIDA INTERNA		1.90	-2.40	1.00	-4.56	209.75
	PARED LATERAL A MURO DE SALIDA INTERNA CON VENTANA		3.90	3.70	1.00	14.43	224.18
	VENTANA EN MURO ANTERIOR		1.90	-2.10	1.00	-3.99	220.19

	MURO DE BAÑO EXTERIOR			4.16	0.80	1.00	3.33	223.52
	2 VENTANAS EN BAÑO EXTERIOR			0.48	-0.60	2.00	-0.58	222.94
 	MURO DE OFICINA VIGILANCIA			17.22	2.53	1.00	43.57	266.51
	2 VENTANAS EN BAÑO EXTERIOR						-12.94	253.57
	MURO DE BAÑO DE OFICINA DE VIGILANCIA			6.79	0.37	1.00	2.51	256.08

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

3	MUROS Y ACABADOS		N° Acta	1.00
3.02	Ítem:	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	Valor Total	69.20

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
 	PLACA ARCHIVO ENCIMA DE PUERTAS CORREDIZAS (SEÑAL DE HUMEDAD)		4.9	8		39.2	39.20
 	PLACA ARCHIVO DESDE ENTRADA DE OFICINA HASTA DIVISION DE LA SIGUIENTE PARTE DE LA OFICINA		6	5		30	69.20

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD 27

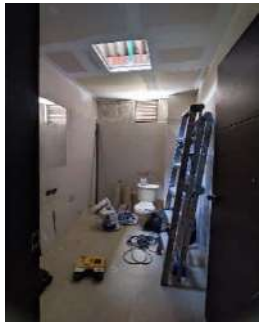
MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


3	MUROS Y ACABADOS		N° Acta	1.00
3.03	Ítem: Estuco plástico sobre muro		Valor Total	256.08



Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones				Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	M2	
	FALLAS EN PARED SUPERIOR OFINAS ENSEÑANZA			5.32	1.15	1.00	6.12	6.12

	FALLA EN PARED EXTERIOR COCINA SEGUNDO PISO		3.70	2.40	1.00	8.88	15.00
	HUMEDAD AL LADO DE VENTANA DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS		1.30	0.60	1.00	0.78	15.78
	OFICINA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS, 2 MUROS PARALELOS (SIN PUERTAS)		2.50	2.40	2.00	12.00	27.78
 	PARED INTERIOR FONDO EN LOS DOS BAÑOS SEGUNDO PISO		1.20	0.50	2.00	1.20	28.98
	PARED INTERIOR DE LOS DOS BAÑOS CON PUERTA SEGUNDO PISO		0.82	0.50	2.00	0.82	29.80
	PAREDES INTERIOR PARALELAS DOS BAÑOS SEGUNDO PISO		2.60	0.50	4.00	5.20	35.00

 	HUMEDAD EN VENTANA DE OFICINA DIVISIÓN DE TRÁNSITO		6.20	2.85	1.00	17.67	52.67
	2 VENTANAS EN OFICINA DE DIVISIÓN DE TRÁNSITO		0.96	-1.40	2.00	-2.69	49.98
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO					7.67	57.65
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO					15.52	73.17
	MURO CON VENTANA AL LADO DE MURO 1 (INCLUYE COLUMNA)		2.15	2.85	1.00	6.13	79.30

	VENTANA DE MURO 2		0.99	-2.10	1.00	-2.08	77.22
	MURO 3: ENTRADA PRINCIPAL		10.00	6.07	1.00	60.70	137.92
	PUERTA DE MURO 3		2.74	-2.85	1.00	-7.81	130.11
	2 VENTANAS EN MURO 3		3.83	-5.00	1.00	-19.15	110.96
	MURO CON, LETERO DE MATRICULAS		6.65	2.85	1.00	18.95	129.91
	2 VENTANAS EN MURO DE LETRERO DE MATRICULAS		0.80	-2.00	2.00	-3.20	126.71
	OFICINA 212		2.50	2.40	1.00	6.00	132.71
	VENTANA EN OFICINA 212		1.28	-2.00	1.00	-2.56	130.15
	MURO OFICINA 211		2.50	2.40	2.00	12.00	142.15

	VENTANA EN MURO OFICINA 211		1.28	-2.00	1.00	-2.56	139.59
	MURO OFICINA 210		4.82	2.40	2.00	23.14	162.73
	VENTANA EN MURO OFICINA 210		1.28	-2.00	1.00	-2.56	160.17
	MURO OFICINA DIRECCIÓN		4.10	2.40	1.00	9.84	170.01
	ESTANTE BIBLIOTECA MURO OFICINA DIRECCIÓN		1.60	-2.40	1.00	-3.84	166.17
	VENTANA EN MURO OFICINA DIRECCIÓN		1.94	-2.00	1.00	-3.88	162.29
	MURO DE OFICINA FRENTE A DIRECCIÓN		4.70	2.40	1.00	11.28	173.57
	DOS VENTANAS EN MURO DE OFICINA FRENTE A DIRECCIÓN		1.90	-2.00	2.00	-7.60	165.97
 	MURO DE OFICINA DIAGONAL A DIRECCIÓN		7.19	2.40	1.00	17.26	183.22
	DOS VENTANAS EN MURO DE OFICINA DIAGONAL A DIRECCIÓN		1.90	-2.00	2.00	-7.60	175.62

 	PARED DE OFICINA DE CONTROL INTERNO				1.70	177.32
	MURO PARALELO A LA PARED INTERNA (FONDO)		2.43	2.40	1.00	5.83	183.16
	VENTANA EN MURO 46		1.90	-2.00	1.00	-3.80	179.36
	MURO 47: PARADES PARALELAS FALTANTES OFICINA CONTROL INTERNO		2.60	2.40	2.00	12.48	191.84
	MURO DE OFICINA 205 SISTEMAS		5.15	2.40	1.00	12.36	204.20
	VENTANA EN MURO DE OFICINA 205 SISTEMAS		1.90	-2.00	1.00	-3.80	200.40
  	PARED CON PUERTA DE SALIDA INTERNA		4.64	3.70	1.00	17.17	217.56
	VENTANA EN MURO DE SALIDA INTERNA		1.55	-2.10	1.00	-3.26	214.31
	PUERTA EN MURO DE SALIDA INTERNA		1.90	-2.40	1.00	-4.56	209.75
	PARED LATERAL A MURO DE SALIDA INTERNA CON VENTANA		3.90	3.70	1.00	14.43	224.18
	VENTANA EN MURO ANTERIOR		1.90	-2.10	1.00	-3.99	220.19

	MURO DE BAÑO EXTERIOR			4.16	0.80	1.00	3.33	223.52
	2 VENTANAS EN BAÑO EXTERIOR			0.48	-0.60	2.00	-0.58	222.94
 	MURO DE OFICINA VIGILANCIA			17.22	2.53	1.00	43.57	266.51
	2 VENTANAS EN BAÑO EXTERIOR						-12.94	253.57
	MURO DE BAÑO DE OFICINA DE VIGILANCIA			6.79	0.37	1.00	2.51	256.08

Nota:

Firma	Claudia Y. D. S.		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

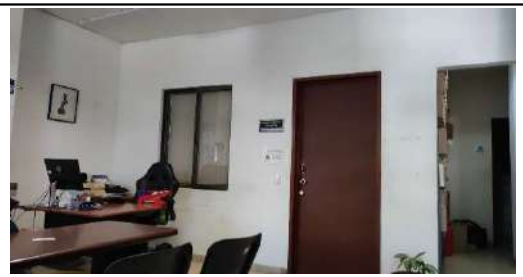
Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


3	MUROS Y ACABADOS	N° Acta	1.00
3.04	Ítem: Pintura con vinilo sobre muros tres manos	Valor Total	904.10


Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones				Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	M2	
	PRIMER PISO							
	MURO 1: PISO 1, SALÓN ATENCIÓN AL USUARIO, MURO CON LETRERO DE "SEÑOR USUARIO DE IDTQ"			5.56	2.85	1.00	15.85	15.85
	COLUMNA AZUL DE MURO 1			0.73	2.85	1.00	2.08	17.93
	MURO 2: MURO CON VENTANA AL LADO DE MURO 1 (INCLUYE COLUMNA)			2.15	2.85	1.00	6.13	24.05

	VENTANA DE MURO 2		0.99	-2.10	1.00	-2.08	21.98
	MURO 3: ENTRADA PRINCIPAL		10.00	6.07	1.00	60.70	82.68
	PUERTA DE MURO 3		2.74	-2.85	1.00	-7.81	74.87
	2 VENTANAS EN MURO 3		3.83	-5.00	1.00	-19.15	55.72
	MURO 4: PARALELO AL CAJERO DAVIVIENDA (INCLUYE COLUMNA)		6.90	6.07	1.00	41.88	97.60
	PINTURA BLANCA EN CAJERO DAVIVIENDA				1.00	16.28	113.88
	PINTURA AZUL DE PUESTOS DE ATENCION AL USUARIO				1.00	18.45	132.33
	PINTURA BLANCA DE PUESTOS DE ATENCION AL USUARIO (INCLUYE COLUMNAS Y DIVISIONES)				1.00	59.57	191.90
 	MURO 5: MURO CONECTADO A MURO 4, LETERO DE MATRICULAS		6.65	2.85	1.00	18.95	210.85
	2 VENTANAS EN MURO 5		0.80	-2.00	2.00	-3.20	207.65

	MURO 6: DIVISIÓN CONTROL TRÁNSITO		3.45	2.85	1.00	9.83	217.48
	1 VENTANA EN MURO 6		0.96	-1.40	1.00	-1.34	216.14
	1 PUERTA EN MURO 6		0.92	-2.20	1.00	-2.02	214.12
  	OFICINA DIVISIÓN DE TRÁNSITO (MUROS PARALELOS, UNO INCLUYE LA PUERTA PRINCIPAL)		3.45	2.85	2.00	19.67	233.78
	MUROS PARALELOS FALTANTES DE LA OFICINA DIVISIÓN DE TRÁNSITO		6.20	2.85	2.00	35.34	269.12
	2 VENTANAS EN OFICINA DE DIVISIÓN DE TRÁNSITO		0.96	-1.40	2.00	-2.69	266.43
	MURO 7: MURO DE ARCHIVO AL FONDO DEL PRIMER PISO (NO SE TUVO EN CUENTA ESPACIO OCUPADO POR LAS CAJAS)		1.73	2.85	1.00	4.93	271.36
	MURO 8: PARALELO AL MURO 7		5.33	2.85	1.00	15.19	286.55
	CORREDOR DE BAÑOS PRIMER PISO					6.86	293.41

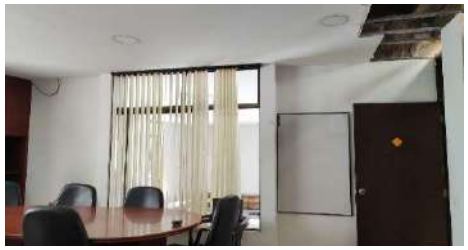
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO					7.67	301.08
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO					15.52	316.60
	MURO 9: MURO DE ESCALERA DEL PISO 1 HASTA DESCANSO		3.95	6.07	1.00	23.98	340.58
	ESCALERA HASTA EL DESCANSO					-2.98	337.60
	MURO 10: MURO DE DESCANSO DE LA ESCALERA		3.10	6.07	1.00	18.82	356.42
	ESCALERA EN EL DESCANSO					-6.00	350.42


	MURO 11: MURO DE ESCALERA, PARALELO A MURO 9		3.95	3.20	1.00	12.64	363.06
	MURO 12: MURO DE ESCALERA CON PUERTA A SEGUNDO PISO		2.28	2.40	1.00	5.47	368.53
 	MURO 13: MURO CON PLACA 103 PRIMER PISO		1.73	2.85	1.00	4.93	373.46
	PUERTA EN MURO 13		0.91	-2.10	1.00	-1.91	371.55
	MURO 14: CONTIGUO IZQUIERDO MURO 13				1.00	1.63	373.18
	MURO 15: CONTIGUO DERECHO MURO 13		1.36	2.85	1.00	3.88	377.06
 	MURO 16: INTERIOR DE OFICINA 103 PRIMER PISO, DOS MUROS PARALELOS (MUROS CON PUERTAS)		4.65	2.85	2.00	26.51	403.56
	DOS PUERTAS EN MURO 16 (UNA PUERTA EN CADA MURO)		0.91	-2.10	2.00	-3.82	399.74

 	MURO 17: INTERIOR DE OFICINA 103 PRIMER PISO, MUROS PARALELOS FALTANTES		3.66	2.85	2.00	20.86	420.60
	PUERTA EN MURO 17		1.80	-2.10	1.00	-3.78	416.82
	SEGUNDO PISO						
 	MURO 18: OFICINA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS, 2 MUROS PARALELOS (MURO CON PUERTA)		2.05	2.40	2.00	9.84	426.66
	PUERTA EN (UN) MURO 18		0.92	-2.40	1.00	-2.21	424.45
	MURO 19: OFICINA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS, 2 MUROS PARALELOS (SIN PUERTAS)		2.50	2.40	2.00	12.00	436.45
	MURO 20: CORREDOR DE OFICINA ARCHIVOS		2.90	2.40	1.00	6.96	443.41
	MURO 21: PARED FRENTE Y FONDO A LA OFICINA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS		4.70	2.40	1.00	11.28	454.69
	MURO 22: OFICINA 212, MUROS PARALELOS (SIN PUERTAS)		4.00	2.40	2.00	19.20	473.89
	MURO 23: OFICINA 212, MUROS PARALELOS (CON PUERTA PRINCIPAL)		2.50	2.40	2.00	12.00	485.89
	VENTANA EN (UN) MURO 23		1.28	-2.00	1.00	-2.56	483.33

	VENTANA EN MURO 23		0.97	-2.00	1.00	-1.94	481.39
	PUERTA EN (UN) MURO 23		0.92	-2.40	1.00	-2.21	479.18
	MURO 24: OFICINA 211, MUROS PARALELOS (SIN PUERTAS)		4.00	2.40	2.00	19.20	498.38
	MURO 25: OFICINA 211, MUROS PARALELOS (CON PUERTA PRINCIPAL)		2.50	2.40	2.00	12.00	510.38
	VENTANA EN (UN) MURO 25		1.28	-2.00	1.00	-2.56	507.82
	VENTANA EN MURO 25		0.97	-2.00	1.00	-1.94	505.88
	PUERTA EN (UN) MURO 25		0.92	-2.40	1.00	-2.21	503.68
 	MURO 26 OFICINA 210, MUROS PARALELOS (SIN PUERTAS)		4.20	2.40	2.00	20.16	523.84
	MURO 27: OFICINA 210, MUROS PARALELOS (CON PUERTA PRINCIPAL)		4.82	2.40	2.00	23.14	546.97
	VENTANA EN (UN) MURO 26, VISTA SALÓN ATENCIÓN AL USUARIO		1.93	-2.00	1.00	-3.86	543.11
 	PUERTA EN (UN) MURO 27		0.92	-2.40	1.00	-2.21	540.90
	VENTANA EN MURO 27		0.97	-2.00	1.00	-1.94	538.96
	VENTANA EN (UN) MURO 27		1.28	-2.00	1.00	-2.56	536.40

	MURO 28: CORREDOR CONECTOR OFICINAS 212 Y 211 (DOS PAREDES)					18.54	554.94
	MURO 29: MURO EXTERIOR OFICINA 210					2.92	2.40	1.00	7.01	561.95
	VENTANA EN MURO 29					0.97	-2.00	1.00	-1.94	560.01
	MURO 30: PARED CON PUERTA HACIA ESCALERA					2.37	2.40	1.00	5.69	565.70
	MURO 31: FACHADA OFICINA DIRECCIÓN (CON DESCUENTO DE VENTANAS Y PUERTAS)					4.17	2.40	1.00	10.01	575.71
	MURO 32: OFICINA DIRECCIÓN, PARED CON PUERTA PRINCIPAL (INTERIOR)					4.17	2.40	1.00	10.01	585.72


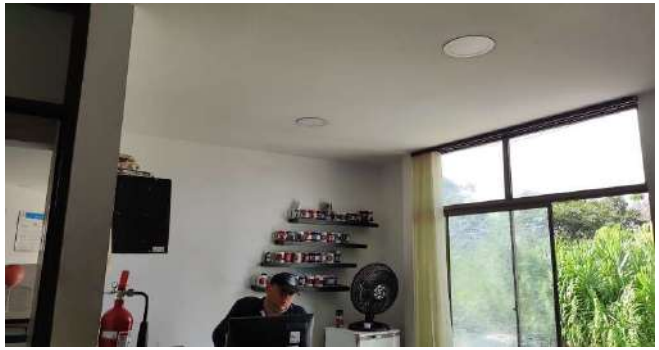
	MURO 33: OFICINA DIRECCIÓN, MURO PARALELO AL 32 (FONDO)		4.10	2.40	1.00	9.84	595.56
	ESTANTE BIBLIOTECA MURO 33		1.60	-2.40	1.00	-3.84	591.72
	VENTANA EN MURO 33		1.94	-2.00	1.00	-3.88	587.84
	MURO 34: OFICINA DIRECCIÓN, PAREDES PARALELAS FALTANTES		5.80	2.40	2.00	27.84	615.68
	ESTANTE BIBLIOTECA EN MURO 34		1.75	-2.40	1.00	-4.20	611.48
	PUERTA BAÑO EN MURO 34		0.92	-2.40	1.00	-2.21	609.27
	VENTANA EN MURO 34		1.94	-2.00	1.00	-3.88	605.39
	MURO 35: FACHADA OFICINA FRENTE A DIRECCIÓN		4.70	2.40	1.00	11.28	616.67
	2 VENTANAS EN MURO 35		0.97	-2.00	2.00	-3.88	612.79
	PUERTA EN MURO 35		0.91	-2.00	1.00	-1.82	610.97
	MURO 36: PARED INTERIOR MURO 35				1.00	6.51	617.48


	MURO 37: OFICINA FRENTE A DIRECCIÓN, MURO PARALELO AL 36 (FONDO)		4.70	2.40	1.00	11.28	628.76
	DOS VENTANAS EN MURO 37		1.90	-2.00	2.00	-7.60	621.16
	MURO 38: OFICINA FRENTE A DIRECCIÓN, PAREDES PARALELAS FALTANTES (SIN PUERTA)		3.40	2.40	2.00	16.32	637.48
	MURO 39: PARED DIVISORIA CON OFICINA CONTINUA		1.45	2.40	1.00	3.48	640.96
	MURO 40: FACHADA OFICINA CONTINUA AL MURO 39					4.06	645.02
	MURO 41: OFICINA PARED INTERIOR MURO 40					4.06	649.08



   	MURO 42: FONDO OFICINA MURO 41		7.19	2.40	1.00	17.26	666.33
	DOS VENTANAS EN MURO 42		1.90	-2.00	2.00	-7.60	658.73
	MURO 43: PAREDES PARALELAS FALTANTES (SIN PUERTAS)		4.80	2.40	2.00	23.04	681.77
	MURO 44: FACHADA OFICINA DE CONTROL INTERNO					5.69	687.46
	MURO 45: PARED INTERNA A LA FACHADA OFICINA DE CONTROL INTERNO					1.70	689.16
	MURO 46: PARALELA A LA PARED INTERNA (FONDO)		2.43	2.40	1.00	5.83	695.00
	VENTANA EN MURO 46		1.90	-2.00	1.00	-3.80	691.20
	MURO 47: PARADES PARALELAS FALTANTES OFICINA CONTROL INTERNO		2.60	2.40	2.00	12.48	703.68

	MURO 48: PARED CON CAMILLA DE EMERGENCIA		1.29	2.40	1.00	3.10	706.77
	MURO 49: CORREDOR BAÑOS CON 2 PUERTAS		4.48	2.40	1.00	10.75	717.52
	DOS PUERTAS EN MURO 49		0.92	-2.40	2.00	-4.42	713.11
	MURO 50: CORREDOR BAÑOS SIN PUERTA		3.44	2.40	1.00	8.26	721.36
 	MURO 51: PARED INTERIOR FONDO EN LOS DOS BAÑOS		1.20	0.50	2.00	1.20	722.56
	MURO 52: PARED INTERIOR DE LOS DOS BAÑOS CON PUERTA		0.82	0.50	2.00	0.82	723.38
	MURO 53: PAREDES INTERIOR PARALELAS DOS BAÑOS		2.60	0.50	4.00	5.20	728.58


	MURO 54: PARED FONDO DEL CORREDOR BAÑOS		1.02	2.40	1.00	2.45	731.03
 	MURO 55: PAREDES COCINA COMPLETA					14.42	745.45
	MURO 56: PARED CON LETRERO AMARILLO DE CONTROL INTERNO		3.30	2.40	1.00	7.92	753.37
	VENTANA EN MURO 56		0.92	-2.00	1.00	-1.84	751.53

	MURO 57: PARED CON LETRERO DE SISTEMAS OFICINA 205		2.30	2.40	1.00	5.52	757.05
 	MURO 58: OFICINA 205 SISTEMAS (PARED CON VENTANA HACIA EXTERIOR)		5.15	2.40	1.00	12.36	769.41
	VENTANA EN MURO 58		1.90	-2.00	1.00	-3.80	765.61
	MURO 59: OFICINA 205 (PARED PARALELA A MURO 58)		2.85	2.40	1.00	6.84	772.45
	MURO 60: OFICINA 205 (PARED CON PUERTA HACIA MAQUINARIA)		3.87	2.40	1.00	9.29	781.74
	MURO 61: PARED PARALELA A MURO 60		2.85	2.40	1.00	6.84	788.58

	MURO 62: PARED EXTERIOR COCINA		3.70	2.40	1.00	8.88	797.46
	PINTURA ESCALERA SALIDA ALTERNA					12.80	810.26
	MURO 63: PARED ESCALERA					12.66	822.92
  	MURO 64: PARED CON PUERTA DE SALIDA INTERNA		4.64	3.70	1.00	17.17	840.09
	VENTANA EN MURO 64		1.55	-2.10	1.00	-3.26	836.83
	PUERTA EN MURO 64		1.90	-2.40	1.00	-4.56	832.27
	MURO 65: PARED LATERAL A MURO 64 CON VENTANA		3.90	3.70	1.00	14.43	846.70
	VENTANA EN MURO 65		1.90	-2.10	1.00	-3.99	842.71

 	MURO 66: FACHADA OFICINAS DE ENSEÑANZA			7.60	2.55	1.00	19.38	862.09
	MURO 67: PARED SUPERIOR OFINAS ENSEÑANZA			5.32	1.15	1.00	6.12	868.21
	MURO DE BAÑO EXTERIOR			4.16	0.80	1.00	3.33	871.54
	2 VENTANAS EN BAÑO EXTERIOR			0.48	-0.60	2.00	-0.58	870.96
 	MURO DE OFICINA VIGILANCIA			17.22	2.53	1.00	43.57	914.53
	2 VENTANAS EN BAÑO EXTERIOR						-12.94	901.59
	MURO DE BAÑO DE OFICINA DE VIGILANCIA			6.79	0.37	1.00	2.51	904.10

Nota:

Firma			Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

3	MUROS Y ACABADOS	N° Acta	1.00
3.05	Ítem: Muro en Panel Yeso e= 1/2" a dos caras	Valor Total	10.97

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Alto	M2	
	Muro en Panel Yeso e= 1/2" a dos caras			1.86	2.95	10.97	10.97

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz	Firma	
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra
Fecha	AA 2023	MM Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

3	MUROS Y ACABADOS	N° Acta	1.00
3.06	Ítem: Estructura para muro en placa Liviana (Canal - Paral)	Valor Total	5.49

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Alto	M2	
	Estructura para muro en placa Liviana (Canal - Paral)			1.86	2.95	5.49	5.49

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz	Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA 2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

3	MUROS Y ACABADOS	N° Acta	1.00
3.07	Ítem: Suministro e instal. De puerta en doble lamina llena Cal. 16 con refuerzo interno, incluye marco y bisagras antivandálicas	Valor Total	0.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad:	M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula		Largo	Ancho	Alto	M2	
	Suministro e instal. De puerta en doble lámina llena Cal. 16 con refuerzo interno, incluye marco y bisagras antivandálicas						0.00	0.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

4	REDES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN	N° Acta	1.00
4.01	Ítem: Luminaria Tipo Panel Led 15 W	Valor Total	0.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
	Luminaria Tipo Panel Led 15 W					0.00	0.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

4	REDES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN	N° Acta	1.00
4.02	Ítem: Punto eléctrico iluminación	Valor Total	35.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
	PUNTOS ELECTRICOS PARA LUMINARIA TIPO PANEL LED 18 W					35.00	35.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA 2023		MM	Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

4	REDES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN	N° Acta	1.00
4.03	Ítem: Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores	Valor Total	6.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
	Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores					6.00	6.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz	Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA 2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

4	REDES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN	N° Acta	1.00
4.04	Ítem: Desmonte Y Retiro De Red Electrica Existente En Placa, Incluye Accesorios. (Area Aproximada De Desmonte 80 Mt) Y Traslado Sitio Interno De Disposicion De Desmontes Y De Mas Elementos Necesarios Para La Ejecucion Del Item	Valor Total	1.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: GLB	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	GLB	
	Desmonte Y Retiro De Red Electrica Existente En Placa, Incluye Accesorios. (Area Aproximada De Desmonte 80 Mt²) Y Traslado Sitio Interno De Disposicion De Desmontes Y De Mas Elementos Necesarios Para La Ejecucion Del Item					1.00	1.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz	Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA 2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

4	REDES ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN	N° Acta	1.00
4.05	Ítem: Suministro e instalación de toma GFCI	Valor Total	5.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
	Suministro e instalación de toma GFCI					5.00	5.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz	Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA 2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

5	REDES HIDROSANITARIAS		N° Acta	1.00
5.01	Ítem: Revisión de Punto Hidráulico existente		Valor Total	10.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
 	Revisión de Punto Hidráulico existente					10.00	10.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma				
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES			
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra			
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27	

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Versión: 001 | Pag: 12 de 14

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

5	REDES HIDROSANITARIAS	N° Acta	1.00
5.02	Ítem: Revisión aparato sanitario	Valor Total	10.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
 						10.00	10.00

Nota:

Firma		Firma	
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra
Fecha	AA 2023	MM Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

5	REDES HIDROSANITARIAS		N° Acta	1.00
5.03	Ítem: Suministro e instalación orinal de pared		Valor Total	3.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
 	Suministro e instalación orinal de pared					3.00	3.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

5	REDES HIDROSANITARIAS		N° Acta	1.00
5.04	Ítem: Suministro e instalación sanitario institucional		Valor Total	1.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
	Suministro e instalación sanitario institucional					1.00	1.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz	Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA 2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

5	REDES HIDROSANITARIAS	N° Acta	1.00
5.05	Ítem: Desmonte de aparatos sanitarios incluye grifería	Valor Total	2.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
	Desmonte de aparatos sanitarios incluye grifería				2.00	2.00	2.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz	Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO	Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista	Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA 2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

5	REDES HIDROSANITARIAS	N° Acta	1.00
5.06	Ítem: Suministro e instalación lavamanos institucional	Valor Total	1.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: UND	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	UND	
	Suministro e instalación lavamanos institucional				1.00	1.00	1.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Versión: 001 | Pag: 12 de 14

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

6	LIMPIEZA DE OBRA		N° Acta	1.00
6.01	Ítem:	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	Valor Total	14.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad:	M3	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula		Largo	Ancho	Cantidad	M3	
	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km					14.00	14.00	14.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

6	LIMPIEZA DE OBRA		N° Acta	1.00
6.02	Ítem: Limpieza general de espacios construidos		Valor Total	400.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
	Limpieza general de espacios construidos				400.00	400.00	400.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

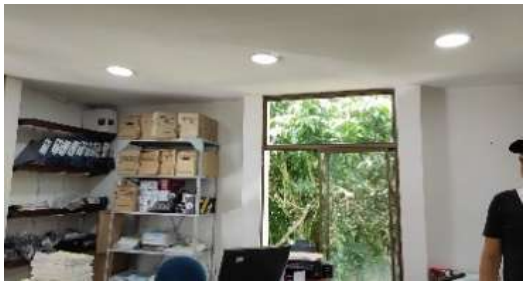
Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.


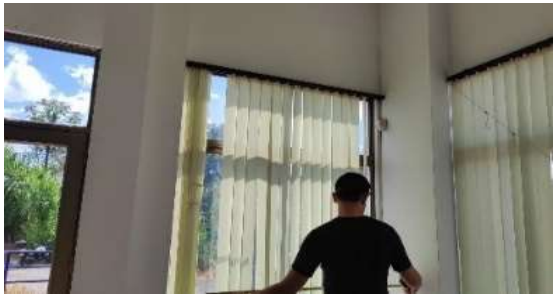
7	OBRAS ADICIONALES			N° Acta	1.00
7.01	Ítem: SELLO CON SIKAFLEX			Valor Total	122.98



Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: ML	Dimensiones				Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	ML	
 	VENTANA EN OFICINA DE DIVISIÓN DE TRÁNSITO			0.96	1.40	2.00	4.72	4.72

	VENTANA DE MURO 2		0.99	2.10	2.00	6.18	10.90
	VENTANA EN MURO DE ENTRADA PRINCIPAL		3.83	5.00	2.00	17.66	28.56
 	2 VENTANAS EN MURO DE LETRERO DE MATRICULAS		0.80	2.00	4.00	11.20	39.76

	VENTANA EN MURO OFICINA 211		1.28	2.00	2.00	6.56	46.32
	VENTANA EN MURO OFICINA 210		1.28	2.00	2.00	6.56	52.88
	VENTANA EN MURO OFICINA DIRECCIÓN		1.94	2.00	2.00	7.88	60.76

	DOS VENTANAS EN MURO DE OFICINA FRENTE A DIRECCIÓN		1.90	2.00	4.00	15.60	76.36
 	DOS VENTANAS EN MURO DE OFICINA DIAGONAL A DIRECCIÓN		1.90	2.00	2.00	7.80	84.16
 	VENTANA EN MURO 46		1.90	2.00	2.00	7.80	91.96

	VENTANA EN MURO DE OFICINA 205 SISTEMAS		1.90	2.00	2.00	7.80	99.76
	VENTANA EN MURO DE SALIDA INTERNA		1.55	2.10	2.00	7.30	107.06
	VENTANA EN MURO ANTERIOR		1.90	2.10	2.00	8.00	115.06

 	VENTANA EN OFICINA VIGILANCIA			2.00	1.96	2.00	7.92	122.98

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma				
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES			
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra			
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27	

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta


Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.



7	OBRAS ADICIONALES			N° Acta	1.00
7.02	Ítem: IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS			Valor Total	225.50

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones				Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	M2	
	HUMEDAD AL LADO DE VENTANA DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS			1.30	0.60	1.00	0.78	0.78
	OFICINA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS, 2 MUROS PARALELOS (SIN PUERTAS)			2.50	2.40	2.00	12.00	12.78
 	PARED INTERIOR FONDO EN LOS DOS BAÑOS SEGUNDO PISO			1.20	0.50	2.00	1.20	13.98
	PARED INTERIOR DE LOS DOS BAÑOS CON PUERTA SEGUNDO PISO			0.82	0.50	2.00	0.82	14.80

 	PAREDES INTERIOR PARALELAS DOS BAÑOS SEGUNDO PISO		2.60	0.50	4.00	5.20	20.00
 	HUMEDAD EN VENTANA DE OFICINA DIVISIÓN DE TRÁNSITO		6.20	2.85	1.00	17.67	37.67
	2 VENTANAS EN OFICINA DE DIVISIÓN DE TRÁNSITO		0.96	-1.40	2.00	-2.69	34.98
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO					7.67	42.65
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO					15.52	58.17

	MURO CON VENTANA AL LADO DE MURO 1 (INCLUYE COLUMNA)		2.15	2.85	1.00	6.13	64.30
	VENTANA DE MURO 2		0.99	-2.10	1.00	-2.08	62.22
	MURO DE ENTRADA PRINCIPAL		8.00	6.07	1.00	48.56	110.78
	PUERTA DE MURO DE ENTRADA PRINCIPAL		2.74	-2.85	1.00	-7.81	102.97
	2 VENTANAS EN MURO DE ENTRADA PRINCIPAL		3.83	-5.00	1.00	-19.15	83.82
 	MURO CON LETERO DE MATRICULAS		6.65	2.85	1.00	18.95	102.77
	2 VENTANAS EN MURO DE LETRERO DE MATRICULAS		0.80	-2.00	2.00	-3.20	99.57
	MURO OFICINA 211		2.50	2.40	2.00	12.00	111.57

	VENTANA EN MURO OFICINA 211		1.28	-2.00	1.00	-2.56	109.01
	MURO OFICINA 210		4.82	2.40	2.00	23.14	132.15
	VENTANA EN MURO OFICINA 210		1.28	-2.00	1.00	-2.56	129.59
	MURO OFICINA DIRECCIÓN		4.10	2.40	1.00	9.84	139.43
	ESTANTE BIBLIOTECA MURO OFICINA DIRECCIÓN		1.60	-2.40	1.00	-3.84	135.59
	VENTANA EN MURO OFICINA DIRECCIÓN		1.94	-2.00	1.00	-3.88	131.71
	MURO DE OFICINA FRENTE A DIRECCIÓN		4.70	2.40	1.00	11.28	142.99
	DOS VENTANAS EN MURO DE OFICINA FRENTE A DIRECCIÓN		1.90	-2.00	2.00	-7.60	135.39
 	MURO DE OFICINA DIAGONAL A DIRECCIÓN		7.19	2.40	1.00	17.26	152.65
	DOS VENTANAS EN MURO DE OFICINA DIAGONAL A DIRECCIÓN		1.90	-2.00	2.00	-7.60	145.05

 	PARED DE OFICINA DE CONTROL INTERNO				1.70	146.75
	MURO PARALELO A LA PARED INTERNA (FONDO)		2.43	2.40	1.00	5.83	152.58
	VENTANA EN MURO 46		1.90	-2.00	1.00	-3.80	148.78
	MURO 47: PARADES PARALELAS FALTANTES OFICINA CONTROL INTERNO		2.60	2.40	2.00	12.48	161.26
	MURO DE OFICINA 205 SISTEMAS		5.15	2.40	1.00	12.36	173.62
	VENTANA EN MURO DE OFICINA 205 SISTEMAS		1.90	-2.00	1.00	-3.80	169.82
  	PARED CON PUERTA DE SALIDA INTERNA		4.64	3.70	1.00	17.17	186.99
	VENTANA EN MURO DE SALIDA INTERNA		1.55	-2.10	1.00	-3.26	183.73
	PUERTA EN MURO DE SALIDA INTERNA		1.90	-2.40	1.00	-4.56	179.17
	PARED LATERAL A MURO DE SALIDA INTERNA CON VENTANA		3.90	3.70	1.00	14.43	193.60
	VENTANA EN MURO ANTERIOR		1.90	-2.10	1.00	-3.99	189.61

	MURO DE BAÑO EXTERIOR			4.16	0.80	1.00	3.33	192.94
	2 VENTANAS EN BAÑO EXTERIOR			0.48	-0.60	2.00	-0.58	192.36
 	MURO DE OFICINA VIGILANCIA			17.22	2.53	1.00	43.57	235.93
	2 VENTANAS EN OFICINA VIGILANCIA						-12.94	222.99
	MURO DE BAÑO DE OFICINA DE VIGILANCIA			6.79	0.37	1.00	2.51	225.50

Nota:

Firma	Claudia Y. D. S.		Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

3	MUROS Y ACABADOS		N° Acta	1.00
3.02	Ítem:	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	Valor Total	69.20

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
 	PLACA ARCHIVO ENCIMA DE PUERTAS CORREDIZAS (SEÑAL DE HUMEDAD)		4.9	8		39.2	39.20
 	PLACA ARCHIVO DESDE ENTRADA DE OFICINA HASTA DIVISION DE LA SIGUIENTE PARTE DE LA OFICINA		6	5		30	69.20

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

7	OBRAS ADICIONALES	N° Acta	1.00
7.04	Ítem: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE	Valor Total	50.40

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: ML	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	ML	
	CABALLETES			0.90	56.00	50.40	50.40

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma				
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES			
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra			
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27	

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

7	OBRAS ADICIONALES		N° Acta	1.00
7.05	Ítem: SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA		Valor Total	108.00

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
	TEJA TRASLUCIDA		3.00	0.90	40.00	108.00	108.00

Nota:

Firma	Claudia Y. Díaz		Firma		
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES	
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra	
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD 27

MEMORIA DE CANTIDADES


Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

7	OBRAS ADICIONALES		N° Acta	1.00
7.06	Ítem: TRATAMIENTO DE VIGA CANALES EN CONCRETO		Valor Total	124.51

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: ML	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	ML	
	CANAL INTERNA DE 45 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 1		7.60			7.60	7.60

	CANAL PERIMETRAL DE 20 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 1		22.66			22.66	30.26
	CANAL INTERNA DE 31 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 2		19.20			19.20	49.46
	CANAL PERIMETRAL DE 20 CM DE ANCHO EN CUBIERTA 2		75.05			75.05	124.51
Nota:							

Firma			Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27

MEMORIA DE CANTIDADES

Claudia Díaz arquitecta

Contrato No.		Año	2023	Objeto	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

2	CUBIERTA Y CIELO RASO	N° Acta	1.00
2.01	Ítem: Cielo Raso en Panel Yeso incluye estructura de soporte	Valor Total	89.30

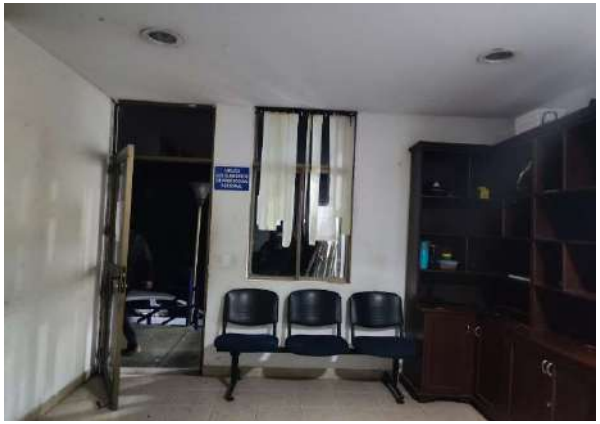
Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad: M2	Dimensiones			Valor Total	Valor acumulado
		Formula	Largo	Ancho	Cantidad	M2	
	CIELO RASO ZONA ATENCIÓN AL USUARIO		1.22	2.44	5.00	14.88	14.88
 	CIELO RASO ESCALERA		1.22	2.44	1.00	2.98	17.86

 	CIELO RASO OFICINA 211 SEGUNDO PISO (NECESITA 1 PLACA 2X2)	1.22	2.44	1.00	2.98	20.84
	CIELO RASO SEGUNDO PISO, FRENTE A OFICINA 211	1.22	2.44	1.00	2.98	23.81
	CIELO RASO SEGUNDO PISO, PASILLO DE OFICINA 211 Y 212	1.22	2.44	2.00	5.95	29.77

	CIELO RASO SEGUNDO PISO, PASILLO DE BAÑOS	1.22	2.44	2.00	5.95	35.72
	CIELO RASO DE BAÑO SEGUNDO PISO	1.22	2.44	2.00	5.95	41.68
 	CIELO RASO OFICINA DE DIRECCIÓN SEGUNDO PISO	1.22	2.44	2.00	5.95	47.63

	CIELO RASO ENTRE OFICINA 205 Y BAÑOS SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	50.61
	CIELO RASO DE CORREDOR BAÑOS DE SEGUNDO PISO AL LADO DE CAMILLA	1.22	2.44	2.00	5.95	56.56
 	CIELO RASO DE 2 BAÑOS SEGUNDO PISO, AL LADO DE CAMILLA	1.22	2.44	4.00	11.91	68.47

	CIELO RASO DE ZONA EXTERIOR A LA COCINA DEL SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	71.44
	CIELO RASO COCINA SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	74.42

	CIELO RASO AFUERA DE BAÑOS SEGUNDO PISO	1.22	2.44	1.00	2.98	77.40
	CIELO RASO OFICINA DE VIGILANCIA	1.22	2.44	2.00	5.95	83.35

	CIELO RASO BAÑO OFICINA DE VIGILANCIA		1.22	2.44	1.00	2.98	86.33
	CIELO RASO BAÑO EXTERIOR		1.22	2.44	1.00	2.98	89.30

Nota:

Firma			Firma			
Nombre	CLAUDIA XIMENA DÍAZ ARÉVALO		Nombre	JAIRO ALONSO ESCANDON GONZÁLES		
Cargo	Contratista		Cargo	Supervisor de obra		
Fecha	AA	2023	MM	Diciembre	DD	27
