INFORME 01

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2122 DEL 14 DE JUNIO DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDRAS Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO" DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL TOLIMA

COOPERANTE:

MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA

VALOR DEL CONVENIO:

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE ($ 268.824.000)

DISTRIBUIDOS ASÍ:

APORTE GOBIERNO DEPARTAMENTAL: SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL PESOS (79,074,000, oo) M/CTE IVA INCLUIDO
APORTE MUNICIPIO REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 189.750.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN:
CIENTO DIEZ (110) CALENDARIO

PERIODO DEL INFORME:
11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023

PIEDRAS TOLIMA.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, contiene la información correspondiente a la ejecución de actividades realizadas durante el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2122 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDRAS Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO" DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"** suscrito entre la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA y ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDRAS TOLIMA, en el plazo inicial de CIENTO DIEZ (110) DIAS calendario contados a partir del acta de iniciación suscrita por las partes el VEINTICUATRO (24) de JULIO del 2023. para el presente informe se presenta un avance de obra de 48,91%. Se desarrollaron las actividades de mantenimiento periódico y trabajos de perfilado, cuneteo, embalastre y compactación, así como el cargue y desplazamiento del material para la aplicación en el mejoramiento de las vías terciarias del municipio de piedras.

2. OBJETIVO

Presentar el informe de avance del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2122 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDRAS Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO" DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

3. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

INFORMACION GENERAL	
CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA	**NIT:** 800.113.672-7
CONVENIO No: 2122 DE 2023	**CIUDAD:** Ibagué Tolima
COOPERANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDRAS	**NIT:** 800.100.136-4
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR GONGORA SANCHEZ	**CEDULA:** 79.882.952
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDRAS Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO" DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:	14 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONVENIO	24 DE JULIO DE 2023.
PLAZO INICIAL	CIENTO DIEZ (110) DIAS CALENDARIO.
PRÓRROGAS	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO DIEZ (110) DIAS CALENDARIO.
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE ($ 268.824.000)
VALOR ADICIONES	($0.00) MCTE
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE ($ 268.824.000)
SUSPENSIONES	N/A.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023.

4. PÓLIZAS DEL CONVENIO

El convenio se encuentra amparado bajo las pólizas de cumplimiento y pago de anticipo. PÓLIZA ASEGURADORA SOLIDARIA NIT. 860.524.654-6

No, DE LA POLIZA	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		Desde (día/mes/año)	Hasta (día/mes/año)	
480-47-994000048406 ANEXO 1	CUMPLIMIENTO	24/07/2023	28/06/2024	$26.882.400
	PAGO DE ANTICIPO	24/07/2023	28/06/2024	$39.537.000

5. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO


El Municipio de Piedras Tolima ha suscrito el convenio interadministrativo No. 2122 del 14 de junio de 2023, con lo cual se procedió a realizar el correspondiente proceso de contratación de selección abreviada No. PSAMC -010 del 08 de septiembre de 2023, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 2122 DE 2023 SUSCRITO CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA".

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO NO. 2122 DEL 14 DE JUNIO DE 2023	
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDRAS	**NIT:** 800.100.136-4
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR GONGORA SANCHEZ	**CEDULA:** 79.882.952
CONTRATO DE OBRA No: 010 De 2023	**CIUDAD:** Piedras Tolima
CONTRATISTA: INVERSIONES PIEDRAS SASS	**NIT:** 901.558.922-1

REPRESENTANTE LEGAL: HOLMAN GUEVARA PAREDES	**CEDULA:** 93.390.980	
DIRECCIÓN: AV GUABINAL CALLE 60 CC ACQUAC OFICINA 809 URBANIZACION PRADOS DEL NORTE	**TELÉFONO:** 317 442 52 08	**CIUDAD:** IBAGUÉ TOLIMA
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 2122 DE 2023 SUSCRITO CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA"		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO.	
PRÓRROGAS	N/A	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE (69) DIAS Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL	
VALOR INICIAL	SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL PESOS (79,074,000,oo) M/CTE M/CTE. Incluido el IVA	
VALOR ADICIONES	($0.00) MCTE	
VALOR TOTAL	SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL PESOS (79,074,000,oo) M/CTE M/CTE. Incluido el IVA	
SUSPENSIONES	N/A.	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2023.	

6. LOCALIZACIÓN GENERAL

El municipio de Piedra Tolima se encuentra localizado en la zona centro oriente del Departamento del Tolima, a 47km de Ibagué, en la margen izquierda del Río grande de la Magdalena Limita al norte con el Municipio de Venadillo, al occidente con el Municipio de Alvarado, al oriente con el Departamento de Cundinamarca y al sur con los Municipios de Ibagué y Coello.

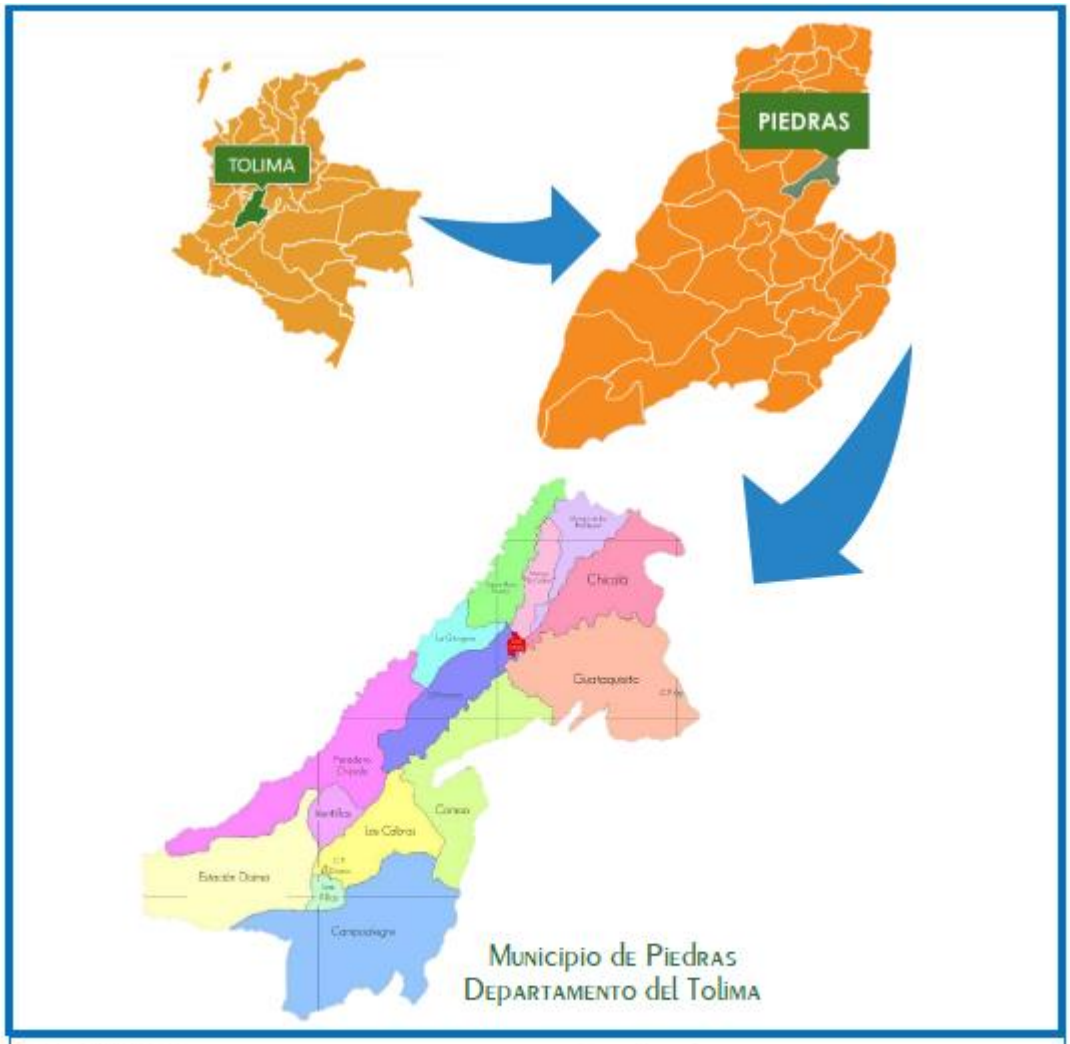

Código DANE: 73547	Región: Centro Sur
Subregión (SCR): Ibagué	Entorno de desarrollo (DNP): Intermedio
Categoría Ley 617 de 2000: 6	Extensión: 361 Km2

7. Tramos a intervenir

El objeto contractual se desarrolla en la zona rural municipio de Piedra Tolima sobre las vías terciarias específicas para el convenio interadministrativo No. 2122 del 14 de junio de 2023.

Nombre de la Vía	Número de Kilómetros
Casco Urbano – Vereda Paradero Chipalo	9,00 Km
Vereda Chicalá- Vereda Guataquisito	10,00 Km
Vereda Campoalegre (Sector Portillo)	6,00 Km
Vereda Campoalegre (Sector Madroñal)	5,00 Km
Vereda Las Cabras – Centro Poblado Doima	8,00 Km
Vereda Camao – Centro Poblado Doima	10,00 Km
Vereda Villas (Parte Alta) – Centro Poblado Doima	6,00 Km
Vereda Estación – Centro Poblado Doima	8,00 Km
Vereda Chipalo– Centro Poblado Doima	3,00 Km
Vereda Ventillas – Centro Poblado Doima	11,00 Km
Vereda Ventillas – Vereda Chipalo	10,00 Km
Casco Urbano – Vereda Manga de la Ceiba	4,00 Km
Vereda Villas – Vereda Campoalegre	1,00 Km
Vereda Chicalá (Sector Coliseo) - Vereda Chicalá (Alto el Líbano)	3,00 Km
Casco Urbano – Vereda Góngora	5,00 Km
Vereda Villas (Parte Baja) – Centro Poblado Doima	1 Km
Total	100 Km

8. TRAMOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023.

En el periodo de ejecución del presente informe se realizó el mantenimiento periódico a las vías terciarias de los siguientes tramos:

1. TRAMO 1: Tramo Casco Urbano – Vereda Paradero Chipalo

- Coordenadas: Latitud: 4°29'30.32"N Longitud: 74°57'10.02" O

TRAMO 1 (Tramo Casco Urbano – Vereda Paradero Chipalo)							
MAQUINA Y/O EQUIPO	**Gl/Hr**	**Gl/ Dia**	**Dias Laborados (11/Sep/23 a 17/Sept/23)**	**Total Galones (Gl) Por Equipo**	**Km Intervenidos/Dia**	**Km Intervenidos Total Tramo**	**Rend Gl/Km Inter.**
VOLQUETA OGL 037	0,0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
VOLQUETA OTC 053	2,7	21,43	7	150	1,29	9	16,67
VIBROCOMPACTOR	4,3	34,29	7	240	1,29	9	26,67
RETROEXCAVADORA	3,2	25,71	7	180	1,29	9	20,00
MOTONIVELADORA	4,3	34,29	7	240	1,29	9	26,67
TOTAL				**810**			

Nota: Conforme al cuadro anterior se observa que para el mantenimiento del TRAMO 1 (Tramo Casco Urbano – Vereda Paradero Chipalo) con ancho de vía promedio 4,8m se ha realizado 1,29 km/día dejando en claro que para el manteamiento se compromete todo el kit de maquinaria, excepto la volqueta OGL 037 salió de funcionamiento por averías mecánicas en el periodo del 11 de septiembre al 13 de octubre de 2023

- Consumo de combustible en el tramo 1: Tramo Casco Urbano – Vereda Paradero Chipalo

RELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALONES TRAMO 1 (TRAMO CASCO URBANO – VEREDA PARADERO CHIPALO)							
11/9/23	**12/9/23**	**13/9/23**	**14/9/23**	**15/9/23**	**16/9/23**	**17/9/23**	**TOTAL**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
50	0	50	0	50	0	0	**150**
80	0	80	0	80	0	0	**240**
60	0	60	0	60	0	0	**180**
80	0	80	0	80	0	0	**240**
					CONSUMO KIT MPIO.		**810**

DIRECCIÓN:
Palacio Municipal,
Frente a Parque Principal

CORREO:
alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB:
www.piedras-tolima.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES NO.1

VOLQUETA OTC053, MOTONIVELADORA CARGADOR NEW HOLLAN, VIBROCOMPACTAOR CASE 208 Y RETROEXCAVADORA 590 SN

LONGITUD (KM-INTERVENIDO)		9		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
TRAMO	TIPO DE MAQUINARIA	FECHA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVADES	Coordenadas:	Latitud: 4°29'30.32"N Longitud: 74°57'10.02" O
TRAMO 1 (Tramo Casco Urbano – Vereda Paradero Chipalo)	VOLQUETA OTC053, VOLQUETA OGL037, MOTONIVELADORA CARGADOR NEW HOLLAN, VIBROCOMPACTAOR CASE 208 Y RETROEXCAVADORA 590 SN	11 SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONFORMACION DE LA VIA, SE APLICA MATERIAL RECEBO, SE HACE CUNETEO CON SUS RESPECTIVOS DESCOLES Y DESPUES SE REALIZA LA COMPACTACION DE LA VIA		
					

SANDRA LILIANA PEREZ GUEVARA
Almacenista General
Supervisora

2. Tramo 2: Tramo Vereda Paradero Chipalo - Centro Poblado Doima
- Coordenadas: Latitud: 4°25'56.89"N Longitud: 74°59'1.79"O

TRAMO 2(Tramo Vereda Paradero Chipalo - Centro Poblado Doima)							
MAQUINA Y/O EQUIPO	**Gl/Hr**	**Gl/ Dia**	**Dias Laborados (18/Sep/23 a 20/Sept/23**	**Total Galones (Gl) Por Equipo**	**Km Intervenidos/Dia**	**Km Intervenidos Total Tramo**	**Rend Gl/Km Inter.**
VOLQUETA OGL 037	0,0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
VOLQUETA OTC 053	4,2	33,33	3	100	1,00	3	33,33
VIBROCOMPACTOR	6,7	53,33	3	160	1,00	3	53,33
RETROEXCAVADORA	5,0	40,00	3	120	1,00	3	40,00
MOTONIVELADORA	6,7	53,33	3	160	1,00	3	53,33
TOTAL				**540**			

Nota: Conforme al cuadro anterior se observa que para el mantenimiento del TRAMO 2 (Tramo Vereda Paradero Chipalo - Centro Poblado Doima) con ancho de vía promedio 5,0m se ha realizado 1,00 km/día dejando en claro que para el manteamiento se compromete todo el kit de maquinaria, excepto la volqueta OGL 037 salió de funcionamiento por averías mecánicas en el periodo del 11 de septiembre al 13 de octubre de 2023

- Consumo de combustible en el Tramo 2: Tramo Vereda Paradero Chipalo - Centro Poblado Doima

RELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALONES TRAMO 2 (TRAMO VEREDA PARADERO CHIPALO - CENTRO POBLADO DOIMA)				
17/9/23	**18/9/23**	**19/9/23**	**20/9/23**	**TOTAL**
0	0	0	0	**0**
0	50	0	50	**100**
0	80	0	80	**160**
0	60	0	60	**120**
0	80	0	80	**160**
		CONSUMO KIT MPIO.		**540**

DIRECCIÓN:
Palacio Municipal,
Frente a Parque Principal

CORREO:
alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB:
www.piedras-tolima.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES NO.1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 2122 DEL 14 DE JUNIO DE 2023 CUYO OBJETO DEL CONVENIO ES"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDRAS Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

LONGITUD (KM-INTERVENIDO)		3		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
TRAMO	TIPO DE MAQUINARIA	FECHA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVADES	Coordenadas:	Latitud: 4°25'56.89"N Longitud: 74°59'1.79"O
TRAMO 2(Tramo Vereda Paradero Chipalo - Centro Poblado Doima)	VOLQUETA OTC053, MOTONIVELADORA CARGADOR NEW HOLLAN, VIBROCOMPACTAOR CASE 208 Y RETROEXCAVADORA 590 SN	18 SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONFORMACION DE LA VIA, SE APLICA MATERIAL RECEBO, SE HACE CUNETEO CON SUS RESPECTIVOS DESCOLES Y DESPUES SE REALIZA LA COMPACTACION DE LA VIA		

SANDRA LILIANA PEREZ GUEVARA
Almacenista General
Supervisora

3. Tramo 3: Tramo Vereda Chicalá-Vereda Guataquisito
- Coordenadas: Latitud: 4°31'6.08"N Longitud: 74°47'51.32"O

TRAMO 3 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Chicalá-Vereda Guataquisito)							
MAQUINA Y/O EQUIPO	**Gl/Hr**	**Gl/ Dia**	**Dias Laborados (21/Sep/23 a 27/Sept/23**	**Total Galones (Gl) Por Equipo**	**Km Intervenidos/Dia**	**Km Intervenidos Total Tramo**	**Rend Gl/Km Inter.**
VOLQUETA OGL 037	0,0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
VOLQUETA OTC 053	3,1	25,00	6	150	1,67	10	15,00
VIBROCOMPACTOR	5,0	40,00	6	240	1,67	10	24,00
RETROEXCAVADORA	3,8	30,00	6	180	1,67	10	18,00
MOTONIVELADORA	5,0	40,00	6	240	1,67	10	24,00
TOTAL				**810**			

Nota: Conforme al cuadro anterior se observa que para el mantenimiento del TRAMO 3 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Chicalá- Vereda Guataquisito) con ancho de vía promedio 4,8m se ha realizado 1,67 km/día dejando en claro que para el manteamiento se compromete todo el kit de maquinaria, excepto la volqueta OGL 037 salió de funcionamiento por averías mecánicas en el periodo del 11 de septiembre al 13 de octubre de 2023

- Consumo de combustible en el Tramo 3: Tramo Vereda Chicalá-Vereda Guataquisito

RELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALONES TRAMO 3 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Chicalá-Vereda Guataquisito)							
21/9/23	**22/9/23**	**23/9/23**	**24/9/23**	**25/9/23**	**26/9/23**	**27/9/23**	**TOTAL**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	50	0	0	50	0	50	**150**
0	80	0	0	80	0	80	**240**
0	60	0	0	60	0	60	**180**
0	80	0	0	80	0	80	**240**
					CONSUMO KIT MPIO.		**810**

DIRECCIÓN:
Palacio Municipal,
Frente a Parque Principal

CORREO:
alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB:
www.piedras-tolima.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES NO.1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 2122 DEL 14 DE JUNIO DE 2023 CUYO OBJETO DEL CONVENIO ES"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDRAS Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

LONGITUD (KM-INTERVENIDO)		10		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
TRAMO	TIPO DE MAQUINARIA	FECHA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVADES	Coordenadas:	Latitud: 4°31'6.08"N Longitud: 74°47'51.32"O
TRAMO 3 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Chicalá-Vereda Guataquisito)	VOLQUETA OTC053, MOTONIVELADORA CARGADOR NEW HOLLAN, VIBROCOMPACTAOR CASE 208 Y RETROEXCAVADORA 590 SN	21 SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONFORMACION DE LA VIA, SE APLICA MATERIAL RECEBO, SE HACE CUNETEO CON SUS RESPECTIVOS DESCOLES Y DESPUES SE REALIZA LA COMPACTACION DE LA VIA		
					

SANDRA LILIANA PEREZ GUEVARA
Almacenista General
Supervisora

4. Tramo 4: Tramo Vereda Campoalegre Sector Madroñal

- Coordenadas: Latitud: 4°24'30.65"N Longitud: 74°57'44.50"O

TRAMO 4 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Campoalegre Sector Madroñal)							
MAQUINA Y/O EQUIPO	**Gl/Hr**	**Gl/ Dia**	**Dias Laborados (28/Sep/23 a 29/Sept/23**	**Total Galones (Gl) Por Equipo**	**Km Intervenidos/Dia**	**Km Intervenidos Total Tramo**	**Rend Gl/Km Inter.**
VOLQUETA OGL 037	0,0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
VOLQUETA OTC 053	3,1	25,00	2	50	2,50	5	10,00
VIBROCOMPACTOR	5,0	40,00	2	80	2,50	5	16,00
RETROEXCAVADORA	3,8	30,00	2	60	2,50	5	12,00
MOTONIVELADORA	5,0	40,00	2	80	2,50	5	16,00
TOTAL				**270**			

Nota: Conforme al cuadro anterior se observa que para el mantenimiento del TRAMO 4 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Campoalegre Sector Madroñal) con ancho de vía promedio 4,0m se ha realizado 2,50 km/día dejando en claro que para el manteamiento se compromete todo el kit de maquinaria, excepto la volqueta OGL 037 salió de funcionamiento por averías mecánicas en el periodo del 11 de septiembre al 13 de octubre de 2023

- Consumo de combustible en el Tramo 4: Tramo Vereda Campoalegre Sector Madroñal

RELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALONES TRAMO 4 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Campoalegre Sector Madroñal)		
28/9/23	**29/9/23**	**TOTAL**
0	0	**0**
0	50	**50**
0	80	**80**
0	60	**60**
0	80	**80**
	CONSUMO KIT MPIO.	**270**

DIRECCIÓN:
Palacio Municipal,
Frente a Parque Principal

CORREO:
alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB:
www.piedras-tolima.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES NO.1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 2122 DEL 14 DE JUNIO DE 2023 CUYO OBJETO DEL CONVENIO ES"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDRAS Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

LONGITUD (KM-INTERVENIDO)		5		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
TRAMO	TIPO DE MAQUINARIA	FECHA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVADES	Coordenadas:	Latitud: 4°24'30.65"N Longitud: 74°57'44.50"O
TRAMO 4 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Campoalegre Sector Madroñal)	VOLQUETA OTC053, MOTONIVELADORA CARGADOR NEW HOLLAN, VIBROCOMPACTAOR CASE 208 Y RETROEXCAVADORA 590 SN	28 SEPTIEMBRE AL 29DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONFORMACION DE LA VIA, SE APLICA MATERIAL RECEBO, SE HACE CUNETEO CON SUS RESPECTIVOS DESCOLES Y DESPUES SE REALIZA LA COMPACTACION DE LA VIA		
					

SANDRA LILIANA PEREZ GUEVARA
Almacenista General
Supervisora

5. Tramo 5: Tramo Vereda Campoalegre (Sector Portillo)

- Coordenadas: Latitud: 4°24'54.27"N Longitud: 74°57'33.74"O

TRAMO 5 (Realizar el mantenimiento de tramo Vereda Campoalegre (Sector Portillo))							
MAQUINA Y/O EQUIPO	**Gl/Hr**	**Gl/ Dia**	**Dias Laborados (02/Octub/23 a 04/Oct/23**	**Total Galones (Gl) Por Equipo**	**Km Intervenidos/Dia**	**Km Intervenidos Total Tramo**	**Rend Gl/Km Inter.**
VOLQUETA OGL 037	0,0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
VOLQUETA OTC 053	4,2	33,33	3	100	2,00	6	16,67
VIBROCOMPACTOR	6,7	53,33	3	160	2,00	6	26,67
RETROEXCAVADORA	5,0	40,00	3	120	2,00	6	20,00
MOTONIVELADORA	6,7	53,33	3	160	2,00	6	26,67
TOTAL				**540**			

Nota: Conforme al cuadro anterior se observa que para el mantenimiento del TRAMO 5 (Realizar el mantenimiento de tramo Vereda Campoalegre (Sector Portillo)) con ancho de vía promedio 4,0m se ha realizado 2,00 km/día dejando en claro que para el manteamiento se compromete el kit de maquinaria, excepto la volqueta OGL 037 salió de funcionamiento por averías mecánicas en el periodo del 11 de septiembre al 13 de octubre de 2023

- Consumo de combustible en el Tramo 5: Tramo Vereda Campoalegre (Sector Portillo)

RELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALONES TRAMO 5 (Realizar el mantenimiento de tramo Vereda Campoalegre (Sector Portillo))			
2/10/23	**3/10/23**	**4/10/23**	**TOTAL**
0	0	0	**0**
50	0	50	**100**
80	0	80	**160**
60	0	60	**120**
80	0	80	**160**
		CONSUMO KIT MPIO.	**540**

DIRECCIÓN:
Palacio Municipal,
Frente a Parque Principal

CORREO:
alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB:
www.piedras-tolima.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES NO.1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 2122 DEL 14 DE JUNIO DE 2023 CUYO OBJETO DEL CONVENIO ES"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDRAS Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

LONGITUD (KM-INTERVENIDO)		6		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
TRAMO	TIPO DE MAQUINARIA	FECHA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVADES	Coordenadas:	Latitud: 4°24'54.27"N Longitud: 74°57'33.74"O
TRAMO 5 (Realizar el mantenimiento de tramo Vereda Campoalegre (Sector Portillo))	VOLQUETA OTC053, MOTONIVELADORA CARGADOR NEW HOLLAN, VIBROCOMPACTAOR CASE 208 Y RETROEXCAVADORA 590 SN	2 DE OCTUBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2023	CONFORMACION DE LA VIA, SE APLICA MATERIAL RECEBO, SE HACE CUNETEO CON SUS RESPECTIVOS DESCOLES Y DESPUES SE REALIZA LA COMPACTACION DE LA VIA		
					

SANDRA LILIANA PEREZ GUEVARA
Almacenista General
Supervisora

6. Tramo 6: Tramo Vereda Las Cabras - Centro Poblado Doima
- Coordenadas: Latitud: 4°25'36.52"N Longitud: 74°57'37.90"O

TRAMO 6 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Las Cabras - Centro Poblado Doima)							
MAQUINA Y/O EQUIPO	**Gl/Hr**	**Gl/ Dia**	**Dias Laborados (05/Oct/23 a 13/Oct/23)**	**Total Galones (Gl) Por Equipo**	**Km Intervenidos/Dia**	**Km Intervenidos Total Tramo**	**Rend Gl/Km Inter.**
VOLQUETA OGL 037	0,0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
VOLQUETA OTC 053	3,6	28,57	7	200	1,14	8	25,00
VIBROCOMPACTOR	5,7	45,71	7	320	1,14	8	40,00
RETROEXCAVADORA	4,3	34,29	7	240	1,14	8	30,00
MOTONIVELADORA	5,7	45,71	7	320	1,14	8	40,00
TOTAL				**1080**			

Nota: Conforme al cuadro anterior se observa que para el mantenimiento del TRAMO 6 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Las Cabras – Centro Poblado Doima) con ancho de vía promedio 4,0m se ha realizado 1,14 km/día dejando en claro que para el manteamiento se compromete todo el kit de maquinaria, excepto la volqueta OGL 037 salió de funcionamiento por averías mecánicas en el periodo del 11 de septiembre al 13 de octubre de 2023.

- Consumo de combustible en el Tramo 6: Tramo Vereda Las Cabras - Centro Poblado Doima

RELACION CONSUMO DE COMBUSTIBLE GALONES TRAMO 6 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Las Cabras - Centro Poblado Doima)									
5/10/23	**6/10/23**	**7/10/23**	**8/10/23**	**9/10/23**	**10/10/23**	**11/10/23**	**12/10/23**	**13/10/23**	**TOTAL**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	50	0	0	50	0	50	0	50	**200**
0	80	0	0	80	0	80	0	80	**320**
0	60	0	0	60	0	60	0	60	**240**
0	80	0	0	80	0	80	0	80	**320**
							CONSUMO KIT MPIO.		**1080**

DIRECCIÓN:
Palacio Municipal,
Frente a Parque Principal

CORREO:
alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB:
www.piedras-tolima.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES NO.1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 2122 DEL 14 DE JUNIO DE 2023 CUYO OBJETO DEL CONVENIO ES"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDRAS Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ENTREGANDO EL DEPARTAMENTO AL ENTE TERRITORIAL RECURSOS ECONOMICOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

LONGITUD (KM-INTERVENIDO)		8		REGISTRO FOTOGRÁFICO	
TRAMO	TIPO DE MAQUINARIA	FECHA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVADES	Coordenadas:	Latitud: 4°25'36.52"N Longitud: 74°57'37.90"O
TRAMO 6 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Las Cabras - Centro Poblado Doima)	VOLQUETA OTC053, MOTONIVELADORA CARGADOR NEW HOLLAN, VIBROCOMPACTAOR CASE 208 Y RETROEXCAVADORA 590 SN	DEL 5 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE	CONFORMACION DE LA VIA, SE APLICA MATERIAL RECEBO, SE HACE CUNETEO CON SUS RESPECTIVOS DESCOLES Y DESPUES SE REALIZA LA COMPACTACION DE LA VIA		
					

SANDRA LILIANA PEREZ GUEVARA
Almacenista General
Supervisora

9. RESUMEN DE LOS TRAMOS INTERVENIDOS

RESUMEN TRAMOS INTERVENIDOS PERIODO 11/Sep/23 AL 13/Oct/23							
TRAMO	**Gl/Hr (Kit Maquinaria)**	**Gl/ Dia (Kit Maquinaria)**	**Dias Laborados (11/Sept/23 a 13/Oct/23**	**Total Galones (Gl) Por Kit Maquinaria**	**Km Intervenidos/Dia**	**Km Intervenidos Total Tramo**	**Rend Gl/Km Inter.**
TRAMO 1 (Tramo Casco Urbano – Vereda Paradero Chipalo)	14,5	115,71	7	810	1,29	9	90,00
TRAMO 2(Tramo Vereda Paradero Chipalo - Centro Poblado Doima)	22,5	180,00	3	540	1,00	3	180,00
TRAMO 3 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Chicalá-Vereda Guataquisito)	16,9	135,00	6	810	1,67	10	81,00
TRAMO 4 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Campoalegre Sector Madroñal)	16,9	135,00	2	270	2,50	5	54,00
TRAMO 5 (Realizar el mantenimiento de tramo Vereda Campoalegre (Sector Portillo))	22,5	180,00	3	540	2,00	6	90,00

TRAMO 6 (Realizar el mantenimiento del tramo Vereda Las Cabras - Centro Poblado Doima)	19,3	154,29	7	1080	1,14	8	135,00
TOTAL			**28,00**	**4050,00**		**41,00**	

Nota: De acuerdo con los mantenimientos de los tramos de las vías terciarias que en este caso corresponden a (6) seis tramos como lo indica el cuadro plasmado, se realizaron trabajos de perfilado, cuneteo, embalastre y compactación, así como el cargue y desplazamiento del material para la aplicación en el mejoramiento de la vía. Los trabajos ejecutados para los tramos 1,2,3,4.5 y 6 fueron realizados en el periodo correspondiente del 11 de septiembre del 2023 hasta el 13 de octubre del 2023, cabe anotar que los días laborados corresponden a 28 días donde fueron intervenidos 41km de vía terciarias con anchos promedio de 4,20m. y se obtuvo un consumo total de galones de la operación del Kit de Maquinaria de 4.050 Gl (Galones). Para los rendimientos de kilómetros intervenidos por día (km intervenidos/día) se debe tener en cuenta el estado del clima, el estado en que se encontraba el tramo de vía a intervenir, desplazamientos desde el sitio de extracción de material al lugar de la intervención vial entre otros factores que influyen en la ejecución de actividades, el rendimiento promedio de Km intervenido/día obedece a 1,6 Km.

10. NOVEDADES DEL CONVENIO

Sobre el particular, es de advertir que durante la ejecución de las actividades del periodo del 11 de septiembre al 13 de octubre de 2023 en la relación del suministro de combustible, solo son relacionados, la motoniveladora, la retroexcavadora, el vibro compactador y la volqueta de placas OTC 053; ya que en el caso de la volqueta con placas OGL 037, se sacó de funcionamiento por averías mecánicas, cuyos suministros de combustible no son relacionados en el presente informe.

11. CONTRATOS DE OPERARIOS.

Se relaciona a continuación los contratos de prestación de servicio de operarios del parque automotor del municipio en vigencia a el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2122 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDRAS	**NIT:** 800.100.136-4
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR GONGORA SANCHEZ	**CEDULA:** 79.882.952
CONTRATO DE OBRA No: 066 De 2023	**CIUDAD:** Piedras Tolima
CONTRATISTA: PEDRO CUELLAR	**CEDULA:** 2.254.389
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ASISTENCIA COMO OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RG 140 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA "	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	16 DE MAYO DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	17 DE MAYO DE 2023
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGAS	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($15.750.000) M/CTE M/CTE.
VALOR ADICIONES	($0.00) MCTE
VALOR TOTAL	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($15.750.000) M/CTE M/CTE.
SUSPENSIONES	N/A.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2023.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDRAS	**NIT:** 800.100.136-4
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR GONGORA SANCHEZ	**CEDULA:** 79.882.952
CONTRATO DE OBRA No: 080 De 2023	**CIUDAD:** Piedras Tolima
CONTRATISTA: ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ	**CEDULA:** 1.108.232.188
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PARQUE AUTOMOTOR DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA "	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	05 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	06 DE JUNIO DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES VEINTICINCO (25) DIAS
PRÓRROGAS	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES VEINTICINCO (25) DIAS
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($7.200.000) M/CTE
VALOR ADICIONES	($0.00) MCTE
VALOR TOTAL	SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($7.200.000) M/CTE
SUSPENSIONES	N/A.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDRAS	**NIT:** 800.100.136-4
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR GONGORA SANCHEZ	**CEDULA:** 79.882.952
CONTRATO DE OBRA No: 157 De 2023	**CIUDAD:** Piedras Tolima
CONTRATISTA: ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ	**CEDULA:** 1.108.232.188
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PARQUE AUTOMOTOR DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA "	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	03 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	UN (01) MESE, VEINTIOCHO (28) DIAS
PRÓRROGAS	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	UN (01) MESE, VEINTIOCHO (28) DIAS
VALOR INICIAL	TRES MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS ($3.600.000) M/CTE
VALOR ADICIONES	($0.00) MCTE
VALOR TOTAL	TRES MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS ($3.600.000) M/CTE
SUSPENSIONES	N/A.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

RELACION PERSONAL DE PLANTA DE LA ALCALDIA DE PIEDRAS TOLIMA	
NOMBRE: JOSE ERNESTO PRADA ESPINOSA **CARGO:** CONDCTOR OPERADOR	**CEDULA:** 5.975.723
NOMBRE: FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ **CARGO:** CONDUCTOR OPERADOR	**CEDULA:** 5.975.979
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CHACON OSPINA **CARGO:** CONDUCTOR OPERADOR	**CEDULA:** 5.976.140

NOTA: Cada uno de los operarios se encuentran adscritos al régimen de salud contributivo desde la fecha de inicio de sus contratos respectivamente y los operarios de planta quien están nombrados.

Cordial saludo,

SANDRA LILIANA PEREZ GUEVARA
Almacenista General
Supervisora.
