	ALCALDÍA DE FLORENCIA CAUCA ¡NUESTRO COMPROMISO ES FLORENCIA! NIT: 800188492-1	Código: GJ- FT- 013:14
		Versión: 04
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 02/01/2020
	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA FORMATO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	F2-F35-133-2022	Fecha	4 de enero de 2023	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA			
CONTRATISTA:	SUNNOVA SAS			
REP LEGAL DEL CONTRATISTA:	FABIO PEREZ MUÑOZ			
IDENTIFICACION C.C. o NIT:	76.358.442	Expedida en	Florencia Cauca	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAUCA			
VALOR CONTRATO	OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE			$ 80.530.555,30
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES	4-ene-23	Al	5-mar-23
SUSPENSION N1	11 de enero de 2023			
REINICIO N1	22 de junio de 2023			
FECHA PRESENTE ACTA	**19 de julio de 2023**			
SUPERVISION	Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal			

Con base en el informe presentado por el contratista SUNNOVA SAS respecto de las actividades ejecutadas dentro del periodo antes mencionado y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por el Municipio de Florencia Cauca.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista SUNNOVA SAS con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades del contrato de obra realizada durante el periodo del 22 de junio de 2023 hasta el 19 de julio de 2023 es el siguiente:


INFORME TECNICO

ITEM	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD
1	Poste De Concreto De 8 Mts X 510 Kf	UND	11,00
2	Percha Tipo Pesado De 1 Puesto Incluye Carrete	UND	6,00
3	Suministro E Instalacion De Retenida Para Poste De Baja Tension	UND	4,00
4	Suministro De Instalacion De Red Trensada 1/0 Trifasica	M	214,50
5	Conector De Tornillo De Perforacion De Chaqueta Aislada Principal	UND	0,00
6	Caja De Derivacion En Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios Marca Compac - 150Amp	UND	4,00
7	Transformador Monofasico En Aceite De 25 Kva - 13.200 V - 120 - 240 V	UND	1,00
8	Suministro E Instalacion Pararrayo Polimérico 15Kv 10Ka	UND	2,00
9	Suministro De Instalacion De Puesta A Tierra Incluye Varilla	UND	0,00
10	Cortacircuito Para 15 Kv-100A - 110 Kdvil	UND	2,00
11	Luminaria led para Alumbrado Público 70 w	UND	0,00
12	Suministro De Instalacion De Cable De Aluminio Desnudo N 1-0 Acsr	M	1275,554
13	Suministro De Instalacion De Cable De Aluminio Desnudo N 2 Acsr	M	1274,307
14	Suministro E Instalacion Percha Tipo Pesado De 3 Puesto Incluye Aisladores Carretes	UND	6,0
15	Suministro De Instalacion De Puesta A Tierra Incluye Varilla	UND	0,0

REGISTRO FOTOGRAFICO



Poste De Concreto De 8 Mts X 510 Kf


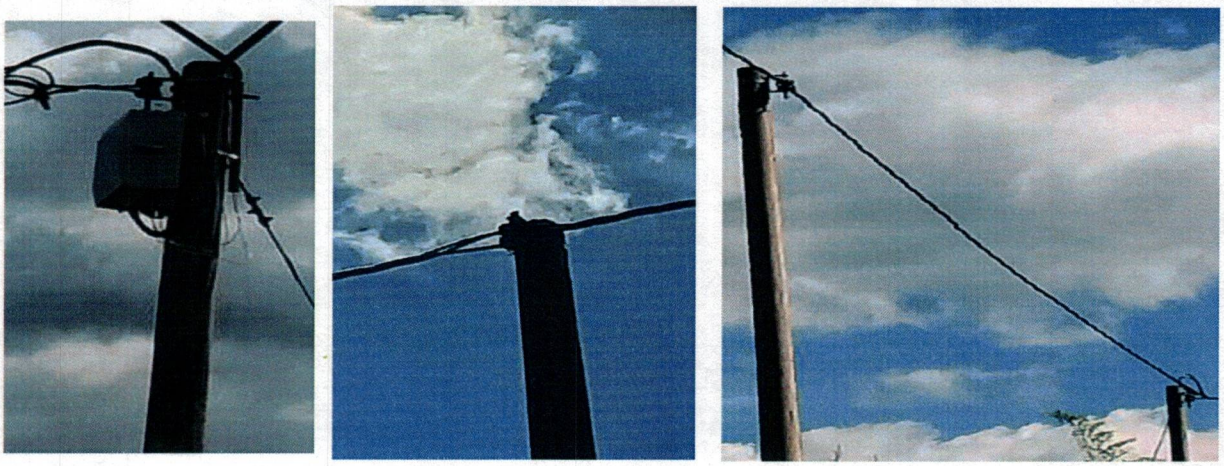


Percha Tipo Pesado De 1 Puesto Incluye Carrete





Suministro E Instalacion De Retenida Para Poste De Baja Tension

	ALCALDÍA DE FLORENCIA CAUCA ¡NUESTRO COMPROMISO ES FLORENCIA! NIT: 800188492-1	Código: GJ- FT- 013:14
		Versión: 04
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 02/01/2020
	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA FORMATO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Página 1 de 1


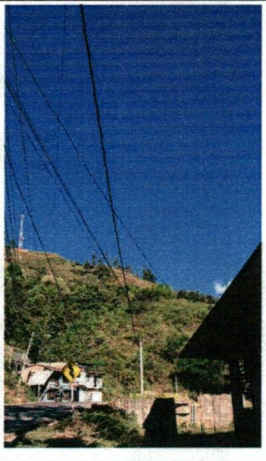
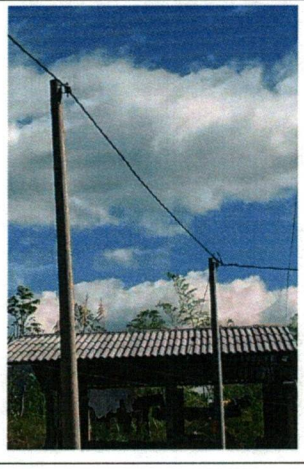


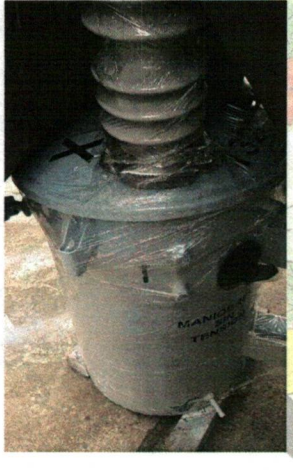

Suministro De Instalacion De Red Trensada 1/0 Trifasica

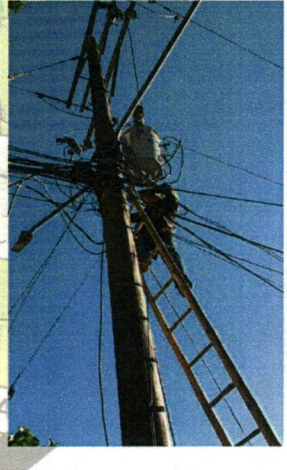

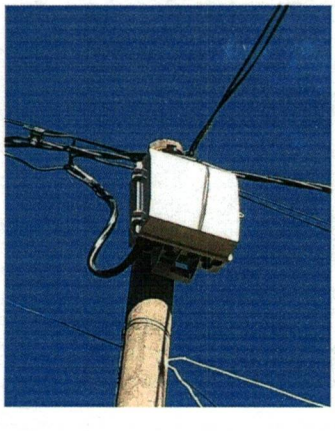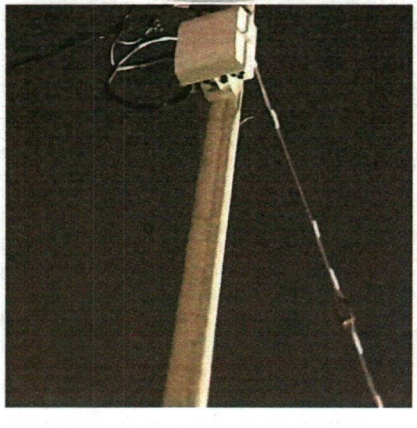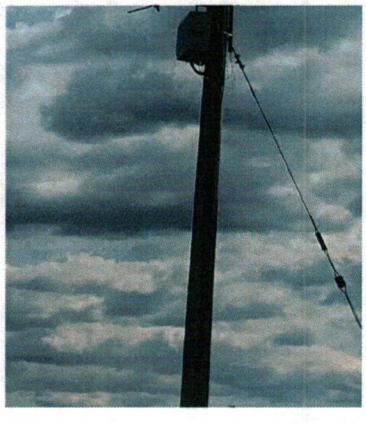

Transformador Monofasico En Aceite De 25 Kva - 13.200 V - 120 - 240 V


Caja De Derivacion En Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios Marca Compac - 150Amp









Suministro E Instalacion Pararrayo Polimérico 15Kv 10Ka

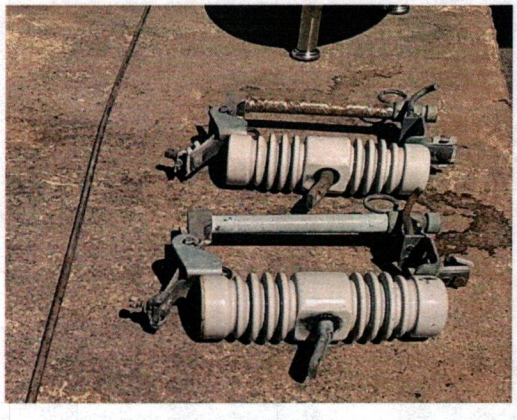


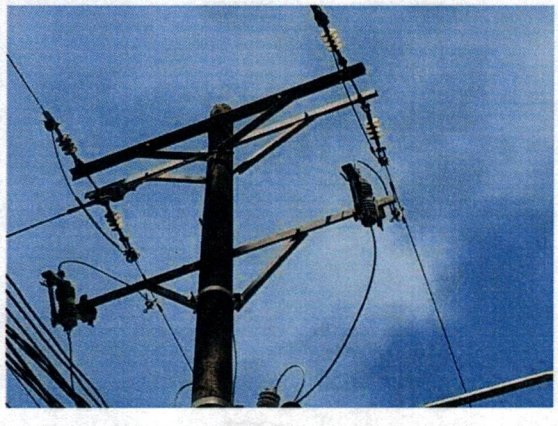


Cortacircuito Para 15 Kv-100A - 110 Kdvil






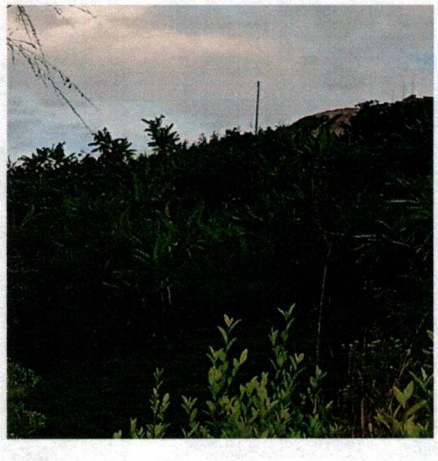

Suministro De Instalacion De Cable De Aluminio Desnudo N 1-0 Acsr

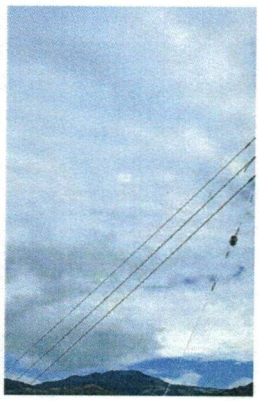Suministro De Instalacion De Cable De Aluminio Desnudo N 2 Acsr

Suministro E Instalacion Percha Tipo Pesado De 3 Puesto Incluye Aisladores Carretes

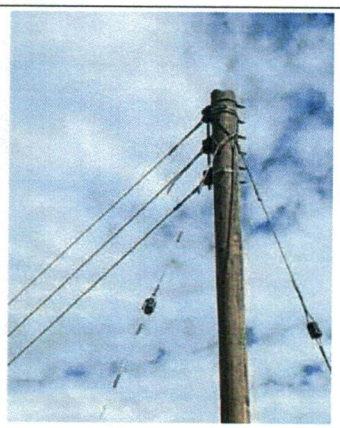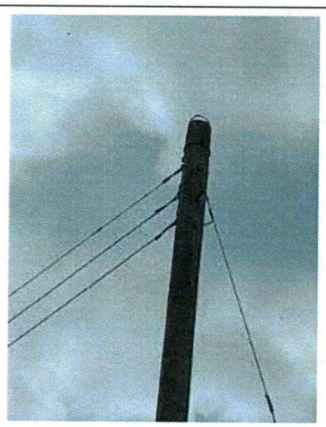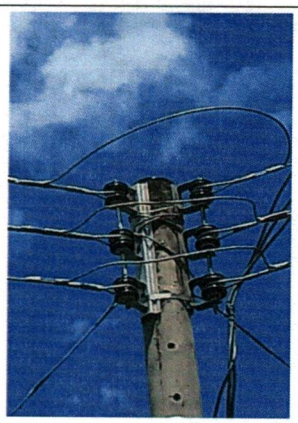La presente se expide en Florencia Cauca, en la fecha	19 de julio de 2023

FIRMA:

ORIGINAL FIRMADO

FABIO HERNAN CHAUZA NARVAEZ

Secretario de Planeación Municipal
