
PLAN DE TRABAJO PARA TERMINAR CONTRATO Y Otrosí

Cara d Gato

Actividad	Cantidad	Unidad
Preliminares		
Combustible y personal operativo	1	ea
Combustible y personal operativo	1	ea
Instalación de geotextil no tejido		
Instalación Geo textil	4700	m2
Retro excavadora	7	día
Instalación Geo textil	4000	m2
Dragado para Gobernaciones		
Draga 1 Para extraer material para la construcción del Jarillón.	27.990	m3
	400	M3/h
	70	horas
Draga 2 Para generar playa apoyo de Jarillón.	27.990	m3
	400	M3/h
	70	horas
Construcción Jarillón	55.980	m3
Material Jarillón	9.330	M3/día
Colocación bolsas BIG BAG - **Comunidad**	5.712	un


Rectificadora del Cauca

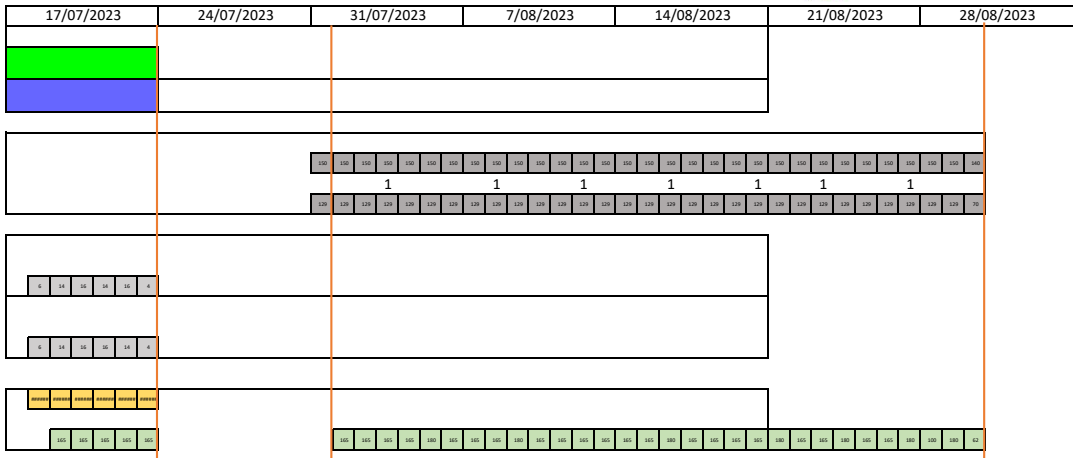

Liquidación contrato y otrosí con las gobernaciones

MAQUINARIA AMARILLA y VOLQUETAS ALCALDIA

Actividad	Cantidad	Unidad		
Preliminares				
Reunión con planeación municipal interventora del contrato				
Traslado de Maquinaria y volquetas (2 Retroexcavadora, 1Cargador, 1 Buldócer, 15 volquetas)	1	ea		
Combustible	1	ea		
Dragado para la alcaldía				
Draga 1 Para extraer material para la construcción del Jarillón.	48.000	m3	160	horas
	400	M3/h		
	120	horas	160	
Draga 2 Para generar playa apoyo de Jarillón.	48.000	m3	160	horas
	400	M3/h		
	120	horas	160	
Construcción Jarillón				
Construcción Jarillón	59.100	m3		
Viajes de volqueta (17 M3)	3.476	Viajes		

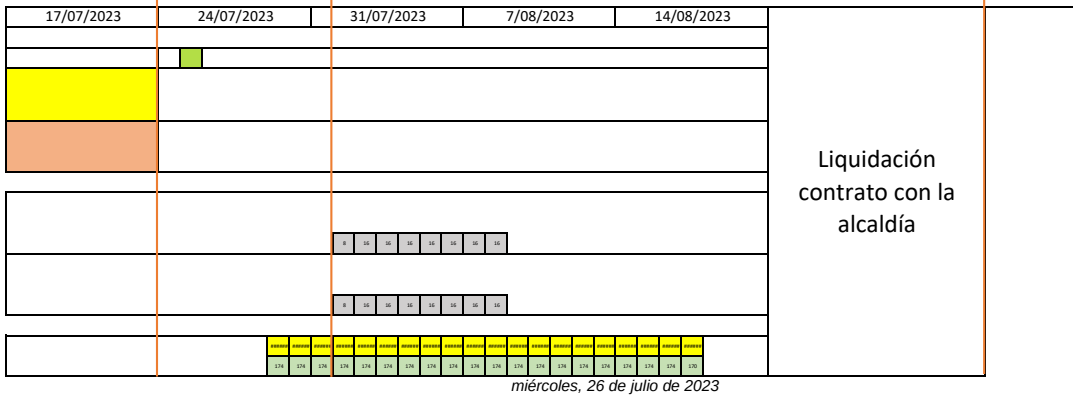

miércoles, 26 de julio de 2023
