"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍA URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ"

INFORME MENSUAL No. 02

PERIODO:
26 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME ELABORADO PARA:

ALCALDÍA DE VILLA DE LEYVA, SANTANDER

INFORME ELABORADO POR:

Ing. César Giovanny Mojica Barreto
Especialista en Infraestructura Vial

SEPTIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 4

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 6
3.1. Información general del contrato de obra 6
3.1. Relación del Personal de obra 6
3.2. Descripción de actividades ejecutadas 7
3.3. Seguimiento PMT 7
3.4. Seguimiento PMA 9
3.5. Informe del avance 9
3.6. Estado general del tiempo 10
3.7. Planillas de aportes al sistema de seguridad social de obra 10

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
4.1. Información general del contrato de interventoría 11
4.2. Relación del Personal de interventoría 11
4.3. Descripción de las actividades ejecutadas por la interventoría 12

5. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 13

6. REGISTRO FOTOGRAFICO 14

7. CONCLUSIONES 16

8. ANEXOS 17

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Información Contractual de obra 6
Tabla 2. Personal Vinculado 6
Tabla 3. Seguimiento al PMT 7
Tabla 4. Seguimiento al PMA 9
Tabla 5. Información contractual de Interventoría 11
Tabla 6. Personal Vinculado 11
Tabla 7. Relación de correspondencia 13

LISTA DE ILUSTACIONES

Pág.

Ilustración 1. Localización general del proyecto. 5
Ilustración 2. Localización zona de intervención. 5
Ilustración 3. Curva de avance semanal 10

1. INTRODUCCIÓN


El presente informe contiene la descripción de las actividades realizadas en la ejecución del Contrato de interventoría CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA No 092 DE 2023, celebrado entre el Municipio de Villa de Leyva y el Ing. César Giovanny Mojica Barreto.

El proyecto consiste en realizar los la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, con la cual se busca garantizar la calidad de la obra, cumpliendo con los parámetros técnicos establecidos por la entidad.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área del proyecto se encuentra localizado en el casco urbano del municipio de Villa de Leyva en diferentes tramos.

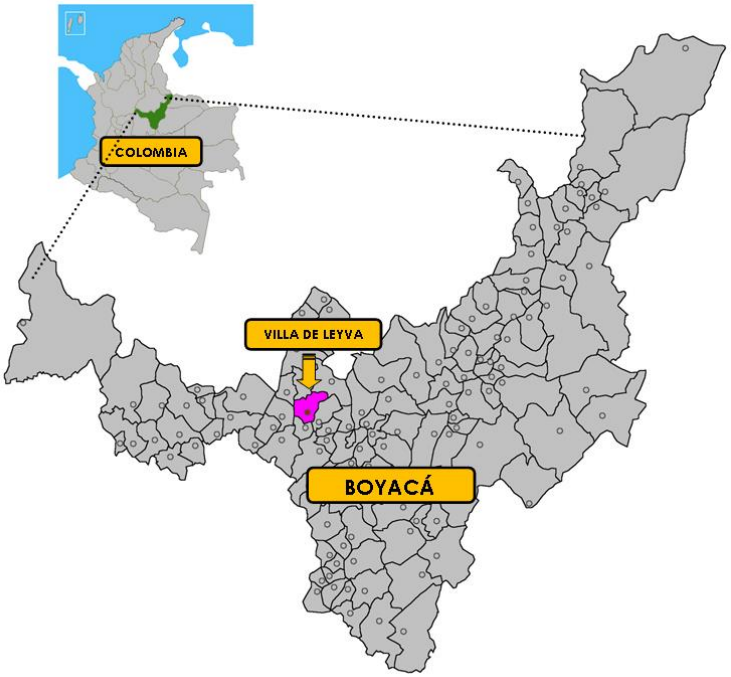Ilustración 1. Localización general del proyecto.



Fuente: Google maps

Ilustración 2. Localización zona de intervención.



Fuente: Google earth

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato de obra

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de obra.

Tabla 1. Información Contractual de obra

No CONTRATO	CONTRATO 166 DE 2022
OBJETO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.
CONTRATANTE	MUNICIPIO VILLA DE LEYVA, BOYACÁ
CONTRATISTA	ROKAVÍA LTDA R.L YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ
INTERVENTOR	CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO C.C. 1.052.390.144 de Duitama, Boyacá
SUPERVISOR	ING. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS
VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($ 245,975,082.00) M/CTE
FECHA DE INICIACIÓN	1/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No 01	1/12/2022
FECHA DE REINICIO No 01	5/5/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No 02	12/5/2023
FECHA DE REINICIO No 02	25/7/2023
FECHA TERMINACION ACTUALIZADA	30/09/2023

Fuente: El proyecto

3.1. Relación del Personal de obra

Durante el presente periodo se contó con la participación del siguiente personal profesional para la ejecución del proyecto.

Tabla 2. Personal Vinculado

APELLIDOS Y NOMBRES	No DE IDENTIFICACIÓN	CARGO

YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ	7.179.871	DIRECTOR DE OBRA
YULI NORETH DAZA CORREA	1.020.741.873	RESIDENTE OBRA
GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA	1.049.617.189	RESIDENTE QHSE
IVAN DARIO HUERTAS PEDRAZA	1.094.650.708	INSPECTOR
SEGUNDO ABRAHAM MEDINA	4.221.328	MAESTRO
MAXIMILIANO KAMMERER	17.977.048	OFICIAL
JULIO EVARISTO CACERES CERON	1.002.414.842	AYUDANTE
JUAN DE JESUS CARDENAS ACERO	4.280.518	AYUDANTE
JOHAN ESTIBEN BOCAREJO VELAZCO	1.024.592.521	TORNILLERO
YIMY FERNEY GUTIERREZ AVELLA	1.057.589.777	OPERADOR FINNISHER
DIEGO ALEXANDER CERON	1.057.602.294	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
LUIS CERON MANTAÑA	9.396.730	AYUDANTE

Fuente: El proyecto

3.2. Descripción de actividades ejecutadas

- Se realza apertura mecánica de cajas y retiro de sobrante sobre los lugares donde el pavimento presenta fallas significativas, demarcados y aprobados por la supervisión y la interventoría, los cuales están ubicados en la Carrera 8 entre calles 7B y 6A.

- Se realiza imprimación con emulsión asfáltica una vez realizada la apertura de la caja, retiro de sobrantes, humectación, compactación, barrido y soplado.



- Conformación de mezcla asfáltica MDC-19 en los lugares demarcados para intervención, luego de aplicar emulsión asfáltica CRL-1H para la imprimación, esta conformación se realizó entre 8 y 11 cm de espesor.

- Las anteriores actividades se ejecutaron en la carrera 8 entre la calle 7B y calle 6A.

3.3. Seguimiento PMT

Se realiza seguimiento a las siguientes actividades ejecutadas en el PMT del proyecto:

Tabla 3. Seguimiento al PMT

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
1	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES MALETIN	UNIDAD	1,00	X		Instalan maletin de señalización 	
2	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CANECAS	UNIDAD	6,00	X		Instalan canecas para señalizar 	
3	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CONOS	UNIDAD	8,00	X		Se instalan conos para demarcar sitios de trabajo 	
4	ELABORACION DE VALLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO	UNIDAD	2,00		X	No se instalaron vallas informativas	
5	CINTA DE DEMARCACIÓN CAL. 3 (ROLLO 500 M * 0.1 M)	UNIDAD	3,00	X		Con cinta se demarco el area de cierre 	
6	ALQUILER SEÑALES PREVENTIVAS DE OBRA	UNIDAD	2,00	X		Se instalaron señales preventivas 	
7	ALQUILER BARRICADA DE LISTONES	UNIDAD	1,00		X	No se instlaron por parte del contratista barricada de listones 	

Fuente: El proyecto

Como se evidencia en la tabla anterior, a la fecha del presente informe el contratista continúa incumpliendo con la instalación de las vallas y barricada de listones.

3.4. Seguimiento PMA

Tabla 4. Seguimiento al PMA

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
Punto ecológico en frente de obra incluye suministro, instalación, mantenimiento y desmonte							
1	Residuos reciclables	Und	1,00	X		El contratista instala punto ecologico en obra	
1	Residuos ordinarios	Und	1,00	X			
1	Residuos Peligrosos	Und	1,00	X			
Gestion intrgral de residuos organicos, peligrosos, volumetricos y escombros.							
2	Gestion de residuos Organicos	Und	1,00		x	El contratista realiza gestion de escombros, ya que se realiza acopio de material de excavacion en lugar autorizado por el municipio. Pero de los demas programas de gestión no realiza su implementación	
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de escombros	Und	1,00	x			
Servicio de baño para el personal de la obra							
3	Servicio de baño personal de obra	Und	1,00	x		El contratista dispone de un baño en un parqueadero cercano	
Desarrollo y aplicación de la gestion ambiental							
4	Programa de gestion ambiental	Und	1,00		x	No desarrolla ningun programa de gestión ambiental	

Fuente: El proyecto

Por parte del contratista de obra se sigue incumpliendo la implementación del PMT

3.5. Informe del avance


Desde el 25 de agosto hasta el 13 de septiembre del 2023 el contratista de obra no ejecutó actividades, justificándose en que no contaba con el recurso financiero para continuar con la ejecución. Por parte de interventoría se le notificó dicha novedad a la entidad contratante para requerir al contratista.

A partir del 14 de septiembre de 2023, el contratista retomó labores en campo, durante este periodo se realizan labores de apertura mecánica de cajas y retiros de sobrantes, barrido y

soplado de cajas, imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H y suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica para parcheo.

El avance a la fecha de la presentación de este informe, que corresponde a la semana 10 de ejecución es de 61,57%, respecto al programado que corresponde al 79,87%.

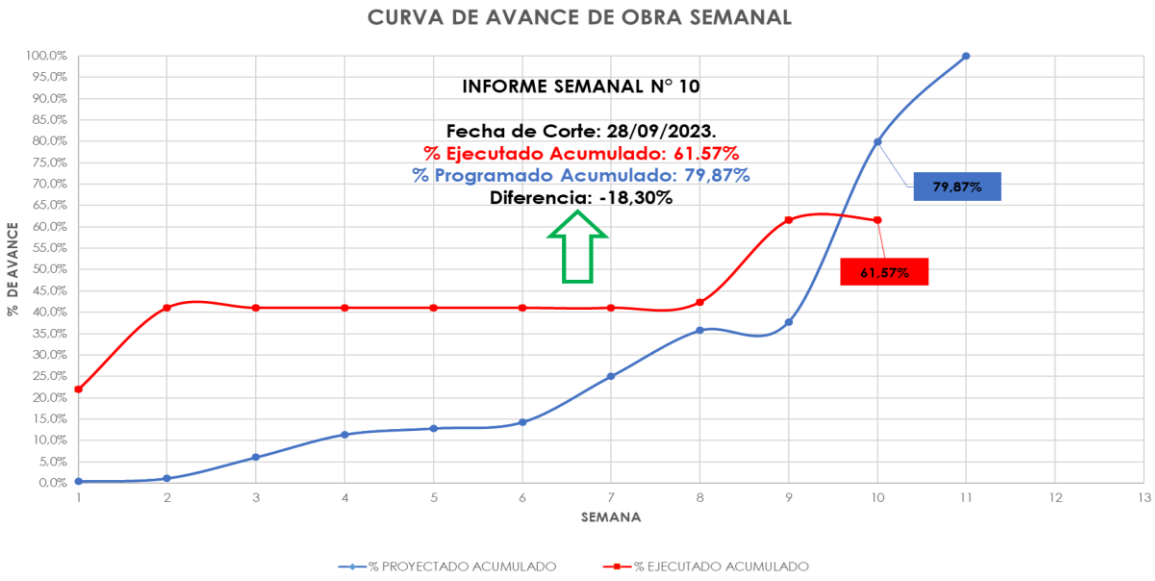Ilustración 3. Curva de avance semanal



Fuente: El proyecto

3.6. Estado general del tiempo

Durante el periodo del presente informe no se presentaron precipitaciones en la zona donde se está ejecutando el proyecto. Lo cual ha permitido el desarrollo normal de las actividades en campo.

3.7. Planillas de aportes al sistema de seguridad social de obra

Durante el periodo del presente informe, el contratista no ha presentado planillas de seguridad social, así como tampoco certificados de afiliación del personal relacionado anteriormente.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. Información general del contrato de interventoría

Tabla 5. Información contractual de Interventoría

No CONTRATO	ACEPTACIÓN DE OFERTA No 092 DE 2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍA URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ
CONTRATISTA	CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO C.C. 1.052.390.144 de Duitama, Boyacá
SUPERVISOR	ING. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS
VALOR	CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($14.560.000) M/CTE
FECHA DE INICIACIÓN	JUNIO 30 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 30 DE 2023
PLAZO	TRES (03) MESES

Fuente: el proyecto

4.2. Relación del Personal de interventoría

Durante el presente periodo se contó con la participación del siguiente personal profesional para la ejecución del proyecto.

Tabla 6. Personal Vinculado

NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	CARGO	% DEDICACIÓN
César Giovanny Mojica Barreto	1.052.390.144	Director de interventoría	30%
Camilo Adolfo Barrera	1.052.390.144	Residente de interventoría	100%
Camilo Andrés Garrido Rivero	1.094.269.468	Profesional HSEQ	30%
Fausto Andrés Trujillo Pinto	1.052.386.569	Profesional especialista en Geotecnia	30%

Fuente: El proyecto

4.3. Descripción de las actividades ejecutadas por la interventoría

- Entrega de informes semanales a la supervisión
- Acompañamiento en la ejecución de actividades de campo.
- Constante y eficiente comunicación con el contratista y supervisor.
- Entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada.
- Digitalización de correspondencia y documentación del proyecto
- Recepción y verificación de informes del contratista.
- La interventoría realiza supervisión a las actividades de apertura mecánica, solicitando afiliación del personal de obra y gestión de material de excavación.
- Se realiza la vigilancia técnica a las labores de compactación del material granular existente, barrido y soplado de la superficie.
- Se realiza vigilancia a las labores de instalación de la imprimación con emulsión asfáltica, en dicha labor se le advierte al contratista de las deficiencias al realizar la actividad, debido a que no se garantiza que la emulsión tenga el adecuado proceso de rotura, así como tampoco se garantizó la instalación de la emulsión de manera uniforme a lo largo de la superficie.
- Se realiza la instalación de la mezcla asfáltica, se le solicita al contratista mejorar la compactación de la misma especialmente en los bordes y garantizar la superficie más uniforme.
- Se realiza medición en campo de actividades ejecutadas por el contratista como apertura mecánica, barrido y soplado, imprimación de emulsión asfáltica, suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica, con el fin de llevar un seguimiento preciso de la ejecución del proyecto.
- Se realizan comités técnicos con el fin de revisar el avance de obra ejecutado por el contratista y para definir las actividades pendientes por realizar como lo es el muro de contención y placa de concreto.

5. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia generada durante el periodo del presente informe.

Tabla 7. Relación de correspondencia

OFICIO	FECHA DE RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
OF-INTV-VDL-011-23	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SUPERVISOR	Apremio No. 02 por presunto incumplimiento del contratista de obra	TRÁMITE
OF-INTV-VDL-012-23	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SUPERVISOR	Solicitud conformación MDC-19	TRÁMITE
OF-INTV-VDL-013-23	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud implementación total del PMT y PMA	TRÁMITE
OF-INTV-VDL-014-23	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONTRATISTA DE OBRA	No aval de actividades de imprimación y conformación de mezcla asfáltica.	TRÁMITE
OF-INTV-VDL-015-23	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud reprogramación de obra	TRÁMITE
OF-INTV-VDL-016-23	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SUPERVISOR	Apremio No. 03 por presunto incumplimiento del contratista de obra	TRÁMITE

Fuente: El proyecto

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Demarcación de cajas	*Corte de pavimento*
	
Apertura mecánica de cajas	*Retiro de material sobrante*
	
Compactación de base existente	*Barrido y soplado de caja*

	
Imprimación con emulsión asfáltica	*Imprimación con emulsión asfáltica, jornada de la noche*
	
Instalación de mezcla asfáltica para parcheo	*Instalación de mezcla asfáltica para parcheo, jornada de la noche*
	
Compactación de la mezcla instalada	*Compactación de la mezcla instalada*

7. CONCLUSIONES

- Se observa un avance significativo de ejecución de obra en comparación con el programado, pero es necesario continuar con las actividades programadas como las relacionadas con el MURO DE CONTENCION las cuales estaban previstas ejecutarse desde las primeras semanas.

- La interventoría de obra ha venido realizando el respectivo seguimiento a la documentación administrativa del contratista de obra.

- Se ha mantenido la comunicación entre obra, interventoría y supervisión.

- El contratista de obra presenta abandono de obra desde el día 6 de agosto hasta el 13 de septiembre de 2023. Debido al abandono de obra por parte del contratista se le ha solicitado a la entidad contratante el inicio del trámite señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 cuya consecuencia está estipulada en la Cláusula quince (15) del contrato de obra, denominada Multas en caso de incumplimiento a las obligaciones del contratista derivadas del presente contrato, “Por suspensión temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al contratista, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo”.

- El contratista reanudó labores el 14 de septiembre hasta el 22 de septiembre de 2023, las actividades ejecutadas por el contratista de obra han sido objeto de seguimiento y control por parte de interventoría.

- El contratista no cumple con la implementación del plan de manejo ambiental ni con el plan de manejo de tránsito en su totalidad.

- Se ha advertido en reiteradas ocasiones, de forma verbal, en bitácora y por oficio de las deficiencias en la ejecución de las actividades tales como, imprimación con emulsión asfáltica, instalación de mezcla y compactación de la misma. Por parte de interventoría no se reconocerá pago por la ejecución de las actividades que se mencionan en el oficio OF-INTV-VDL-014-23, del 21 de septiembre de 2023.

Cordialmente:

CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Ingeniero Civil
Director de Interventoría

8. ANEXOS

Anexo 1. informes semanales de interventoría

	CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO **INTERVENTOR**	**INFORME SEMANAL 6** **(28 DE AGOSTO DE 2023 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023)**

INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL AL CONTRATO 166 DE 2022

INFORMACIÓN PREVIA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO CONTRATO 092 DE 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍA URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.560.000,00								
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00								
VALOR TOTAL	$ 14.560.000,00								
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	**SUSPENSIÓN 1**		**REINICIO 1**		**Prorroga Nº 1**	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO	30/06/2023	**SUSPENSIÓN 2**		**REINICIO 2**		**Prorroga Nº 2**	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/09/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**	28/09/2023			**Plazo Actualizado**	3 meses		

INFORMACION PREVIA CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRATO 166 DE 2022	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 245.975.082,00								
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00								
VALOR TOTAL	$ 245.975.082,00								
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	**SUSPENSIÓN 1**	1/12/2022	**REINICIO 1**	5/05/2023	**Prorroga Nº 1**	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO	1/12/2022	**SUSPENSIÓN 2**	12/05/2023	**REINICIO 2**	25/07/2023	**Prorroga Nº 2**	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**	30/09/2023			**Plazo Actualizado**	3 meses		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	6	Periodo comprendido entre el	28 DE AGOSTO DE 2023	y el	03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

CONTROL POLIZAS DE GARANTIA

CONTRATO DE OBRA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FIANZAS PATRÍA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	28/02/2023	22/07/2023	$ 35.365.127,80
Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	28/02/2023	01/04/2026	$ 35.365.127,80
Estabilidad y calidad de la obra	22/03/2023	22/03/2028	$ 70.730.255,60
RCE.	28/02/2023	01/04/2023	$ 232.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FIANZAS PATRÍA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	17/01/2023	10/01/2024	$ 3.864.360,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	17/01/2023	10/07/2026	$ 1.932.180,00
Calidad del Servicio.	17/04/2024	16/04/2028	$ 3.864.360,00

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIIVDAD	UBICACIÓN
No se realizaron actividades de obra	

CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

INFORME SEMANAL 6
(28 DE AGOSTO DE 2023 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCION	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA

OFICIO	FECHA DE RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

PERSONAL EN OBRA

APELLIDOS Y NOMBRES	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DIAS EN OBRA						
			28	29	30	31	1	2	3
			L	M	M	J	V	S	D
YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ	7.179.871	DIRECTOR DE OBRA							
YULI NORETH DAZA CORREA	1.020.741.873	RESIDENTE OBRA							
GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA	1.049.617.189	RESIDENTE QHSE							
JOSE EDILBERTO ROJAS BARRERA	7.185.910	INSPECTOR							
FAVIO CRUZ	88.157.061	OPERADOR							
JUAN DE JESUS CARDENAS ACERO	4.280.518	AYUDANTE							
JULIO EVARISTO CACERES CERON	1.002.414.842	AYUDANTE							
JORGE ESTEBAN MORENO CARDENAS	1.049.658.990	AYUDANTE							
JOSE ALFONSO LOPEZ SANABRIA,	4.248.729	AYUDANTE							
JOSE GONZALO CORREDOR RODRIGUEZ	80.434.638	OPERADOR							
JESUS ANTONIO ROZO SILVA	13.353.948	AYUDANTE							

CONTROL DE LLUVIAS

DIAS	28	29	30	31	1	2	3
	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DEL CLIMA							
HORAS DE LLUVIA							
TOTAL HORAS DE LLUVIAS							

ESTADO DEL CLIMA
B BUENO
R REGULAR
M MALO
P PESIMO

RELACION DE COMITES DE OBRA REALIZADOS


DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

	CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO **INTERVENTOR**	**INFORME SEMANAL 6** **(28 DE AGOSTO DE 2023 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023)**

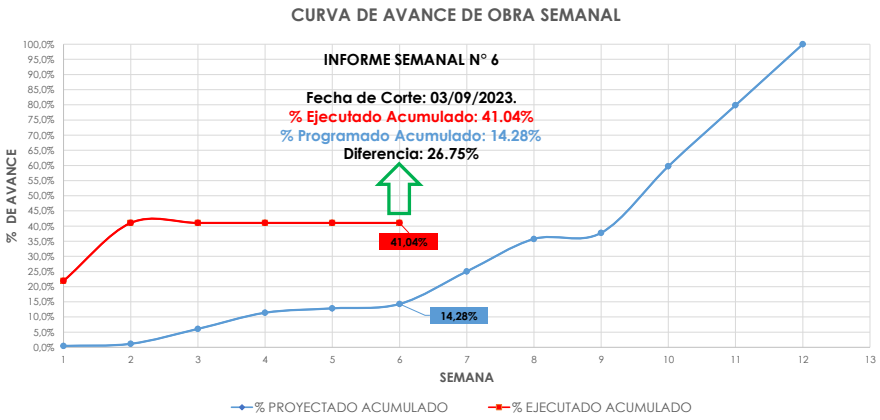CONTROL Y SEGUIMIENTO



REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

No se realizaron actividades de obra, contratista mantiene el abandono de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

ING. CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

INFORME SEMANAL 6 (28 DE AGOSTO DE 2023 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
Punto ecológico en frente de obra incluye suministro, instalación, mantenimiento y desmonte							
1	Residuos reciclables	Und	1,00		X	El contratista no instala punto ecologico	
1	Residuos ordinarios	Und	1,00		X		
1	Residuos Peligrosos	Und	1,00		X		
Gestion intrgral de residuos organicos, peligrosos, volumetricos y escombros.							
2	Gestion de residuos Organicos	Und	1,00		x	El contratista no se encuentra realizando actividades de obra	
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de escombros	Und	1,00		x		
Servicio de baño para el personal de la obra							
3	Servicio de baño personal de obra	Und	1,00		x	El contratista no se encuentra realizando actividades de obra	
Desarrollo y aplicación de la gestion ambiental							
4	Programa de gestion ambiental	Und	1,00		x	No desarrolla ningun programa de gestión ambiental	
Observaciones							

El contratista no cumple con la ejecucion del plan de manejo ambiental



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

ING. CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT

INFORME SEMANAL 6
(28 DE AGOSTO DE 2023 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
1	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES MALETIN	UNIDAD	1,00		x	No se realizan actividades 	
2	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CANECAS	UNIDAD	6,00	X		No se realizan actividades 	
3	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CONOS	UNIDAD	8,00		X	No se realizan actividades 	
4	ELABORACION DE VALLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO	UNIDAD	2,00		X	No se instalaron vallas informativas	
5	CINTA DE DEMARCACIÓN CAL. 3 (ROLLO 500 M * 0.1 M)	UNIDAD	3,00		X	No se utilizo cinta de demarcacion 	
6	ALQUILER SEÑALES PREVENTIVAS DE OBRA	UNIDAD	2,00		X	No se usaron señales preventivas 	
7	ALQUILER BARRICADA DE LISTONES	UNIDAD	1,00		X	No se instlaron por parte del contratista barricada de listones 	

Observaciones

El contratista no cumple con la ejecucion del plan de manejo de transito

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

	CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO **INTERVENTOR**	**INFORME SEMANAL 7** **(04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)**

INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL AL CONTRATO 166 DE 2022

INFORMACIÓN PREVIA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO CONTRATO 092 DE 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍA URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.560.000,00						
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00						
VALOR TOTAL	$ 14.560.000,00						
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	**SUSPENSIÓN 1**		**REINICIO 1**		**Prorroga Nº 1**	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	30/06/2023	**SUSPENSIÓN 2**		**REINICIO 2**		**Prorroga Nº 2**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/09/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**		28/09/2023		**Plazo Actualizado**	3 meses

INFORMACION PREVIA CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRATO 166 DE 2022	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 245.975.082,00						
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00						
VALOR TOTAL	$ 245.975.082,00						
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	**SUSPENSIÓN 1**	1/12/2022	**REINICIO 1**	5/05/2023	**Prorroga Nº 1**	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	1/12/2022	**SUSPENSIÓN 2**	12/05/2023	**REINICIO 2**	25/07/2023	**Prorroga Nº 2**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**		30/09/2023		**Plazo Actualizado**	3 meses

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	7	Periodo comprendido entre el	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	y el	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROYECTO:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.				

CONTROL POLIZAS DE GARANTIA

CONTRATO DE OBRA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FIANZAS PATRÍA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	28/02/2023	22/07/2023	$ 35.365.127,80
Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	28/02/2023	01/04/2026	$ 35.365.127,80
Estabilidad y calidad de la obra	22/03/2023	22/03/2028	$ 70.730.255,60
RCE.	28/02/2023	01/04/2023	$ 232.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FIANZAS PATRÍA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	17/01/2023	10/01/2024	$ 3.864.360,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	17/01/2023	10/07/2026	$ 1.932.180,00
Calidad del Servicio.	17/04/2024	16/04/2028	$ 3.864.360,00

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIIVDAD	UBICACIÓN
No se realizaron actividades de obra	

CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

INFORME SEMANAL 7
(04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCION	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA

OFICIO	FECHA DE RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
OF-INTV-VDL-011-23	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SUPERVISOR	Apremio No. 02 por presunto incumplimiento	TRÁMITE

PERSONAL EN OBRA

APELLIDOS Y NOMBRES	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DIAS EN OBRA						
			4	5	6	7	8	9	10
			L	M	M	J	V	S	D
YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ	7.179.871	DIRECTOR DE OBRA							
YULI NORETH DAZA CORREA	1.020.741.873	RESIDENTE OBRA							
GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA	1.049.617.189	RESIDENTE QHSE							
JOSE EDILBERTO ROJAS BARRERA	7.185.910	INSPECTOR							
FAVIO CRUZ	88.157.061	OPERADOR							
JUAN DE JESUS CARDENAS ACERO	4.280.518	AYUDANTE							
JULIO EVARISTO CACERES CERON	1.002.414.842	AYUDANTE							
JORGE ESTEBAN MORENO CARDENAS	1.049.658.990	AYUDANTE							
JOSE ALFONSO LOPEZ SANABRIA,	4.248.729	AYUDANTE							
JOSE GONZALO CORREDOR RODRIGUEZ	80.434.638	OPERADOR							
JESUS ANTONIO ROZO SILVA	13.353.948	AYUDANTE							

CONTROL DE LLUVIAS

DIAS	4	5	6	7	8	9	10
	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DEL CLIMA							
HORAS DE LLUVIA							
TOTAL HORAS DE LLUVIAS							

ESTADO DEL CLIMA
B BUENO
R REGULAR
M MALO
P PESIMO

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS


DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

	CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO **INTERVENTOR**	**INFORME SEMANAL 7** **(04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)**

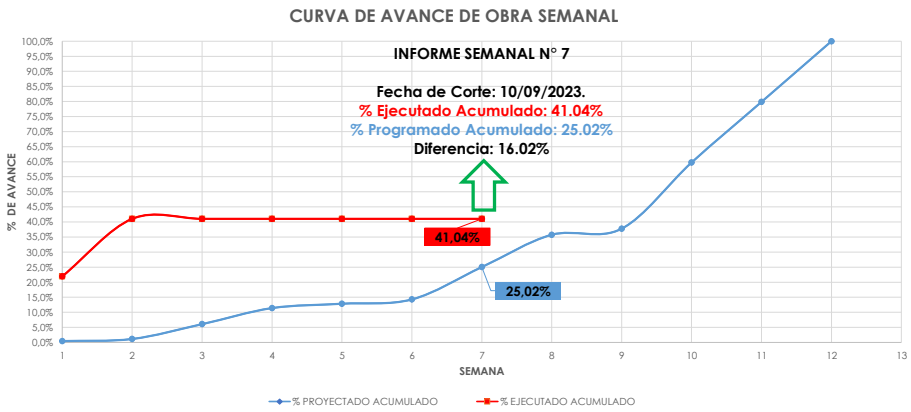CONTROL Y SEGUIMIENTO



REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

No se realizaron actividades de obra, contratista mantiene el abandono de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

ING. CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

INFORME SEMANAL 7 (04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)



ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
Punto ecológico en frente de obra incluye suministro, instalación, mantenimiento y desmonte							
1	Residuos reciclables	Und	1,00		X	El contratista no se encuentra realizando actividades de obra	
1	Residuos ordinarios	Und	1,00		X		
1	Residuos Peligrosos	Und	1,00		X		
Gestion intrgral de residuos organicos, peligrosos, volumetricos y escombros.							
2	Gestion de residuos Organicos	Und	1,00		x	El contratista no se encuentra realizando actividades de obra	
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de escombros	Und	1,00		x		
Servicio de baño para el personal de la obra							
3	Servicio de baño personal de obra	Und	1,00		x	El contratista no se encuentra realizando actividades de obra	
Desarrollo y aplicación de la gestion ambiental							
4	Programa de gestion ambiental	Und	1,00		x	No desarrolla ningun programa de gestión ambiental	
Observaciones							

El contratista no cumple con la ejecucion del plan de manejo ambiental

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

	ING. CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO **INTERVENTOR** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT**	**INFORME SEMANAL 7** **(04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023)**

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
1	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES MALETIN	UNIDAD	1,00		x	No se realizan actividades 	
2	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CANECAS	UNIDAD	6,00	X		No se realizan actividades 	
3	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CONOS	UNIDAD	8,00		X	No se realizan actividades 	
4	ELABORACION DE VALLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO	UNIDAD	2,00		X	No se instalaron vallas informativas	
5	CINTA DE DEMARCACIÓN CAL. 3 (ROLLO 500 M * 0.1 M)	UNIDAD	3,00		X	No se utilizo cinta de demarcacion 	
6	ALQUILER SEÑALES PREVENTIVAS DE OBRA	UNIDAD	2,00		X	No se usaron señales preventivas 	
7	ALQUILER BARRICADA DE LISTONES	UNIDAD	1,00		X	No se instlaron por parte del contratista barricada de listones 	

Observaciones

El contratista no cumple con la ejecucion del plan de manejo de transito

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

	CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO **INTERVENTOR**	**INFORME SEMANAL 8** **(11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023)**

INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL AL CONTRATO 166 DE 2022

INFORMACIÓN PREVIA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO CONTRATO 092 DE 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍA URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.560.000,00						
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00						
VALOR TOTAL	$ 14.560.000,00						
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	**SUSPENSIÓN 1**		**REINICIO 1**		**Prorroga Nº 1**	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	30/06/2023	**SUSPENSIÓN 2**		**REINICIO 2**		**Prorroga Nº 2**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/09/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**		28/09/2023		**Plazo Actualizado**	3 meses

INFORMACION PREVIA CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRATO 166 DE 2022	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 245.975.082,00						
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00						
VALOR TOTAL	$ 245.975.082,00						
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	**SUSPENSIÓN 1**	1/12/2022	**REINICIO 1**	5/05/2023	**Prorroga Nº 1**	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	1/12/2022	**SUSPENSIÓN 2**	12/05/2023	**REINICIO 2**	25/07/2023	**Prorroga Nº 2**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**		30/09/2023		**Plazo Actualizado**	3 meses

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	8	Periodo comprendido entre el	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	y el	17 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

CONTROL POLIZAS DE GARANTIA

CONTRATO DE OBRA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FIANZAS PATRÍA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	28/02/2023	22/07/2023	$ 35.365.127,80
Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	28/02/2023	01/04/2026	$ 35.365.127,80
Estabilidad y calidad de la obra	22/03/2023	22/03/2028	$ 70.730.255,60
RCE.	28/02/2023	01/04/2023	$ 232.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FIANZAS PATRÍA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	17/01/2023	10/01/2024	$ 3.864.360,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	17/01/2023	10/07/2026	$ 1.932.180,00
Calidad del Servicio.	17/04/2024	16/04/2028	$ 3.864.360,00

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIIVDAD	UBICACIÓN
Se realizaron cortes para retiro de pavimento exitente en forma de cajas.	CARRERA 8 ENTRE CLL 7B Y 6A VILLA DE LEYVA, BOYACÁ
Retiro de pavimento existente con maquina y manualmente.	CARRERA 8 ENTRE CLL 7B Y 6A VILLA DE LEYVA, BOYACÁ

CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

INFORME SEMANAL 8
(11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCION	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
CORTADORA	

CORRESPONDENCIA

OFICIO	FECHA DE RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
OF-INTV-VDL-012-23	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SUPERVISOR	Solicitud conformación MDC-19	TRÁMITE

PERSONAL EN OBRA

APELLIDOS Y NOMBRES	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DIAS EN OBRA						
			11	12	13	14	15	16	17
			L	M	M	J	V	S	D
YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ	7.179.871	DIRECTOR DE OBRA							
YULI NORETH DAZA CORREA	1.020.741.873	RESIDENTE OBRA							
GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA	1.049.617.189	RESIDENTE QHSE							
IVAN DARIO HUERTAS PEDRAZA	1.094.650.708	INSPECTOR							
SEGUNDO ABRAHAM MEDINA	4.221.328	MAESTRO							
MAXIMILIANO KAMMERER	17.977.048	OFICIAL							
JULIO EVARISTO CACERES CERON	1.002.414.842	AYUDANTE							
JUAN DE JESUS CARDENAS ACERO	4.280.518	AYUDANTE							

CONTROL DE LLUVIAS

DIAS	11	12	13	14	15	16	17
	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DEL CLIMA	B	B	B	B	B	B	B
HORAS DE LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS DE LLUVIAS	0						

ESTADO DEL CLIMA
B BUENO
R REGULAR
M MALO
P PESIMO

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS


DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ No. 03	14	9	2023	

	CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO **INTERVENTOR**	**INFORME SEMANAL 8** **(11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023)**

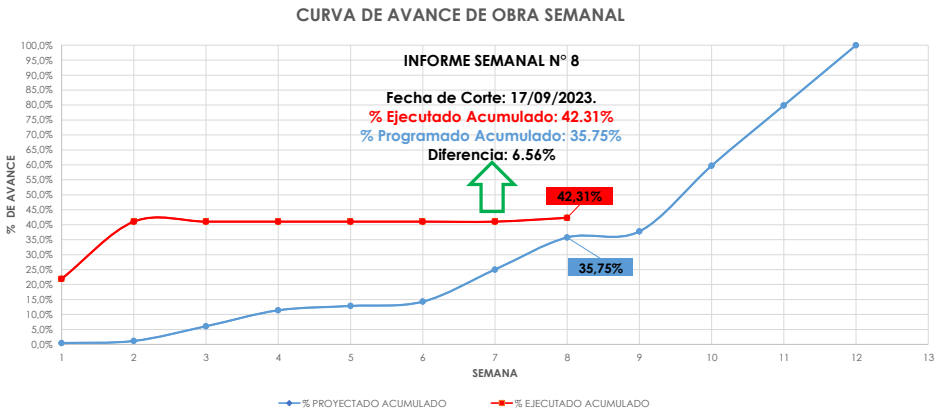CONTROL Y SEGUIMIENTO



REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES

Se le solicita al contratista usar la cimbra para garantizar cortes mas uniformes y la implementación del PMT y PMA en las labores realizadas

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

ING. CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

INFORME SEMANAL 8 (11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
Punto ecológico en frente de obra incluye suministro, instalación, mantenimiento y desmonte							
1	Residuos reciclables	Und	1,00		X	El contratista no instala punto ecologico	
1	Residuos ordinarios	Und	1,00		X		
1	Residuos Peligrosos	Und	1,00		X		
Gestion intrgral de residuos organicos, peligrosos, volumetricos y escombros.							
2	Gestion de residuos Organicos	Und	1,00		x	El contratista realiza gestion de escombros, ya que se realiza acopio de material de excavacion en lugar autorizado por el municipio	
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de escombros	Und	1,00	x			
Servicio de baño para el personal de la obra							
3	Servicio de baño personal de obra	Und	1,00	x		El contratista dispone de un baño en un parqueadero cercano	
Desarrollo y aplicación de la gestion ambiental							
4	Programa de gestion ambiental	Und	1,00		x	No desarrolla ningun programa de gestión ambiental	

Observaciones

El contratista no cumple con la ejecucion del plan de manejo ambiental, se reitera en campo y en bitacora dicha observación, la cual no es acatada por el contratista



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

ING. CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT

INFORME SEMANAL 8
(11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
1	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES MALETIN	UNIDAD	1,00		x	No instalan maletin de señalización 	
2	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CANECAS	UNIDAD	6,00	X		No instalan canecas para señalizar 	
3	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CONOS	UNIDAD	8,00		X	Se instalan conos para demarcar sitios de trabajo 	
4	ELABORACION DE VALLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO	UNIDAD	2,00		X	No se instalaron vallas informativas	
5	CINTA DE DEMARCACIÓN CAL. 3 (ROLLO 500 M * 0.1 M)	UNIDAD	3,00		X	No se utilizo cinta de demarcacion 	
6	ALQUILER SEÑALES PREVENTIVAS DE OBRA	UNIDAD	2,00		X	No se usaron señales preventivas 	
7	ALQUILER BARRICADA DE LISTONES	UNIDAD	1,00		X	No se instlaron por parte del contratista barricada de listones 	

Observaciones

El contratista no cumple con la ejecucion del plan de manejo de transito, se reitera verbalmente y en bitacora el uso de la señalización, especialmente de señales informativas tales como via cerrada y desvio, debido a que la vía es de alto flujo vehicular

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

	CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO **INTERVENTOR**	**INFORME SEMANAL 9** **(18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023)**

INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL AL CONTRATO 166 DE 2022

INFORMACIÓN PREVIA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO CONTRATO 092 DE 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍA URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.560.000,00						
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00						
VALOR TOTAL	$ 14.560.000,00						
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	**SUSPENSIÓN 1**		**REINICIO 1**		**Prorroga Nº 1**	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	30/06/2023	**SUSPENSIÓN 2**		**REINICIO 2**		**Prorroga Nº 2**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/09/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**		28/09/2023		**Plazo Actualizado**	3 meses

INFORMACION PREVIA CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRATO 166 DE 2022	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 245.975.082,00						
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00						
VALOR TOTAL	$ 245.975.082,00						
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	**SUSPENSIÓN 1**	1/12/2022	**REINICIO 1**	5/05/2023	**Prorroga Nº 1**	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	1/12/2022	**SUSPENSIÓN 2**	12/05/2023	**REINICIO 2**	25/07/2023	**Prorroga Nº 2**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**		30/09/2023		**Plazo Actualizado**	3 meses

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	9	Periodo comprendido entre el	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	y el	24 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

CONTROL POLIZAS DE GARANTIA

CONTRATO DE OBRA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FIANZAS PATRÍA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	28/02/2023	22/07/2023	$ 35.365.127,80
Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	28/02/2023	01/04/2026	$ 35.365.127,80
Estabilidad y calidad de la obra	22/03/2023	22/03/2028	$ 70.730.255,60
RCE.	28/02/2023	01/04/2023	$ 232.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FIANZAS PATRÍA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	17/01/2023	10/01/2024	$ 3.864.360,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	17/01/2023	10/07/2026	$ 1.932.180,00
Calidad del Servicio.	17/04/2024	16/04/2028	$ 3.864.360,00

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIIVDAD	UBICACIÓN
Se continuaron con cortes, aperturas mecanicas y manual de cajas y retiro de material sobrante	CARRERA 8 ENTRE CLL 7B Y 6A VILLA DE LEYVA, BOYACÁ
Se realizaron labores de barrido y soplado de las cajas aperturadas	CARRERA 8 ENTRE CLL 7B Y 6A VILLA DE LEYVA, BOYACÁ
Se realizó la instalación de imprimación con emulsión asfaltica	CARRERA 8 ENTRE CLL 7B Y 6A VILLA DE LEYVA, BOYACÁ
Se suministró, instaló y compacto la mezcla asfaltica	CARRERA 8 ENTRE CLL 7B Y 6A VILLA DE LEYVA, BOYACÁ

CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

INFORME SEMANAL 9
(18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCION	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
FINNISHER	Presentó problemas mecánicos durante la operación
VIBROCOMPACTADOR	Presentó problemas mecánicos durante la operación

CORRESPONDENCIA

OFICIO	FECHA DE RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
OF-INTV-VDL-013-23	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud implementación total del PMT y PMA	TRÁMITE
OF-INTV-VDL-014-23	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONTRATISTA DE OBRA	No aval de actividades de imprimación y conformación de mezcla asfáltica.	TRÁMITE
OF-INTV-VDL-015-23	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONTRATISTA DE OBRA	Solicitud reprogramación de obra	TRÁMITE

PERSONAL EN OBRA

APELLIDOS Y NOMBRES	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DIAS EN OBRA						
			18	19	20	21	22	23	24
			L	M	M	J	V	S	D
YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ	7.179.871	DIRECTOR DE OBRA							
YULI NORETH DAZA CORREA	1.020.741.873	RESIDENTE OBRA							
GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA	1.049.617.189	RESIDENTE QHSE							
IVAN DARIO HUERTAS PEDRAZA	1.094.650.708	INSPECTOR							
SEGUNDO ABRAHAM MEDINA	4.221.328	MAESTRO							
MAXIMILIANO KAMMERER	17.977.048	OFICIAL							
JULIO EVARISTO CACERES CERON	1.002.414.842	AYUDANTE							
JUAN DE JESUS CARDENAS ACERO	4.280.518	AYUDANTE							
JOHAN ESTIBEN BOCAREJO VELAZCO	1.024.592.521	TORNILLERO							
YIMY FERNEY GUTIERREZ AVELLA	1.057.589.777	OPERADOR FINNISHER							
DIEGO ALEXANDER CERON	1.057.602.294	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR							
LUIS CERON MANTAÑA	9.396.730	AYUDANTE							

CONTROL DE LLUVIAS

DIAS	18	19	20	21	22	23	24
	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DEL CLIMA	B	B	B	B	B	B	B
HORAS DE LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS DE LLUVIAS	0						

ESTADO DEL CLIMA
B BUENO
R REGULAR
M MALO
P PESIMO

RELACION DE COMITES DE OBRA REALIZADOS


DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

	CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO **INTERVENTOR**	**INFORME SEMANAL 9** **(18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023)**

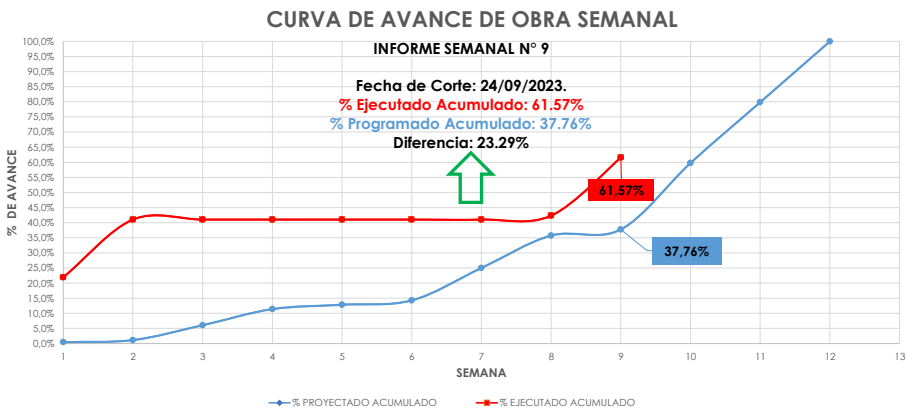CONTROL Y SEGUIMIENTO



REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES

Se le manifiesta al contratista de las deficiencias en la compactación especialmente de los bordes.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

ING. CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

INFORME SEMANAL 9 (18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
Punto ecológico en frente de obra incluye suministro, instalación, mantenimiento y desmonte							
1	Residuos reciclables	Und	1,00	X		El contratista instala punto ecologico en obra	
1	Residuos ordinarios	Und	1,00	X			
1	Residuos Peligrosos	Und	1,00	X			
Gestion intrgral de residuos organicos, peligrosos, volumetricos y escombros.							
2	Gestion de residuos Organicos	Und	1,00		x	El contratista realiza gestion de escombros, ya que se realiza acopio de material de excavacion en lugar autorizado por el municipio. Pero de los demas programas de gestión no realiza su implementación	
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de escombros	Und	1,00	x			
Servicio de baño para el personal de la obra							
3	Servicio de baño personal de obra	Und	1,00	x		El contratista dispone de un baño en un parqueadero cercano	
Desarrollo y aplicación de la gestion ambiental							
4	Programa de gestion ambiental	Und	1,00		x	No desarrolla ningun programa de gestión ambiental	
Observaciones							
El contratista no cumple con la ejecucion del plan de manejo ambiental, se reitera en campo y en bitacora dicha observación.							



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

ING. CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT

INFORME SEMANAL 9
(18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
1	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES MALETIN	UNIDAD	1,00	X		Instalan maletin de señalización 	
2	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CANECAS	UNIDAD	6,00	X		Instalan canecas para señalizar 	
3	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CONOS	UNIDAD	8,00	X		Se instalan conos para demarcar sitios de trabajo 	
4	ELABORACION DE VALLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO	UNIDAD	2,00		X	No se instalaron vallas informativas	
5	CINTA DE DEMARCACIÓN CAL. 3 (ROLLO 500 M * 0.1 M)	UNIDAD	3,00	X		Con cinta se demarco el area de cierre 	
6	ALQUILER SEÑALES PREVENTIVAS DE OBRA	UNIDAD	2,00	X		Se instalaron señales preventivas 	
7	ALQUILER BARRICADA DE LISTONES	UNIDAD	1,00		X	No se instlaron por parte del contratista barricada de listones 	

Observaciones

Continua pendiente por parte del contratista la instalación de vallas con la infomación del proyecto e instalación de barricada de listones, tal como lo contempla el PMT

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

	CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO **INTERVENTOR**	**INFORME SEMANAL 10** **(25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023)**

INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL AL CONTRATO 166 DE 2022

INFORMACION PREVIA CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO CONTRATO 092 DE 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍA URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.560.000,00						
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00						
VALOR TOTAL	$ 14.560.000,00						
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	**SUSPENSIÓN 1**		**REINICIO 1**		**Prorroga Nº 1**	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	30/06/2023	**SUSPENSIÓN 2**		**REINICIO 2**		**Prorroga Nº 2**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/09/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**		28/09/2023		**Plazo Actualizado**	3 meses

INFORMACIÓN PREVIA CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRATO 166 DE 2022	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 245.975.082,00						
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00						
VALOR TOTAL	$ 245.975.082,00						
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	**SUSPENSIÓN 1**	1/12/2022	**REINICIO 1**	5/05/2023	**Prorroga Nº 1**	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	1/12/2022	**SUSPENSIÓN 2**	12/05/2023	**REINICIO 2**	25/07/2023	**Prorroga Nº 2**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**		30/09/2023		**Plazo Actualizado**	3 meses

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	10	Periodo comprendido entre el	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	y el	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROYECTO:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.				

CONTROL POLIZAS DE GARANTIA

CONTRATO DE OBRA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FIANZAS PATRÍA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	28/02/2023	22/07/2023	$ 35.365.127,80
Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	28/02/2023	01/04/2026	$ 35.365.127,80
Estabilidad y calidad de la obra	22/03/2023	22/03/2028	$ 70.730.255,60
RCE.	28/02/2023	01/04/2023	$ 232.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FIANZAS PATRÍA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO.

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	17/01/2023	10/01/2024	$ 3.864.360,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	17/01/2023	10/07/2026	$ 1.932.180,00
Calidad del Servicio.	17/04/2024	16/04/2028	$ 3.864.360,00

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIIVDAD	UBICACIÓN
No se realizaron actividades de obra	

CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

INFORME SEMANAL 10
(25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCION	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA

OFICIO	FECHA DE RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
OF-INTV-VDL-016-23	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SUPERVISOR	Apremio No. 03 por presunto incumplimiento del contratista de obra.	TRÁMITE

PERSONAL EN OBRA

APELLIDOS Y NOMBRES	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DIAS EN OBRA						
			25	26	27	28	29	30	1
			L	M	M	J	V	S	D
YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ	7.179.871	DIRECTOR DE OBRA							
YULI NORETH DAZA CORREA	1.020.741.873	RESIDENTE OBRA							
GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA	1.049.617.189	RESIDENTE QHSE							
IVAN DARIO HUERTAS PEDRAZA	1.094.650.708	INSPECTOR							
SEGUNDO ABRAHAM MEDINA	4.221.328	MAESTRO							
MAXIMILIANO KAMMERER	17.977.048	OFICIAL							
JULIO EVARISTO CACERES CERON	1.002.414.842	AYUDANTE							
JUAN DE JESUS CARDENAS ACERO	4.280.518	AYUDANTE							
JOHAN ESTIBEN BOCAREJO VELAZCO	1.024.592.521	TORNILLERO							
YIMY FERNEY GUTIERREZ AVELLA	1.057.589.777	OPERADOR FINNISHER							
DIEGO ALEXANDER CERON	1.057.602.294	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR							
LUIS CERON MANTAÑA	9.396.730	AYUDANTE							

CONTROL DE LLUVIAS

DIAS	25	26	27	28	29	30	1
	L	M	M	J	V	S	D
ESTADO DEL CLIMA							
HORAS DE LLUVIA							
TOTAL HORAS DE LLUVIAS							

ESTADO DEL CLIMA
B BUENO
R REGULAR
M MALO
P PESIMO


RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

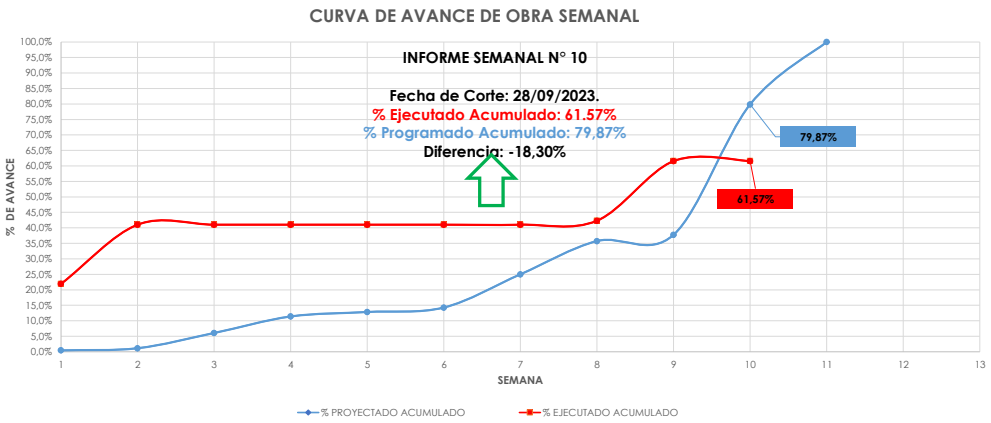CONTROL Y SEGUIMIENTO



REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

No se realizaron actividades de obra, el contratista nuevamente abandonó la obra. El 28 de septiembre de 2023, se suscribió acta de suspensión del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

ING. CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

INFORME SEMANAL 10 (25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
Punto ecológico en frente de obra incluye suministro, instalación, mantenimiento y desmonte							
1	Residuos reciclables	Und	1,00		X	El contratista no instala punto ecologico	
1	Residuos ordinarios	Und	1,00		X		
1	Residuos Peligrosos	Und	1,00		X		
Gestion intrgral de residuos organicos, peligrosos, volumetricos y escombros.							
2	Gestion de residuos Organicos	Und	1,00		x	El contratista no se encuentra realizando actividades de obra	
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de residuos Peligrosos	Und	1,00		x		
2	Gestion de escombros	Und	1,00		x		
Servicio de baño para el personal de la obra							
3	Servicio de baño personal de obra	Und	1,00		x	El contratista no se encuentra realizando actividades de obra	
Desarrollo y aplicación de la gestion ambiental							
4	Programa de gestion ambiental	Und	1,00		x	No desarrolla ningun programa de gestión ambiental	
Observaciones							

El contratista no cumple con la ejecucion del plan de manejo ambiental




DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD

ING. CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
INTERVENTOR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT

INFORME SEMANAL 10
(25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	CUMPLE		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				SI	NO		
1	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES MALETIN	UNIDAD	1,00		x	No se realizan actividades 	
2	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CANECAS	UNIDAD	6,00	X		No se realizan actividades 	
3	ALQUILER DISPOSITIVOS MANUALES CONOS	UNIDAD	8,00		X	No se realizan actividades 	
4	ELABORACION DE VALLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO	UNIDAD	2,00		X	No se instalaron vallas informativas	
5	CINTA DE DEMARCACIÓN CAL. 3 (ROLLO 500 M * 0.1 M)	UNIDAD	3,00		X	No se utilizo cinta de demarcacion 	
6	ALQUILER SEÑALES PREVENTIVAS DE OBRA	UNIDAD	2,00		X	No se usaron señales preventivas 	
7	ALQUILER BARRICADA DE LISTONES	UNIDAD	1,00		X	No se instlaron por parte del contratista barricada de listones 	

Observaciones

El contratista no cumple con la ejecucion del plan de manejo de transito

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma

Nombre: CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
Matrícula No. : 68202-296240 STD
