MEMORANDO SPL.1129.2023 - 07-12-2023 01:05

PARA: **MERLY KATHERINE PARRA DÍAZ**
Tesorera - CAS

DE: **ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

ASUNTO: **PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**

FECHA: 07 de diciembre de 2023

Por medio del presente me permito remitirle la siguiente documentación del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**, suscrito entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS** y la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA**, representada legalmente por el señor **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO** C.C. 93.367.013, cuyo objeto es: "REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS" con el fin de proceder a realizar el pago del Acta Parcial No. 02.

CONTRATO No.	01415-2023
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
NIT:	804.000.292-0
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA
NIT:	809.010.058-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO CC No. 93.367.013
OBJETO	"REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS".
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66)

icontec ISO 14001 SA367-1
icontec ISO 45001 ST-CER944508
icontec ISO 9001 SC3264-1
icontec Norsok S WA-006
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

SUPERVISOR	ROCIO AYALA MORENO SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL - CAS
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023 SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023
SUSPENSION	NO APLICA
REINICIO	NO APLICA
PRORROGA	NO APLICA

El balance financiero del Contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	$154.036.665,66	
VALOR PAGADO		$49.199.311,01
VALOR PAGO ACTUAL		$81.131.111,80
VALOR POR EJECUTAR		$23.706.242,85
SUMAS IGUALES	$154.036.665,66	$154.036.665,66

En Virtud de la CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: LA CORPORACIÓN pagará al CONTRATISTA el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, POR ACTAS PARCIALES de conformidad con el porcentaje de avance de ejecución de acuerdo a las actividades ejecutadas conforme al alcance y especificaciones del objeto contractual y el valor del presupuesto, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes parciales presentados por el Contratista con soportes y evidencias de ejecución. El saldo del 10% se cancelará con posterioridad a la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la Supervisión con los soportes respectivos referidos para lo cual deberá presentar; (i) Acta de recibo final de las obras. (ii) Archivo fotográfico de realización de los trabajos, (iii) Acta de terminación del contrato y liquidación de mutuo acuerdo del mismo, y esta acta obtenga el visto bueno del Supervisor de la obra y se encuentre debidamente firmada por el contratista, (iv) Que el contratista aporte la prueba del pago de nómina (salarios y prestaciones sociales), seguridad social y aportes parafiscales. (v) Que el Supervisor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción de la CAS. (vi) Que el contratista presente la factura de cobro respectiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ordena pago correspondiente al valor ejecutado a la fecha que asciende a la suma de. **OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($81.131.111,80)** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023** a nombre de la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE – ACODEMA**, identificada con NIT 809.010.058-4.

Anexos:

- Oficio de remisión de la solicitud presentada por contratista.
- Certificación Bancaria.
- Factura electrónica de venta No. FE 3.
- Copia RUT.
- Memorando de Contabilidad.
- Tarjeta Profesional y Certificación Junta Central de Contadores del Contador.
- Certificado aportes parafiscales.
- Concepto financiero.
- Certificación Desglose Factor Multiplicador.
- Planillas de pago Seguridad Social del personal vinculado al proyecto y Representante Legal.
- Informe de ejecución.
- Formato F-PCT-034 - Informe Supervisión e Interventoría.
- Formato F-PCT-008 - Informe de Seguimiento Supervisión e Interventoría.
- Formato F-PCT-032 - Acta Parcial.
- Bitácora de obra.
- Transporte.

Sin otro particular,

DRA. ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS

Proyectó y revisó: Jorge Andrés Báez Gómez

Vto Bo. Ines Castro Ballesteros

icontec ISO 14001 SA367-1
icontec ISO 45001 ST-CER944508
icontec ISO 9001 SC3264-1
icontec Norsok S WA-006
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

San Gil, 11 de diciembre de 2023.

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
Carrera. 12 No. 9 – 06
Planeación, Tesorería y Contabilidad
Ciudad

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA CUENTA DE COBRO NO. 2 CONTRATO NO. 01415-2023.

En desarrollo del contrato No. 01415-2023 cuyo objeto es "REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS.", nos permitimos presentar cuenta de cobro No. 2, aportando la documentación relacionada acontinuación:

1. Certificación bancaria
2. Factura electrónica **No. FE 3**
3. RUT
4. Tarjeta contador y junta central de contadores
5. Certificación Desglose Factor multiplicador
6. Comprobantes pago de nomina
7. Certificado de aportes parafiscales (Incluido Rep. Legal)
8. Planilla de aportes parafiscales
9. Certificado pago transporte
10. Informe de ejecución
11. Bitácora

JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO
Representante legal.
Asociación colombiana para la defensa del medio ambiente- ACODEMA

EL SUSCRITO COORDINADOR DE LA OFICINA IBAGUÉ

FINANCIERA JURISCOOP S.A.
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
NIT. 900688066-3

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACO** identificado(a) con NIT 809010058, se encuentra en nuestra base de datos con el producto **Cuenta de ahorros No. 58500034693,** la cual se encuentra activa.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado(a), a los 05 días del mes de Septiembre del 2023.

NOTA: Los traslados de dinero deberán ser enviados a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, identificada ante CENIT y las entidades financieras de la siguiente manera:

a. Numero de ruta: **00001**
b. Numero de transito: **121**
c. Código de chequeo: **9**

Cordialmente,

FINANCIERA JURISCOOP
CODIGO 30018
OFICINA IBAGUÉ

ANDRES FELIPE FRANCO
Coordinador Oficina
Ibagué

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA
NIT 809.010.058-4
URB MILENIUM 1 AP 133 B
Tel: (608) 3144569724
Ibagué - Colombia
acodema23@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 3

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		
NIT	804.000.292-0	**Teléfono**	(608) 7238925 - Ext. 000
Dirección	CRA 12 N 9 06	**Ciudad**	San Gil - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2023, 09:10
Expedición	21/12/2023, 10:49
Vencimiento	11/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.01415-2023 CON OBJETO: REALIZAR LABORES DEADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL YCONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTION INTEGRAL DE LOSECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE RECARGA HIDRICA DEACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CAS, POR 52,67%	1.00	62,544,373.70

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y un millones ciento treinta y un mil ciento once pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 81,131,111.80

Observaciones:

Total Bruto	61,955,793.66
Administración 24.00%	14,869,390.48
Imprevistos 1.00%	619,557.94
Utilidad 5.00%	3,097,789.68
IVA 19%	588,580.04
Total a Pagar	81,131,111.80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060250134 aprobado en 20231119 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0210 Silvicultura y otras actividades forestales Tarifa
CUFE: 140b79922139a64707ea15b855eb7fc61dd96e651249fb389cd5ba52e860b95ef3b1ae8cbcfe08fb13de8e72dd5b572d

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14906810516

(415)7707212489984(8020) 000001490681051 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 9 0 1 0 0 5 8	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
URB MILENIUM 1 AP 133 B

42. Correo electrónico acodemaa@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 5 6 9 7 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 2 1 0	1 9 9 4 0 4 2 5	4 2 9 0	1 9 9 4 0 4 2 5	7 4 9 0	0 2 4 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 04 / 09 : 32: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ZARABANDA PERDOMO JOSE IGNACIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906810516

(415)7707212489984(8020) **000001490681051 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 9 0 1 0 0 5 8	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	0 4
72. Número	1 1	
73. Fecha	1 9 9 4 0 4 2 5	2 0 1 8 0 5 1 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 7 3 1	2 0 1 8 0 5 1 6
77. No. Matrícula mercantil	S 0 5 0 2 3 4 0	S 0 5 0 2 3 4 0
78. Departamento	7 3	7 3
79. Ciudad/Municipio	1 6	1 6
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 4 0 4 2 5	1 9 9 4 0 4 2 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 9 2 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906810516

(415)7707212489984(8020) **000001490681051 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 9 0 1 0 0 5 8	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 3 1 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 3 3 6 7 0 1 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ZARABANDA	PERDOMO	JOSE	IGNACIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906810516

(415)7707212489984(8020) **000001490681051 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 9 0 1 0 0 5 8	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	9 3 3 3 4 8 9 7		COLOMBIA 1 6 9	IGUARAN	IGUARAN	OSCAR					2 0 0 5 0 3 0 4	2 0 0 6 1 1 2 0
2	Cédula de Ciudada 1 3	6 5 7 8 2 4 4 6		COLOMBIA 1 6 9	GONZALEZ	MONTEALEGRE	YAMILE					2 0 0 5 0 3 0 4	2 0 0 6 1 1 2 0
3	Cédula de Ciudada 1 3	9 3 5 9 4 4 0 9		COLOMBIA 1 6 9	CAVIEDES	PARRA	FERNANDO					2 0 0 5 0 3 0 4	2 0 0 6 1 1 2 0
4	Cédula de Ciudadan 1 3	9 3 3 6 7 0 1 3		COLOMBIA 1 6 9	ZARABANDA	PERDOMO	JOSE	IGNACIO				2 0 0 6 1 1 2 0	2 0 1 3 0 3 1 1
5	Cédula de Ciudadan 1 3	2 8 8 4 5 8 8 4		COLOMBIA 1 6 9	LLANOS	MONROY	JUDIT					2 0 0 6 1 1 2 0	2 0 1 3 0 3 1 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906810516

(415)7707212489984(8020) **000001490681051 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 9 0 1 0 0 5 8	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 8 2 5 1 7 5 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ	BOHORQUEZ	BLANCA	NUBIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 1 1 2 0	2 0 1 3 0 3 1 1

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 8 6 7 5 0 8 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PERDOMO	ZARABANDA	MARIA	MELIDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 3 0 3 1 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 1 0 5 5 4 2 1 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZARABANDA	RIVERA	JOSE	IGNACIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 3 0 3 1 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 0 5 3 0 1 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZARABANDA	RIVERA	ANDRES	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 3 0 3 1 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906810516

(415)7707212489984(8020) **000001490681051 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 9 0 1 0 0 5 8	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento: ACODEMA.MAD

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: CR 8 CL 134 25 SEC LA CEIBA BRR EL SALADO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 7 1 5 6 3	2 0 1 6 0 9 2 6
168. Teléfono: 3 1 1 8 0 3 7 9 2 0	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

MEMORANDO SPL.1131.2023 - 07-12-2023 01:15

PARA: **MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MACIAS**
Contadora- CAS

DE: **ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

ASUNTO: **PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**

FECHA: 07 de diciembre de 2023

Cordial Saludo,

Comedidamente me remito a usted con el fin de informar que el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**, cuyo objeto es: "REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS", es conexo de contrato de obra.

Así mismo se informa que la ejecución del contrato según CLÁUSULA CUARTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución de las actividades objeto del presente proceso se ejecutarán en las Veredas El Resguardo del Municipio de Charalá, y Veredas Los Medios y Piedra de Rayo del Municipio de Valle de San José, municipios de la jurisdicción de la CAS.

MUNICIPIOS	%
CHARALÁ (Vereda El Resguardo)	11%
VALLE DE SAN JOSÉ (Vereda Los Medios y Piedra de Rayo)	89%


Sin otro particular,

ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS

Proyecto: Jorge Andrés Báez Gómez – Contratista SPL
Vto Bo. Inés Castro Ballesteros .

icontec ISO 14001 SA367-1
icontec ISO 45001 ST-CER944508
icontec ISO 9001 SC3264-1
icontec Norsok S WA-006
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9B43B0A46E3D52CC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADALBERTO POLANCO GUEVARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14215281 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 57289-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

San Gil, diciembre 11 de 2023

Señores
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
ASUNTO: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
REf: CAS-ACODEMA No. Contrato 01415-2023 – Acta Parcial No. 2

Respetados Señores:


En mi calidad de Representante Legal de la ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, Que la ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA, identificada con NIT No. 809010058-4, se encuentra al día y a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

De igual forma, respecto a contratos de prestación de servicios y en desarrollo de lo manifestado por el Ministerio de la Protección mediante conceptos Nos. 184946 del 29 de junio de 2010 y 10240-140240 del 19 de mayo de 2011, así como, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, la empresa ha verificado que su personal realiza los aportes integrales al sistema de seguridad social de forma anticipada.

Todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1393 de julio 12 de 2010.



JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO
C.C 93367013
REPRESENTANTE LEGAL ACODEMA
ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE – ACODEMA
Nit 809010058-4

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONCEPTO FINANCIERO Y CONTABLE

SPL.75.2023 - 26-12-2023 08:55

PARA: **ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS

DE: **INES CASTRO BALLESTEROS.**
Contadora Pública, Contratista CAS

ASUNTO: REVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 01415-2023**

FECHA: 26 de Diciembre de 2023

OBJETO: "**LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** efectúa la **"**REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS.**"**

icontec Norsok S-006 NK- 072-1
IQNet
icontec ISO 9001 3264-1SC
icontec OHSAS 18001 OS-CER168456
icontec ISO 14001 367-1SA

1. ANTECEDENTES

Entre los suscritos a saber: **ELIANA MAYORGA CASTRO**, mayor de edad y vecina de la ciudad de Bucaramanga, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.557.729 de Bucaramanga, quien mediante Resolución 000474 del 30 de Junio de 2023 es nombrada como Secretaria General de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER**, a quien mediante parágrafo 1 del artículo 5 del manual de contratación de la CAS resolución No. DGL No. 000693 del 04 de octubre de 2022, se le delegó la facultad de celebrar o perfeccionar todos los contratos y convenios cualquiera sea su régimen contractual aplicable y sus modificaciones, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **LA CORPORACION**; y por la otra **ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA NIT No. 809010058-4** representado legalmente por **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.367.013 expedida en Ibagué y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, quien manifiesta no encontrarse incurso en causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad, hemos decidido celebrar el presente CONTRATO teniendo en cuenta la normatividad antes descrita, previo a las siguientes consideraciones. A) Que la **CORPORACIÓN SANTANDER** realizó el procedimiento contractual establecido en la normatividad contractual vigente para la presente contratación. B) Que se publicó en el sistema electrónico de contratación pública todos los documentos del proceso contractual, en la oportunidad y por el término reglado por la Ley. C) Que la CORPORACIÓN de manera objetiva determinó que la propuesta de **ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA NIT No. 809010058-4,** se ajustó a las exigencias establecidas por la entidad en los pliegos de condiciones y en consideración a ello, le fue adjudicada la presente contratación en la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. D) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el presente contrato.

2. INSPECCIÓN DOCUMENTACIÓN

Se llevó a cabo la revisión a la documentación recibida por parte de la supervisión en la cual se evidencia lo siguiente

2.1. Este **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 01415-2023** fue iniciado con las siguientes características.

VALOR: **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66).**

icontec Norsok S-006 NK- 072-1
IQNet
icontec ISO 9001 3264-1SC
icontec OHSAS 18001 OS-CER168456
icontec ISO 14001 367-1SA

IMPUTACION PRESUPUESTAL.

Aporte de **LA CORPORACIÓN** cuenta con los recursos disponibles para esta contratación según Se cuenta con el certificado de disponibilidad No. 23-05952 del 1 de Junio de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato asciende a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66)**, valor que incluirá todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato, conforme a la propuesta ofertada, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	Vr. Unitario	Vr. Parcial
1.0	Establecimiento y revegetalización de las áreas estratégicas de recarga hídrica con plántulas*	Ha	13	$ 4.979.830,08	64.737.791,04
2.0	Cerramiento con suministro e instalación de cerca de 4 hilos	ML	1200	$ 31.309,44	37.571.328,00
3.0	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PARA RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA (COSECHA DE AGUA)**				
3.1	**PRELIMINARES**				
3.1.1	Localización y Replanteo	M2	12	3.738,24	44.858,88
3.1.2	Descapote del terreno	M2	12	7.729,92	92.759,04
3.1.3	Nivelación	M3	1,2	7.767,36	9.320,83
3.1.4	Desmonte de canal de aguas lluvias	ML	110	12.834,24	1.411.766,40
3.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
3.2.1	Excavación manual en material común	M3	2,67	$ 57.520,32	153.579,25
3.2.2	Relleno con material seleccionado	M3	0,57	$ 113.295,36	64.578,36
3.3	**ESTRUCTURA**				
3.3.1	Suministro e Instalación placa de piso Concreto 3000 PSI e = 10 cm	M2	12	111.926,40	1.343.116,80
3.4	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				
3.4.1	Suministro e Instalación tubería de 2"	ML	36	$ 21.115,20	760.147,20
3.4.2	Suministro e Instalación tanque 1000 lts (Incluye accesorios)	UND	3	$ 872.728,32	2.618.184,96
3.5	**CUBIERTA**				
3.5.1	Suministro e Instalación canal PVC de aguas lluvias	ML	110	$ 70.902,72	7.799.299,20
3.5.2	Suministro e Instalación bajante PVC de aguas lluvias	ML	18	$ 56.856,00	1.023.408,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**117.630.137,96**

ADMINISTRACIÓN	24%	28.231.233,11
IMPREVISTOS	1%	1.176.301,38
UTILIDAD	5%	5.881.506,90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U.		**35.289.041,39**
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	1.117.486,31
TOTAL COSTOS OBRA		**154.036.665,66**

2.2. CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: LA CORPORACION pagará al CONTRATISTA el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, POR ACTAS PARCIALES de conformidad con el porcentaje de avance de ejecución de acuerdo a las actividades ejecutadas conforme al alcance y especificaciones del objeto contractual y el valor del presupuesto, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes parciales presentados por el Contratista con soportes y evidencias de ejecución. El saldo del 10% se cancelará con posterioridad a la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la Supervisión con los soportes respectivos referidos para lo cual deberá presentar; (i) acta de recibo final de las obras. (ii) Archivo fotográfico de realización de los trabajos, (iii) acta de terminación del contrato y liquidación de mutuo acuerdo del mismo, y esta acta obtenga el visto bueno

del Supervisor de la obra y se encuentre debidamente firmada por el contratista, (iv) Que el contratista aporte la prueba del pago de nómina (salarios y prestaciones sociales), seguridad social y aportes parafiscales. (v) Que el Supervisor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción de la CAS. (vi) Que el contratista presente la factura de cobro respectiva.

ACTA DE INICIO

En el municipio de San Gil, a los veintiún (21) días de mes de septiembre de 2023, se reunieron el señor **JOSÉ IGNACIO ZARABANDA PERDOMO** como representante legal de ACODEMA identificado (a) con NIT 809010058-4, en calidad de contratista, y por otra parte ROCÍO AYALA MORENO - Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental - CAS en calidad de supervisora del **contrato de obra No. 01415-2023** para la firma de la presente acta de inicio.

CONSIDERANDO

1. Que el día **dieciocho (18) de septiembre de 2023**, se suscribió contrato de obra pública **No. 1415 de 2023**, entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** y **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA**, cuyo objeto es "REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS" por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66).**

2.Que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones de acuerdo con lo siguiente: - Póliza de cumplimiento No. 875 47 994000011250 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DECOLOMBIA, las cuales fueron aprobadas por la CAS el veinte (20) de Septiembre del 2023.

2.5 SUPERVISIÓN DE CONTRATO: La supervisión del contrato será ejercida por **ROCIO AYALA MORENO** subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental CAS.

VALOR ACTA A COBRAR

2.7 Se recibe, factura FE -3 por valor Ochenta y un millones ciento treinta y un mil ciento once pesos m/cte con ochenta cent. ($81.131. 111,80), Correspondiente a ACTA

PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.01415-2023 CON OBJETO: REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL YCONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTION INTEGRAL DE LOSECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE RECARGA HIDRICA DEACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CAS, POR 52,67%

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	%
VALOR CONTRATO	$154.036.665,66	100%
PAGADO ACTA 1	$49.199.311,01	31,94%
VALOR COBRANDO PRESENTE ACTA	$81.131.111,80	52,67%
SALDO PENDIENTE POR COBRAR	$23.706.242,85	15,39%

Se evidencia los siguientes documentos, como parte del informe para tramitar el pago del supervisora del **contrato de obra No. 01415-2023**

- contrato de obra No. 01415-2023
- Acta de inicio contrato de obra No. 01415-2023
- Oficio remisorio
- Certificación desglose factor multiplicador
- Planillas de seguridad social
- Certificado de parafiscales (fecha 11 diciembre de 2023)
- Documento del contador (tarjeta, certificado de antecedentes)
- Informe de ejecución
- Informe de supervisión e interventoría
- Bitácora de obra
- Certificaciones bancaria de Financiera Juriscop
- Acta de recibo Parcial N 02
- Factura FE -3
- Informe contable y Financiero
- Rut (2)
- Transporte N°2
- F-PCT-008 - Informe de Seguimiento Supervisión e Interventoría
- Memorando a tesorería
- Memorando contador

CONSIDERACIONES

Una vez realizada la inspección a la documentación del contrato, se considera que:

icontec Norsok S-006 NK- 072-1
IQNet
icontec ISO 9001 3264-1SC
icontec OHSAS 18001 OS-CER168456
icontec ISO 14001 367-1SA

La presente revisión se realizó basado en la documentación recibida y presentado por el Ing Jorge Andrés Báez Gómez Contratista apoyo a la supervisión y dirigido a la subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental – CAS **ROCIO AYALA MORENO** y supervisora del supervisora del **contrato de obra No. 01415-2023**con la ejecución y cumplimiento requerido del objeto supervisora del **contrato de obra No. 01415-2023** El informe presentado cumple en el aspecto financiero con los soportes necesarios, en los cuales no se confirma la veracidad de los mismos, por lo tanto, se presume la buena fe del contratista, capitulo IV art. 871 del Código de Comercio, Ley 80/93 art.23.

CONCEPTO CONTABLE, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Después de haber revisado la respectiva documentación para el trámite del pago del supervisora del **contrato de obra No. 01415-2023** , podemos decir que: El apoyo a la supervisión financiera se realiza confrontando la información y documentación presentada para el pago en el acta parcial N°02 correspondiente de supervisora del **contrato de obra No. 01415-2023** en referencia, cumple con la ejecución contable y financiera, presentado por ROCIO AYALA MORENO (Supervisora **LA CORPORACION**; y por la otra **ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA NIT No. 809010058-4** representado legalmente por **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.367.013 expedida en Ibagué y quien en adelante se denominará contratista, valor a cobrar Ochenta y un millones ciento treinta y un mil ciento once pesos m/cte con ochenta cent. ($81.131. 111,80), Correspondiente a ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.01415-2023 CON OBJETO: REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL YCONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE RECARGA HIDRICA DEACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CAS, POR 52,67%

Se concluye que la ejecución de supervisora del **contrato de obra No. 01415-2023- esta soportada** con factura FE -3 por valor Ochenta y un millones ciento treinta y un mil ciento once pesos m/cte con ochenta cent. ($81.131. 111,80).

El artículo 83 de la Constitución política “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirán en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Por lo anterior se concluye que el contratista) **LA CORPORACION**; y por la otra **ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA NIT No.**

809010058-4 representado legalmente por **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.367.013 expedida en Ibagué y quien en adelante se denominará contratista, Cumple con los requisitos y los soportes exigidos por la CAS, presentando certificación de los parafiscales que corresponden a planillas liquidadas y pagadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, Riesgos Laborales, dando cumplimiento a las normas consagradas en la Ley 100/93 y sus reglamentarios, Ley 789/02 art. 50 y la Ley 828 de 2003, el informe de seguimiento de supervisión da cumplimiento al objeto contratado y ejecución. Por lo tanto, se puede continuar con el proceso correspondiente pago.



INES CASTRO BALLESTEROS.
Contadora Publica
Apoyo contable y financiero
Subdirección de Planeación
Contratista- CAS

FACTURA 2 -DESGLOSE DEL A.I.U. 30%

OBJETO: REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMA ESTRATEGICOS DE RECARGA HIDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CAS

COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA (CD) =>	**$ 117.630.137,96**		**Salario Mínimo**	**$ 1.160.000,00**	
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**3,5**	**MESES**	**SMMLV =>**	**105,6**	
COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA - ACTA 1 (CD) =>	**$ 37.571.066,06**		**Salario Mínimo**	**$ 1.160.000,00**	Avance 31,94%
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**1,12**	**MESES**	**SMMLV =>**	**105,6**	
COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA - ACTA 2 (CD) =>	**$ 61.955.793,66**		**Salario Mínimo**	**$ 1.160.000,00**	Avance 52,67%
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**1,84**	**MESES**	**SMMLV =>**	**105,6**	

A. ADMINISTRACIÓN

1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

CANTIDAD	CARGO	CATEGORÍA	DEDICACIÓN MES	TOPE MÁXIMO SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	SALARIO MAS PRESTACIONES	EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2
A			B	C	D	E= A * B * C * D		
1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)								
1	DIRECTOR DE PROYECTO	1	30,00%	$ 3.281.557,44	1,749	$ 1.721.833,19	$ 1.924.345,74	$ 3.168.173,07
1	PROFESIONAL RESIDENTE	2	100,00%	$ 2.033.928,96	1,749	$ 3.557.341,75	$ 3.975.736,72	$ 6.545.508,82
1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO								
1	SECRETARIA		17,00%	$ 1.654.514,88	1,749	$ 491.936,91	$ 549.795,82	$ 905.163,91
					SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL	**$ 5.771.111,85**	**$ 6.449.878,28**	**$ 10.618.845,80**

2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES	AREA (M2)	DEDICACIÓN	DEDICACIÓN X AREA (M2)	COSTO ($/M2.MES)	VALOR ($)		
Arriendo of icina. Incluye admon, serv publicos, comunicaciones-Punto atención	20,00	10,00%	5	$ 19.200,00	$ 9.600,00	$ 10.729,10	$ 17.664,00
Campamentos. Incluye Serv. Públicos provisionales	20,00	10,00%	5	$ 14.400,00	$ 7.200,00	$ 8.046,82	$ 13.248,00
GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)					$ 48.960,00	$ 54.718,41	$ 90.086,40
1 VEHICULO MODELO 2015-2018 (1600-3000 CC)		4,00%	$	5.760.000,00	$ 230.400,00	$ 257.498,38	$ 423.936,00
				SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES	**$ 296.160,00**	**$ 330.992,71**	**$ 544.934,40**

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN	**$ 21.235.451,47**	**$ 6.780.870,99**	**$ 11.163.780,20**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN (PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO)	**18,05%**	**18,05%**	**18,05%**

3. IMPUESTOS Y GARANTIAS

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCION	IMPUESTO	VALOR ($)		
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL FONDO DE SEGURIDAD	5,00%	$ 5.880.537,98	$ 1.877.764,15	$ 3.091.482,83
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD	0,50%	$ 588.149,80	$ 187.807,07	$ 309.198,75
FIC	0,25%	$ 294.074,90	$ 93.903,53	$ 154.599,38
	SUBTOTAL IMPUESTOS	**$ 6.762.762,68**	**$ 2.159.474,75**	**$ 3.555.280,95**

3.2 GARANTÍAS

	DESCRIPCIÓN	VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR ($)		
G. UNICA	Cumplimiento	$ 23.525.991,94	20%	10	0,10%	$ 23.525,99	$ 7.512,28	$ 12.367,95
	Salarios y prestaciones	$ 23.525.991,94	20%	36	0,01%	$ 1.960,50	$ 626,02	$ 1.030,66
	Estabilidad y calidad de obra	$ 23.525.991,94	20%	60	0,40%	$ 94.103,97	$ 30.049,13	$ 49.471,80
R.C.E.	Precios, labores y operaciones	$ 222.720.000,00	100%	3,5	0,05%	$ 120.640,00	$ 38.522,58	$ 63.422,17
					SUBTOTAL GARANTIAS	**$ 240.230,46**	**$ 76.710,01**	**$ 126.292,58**


TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	**$ 7.002.993,14**	**$ 2.236.184,77**	**$ 3.681.573,54**
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**5,95%**	**5,95%**	**5,95%**

A. ADMINISTRACION (1 + 2)	**24,00%**	**$ 9.017.055,86**	**$ 14.869.390,48**
I. IMPREVISTOS	**1,00%**		
U. UTILIDAD	**5,00%**		

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) 30,00%

TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA PARCIAL No. 1		**$ 37.571.066,06**
ADMINISTRACION	24%	$ 9.017.055,86
IMPREVISTOS	1%	$ 375.710,66
UTILIDAD	5%	$ 1.878.553,30
TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U. ACTA PARCIAL No. 1		**$ 11.271.319,82**

TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA PARCIAL No. 2		**$ 61.955.793,66**
ADMINISTRACION	24%	$ 14.869.390,48
IMPREVISTOS	1%	$ 619.557,94
UTILIDAD	5%	$ 3.097.789,68
TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U. ACTA PARCIAL No. 2		**$ 18.586.738,10**



JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO
REP. LEGAL ACODEMA

COMPROBANTE DE PAGO DE NÓMINA

NIT: 809010058-4
acodema23@gmail.com
Cra 7 No. 68-22
GERENCIA DE TALENTO
Fecha/Hora Impresión: 08/12/2023 09:48 AM

Código:	1110581774 **Rg Empl:** 2	**Identificación:**	CC 1110581774
Nombre:	JENNIFER N. ZARABANDA LLANOS	**Tipo Salario:**	SALARIO BASICO
Periodo Pago:	octubre 26, 2023 - diciembre 11, 2023		
Cargo:	PROFESIONAL RESIDENTE	**Salario:**	$ 3.557.342
Dedicación:	100%	**Tipo Contrato:**	OBRA O LABOR
Fecha Ingreso:	2023-09-21		

DESCRIPCION	UNIDADES	ENTIDAD	VALOR
INGRESOS LABORALES Y OTROS INGRESOS			
SUELDO	46 Días		**$ 5.454.591**
EXTRA POR AVANCE DE OBRA			**$1.090.918**
		TOTAL INGRESOS LABORALES Y OTROS INGRESOS	**$ 6.545.509**
DESCUENTOS DE LEY			
APORTE OBLIGATORIO SALUD			**$261.820**
APORTE OBLIGATORIO PENSION			**$261.820**
		TOTAL DESCUENTOS DE LEY	**$523.640**
DESCUENTOS AUTORIZADOS			
			$0
		TOTAL DESCUENTOS AUTORIZADOS	**$0**
		COMPENSACION TOTAL (INGRESOS + BENEFICIOS)	**$ 6.545.509**
		TOTAL DEDUCCIONES	**$523.640**
		NETO PAGADO	**$6.021.869**

EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN MOTIVO DE RECLAMO EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, FAVOR FORMULARLO A GERENCIA DE TALENTO DURANTE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES AL PAGO DE LO CONTRARIO, ENTENDEREMOS SU ACEPTACIÓN.

RECIBIDO: Nathalia Zarabanda.

COMPROBANTE DE PAGO DE NÓMINA

NIT: 809010058-4
acodema23@gmail.com
Cra 7 No. 68-22
GERENCIA DE TALENTO
Fecha/Hora Impresión: 08/12/2023 09:54 AM

Código:	28845884 **Rg Empl:** 2	**Identificación:**	CC 28845884
Nombre:	JUDITH LLANOS MONROY	**Tipo Salario:**	SALARIO BASICO
Periodo Pago:	octubre 26, 2023 - diciembre 11, 2023		
Cargo:	SECRETARIA	**Salario:**	$ 491.937
Dedicación:	17%	**Tipo Contrato:**	OBRA O LABOR
Fecha Ingreso:	2023-09-21		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	ENTIDAD	VALOR
INGRESOS LABORALES Y OTROS INGRESOS			
SUELDO	46 Días		**$ 754.303**
EXTRA POR AVANCE DE OBRA			**$150.861**
		TOTAL INGRESOS LABORALES Y OTROS INGRESOS	**$ 905.164**
DESCUENTOS DE LEY			
APORTE OBLIGATORIO SALUD			**$36.207**
APORTE OBLIGATORIO PENSION			**$36.207**
		TOTAL DESCUENTOS DE LEY	**$72.414**
DESCUENTOS AUTORIZADOS			
			$0
		TOTAL DESCUENTOS AUTORIZADOS	**$0**
		COMPENSACION TOTAL (INGRESOS + BENEFICIOS)	**$ 905.164**
		TOTAL DEDUCCIONES	**$72.414**
		NETO PAGADO	**$832.750**

EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN MOTIVO DE RECLAMO EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, FAVOR FORMULARLO A GERENCIA DE TALENTO DURANTE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES AL PAGO DE LO CONTRARIO, ENTENDEREMOS SU ACEPTACIÓN.

RECIBIDO: _____

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809010058	4	ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ACODEMA	milenium 1 apto 133b	IBAGUE-TOLIMA	3219855686	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	325692385	9460180163	E	2023/12/15	2023/12/11	BANCOLOMBIA	0	$2,834,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1101048087	GOMEZ VASQUEZ HENRY	230301	8	$309,334	$49,500	ESSC24	8	$309,334	$38,700	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$7,600	8	$309,334	$15,500
2	CC	28845884	LLANOS MONROY JUDITH	230301	6	$578,750	$92,600	EPS002	6	$578,750	$72,400	CCF50	6	$578,750	$23,200	14-23	6	$578,750	$14,100	6	$578,750	$29,000
3	CC	13703436	RANGEL TRIANA CAMILO	230301	8	$309,334	$49,500	EPS042	8	$309,334	$38,700	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$7,600	8	$309,334	$15,500
4	CC	1101048367	SALAZAR AMAYA REYNELL	230301	8	$309,334	$49,500	ESSC24	8	$309,334	$38,700	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$7,600	8	$309,334	$15,500
5	CC	1098406559	TRIANA NIÑO JOSE DANIEL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$38,700	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$7,600	8	$309,334	$15,500
6	CC	1110581774	ZARABANDA LLANOS JENNIFER NATHALIA	230301	30	$3,557,341	$569,200	EPS002	30	$3,557,341	$444,700	CCF50	30	$3,557,341	$142,300	14-23	30	$3,557,341	$86,700	30	$3,557,341	$178,000
7	CC	93367013	ZARABANDA PERDOMO JOSE IGNACIO	230201	30	$1,721,833	$275,500	EPS041	30	$1,721,833	$215,300	CCF50	30	$1,721,833	$68,900	14-23	30	$1,721,833	$42,000	30	$1,721,833	$86,200
Total			**Afiliados(7)**			**$7,095,260**	**$1,135,300**			**$7,095,260**	**$887,200**			**$7,095,260**	**$284,000**			**$7,095,260**	**$173,200**		**$7,095,260**	**$355,200**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,135,300	$0	$0	$1,135,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$859,800	$0	$0	$859,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$275,500	$0	$0	$275,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$173,200	$0	$0	$173,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$173,200	$0	$0	$173,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$284,000	$0	$0	$284,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	$284,000	$0	$0	$284,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$887,200	$0	$0	$887,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$38,700	$0	$0	$38,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$77,400	$0	$0	$77,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$254,000	$0	$0	$254,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$517,100	$0	$0	$517,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$213,100	$0	$0	$213,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$213,100	$0	$0	$213,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$142,100	$0	$0	$142,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$142,100	$0	$0	$142,100
TOTAL				**7**	**$2,834,900**	**$0**	**$0**	**$2,834,900**

2023/12/08 08:19 AM

COMPROBANTE DE PAGO DE NÓMINA

NIT: 809010058-4
acodema23@gmail.com
Cra 7 No. 68-22
GERENCIA DE TALENTO
Fecha/Hora Impresión: 08/12/2023 09:37 AM

Código:	93367013 **Rg Empl:** 1	**Identificación:**	CC 93367013
Nombre:	JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO	**Tipo Salario:**	SALARIO BASICO
Periodo Pago:	octubre 26, 2023 - diciembre 11, 2023		
Cargo:	DIRECTOR DE PROYECTO	**Salario:**	$ 1.721.833
Dedicación:	30%	**Tipo Contrato:**	OBRA O LABOR
Fecha Ingreso:	2023-09-21		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	ENTIDAD	VALOR
INGRESOS LABORALES Y OTROS INGRESOS			
SUELDO	46 Días		**$ 2.640.144**
EXTRA POR AVANCE DE OBRA			**$528.029**
		TOTAL INGRESOS LABORALES Y OTROS INGRESOS	**$ 3.168.173**
DESCUENTOS DE LEY			
APORTE OBLIGATORIO SALUD			**$126.727**
APORTE OBLIGATORIO PENSION			**$126.727**
		TOTAL DESCUENTOS DE LEY	**$253.454**
DESCUENTOS AUTORIZADOS			
			$0
		TOTAL DESCUENTOS AUTORIZADOS	**$0**
		COMPENSACION TOTAL (INGRESOS + BENEFICIOS)	**$ 3.168.173**
		TOTAL DEDUCCIONES	**$253.454**
		NETO PAGADO	**$2.914.719**

EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN MOTIVO DE RECLAMO EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, FAVOR FORMULARLO A GERENCIA DE TALENTO DURANTE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES AL PAGO DE LO CONTRARIO, ENTENDEREMOS SU ACEPTACIÓN.

RECIBIDO: _____

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809010058	4	ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ACODEMA	milenium 1 apto 133b	IBAGUE-TOLIMA	3219855686	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	325692385	9460180163	E	2023/12/15	2023/12/11	BANCOLOMBIA	0	$2,834,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1101048087	GOMEZ VASQUEZ HENRY	230301	8	$309,334	$49,500	ESSC24	8	$309,334	$38,700	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$7,600	8	$309,334	$15,500
2	CC	28845884	LLANOS MONROY JUDITH	230301	6	$578,750	$92,600	EPS002	6	$578,750	$72,400	CCF50	6	$578,750	$23,200	14-23	6	$578,750	$14,100	6	$578,750	$29,000
3	CC	13703436	RANGEL TRIANA CAMILO	230301	8	$309,334	$49,500	EPS042	8	$309,334	$38,700	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$7,600	8	$309,334	$15,500
4	CC	1101048367	SALAZAR AMAYA REYNELL	230301	8	$309,334	$49,500	ESSC24	8	$309,334	$38,700	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$7,600	8	$309,334	$15,500
5	CC	1098406559	TRIANA NIÑO JOSE DANIEL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$38,700	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$7,600	8	$309,334	$15,500
6	CC	1110581774	ZARABANDA LLANOS JENNIFER NATHALIA	230301	30	$3,557,341	$569,200	EPS002	30	$3,557,341	$444,700	CCF50	30	$3,557,341	$142,300	14-23	30	$3,557,341	$86,700	30	$3,557,341	$178,000
7	CC	93367013	ZARABANDA PERDOMO JOSE IGNACIO	230201	30	$1,721,833	$275,500	EPS041	30	$1,721,833	$215,300	CCF50	30	$1,721,833	$68,900	14-23	30	$1,721,833	$42,000	30	$1,721,833	$86,200
Total			**Afiliados(7)**			**$7,095,260**	**$1,135,300**			**$7,095,260**	**$887,200**			**$7,095,260**	**$284,000**			**$7,095,260**	**$173,200**		**$7,095,260**	**$355,200**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,135,300	$0	$0	$1,135,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$859,800	$0	$0	$859,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$275,500	$0	$0	$275,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$173,200	$0	$0	$173,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$173,200	$0	$0	$173,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$284,000	$0	$0	$284,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	$284,000	$0	$0	$284,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$887,200	$0	$0	$887,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$38,700	$0	$0	$38,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$77,400	$0	$0	$77,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$254,000	$0	$0	$254,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$517,100	$0	$0	$517,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$213,100	$0	$0	$213,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$213,100	$0	$0	$213,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$142,100	$0	$0	$142,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$142,100	$0	$0	$142,100
TOTAL				**7**	**$2,834,900**	**$0**	**$0**	**$2,834,900**

2023/12/08 08:19 AM

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 01415-2023

11 DE DICIEMBRE 2023

OBJETO:	REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS.
FECHA DEL CONTRATO	18 de septiembre de 2023
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS -
NIT	804000292-0
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE ACODEMA, representada legalmente por JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.367.013 expedida en Ibagué
CEDULA DE CIUDADANIA o NIT:	809010058-4
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66)
SUPERVISOR:	ROCIO AYALA MORENO
CARGO:	Subdirectora de Planeación y ordenamiento Ambiental - CAS
PLAZO:	Tres (3) meses y quince (15) días calendario
FECHA DE INICIO:	21 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2023 Sin exceder la vigencia 2023
% AVANCE ACTA PARCIAL No 2:	52,67%
% AVANCE GENERAL:	84,61%

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

1. ESTABLECIMIENTO Y REVEGETALIZACIÓN DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DE RECARGA HÍDRICA CON PLÁNTULAS.

Esta actividad incluye el establecimiento y revegetalización de 13 Has en las áreas estratégicas de recarga hídrica con plántulas, para lo cual se tienen en cuenta tres labores: Inicialmente la selección de las áreas, posterior la preparación del terreno, y por último la siembra de las plantas.

Las plantas se siembran en las áreas forestales protectoras de recarga hídrica de las veredas El Resguardo - Charalá, Los Medios - Valle de San José y Piedra de Rayo - Valle de San José; donde se tienen en cuenta nacimientos, aljibes y áreas de importancia para la comunidad beneficiaria de los acueductos rurales, identificadas mediante socialización con la comunidad.

Adicional a la selección participativa de las áreas a intervenir llevada a cabo mediante el dialogo con los representantes de la comunidad de los acueductos veredales beneficiarios, para la elección de las áreas a reforestar se tienen en cuenta los predios aislados en la primera etapa del proyecto, con el fin garantizar la protección de la nueva cobertura vegetal plantada y así contribuir a la restauración y recuperación natural del área.



Ilustración 1. Socialización de selección de áreas comunidad acueductos el Resguardo – Charalá

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 2. Socialización de selección de áreas comunidad acueductos el Resguardo – Charalá



Ilustración 3. Socialización de selección de áreas comunidad acueductos Los Medios y Piedra de Rayo – Valle de San José

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 4. Socialización de selección de áreas comunidad acueductos Los Medios y Piedra de Rayo – Valle de San José

CONDICIONES TECNICAS:

- Preparación del terreno: consistente en la rocería, donde se eliminan las arvenses que puedan generar competencia para la planta nueva; la segunda actividad consiste en el uso de correctivos incorporados los cuales fueron aplicados 30 días antes de la siembra y de la aplicación de fertilizantes a los árboles. Como correctivo se emplea cal dolomítica a razón de 200 gr/plántula.

- Establecimiento de la plantación o siembra de árboles: desarrollada mediante el transporte de las plántulas, trazado, plateo y ahoyado, material vegetal y plantación.

-Transporte. Las plántulas y los insumos son transportados al lugar de cada plantación con los cuidados necesarios, evitando el deterioro de las mismas.

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

-Trazado. El trazado se realizará en triangulo, de acuerdo a las condiciones topográficas del terreno, permitiendo una densidad de siembra de 550 árboles por hectárea de restauración.

-Plateo y Ahoyado. Plateo con 80 centímetros de diámetro, mediante el cual se eliminan las arvenses que estén en el plato del árbol; por otra parte, el ahoyado cuenta con las siguientes dimensiones: Ancho de la boca: 30x30 centímetros, Profundidad: 40 centímetros.

-Plantación. Para la siembra se incorpora tierra fértil y la mezcla homogénea de los siguientes insumos: 70 gramos de fertilizante Triple 15/planta, 20 gr/planta de elementos menores (Agrimins) y 5 gr de hidroretenedor en el momento de la siembra. El hidroretenedor es mezclado homogéneamente con el suelo y dispuesto bajo superficie en la zona de desarrollo de las raíces de los árboles.

Para la siembra de las plántulas se emplean plántulas de especies nativas que cuentan con características propicias para la adaptación a las condiciones edafológicas y ambientales de los predios

MATERIALES

Las plántulas empleadas para el establecimiento son adquiridas en viveros de reconocida idoneidad, las cuales garantizan el crecimiento y la calidad sanitaria de las plántulas sembradas en el proyecto.

- Material Vegetal: Las plántulas sembradas cuentan con tamaño superior a 30 cm. Adicionalmente dichas plántulas cuentan con certificación ICA del vivero donde se adquirieron, vivero vegas del fonce y vivero el Paraíso. Las especies forestales establecidas en las áreas forestales protectoras son de tipo forestales nativas, entre las cuales se sembraron las siguientes:

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	RANGO ALTITUDINAL
Aro o nacedero	Trichantera gigantea	0-1.5000 msnm
Cedro	Cedrela odorata	0-1.000 msnm
Chachafruto	Erythrina edulis	1.000-2.600 msnm
Guayacán de Manizales	Lafoensia speciosa	1.300-2.900 msnm
Guayacán amarillo	Handroanthus chrysanthus	1.300-2.900 msnm
Guayacán rosado	Tabebuia rosea	0-1.800 msnm
Gualanday	Jacaranda mimosifolia	0-1.000 msnm
Nauno	Pseudosamanea Guachapele	0-1.5000 msnm
Chicala	Tecoma stans	0-2.8000 msnm

Tabla 1. Especies Sembradas

AVANCE DE OBRA

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE

Vereda: PIEDRA DE RAYO: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100%

1- Selección de las áreas.
   Se lleva a cabo la selección del área teniendo en cuenta el área aislada para garantizar la protección de la nueva cobertura.
2- Preparación del terreno.
   -Se realiza la rocería en el terreno
   - Se aplica cal dolomítica (200 gr/sitio).
3- Trazado.
   550 árboles por hectárea de restauración
4- Plateo y Ahoyado.
5- Plantación: 2398 árboles, correspondientes a 4,36 hectáreas con una distancia entre plántulas de aproximadamente 4,2m.
   Se incorpora mezcla homogénea de fertilizante Triple 15 (70 gramos /planta), Agrimins (20 gr/planta), y 5 gr de hidroretenedor en el momento de la siembra.

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

ESPECIE SEMBRADA	NOMBRE CIENTÍFICO	CANTIDAD SEMBRADA
Aro o nacedero	Trichantera gigantea	300
Cedro	Cedrela odorata	198
Guayacán de Manizales	Lafoensia speciosa	500
Guayacán rosado	Tabebuia rosea	300
Gualanday	Jacaranda mimosifolia	200
Nauno	Pseudosamanea Guachapele	900
TOTAL		**2398**

Tabla 2. Especies y distribución de plántulas sembradas Valle de san José – Piedra de rayo



Ilustración 5. Preparación del terreno, plateo y ahoyado Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo



Ilustración 6. Preparación del terreno, plateo y ahoyado Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 7. Preparación del terreno, plateo y ahoyado Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo



Ilustración 8. Cargue de plántulas Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo



Ilustración 9. Cargue de plántulas Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo



Ilustración 10. Descargue de plántulas área nueva cobertura. Valle de san José – Piedra de rayo

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 11. Insumos Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo



Ilustración 12. Material vegetal Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo



Ilustración 13. Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo



Ilustración 14. Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo



Ilustración 15. Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo



Ilustración 16. Siembra. Valle de san José – Piedra de rayo

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE

Vereda: LOS MEDIOS PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%

Predio el Portal; Acueducto: EL CUEVON

1- Selección de las áreas.
   Se lleva a cabo la selección del área teniendo en cuenta el área aislada para garantizar la protección de la nueva cobertura.
2- Preparación del terreno.
   -Se realiza la rocería en el terreno
   - Se aplica cal dolomítica (200 gr/sitio).
3- Trazado.
   550 árboles por hectárea de restauración
4- Plateo y Ahoyado.
5- Plantación: 4351 árboles, correspondientes a 7,91 hectáreas con una distancia entre plántulas de aproximadamente 4,2m.

Se incorpora mezcla homogénea de fertilizante Triple 15 (70 gramos /planta), Agrimins (20 gr/planta), y 5 gr de hidroretenedor en el momento de la siembra.

ESPECIE SEMBRADA	NOMBRE CIENTÍFICO	CANTIDAD SEMBRADA
Aro o nacedero	Trichantera gigantea	851
Chachafruto	Erythrina edulis	200
Guayacán de Manizales	Lafoensia speciosa	200
Guayacán rosado	Tabebuia rosea	200
Guayacán amarillo	Handroanthus chrysanthus	200
Chicala	Tecoma stans	1200
Nauno	Pseudosamanea Guachapele	1500
TOTAL		**4351**

Tabla 3. Especies y distribución de plántulas sembradas Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 17. Preparación del terreno, plateo y ahoyado Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 18. Preparación del terreno, plateo y ahoyado Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 19. Preparación del terreno, plateo y ahoyado Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 20. Preparación del terreno, plateo y ahoyado Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 21. Distanciamiento Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 22. Distanciamiento Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios

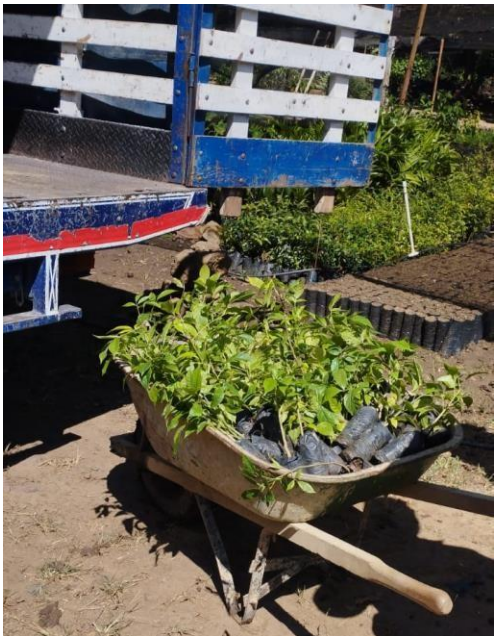


Ilustración 23. Material Vegetal Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 24. Material Vegetal Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 25. Material Vegetal Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 26. Material Vegetal Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 27. Insumos Siembra. Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 28. Siembra. Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 29. Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios



Ilustración 30. Siembra Valle de san José – El Cuevon, Los Medios

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

MUNICIPIO CHARALA

Vereda: RESGUARDO PORCENTAJE DE EJECUCION 100%

Acueducto: LA CASONA

1- Selección de las áreas.
   Se lleva a cabo la selección del área teniendo en cuenta el área aislada para garantizar la protección de la nueva cobertura.
2- Preparación del terreno.
   -Se realiza la rocería en el terreno
   - Se aplica cal dolomítica (200 gr/sitio).
3- Trazado.
   550 árboles por hectárea de restauración
4- Plateo y Ahoyado.
5- Plantación: 203 árboles, correspondientes a 0,37 hectáreas con una distancia entre plántulas de aproximadamente 4,2m.
   Se incorpora mezcla homogénea de fertilizante Triple 15 (70 gramos /planta), Agrimins (20 gr/planta), y 5 gr de hidroretenedor en el momento de la siembra.

ESPECIE SEMBRADA	NOMBRE CIENTÍFICO	CANTIDAD SEMBRADA
Aro o nacedero	Trichantera gigantea	35
Chicala	Tecoma stans	100
Nauno	Pseudosamanea Guachapele	68
TOTAL		**203**

Tabla 4. Especies y distribución de plántulas sembradas La Casona. Charalá, El Resguardo.



Ilustración 31. Material Vegetal Siembra La Casona. Charalá, El Resguardo.



Ilustración 32. Transporte de material vegetal La Casona. Charalá, El Resguardo



Ilustración 33. Siembra La Casona. Charalá, El Resguardo

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 34. Siembra La Casona. Charalá, El Resguardo



Ilustración 35. Siembra La Casona. Charalá, El Resguardo



Ilustración 36. Siembra La Casona. Charalá, El Resguardo



Ilustración 37. Siembra La Casona. Charalá, El Resguardo

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

MUNICIPIO CHARALA

Vereda: RESGUARDO. PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%

Acueducto: LOS CINCHOS

1- Selección de las áreas.
   Se lleva a cabo la selección del área teniendo en cuenta el área aislada para garantizar la protección de la nueva cobertura.
2- Preparación del terreno.
   -Se realiza la rocería en el terreno
   - Se aplica cal dolomítica (200 gr/sitio).
3- Trazado.
   550 árboles por hectárea de restauración
4- Plateo y Ahoyado.
5- Plantación: 198 árboles sembrados correspondientes a 0,36 hectáreas con una distancia entre plántulas de aproximadamente 4,2m.

ESPECIE SEMBRADA	NOMBRE CIENTÍFICO	CANTIDAD SEMBRADA
Aro o nacedero	Trichantera gigantea	40
Guayacán amarillo	Handroanthus chrysanthus	100
Nauno	Pseudosamanea Guachapele	58
TOTAL		**198**

Tabla 5. Especies y distribución de plántulas sembradas Los Cinchos. Charalá, El Resguardo..

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

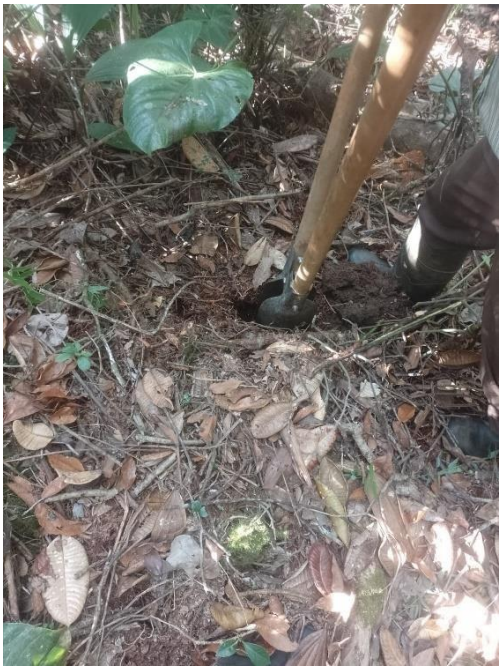


Ilustración 38. Siembra Los Cinchos. Charalá, El Resguardo.



Ilustración 39. Siembra Los Cinchos. Charalá, El Resguardo.



Ilustración 40. Material Vegetal Los Cinchos. Charalá, El Resguardo.



Ilustración 41. Material Vegetal Los Cinchos. Charalá, El Resguardo

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 42. Material Vegetal Los Cinchos. Charalá, El Resguardo



Ilustración 43. Siembra Los Cinchos. Charalá, El Resguardo.



Ilustración 44. Siembra Los Cinchos. Charalá, El Resguardo

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 45. Siembra Los Cinchos. Charalá, El Resguardo



Ilustración 46. Siembra Los Cinchos. Charalá, El Resguardo



Ilustración 47. Siembra Los Cinchos. Charalá, El Resguardo.



Ilustración 48. Siembra Los Cinchos. Charalá, El Resguardo

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1- Se recomienda la ampliación de la cobertura para el establecimiento de especies protectoras a nuevos nacimientos de agua identificados por las comunidades que beneficiaran a los acueductos veredales.
2- Se recomienda llevar a cabo 3 mantenimientos periódicos, a los 3, 6 y 9 meses correspondientemente, que contemplen: limpia, plateo, fertilización, replante y control fitosanitario.
3- Se recomienda una evaluación de las áreas susceptibles a compra por parte de la CAS para la protección de los nacimientos de agua, y proyectar y planificar la adquisición de dichos predios.
4- Se recomienda continuar con las labores de educación ambiental para las comunidades e instituciones educativas de la región.

GEORREFERENCIACIÓN AREAS ESTABLECIMIENTO Y REVEGETALIZACIÓN

MUNICIPIO	VEREDA	COORDENADAS					Ha	ARBOLES
		PUNTO 1	PUNTO 2	PUNTO 3	PUNTO 4	PUNTO 5		
VALLE DE SAN JOSE	PIEDRA DE RAYO	6°26'38"N 73°07'50"W	6°26'30"N 73°07'55"W	6°26'23"N 73°07'57"W	6°26'21"N 73°07'54"W	6°26'33"N 73°07'50"W	4,36	2398
	LOS MEDIOS - EL CUEVON	6°24'09"N 73°06'52"W	6°24'04"N 73°06'50"W	6°23'53"N 73°06'44"W	6°24'00"N 73°06'38"W	6°24'02"N 73°06'41"W	7,91	4351
CHARALA	EL RESGUARDO - LA CASONA	6°15'24"N 73°07'27"W	6°15'23"N 73°07'29"W	6°15'22"N 73°07'28"W	6°15'23"N 73°07'26"W	6°15'24"N 73°07'26"W	0,37	206
	EL RESGUARDO - LOS CINCHOS	6°15'19"N 73°07'20"W	6°15'20"N 73°07'21"W	6°15'18"N 73°07'22"W	6°15'17"N 73°07'22"W	6°15'18"N 73°07'21"W	0,36	198

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

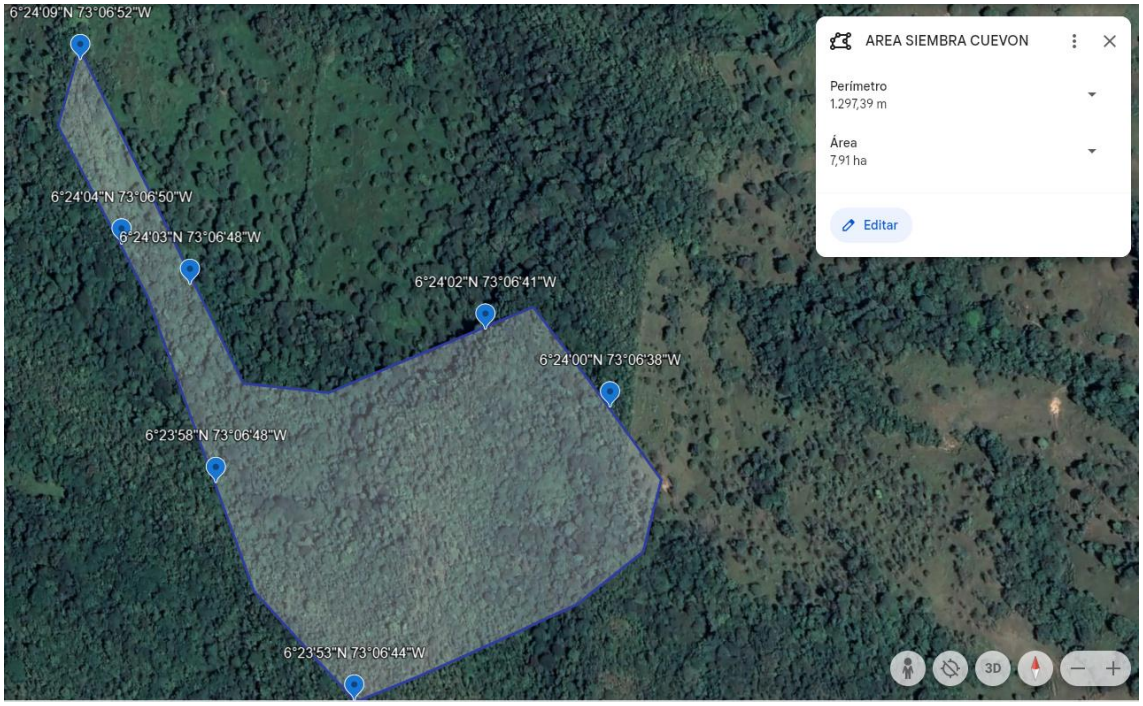


Ilustración 49. Área de siembra acueducto El Cuevon - Valle de San José

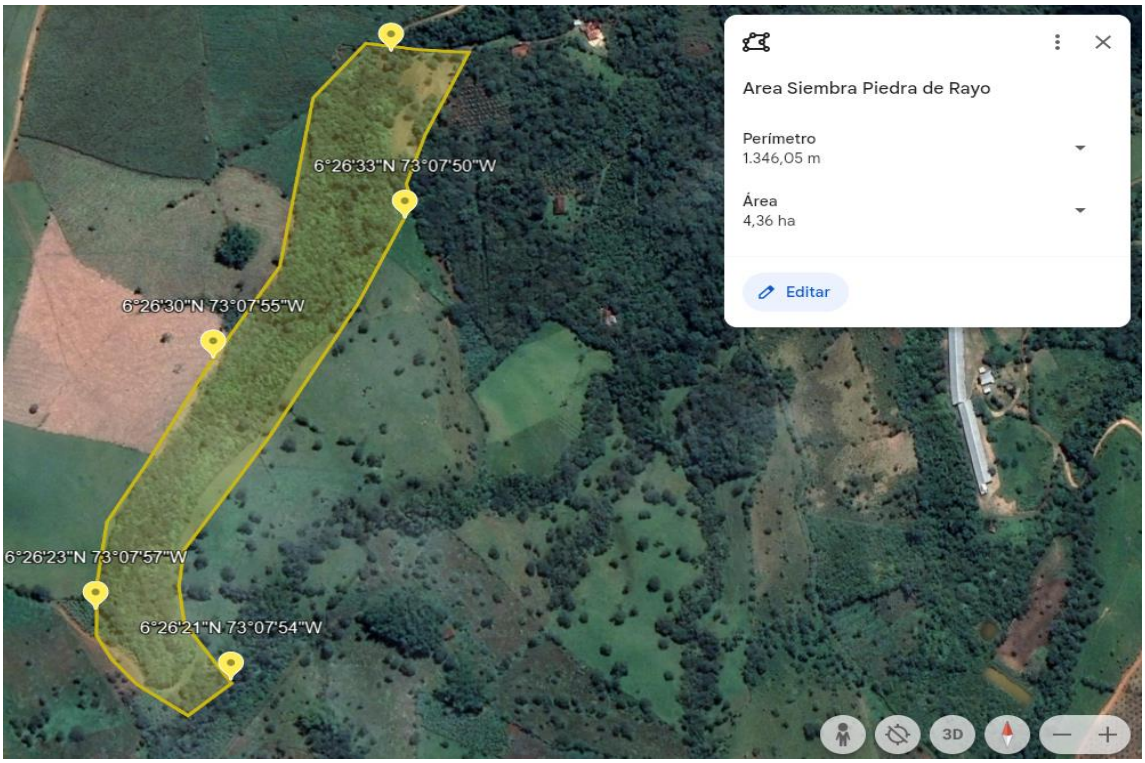


Ilustración 50. Área de siembra acueducto Piedra de Rayo - Valle de San José

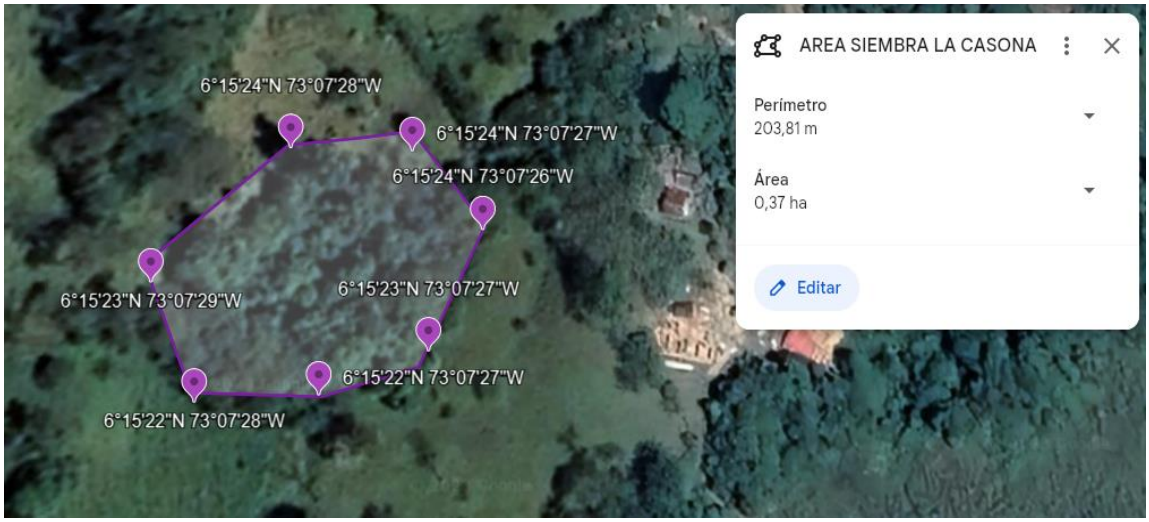


Ilustración 51. Área de siembra acueducto La Casona – Charalá

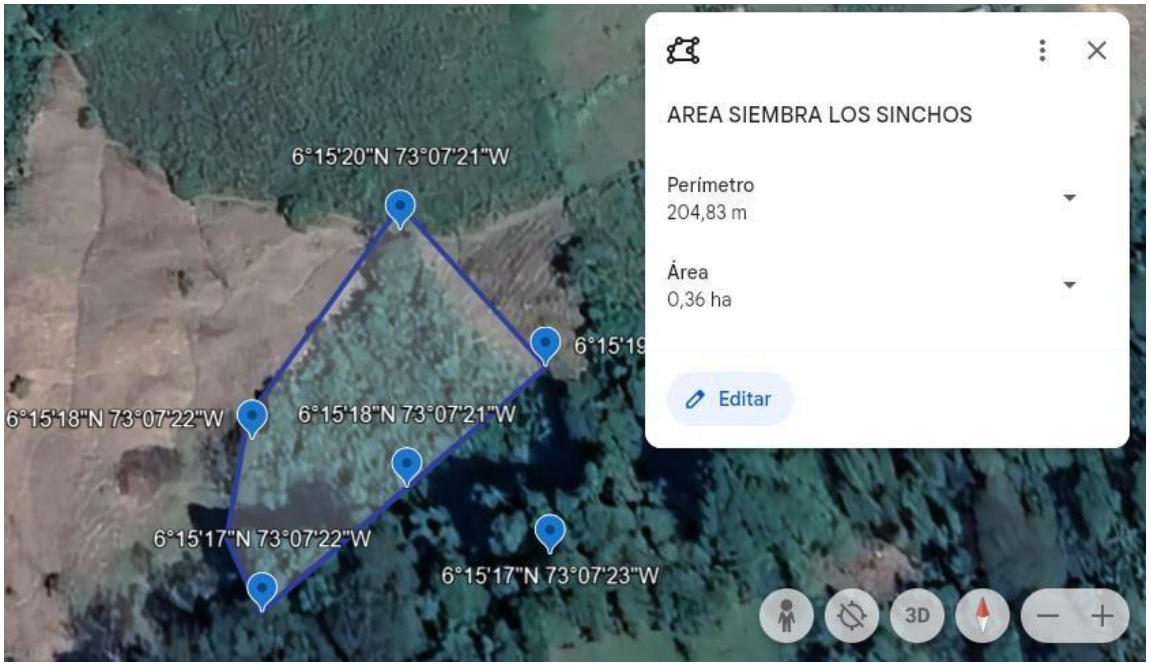


Ilustración 52. Área de siembra acueducto Los Cinchos - Charalá

2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PARA RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA (COSECHA DE AGUA).

La actividad de instalación de los sistemas de captación de aguas lluvias se plantea en una institución educativa de cada una de las tres (3) veredas intervenidas, escuelas identificadas previamente por la Junta de Acueducto en visita de campo.

CONDICIONES TECNICAS:

La instalación consta de canales para la recolección de aguas lluvias y sistemas de conducción hacia los tanques de almacenamiento. Para su ejecución se contemplan las labores:

- Localización y Replanteo del sitio donde se instala la tubería de conducción de aguas lluvias y el tanque de almacenamiento.
- Descapote del terreno del sitio donde se instala el tanque de almacenamiento.
- Nivelación del terreno del sitio donde se instala el tanque de almacenamiento.
- Desmonte de los canales de aguas lluvias existentes en las cubiertas de las instituciones educativas.
- Excavación manual en material común de las zanjas para instalación de tubería y sitio para el tanque de almacenamiento.
- Relleno con material seleccionado de las zanjas para instalación de tubería y nivelación para placa.
- Suministro e Instalación placa de piso Concreto 3000 PSI e = 10 cm para instalar el tanque.
- Suministro e Instalación tubería de 2" para conducir aguas lluvias de los canales al tanque.
- Suministro e instalación de los canales de aguas lluvias en las cubiertas de las instituciones educativas.
- Suministro e instalación de los bajantes de aguas lluvias.
- Suministro e instalación de tanques plásticos de almacenamiento de agua.

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

- ✓ **CANAL 1.**

MUNICIPIO **CHARALA**

Vereda: RESGUARDO.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RESGUARDO SEDE PRIMARIA

PORCENTAJE DE EJECUCION: 55%

- Localización y replanteo:
  Se selecciona la institución educativa El Resguardo – Sede Primaria para intervenir con la instalación de las canales y su respectivo sistema de conducción; así como la ubicación del tanque, el cual se ubica entre dos de los módulos de aulas a la altura necesaria para su correcto funcionamiento y aprovechamiento.
- Descapote y nivelación:
  Se lleva a cabo el descapote del sitio donde se instala el tanque de almacenamiento, así como la nivelación del terreno para garantizar la estabilidad de la placa y las condiciones idóneas para la instalación del tanque de almacenamiento.
- Excavación manual en material común:
  Dadas las condiciones del terreno, la distribución de las aulas y la presencia de cunetas de desagüe, no se hace necesarias las zanjas para instalación de tubería de desagüe; Se realiza excavación para fundida de placa de piso del tanque.
- Relleno con material seleccionado:
  Se realiza relleno en la zona de la placa para llevar a cabo la nivelación del terreno donde reposa el tanque de almacenamiento del sistema.
- Suministro e Instalación placa de piso Concreto:
  Se funde placa de piso según especificación técnica de 2m x 2m con 0,10m de espesor en concreto de 3000 PSI con refuerzo en malla electrosoldada 5 mm.
- Suministro e instalación de los canales de aguas lluvias:
  Se instalan las canales en PVC con sus respectivos accesorios, tales como soportes, uniones, tapas externas y adaptadores; son instaladas en las cubiertas de dos módulos de aulas de la institución educativa en 4 tramos, dadas las cubiertas a dos aguas de cada módulo.

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 49. Módulo de aulas 1 para canales de recolección de aguas lluvias I.E. El Resguardo – Sede Primaria.



Ilustración 50. Módulo de aulas 2 para canales de recolección de aguas lluvias I.E. El Resguardo – Sede Primaria.

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 51. Cunetas de desagüe existentes en la I.E. El Resguardo – Sede Primaria



Ilustración 52. Excavación y relleno placa de piso I.E. El Resguardo – Sede Primaria



Ilustración 53. Dimensiones y refuerzo de placa de piso para tanque de almacenamiento I.E. El Resguardo – Sede Primaria

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 54. Fundida placa de piso para tanque de almacenamiento I.E. El Resguardo – Sede Primaria



Ilustración 55. Relleno placa de piso para tanque de almacenamiento I.E. El Resguardo – Sede Primaria

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 56. Refuerzo placa de piso para tanque de almacenamiento I.E. El Resguardo – Sede Primaria



Ilustración 57. Placa de piso para tanque de almacenamiento I.E. El Resguardo – Sede Primaria

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 58.Canales PVC de aguas lluvias I.E. El Resguardo – Sede Primaria



Ilustración 59. . Canales PVC de aguas lluvias I.E. El Resguardo – Sede Primaria



Ilustración 60.Canales PVC de aguas lluvias I.E. El Resguardo – Sede Primaria

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

- ✓ **CANAL 2.**

MUNICIPIO **VALLE DE SAN JOSE**

Vereda: LOS MEDIOS.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL MORRO SEDE LOS MEDIOS

PORCENTAJE DE EJECUCION: 45%

- Localización y replanteo:
  Se selecciona la institución educativa El Morro - Sede Los Medios para intervenir con la instalación de las canales y su respectivo sistema de conducción; así como la ubicación del tanque, a la altura necesaria para su correcto funcionamiento y aprovechamiento.
- Descapote y nivelación:
  Se lleva a cabo el descapote del sitio donde se instala el tanque de almacenamiento, así como la nivelación del terreno para garantizar la estabilidad de la placa y las condiciones idóneas para la instalación del tanque de almacenamiento.
- Excavación manual en material común:
  Se lleva a cabo la excavación manual para fundida de placa de piso del tanque de almacenamiento.
- Relleno con material seleccionado:
  Se realiza relleno en la zona de la placa para llevar a cabo la nivelación del terreno donde reposa el tanque de almacenamiento del sistema.
- Suministro e Instalación placa de piso Concreto:
  Se funde placa de piso según especificación técnica de 2m x 2m con 0,10m de espesor en concreto de 3000 PSI con refuerzo en malla electrosoldada 5 mm.

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com



Ilustración 61. Excavación y relleno placa de piso I.E. El Morro – Sede Los Medios



Ilustración 62. Refuerzo placa de piso para tanque de almacenamiento I.E. El Morro – Sede Los Medios

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com




Ilustración 63. Fundida placa de piso para tanque de almacenamiento I.E. El Morro – Sede Los Medios



Ilustración 64. Fundida placa de piso para tanque de almacenamiento I.E. El Morro – Sede Los Medios

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

RESUMEN AVANCE DE OBRA

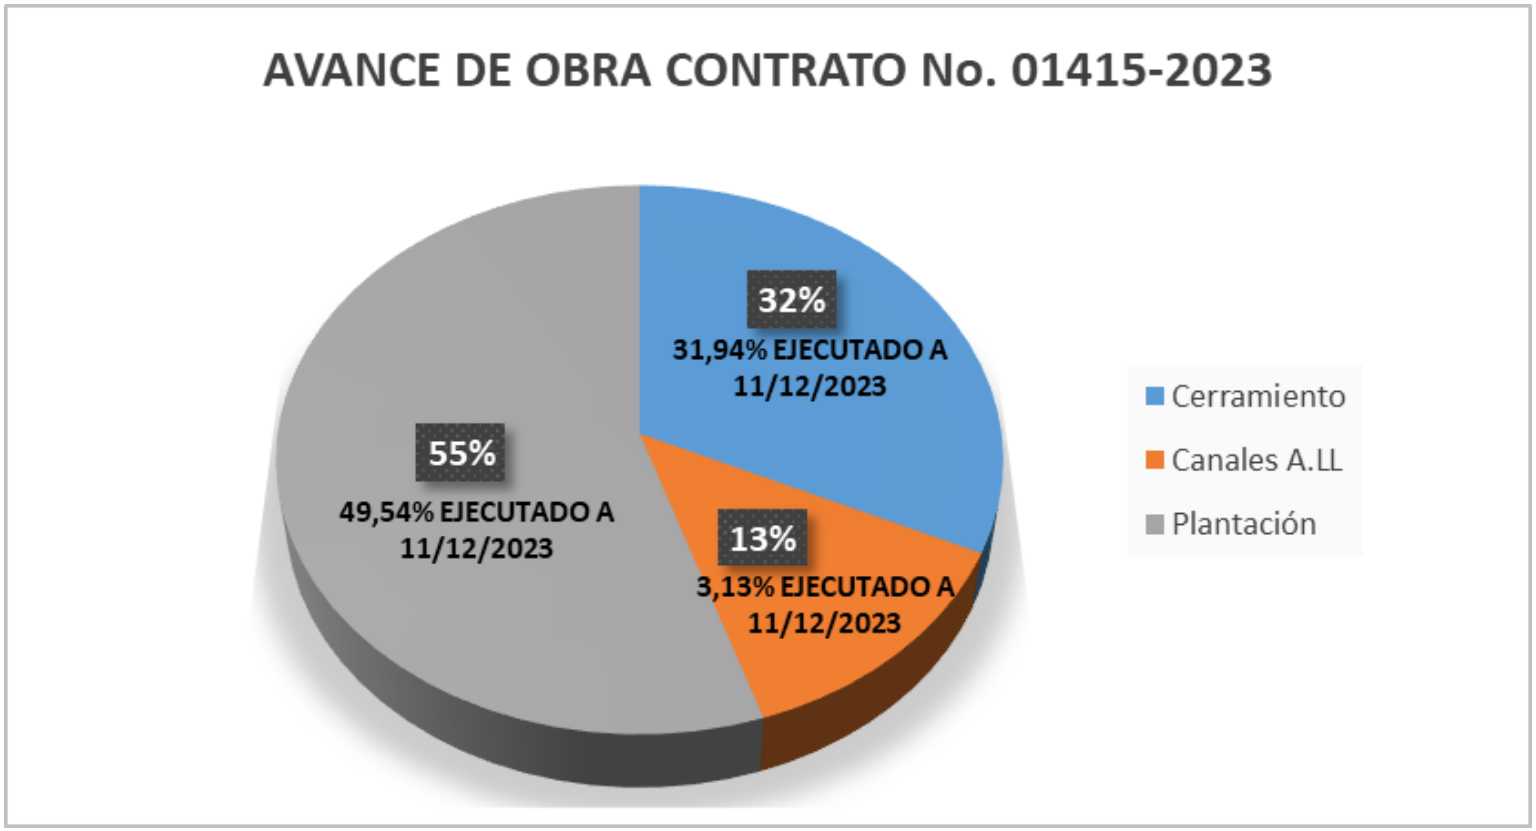

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

AVANCE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 01415-2023

REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE RECARGA HIDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CAS

ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	VR. UNITARIO CONTRATADO	CANT EJECUTADA	PONDERACION	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE GENERAL	PRESUPUESTO EJECUTADO - ACTA 1	PRESUPUESTO EJECUTADO - ACTA 2	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1.0	Establecimiento y revegetalización de las áreas estratégicas de recarga hídrica con plántulas*	Ha	13	$ 4.979.830,08	11,7	55,04 %	90%			$ 58.264.011,94	$ 58.264.011,94	$ 6.473.779,10
2.0	Cerramiento con suministro e instalación de cerca de 4 hilos	ML	1200	$ 31.309,44	1200	31,94 %	100,0%		$ 37.571.066,06		$ 37.571.066,06	$ 261,94
3.0	**SUM. E INST. CANALES PARA RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA**											
3.1	**PRELIMINARES**											
3.1.1	Localización y Replanteo	M2	12	$ 3.738,24	8					$ 29.905,92	$ 29.905,92	$ 14.952,96
3.1.2	Descapote del terreno	M2	12	$ 7.729,92	8					$ 61.839,36	$ 61.839,36	$ 30.919,68
3.1.3	Nivelación	M3	1,2	$ 7.767,36	0,787103					$ 6.113,71	$ 6.113,71	$ 3.207,12
3.1.4	Desmonte de canal de aguas lluvias	ML	110	$ 12.834,24	0					$ -	$ -	$ 1.411.766,40
3.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									$ -		
3.2.1	Excavación manual en material común	M3	2,67	$ 57.520,32	1,79					$ 102.961,37	$ 102.961,37	$ 50.617,88
3.2.2	Relleno con material seleccionado	M3	0,57	$ 113.295,36	0,38			84,61%		$ 43.052,24	$ 43.052,24	$ 21.526,12
3.3	**ESTRUCTURA**									$ -		
3.3.1	Suministro e Instalación placa de piso Concreto 3000 PSI e = 10 cm	M2	12	$ 111.926,40	8	13,02 %	24,05%			$ 895.411,20	$ 895.411,20	$ 447.705,60
3.4	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**									$ -		
3.4.1	Suministro e Instalación tubería de 2"	ML	36	$ 21.115,20	0					$ -	$ -	$ 760.147,20
3.4.2	Suministro e Instalación tanque 1000 lts (Incluye accesorios)	UND	3	$ 872.728,32	0					$ -	$ -	$ 2.618.184,96
3.5	**CUBIERTA**									$ -		
3.5.1	Suministro e Instalación canal PVC de aguas lluvias	ML	110	$ 70.902,72	36					$ 2.552.497,92	$ 2.552.497,92	$ 5.246.801,28
3.5.2	Suministro e Instalación bajante PVC de aguas lluvias	ML	18	$ 56.856,00	0					$ -	$ -	$ 1.023.408,00
						100,00 %			**$ 37.571.066,06**	**$ 61.955.793,66**	**$ 99.526.859,72**	**$ 18.103.278,24**


TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 37.571.066,06**	**$ 61.955.793,66**	**$ 99.526.859,72**	**$ 18.103.278,24**
ADMINISTRACION	24%	$ 9.017.055,85	$ 14.869.390,48	$ 23.886.446,33	$ 4.344.786,78
IMPREVISTOS	1%	$ 375.710,66	$ 619.557,94	$ 995.268,60	$ 181.032,78
UTILIDAD	5%	$ 1.878.553,30	$ 3.097.789,68	$ 4.976.342,99	$ 905.163,91
TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U.		**$ 11.271.319,82**	**$ 18.586.738,10**	**$ 29.858.057,92**	**$ 5.430.983,47**
IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**	$ 356.925,13	$ 588.580,04	$ 945.505,17	$ 171.981,14
TOTAL		**$ 49.199.311,01**	**$ 81.131.111,80**	**$ 130.330.422,81**	**$ 23.706.242,85**
				TOTAL CONTRATADO	**$ 154.036.665,66**

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

EJECUCION CRONOGRAMA CONTRATO DE OBRA No. 01415- 2023

REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE RECARGA HIDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO /EJECUTADO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4		
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
			21-24 SEP	25-30 SEP	02-07 OCT	09-14 OCT	16-21 OCT	23-28 OCT	30 OCT-4 NOV	6-11 NOV	13-18 NOV	20-25 NOV	27 NOV - 02 DIC	04-09 DIC	11-16 DIC	18-23 DIC	25-30 DIC
CAPITULO 1. PLANTACION																	
1.0	Establecimiento y revegetalización de las áreas estratégicas de recarga hídrica con plántulas*	PROGRAMADO													13 Ha		
		EJECUTADO												13 Ha			
CAPITULO 2. AISLAMIENTO																	
2.0	Cerramiento con suministro e instalación de cerca de 4 hilos	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
CAPITULO 3. CANALES PARA RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA (COSECHA DE																	
3.1	**PRELIMINARES**																
3.1.1	Localización y Replanteo	EJECUTADO															
		PROGRAMADO															
3.1.2	Descapote del terreno	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
3.1.3	Nivelación	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
3.1.4	Desmonte de canal de aguas lluvias	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
3.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																
3.2.1	Excavación manual en material común	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
3.2.2	Relleno con material seleccionado	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
3.3	**ESTRUCTURA**																
3.3.1	Suministro e Instalación placa de piso Concreto 3000 PSI e = 10 cm	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
3.4	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**																
3.4.1	Suministro e Instalación tubería de 2"	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
3.4.2	Suministro e Instalación tanque 1000 lts (Incluye accesorios)	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
3.5	**CUBIERTA**																
3.5.1	Suministro e Instalación canal PVC de aguas lluvias	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
3.5.2	Suministro e Instalación bajante PVC de aguas lluvias	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
4.0	**CAPITULO 4. TALLERES**																
4.1	Talleres/ Capacitaciones en instituciones educat	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															
5.0	**CAPITULO 5. VIDEO DE PROMOCION PROYECTO**																
5.1	Videos	PROGRAMADO															
		EJECUTADO															

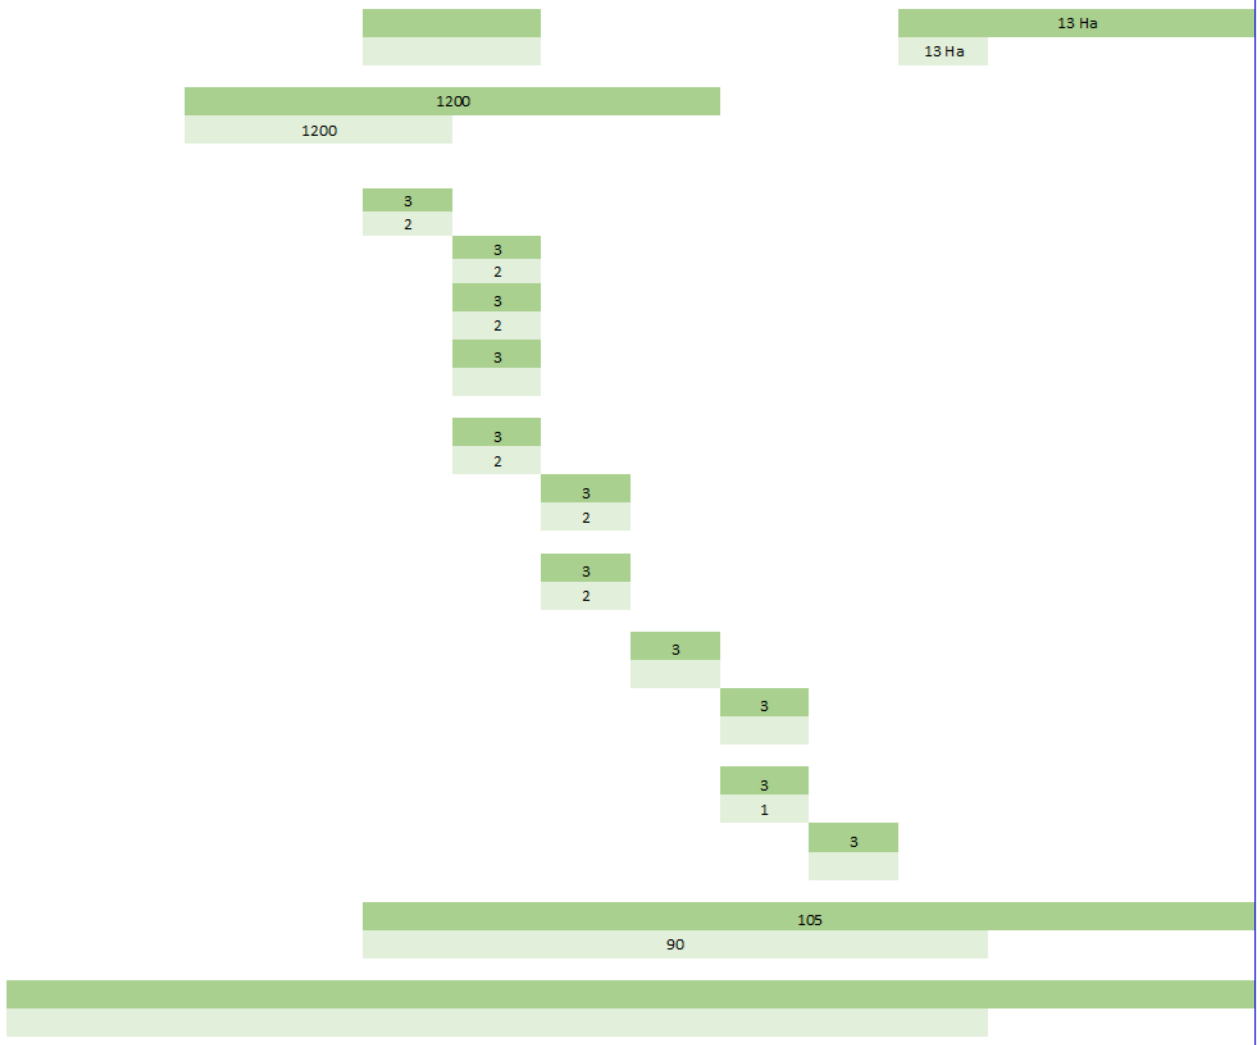

RELACION DE PERSONAL


- José Ignacio Zarabanda
  Perdomo Ing. Forestal
  TP. 03000-15052
  Cargo: Director de obra
  Porcentaje de dedicación: 30%
  Salario base: 1’721.833

- Jennifer Nathalia Zarabanda
  Llanos Ing. Civil
  TP. 161037-0512601
  Cargo: Profesional Residente
  Porcentaje de dedicación:
  100% Salario base: 3’357.341

- Judith Llanos
  Monroy Cargo:
  Secretaria
  Porcentaje de dedicación: 17%
  Salario base: 492.936

Es el informe,

San Gil diciembre 11 de 2023.



JOSE IGNACIO ZARABADA PERDOMO
Representante legal
ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE –ACODEMA-
Ni 809010058-4

Calle 39 No. 4C-90- Ibagué- Celular: 3219855686 Email: acodema23@yahoo.com

INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ACTIVIDADES

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	01415-2023		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA		
Nit o C.C. No.	809.010.058-4		
OBJETO:	"REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS".		
VALOR INICIAL:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($154.036.665,66)		
VALOR ADICIONAL:	$0		
PLAZO CONTRATO:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	ROCIO AYALA MORENO		
CARGO SUPERVISOR	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL - CAS		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA	**Término**	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA	**No Aplica**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023 SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)	NO APLICA		
VALOR A PAGAR	OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($81.131.111,80)		
ACTA A PAGAR:	ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 02		
PAGO No: (En Números)	02		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO	$154.036.665,66	
VALOR PAGO ACTUAL		$81.131.111,80
VALOR PAGADO		$49.199.311,01
VALOR POR EJECUTAR		$23.706.242,85
SUMAS IGUALES	$154.036.665,66	$154.036.665,66

3. Control Pago de Seguridad Social.

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
Director de Obra					
Septiembre 2023	9459715499 - 9460030933	$48.400 - $71.800	$61.900 - $91.900	$9.500 - $14.000	$119.800 - $177.700
Octubre 2023	9458807353 - 9460034294	$106.400 - $215.300	$136.200 - $275.500	$20.800 - $42.000	$263.400 - $532.800
Noviembre 2023	9460180163	$215.300	$275.500	$42.000	$532.800
Profesional Residente					
Septiembre 2023	9459715499 - 9460030933	$48.400 - $148.300	$61.900 - $189.800	$9.500 - $28.900	$119.800 - $367.000
Octubre 2023	9458807353 - 9460034294	$106.400 - $444.700	$136.200 - $569.200	$20.800 - $86.700	$263.400 - $1.100.600
Noviembre 2023	9460180163	$444.700	$569.200	$86.700	$1.100.600
Secretaria					
Septiembre 2023	9460031613	$48.400	$61.900	$9.500	$119.800
Octubre 2023	9460050675	$72.400	$92.600	$14.100	$179.100
Noviembre 2023	9460180163	$72.400	$92.600	$14.100	$179.100

De acuerdo al Certificado de Pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales emitido el día 11 de diciembre de 2023 y firmado por el representante legal de la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA** Señor **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO**, la empresa se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales (Se anexa soporte de pago).

4. Obligaciones Contractuales.

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS					
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNI.**	**CANT.**	**Vr. UNITARIO**	**Vr. TOTAL**
1	Establecimiento y revegetalización de las áreas estratégicas de recarga hídrica con plántulas	ha	11,7	$4.979.830,08	$58.264.011,94
2	Suministro e instalación de canales para recolección de agua lluvia (cosecha de agua)				
2.1	Preliminares				
2.1.1	Localización y replanteo	m2	8	$3.738,24	$29.905,92
2.1.2	Descapote del terreno	m2	8	$7.729,92	$61.839,36
2.1.3	Nivelación	m3	0,787103	$7.767,36	$6.113,71
2.2	Excavaciones y rellenos				
2.2.1	Excavación manual en material común	m3	1,79	$57.520,32	$102.961,37
2.2.2	Relleno con material seleccionado	m3	0,38	$113.295,36	$43.052,24
2.3	Estructura				
2.3.1	Suministro e instalación placa de piso concreto 3000 psi e=10 cm	m2	8	$111.926,40	$895.411,20
2.4	Cubierta				
2.4.1	Suministro e instalación canal pvc de aguas lluvias	ml	36	$70.902,72	$2.552.497,92
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$61.955.793,66**
				ADMINISTARCIÓN 24%	**$14.869.390,48**
				IMPREVISTOS 1%	**$619.557,94**
				UTILIDAD 5%	**$3.097.789,68**
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U.	**$18.586.738,10**
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	**$588.580,04**
				VALOR ACTA No. 02	**$81.131.111,80**

5. Balance Financiero

VALOR DEL CONTRATO	$154.036.665,66
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023 SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$81.131.111,80
SALDO POR PAGAR	$23.706.242,85

El valor total ejecutado a la fecha equivale a **CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($130.330.422,81)**, correspondiente a una ejecución física y financiera del **84,61%** del objeto contractual.

Se anexa el informe de ejecución No. 02 correspondiente al periodo 21 de octubre al 20 de noviembre de 2023.

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de aportes de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo informe contable y planillas de pago seguridad social.**

6. Seguimiento al Control Ambiental:

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	MEDIDA DE CONTROL REALIZADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7. Seguimiento al Control de Riesgos:

RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO	MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

En consecuencia, con base en el informe presentado por el Contratista, respecto a la actividad ejecutada en el presente contrato, LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los once (11) días del mes de diciembre del año 2023.

NOMBRE: ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
SUPERVISORA

Proyecto: Jorge Andrés Báez Gómez - Contratita SPL

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber le do previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, se informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACI N AUT NOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

CAS ¡Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente! 4.0	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: SAMC2-015-2023 SECOP II		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 28-11-2023 **ESTADO DEL CONTRATO:** EN EJECUCIÓN

CONTRATO No: **01415-2023** **TIPO DE CONTRATO:** OBRA

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA

Nit o C.C. No. 809.010.058-4 **No. DE INFORME:** 02

OBJETO: REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS

VALOR INICIAL: $154.036.665,66 **VALOR ADICIONAL: NO APLICA**

PLAZO CONTRATO: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO **PLAZO ADICIONAL:** NO APLICA

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL - CAS

INTERVENTOR: NO APLICA

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 21/09/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	AL	NO APLICA	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	NO APLICA
FECHA DE REINICIO:		NO APLICA		**TIEMPO DE PRORROGAS:**	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31/12/2023 SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	NO APLICA

PERIODO DEL INFORME: 21/10/2023 A 20/11/2023

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA 2 21/10/2023 A 20/11/2023

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66)	NO APLICA	$49.199.311,01	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	DOS (2) MES	84,61%	31,94%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de Inicio	21/09/2023	875 47 994000011250	31/12/2023	$0,00	$ 154.036.665,66	$0,00	$0,00
2	Acta de Recibo Parcial No. 1	24/11/2023		24/11/2023	$49.199.311,01	$ 104.837.354,65	$0,00	$49.199.311,01

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

El contratista realizó en los sitios de trabajo (áreas intervenidas: nacimientos y su cobertura vegetal existente a proteger) que hacen parte del "Municipio de El Valle de San José, Veredas Piedra de Rayo y Los Medios" y "Municipio de Charalá, Vereda El Resguardo", preparación del terreno y siembra de plántulas.

Se inicio la actividad de suministro e instalación de canales para recolección de agua lluvia (cosecha de agua) en el Municipio de Charalá, Vereda El Resguardo, en la Institución Educativa Sede Primaria.

Se encuentra en trámite la cuenta correspondiente al Acta de Recibo Parcial No. 2.

FIRMA INTERVENTOR **FIRMA SUPERVISOR**

Apoyo Supervisión: Jorge Andrés Báez G. - Contrista SPL Revisó: Liliana López F-PCT-008

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02

CONTRATO:	01415-2023
CONTRATANTE.	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
NIT:	804.000.292-0
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA
NIT o C.C.	809.010.058-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO
CEDULA DE CIUDADANÍA	93.367.013 DE IBAGUÉ
COMPROMISO PRESUPUESTAL	CDP No 23-05952 RP No 23-08710
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66)
FECHA DE INICIO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION 1	31 DE DICIEMBRE DE 2023 SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023
FECHA DE TERMINACIÓN 2	NO APLICA
SUPERVISOR	ROCIO AYALA MORENO SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

En la ciudad de San Gil a los once (11) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron los señores: **ROCIO AYALA MORENO**, de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS** en calidad de supervisora y **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.367.013, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial del Contrato.

CONSIDERANDO:

1. Que el día veintiuno (21) de septiembre de 2023, se suscribió el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**, entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS** y la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - ACODEMA**, identificada con NIT. 809.010.058-4 representada legalmente por el señor **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO**, identificado con cédula de ciudadanía 93.367.013 de Ibagué, con el objeto "REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS" por valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($154.036.665,66).

2. Que el día 21 de septiembre de 2023 se firmó acta de inicio con fecha de terminación el día 31 del mes de diciembre de 2023 sin exceder la vigencia 2023.

3. Que en virtud de la cláusula TERCERA del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023** se establece la forma de pago:

   LA CORPORACIÓN pagará al CONTRATISTA el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, POR ACTAS PARCIALES de conformidad con el porcentaje de avance de ejecución de acuerdo a las actividades ejecutadas conforme al alcance y especificaciones del objeto contractual y el valor del presupuesto, previa aprobación por parte del supervisor y entrega de informes parciales presentados por el Contratista con soportes y evidencias de ejecución. El saldo del 10% se cancelará con posterioridad a la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la Supervisión con los soportes respectivos referidos para lo cual deberá presentar; (i) Acta de recibo final de las obras. (ii) Archivo fotográfico de realización de los trabajos, (iii) Acta de terminación del contrato y liquidación de mutuo acuerdo del mismo, y esta acta obtenga el visto bueno del Supervisor de la obra y se encuentre debidamente firmada por el contratista, (iv) Que el contratista aporte la prueba del pago de nómina (salarios y prestaciones sociales), seguridad social y aportes parafiscales. (v) Que el Supervisor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción de la CAS. (vi) Que el contratista presente la factura de cobro respectiva.

4. En virtud de lo anterior el contratista **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.367.013 de Ibagué, remite oficio por medio de correo electrónico relacionando los documentos para la cuenta Acta de Recibido Parcial No. 02, correspondiente al **52,67%** del valor del contrato en cumplimiento del objeto contractual, relacionados así:

   - Oficio de remisión de la solicitud presentada por contratista.
   - Certificación Bancaria.
   - Factura electrónica de venta No. FE 3.
   - Copia RUT.

- Memorando de Contabilidad.
- Tarjeta Profesional y Certificación Junta Central de Contadores del Contador.
- Certificado aportes parafiscales.
- Concepto financiero.
- Certificación Desglose Factor Multiplicador.
- Planillas de pago Seguridad Social del personal vinculado al proyecto y Representante Legal.
- Informe de ejecución.
- Formato F-PCT-034 - Informe Supervisión e Interventoría.
- Formato F-PCT-008 - Informe de Seguimiento Supervisión e Interventoría.
- Formato F-PCT-032 - Acta Parcial.
- Bitácora de obra.
- Transporte.

5. Que el balance financiero es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR ($)**	**VALOR ($)**
VALOR INICIAL	$154.036.665,66	
VALOR PAGADO		$49.199.311,01
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No.02		$81.131.111,80
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$23.706.242,85
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$154.036.665,66	$154.036.665,66

6. Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al Acta de Recibido Parcial No. 02 y de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume su veracidad.

7. Que la CAS ordena el pago al contratista **JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.367.013 de Ibagué**, el valor equivalente a **OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($81.131.111,80)** correspondiente a una ejecución física y financiera del **52,67%** del objeto contractual.

8. Que queda pendiente por ejecutar el valor de: **VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($23.706.242,85)** correspondientes a una ejecución física y financiera **15,39%** del objeto contractual.

9. Que la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS** y según los términos y condiciones establecidos en el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**, avala lo que en la presente acta se suscribe.

10. Los alcances recibidos del contrato se encuentran de conformidad con la relación de ítems y cantidades descritas en los anexos y el Informe de Supervisión e Interventoría F-PCT-034-2022 que forman parte integral de la presente acta.

11. Que, en razón a lo expuesto,

ACUERDAN

1. Suscribir la presente Acta de Recibo Parcial No. 02 del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**, cuyo objeto es "REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA NATURAL Y CONSTRUIDA PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES, EN MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CAS", de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente documento.

2. Que la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS**, ha verificado el estado y avance de las actividades del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01415-2023**, observando que cumple con lo estipulado en el objeto contractual, según informe de supervisión e interventoría F-PCT-034-2022 de fecha once (11) de diciembre de 2023.

3. Ordenar el pago por un valor de: **OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($81.131.111,80)** correspondiente a una ejecución física y financiera del **52,67%** del objeto contractual.

4. En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO
C.C. 93.367.013 DE IBAGUÉ
CONTRATISTA

ROCIO AYALA MORENO
SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y O/A
SUPERVISORA

Proyecto: Jorge Andrés Báez Gómez – Contratista SPL

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Octubre 30 /2023	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose
VEREDA:	Piedra de Rayo	**ACUEDUCTO:**	Piedra de Rayo.

ACTIVIDADES: Se lleva a cabo la seleccion de areas correspondiente al nacimiento de agua que abastece el aweducto de la vereda piedra de rayo. Se inicia labores de trazado con una distancia de siembra de 4.26 metros entre plantulas y la aplicacion de correctivos de acuerdo a especificacion tecnica. -Se lleva a cabo registro fotografico y toma de video.

PERSONAL: Henry Gomez Bacalsmero del aweducto
Edinela Salazar presidenta acweducto.
Jose Ignacio Zarabanda Ingeniero forestal.

MATERIALES Y EQUIPOS Equipo fotografico y de video.

OBSERVACIONES: Se selecciona el area destinada al esta blecimiento del aislamiento con poste de plastico, por su beneficio de Proteccion.

Ing. Jose Ignacio Zarabanda.

RESPONSABLE.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Octubre 31 /2023	**MUNICIPIO:**	Charala
VEREDA:		**ACUEDUCTO:**	la Casona.

ACTIVIDADES: Seleccion de areas para establecer la plantacion con especies protectoras al nacimiento que abastece al acueducto la casona de la vereda el resguardo del municipio de Charala. Se inicia labores de trazado y aplicacion de correctivos

PERSONAL: Jesus Santos presidente de la junta de Accion comunal, Luis felipe Merchan - representante del acueducto, Ing. Jose Ignacio Zarabanda - Director Proy

MATERIALES Y EQUIPOS : Equipo de filmacion y fotografico

OBSERVACIONES : Se lleva a cabo registro fotografico y toma de video.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 1/2023	**MUNICIPIO:**	Charalá
VEREDA:		**ACUEDUCTO:**	los Sinchos.

ACTIVIDADES: Se lleva a cabo la visita al Nacimiento de agua q' abastece el acueducto de los Sinchos, estableciendo el area aislada como sitio ideal para la siembra de especies protectoras; se inicia trazado y aplicativo de correctivos.

PERSONAL: Martha Rincon, Marcela bravo, Jesus Santos, Jose Ignacio Zarabanda

MATERIALES Y EQUIPOS : Cinta metrica, Equipo fotografico

OBSERVACIONES : Se realizan tomas de video.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 2/2023	**MUNICIPIO:**	San Gil.
VEREDA:	N.A.	**ACUEDUCTO:**	N.A.

ACTIVIDADES: Se lleva a Cabo un recorrido por la zona con el fin de buscar el material a plantar, identificando los viveros vegas del fonce en la via q' conduce de San Gil a Charalá y, el paraiso en la via q' conduce de San Gil a Bucaramanga.

PERSONAL: Ing. Jose I Zarabanda
Ing Jennifer Natalia Zarabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS Equipo fotografica

OBSERVACIONES Se preseleccionan viveros y especies

RESPONSABLE.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 3/2023	**MUNICIPIO:**	Paramo.
VEREDA:	N.A.	**ACUEDUCTO:**	N.A

ACTIVIDADES: Con el objetivo de seleccionar un area que nos permita establecer especies protectoras a nacimientos de agua en zonas de recarga hidrica; (por) nos entrevistamos con el alcalde del municipio del paramo quien nos manifesta la posibilidad de un area, (la) la cual por sus caracteristicas de (Pob) cobertura, ubicacion NO es la adecuada.

PERSONAL: personal dela alcaldia de paramo
Ing. Jose Ignacio Tarabanda

MATERIALES Y EQUIPOS Cinta Metrica, altimetro, GPS. equipo fotografico

OBSERVACIONES : predio NO corresponde a los regerimientos del proyecto.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Tarabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 4/2023	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose
VEREDA:		**ACUEDUCTO:**	

ACTIVIDADES: Seleccion de areas para el establecimiento de especies protectoras del nacimiento de Agua del acueducto el cuevon, perteneciente a la vereda los Medio, del municipio de valle de San Jose.- inicio de preparacion del terreno Registro fotografico - (Vd)

PERSONAL: Isaac pinto : Bocatomero acueducto el cuevon

MATERIALES Y EQUIPOS : GPS., Cinta metrica, Equipo foto grafico

OBSERVACIONES: El predio denominado el portal, cumple con los requisitos al estar Ubicado en areas de recarga hidrica del acueducto del cuevon.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Tarabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 6/23	**MUNICIPIO:**	Charalá, Valle San José
VEREDA:	Resguardo, Piedra R.	**ACUEDUCTO:**	Resg. Piedra R. Med

ACTIVIDADES: Visita de interventoria, con el fin de evaluar las actividades ejecutadas en los municipios de Charalá y Valle de San Jose.
se evidencian las caracteristicas tecnicas de los aislamientos y, se imparten instrucciones tecnicas.

PERSONAL: Arq. Jorge Andres Baez.
Ing. Jose I Zarabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS : Equipo fotografico

OBSERVACIONES : FESTIVO.

Arq. Jorge Andres Baez.

RESPONSABLE. Ing. José Ignacio Zarabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Nov. 7/2023	**MUNICIPIO:**	Charalá y Valle SJ.
VEREDA:	Resguardo, Piedra R	**ACUEDUCTO:**	Sinchos, Piedra R

ACTIVIDADES: Socialización con las comunidades. delos acueductos de la vereda piedra de Rayo enel municipio de Valle de San Josè y Resguardo enel municipio de Charalá, conel objetivo de Pareren consentimiento a los actores vivos de la poblacion de estos municipios sobre el proyecto en ejecucion

PERSONAL: Reinel Salazar : pte J.A.C. Vereda piedra Rayo y comunidad
Jesus Santos : Pte J.A.C Vereda Resguardo y C.

MATERIALES Y EQUIPOS : Equipo fotografico

OBSERVACIONES : Se aclaran la disponibilidad de especies para ser sembradas, y Requerimientos de la Comunidad.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda
Ing Jennifer Nathalia Zarabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 9 /23	**MUNICIPIO:**	Charalá
VEREDA:	Resguarda	**ACUEDUCTO:**	Casona. Sinchal

ACTIVIDADES: Talleres de capacitacion en la Institucion educativa llano ondo, dirigido a los estudiantes delos grados 1.2.3.0 5 con los temas relacionados con el buen uso y manejo del agua, proteccion a nacimiento de agua y aislamiento de Nacimientos con materiales reciclables.

PERSONAL: Ing. Jennifer Nathalia Zarabanda
Ing. Jose Ignacio Zarabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS : Equipo de video, material didactico.

OBSERVACIONES : N. A.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda
Ing. Jennifer Natalia Zarabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 10 /23	**MUNICIPIO:**	Charala - Valle S.J
VEREDA:	Resguardo, Medios	**ACUEDUCTO:**	Casona - Cuevon.

ACTIVIDADES: Localizacion del sitio para el establecimiento del sistema de recoleccion de aguas lluvias para la vereda el resguardo.
(localizacion del sitio para).
Socializacion del proyecto con la J. A.C. Vereda los Medios

PERSONAL: JESUS santos pte J. A.C vereda resguardo y comunidad
Alonso Rodriguez, Milena Rodriguez J.A.C Vereda los Medios

MATERIALES Y EQUIPOS : Equipo fotografico

OBSERVACIONES: Se imparten instrucciones sobre las especificaciones tecnicas del proyecto.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda
Ing. Jennifer Nathalia Zarabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 11/23	**MUNICIPIO:**	Charalá
VEREDA:	Resguardo	**ACUEDUCTO:**	Sinchos.

ACTIVIDADES: trazado, plateo y Ahoyado en la vereda el resguardo municipio de Charalá continuando con la preparacion del terreno para la siembra- labores de limpia, trazado plateo. - y Ahoyado

PERSONAL: Ing. Jose Ignacio Farabanda - Comunidad.
Ing. Jennifer Nathalia Farabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS : Cinta metrica, G.P.S

OBSERVACIONES: Buena participacion dela Comunidad.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Farabanda
Ing. Jennifer Nathalia Farabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 14/23	**MUNICIPIO:**	Charalá
VEREDA:	Resguardo	**ACUEDUCTO:**	la Casona.

ACTIVIDADES: preparacion del terreno - plateo, Ahoyada limpia - trazado en el area circundante al nacimiento de agua de Abastece al acueducto la Casona dela vereda el resguardo- municipio de charala

PERSONAL: Luis felipe Merchan - Comunidad.
Ing. Jose Ignacio Farabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS : G.P.S. - Cinta metrica

OBSERVACIONES: Buena participacion dela Comunidad

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Farabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 15 /23	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose
VEREDA:	Piedra de Rayo	**ACUEDUCTO:**	Piedra de Rayo.

ACTIVIDADES: Preparacion del terreno para la Siembra de especies Protectoras Nativas de la region, incluye limpia trazado plateo y ahoyado.
se llevara a cabo video y registro fotografico
Georeferenciacion

PERSONAL: Remel Salazar pk: J.A.C Vereda Piedra de R.
Henry Gomez Bocatomero Vereda Piedra de R.
Ing. Jose I Zarabmda - Comunidad.

MATERIALES Y EQUIPOS : GPS. Cinta metrica
Equipo de filmacion.

OBSERVACIONES : terreno en condiciones optimas para la realizacion de las actividades.

Ing. Jose Ignacio Zarabmda P.

RESPONSABLE. : Ing. Jennifer Nathalia Zarabmda U.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 16/23	**MUNICIPIO:**	Charala
VEREDA:	Resguardo	**ACUEDUCTO:**	Sinchos-Casona

ACTIVIDADES: Adquisicion y Posterior Suministro del material vegetal destinado a la Siembra en las areas Circundantes a los Nacimientos de agua q benefician a los acueductos los Sinchos y Casona de la vereda el resguardo del municipio de Charala

PERSONAL: Ing Jose Ignacio Zarabmda P.
Ing. Jennifer Nathalia Zarabmda U.

MATERIALES Y EQUIPOS : Vehiculo, equipo fotografico.

OBSERVACIONES : Se realiza Video.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabmda P.
Ing. Jennifer Nathalia Zarabmda U.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 17/23	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose
VEREDA:	Los Medios	**ACUEDUCTO:**	El Cuevon

ACTIVIDADES: Preparacion del terreno para la Siembra limpia, trazado plateo y ahoyada. en el predio el Portal, adquirido por la CAS para la Proteccion Ambiental - Correspondiente a las areas de recarga hidrica de abastecen el acueducto el cuevon.

PERSONAL: Isaac pinto - Comunidad
Ing. Jose ignacio Tarabanda P.
Ing. Jennifer Nathalia Tarabanda

MATERIALES Y EQUIPOS : G.P.S - Cinta metrica
Equipo fotografico

OBSERVACIONES : labores que se realizan en la parte baja del predio cumpliendo con los Caracteristicas tecnicas y de ubicacion.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Tarabanda P.
Ing. Jennifer Nathalia Tarabanda U.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 18/23	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose.
VEREDA:	Los Medios	**ACUEDUCTO:**	El Cuevon.

ACTIVIDADES: localizacion, identificacion tecnica para el establecimiento del Sistema de recoleccion de aguas Lluvias en la Institucion educativa de la vereda los medios del municipio de Valle de San Jose - v. 6.

PERSONAL: Ing. Jennifer Nathalia Tarabanda U.
Ing. Jose Ignacio Tarabanda P.

MATERIALES Y EQUIPOS : G.P.S - Cinta metrica
Equipo fotografico

OBSERVACIONES : Sitio adecuado para la realizacion de las labores.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Tarabanda P
Ing. Jennifer Nathalia Tarabanda U.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 20/23	**MUNICIPIO:**	Charalá
VEREDA:	Resguardo.	**ACUEDUCTO:**	los Sinchos

ACTIVIDADES: preparacion del terreno mediante el ahoyado. cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato, en el area circundante a los nacimientos de agua y recarga hidrica del acueducto de los Sinchos - vereda el resguardo - Mpio de Charala.

PERSONAL: Martha Abucena ferreno - Acueducto
Jesus Santos P.T. A.C.
Ing. Jose Ignacio Zorabnda P.

MATERIALES Y EQUIPOS GPS - cinta metrica
Equipo fotografico

OBSERVACIONES : terreno en condiciones optimas para siembra

RESPONSABLE. : Ing. Jose Ignacio Zorabnda P.

FECHA:	Noviembre 21/23	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose.
VEREDA:	Piedra de rayo.	**ACUEDUCTO:**	Piedra de Rayo.

ACTIVIDADES: Ahoyado del terreno correspondiente al acueducto dela vereda piedra de rayo, para el esta blecimiento de especies protectoras en las zonas de recarga hidrica.

PERSONAL: Henrry Gomez - Comunidad
Ing. Jose Ignacio Zorabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS : GPS. Ahoyadora.

OBSERVACIONES : terreno en condiciones óptimas para la siembra

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zorabnda P.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 22/23	**MUNICIPIO:**	Chorala
VEREDA:	Resguardo.	**ACUEDUCTO:**	Sinchos

ACTIVIDADES: Siembra de especies protectoras Nativas en el area de recarga hidrica q' abastece el acueducto de los Sinchos en la vereda el resguardo - municipio de Chorala. Cumpliendo con los especificaciones tecnicas.

PERSONAL: Martha Asucena Ferrucho
Jesus Santos J. M. C.
Ing. Jose I. Zarabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS : Especies protectoras - insumos.

OBSERVACIONES : buen estado fitosanitario y de vigorosidad del material

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda P.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 23/23	**MUNICIPIO:**	Valle de San José
VEREDA:	Los Medios.	**ACUEDUCTO:**	El cuevon.

ACTIVIDADES: Se continua con la labor de cnoyado en la micro cuenca que abastece de agua al acueducto de la vereda los medios - acueducto el cuevon -; cumpliendo con las especificaciones tecnicas
Se lleva a Cabo video para informe final.

PERSONAL: Isaac Pinto - Reinel Salazar.
Jose Ignacio Zarabanda

MATERIALES Y EQUIPOS GPS - Cinta metrica
Equipo de fotografia.

OBSERVACIONES : N.A.

RESPONSABLE. Jose Ignacio Zarabanda P.
Jennifer Natalia Zarabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 24/23	**MUNICIPIO:**	Charab-Valle S J.
VEREDA:		**ACUEDUCTO:**	Cuevon - Piedra R.

ACTIVIDADES: Adquisicion y Suministro de insumos requeridos para la siembra - transporte mayor y menor. Con destino al acueducto de Piedra de Rayo - mpio de Valle de San Jose.
Se continuo con el ahoyado en la el Predio el portal.

PERSONAL: Henry Gomez Reynel Salazar - Isaac pinta

MATERIALES Y EQUIPOS Ahoyadora, Cinta metrica, GPS.

OBSERVACIONES : N.A.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda R
Ing. Jennifer Nathalia Zarabanda.

FECHA:	Noviembre 25/23	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose.
VEREDA:	Los Medios.	**ACUEDUCTO:**	El Cuevon.

ACTIVIDADES: Adquisicion y Suministro de insumos requeridos para la siembra de especies protectoras en la microcuenca q' abastece de agua al acueducto de la Quebrada el cuevon.
Transporte mayor y menor.

PERSONAL: Ing Jennifer Nathalia Zarabanda C.
Ing. Jose Ignacio Zarabanda R

MATERIALES Y EQUIPOS Equipos de fotografia y video.

OBSERVACIONES : N A.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda R
Ing Jennifer Nathalia Zarabanda.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 27/23	**MUNICIPIO:**	Valle de San José
VEREDA:	N.A.	**ACUEDUCTO:**	N.A.

ACTIVIDADES: Informes en oficina.

PERSONAL: Ing. Jose Ignacio Zarabanda P.
Ing Jennifer Nathalia Zarabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS Equipos de oficina.

OBSERVACIONES N.A.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda P.
Ing Jennifer Nathalia Zarabanda U.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 28/23	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose.
VEREDA:	Los medios	**ACUEDUCTO:**	el Cuevon

ACTIVIDADES: Culminacion del ahoyado en el predio el portal como actividad preliminar a la siembra de especies protectoras - Acueducto el Cuevon - vereda los medios - mpio valle de San Jose. Registro fotografico - video.

PERSONAL: Isaac pinto. Ing Jose Ignacio Zarabanda P.
Reynel Salazar

MATERIALES Y EQUIPOS Ahoyadora, cinta metrica.

OBSERVACIONES N.A

RESPONSABLE. Ing Jose Ignacio Zarabanda P
Ing Jennifer Nathalia Zarabanda U.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 29/23	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose
VEREDA:	Piedra de rayo	**ACUEDUCTO:**	Piedra de rayo.

ACTIVIDADES: Se culmina la actividad preliminar a la siembra como es el Ahoyado y Plateo, en el area circundante al nacimiento de agua q' abastece el acueducto de Piedra de rayo. Registro fotografico.

PERSONAL: Ing. Jose Ignacio Zarabanda P.
Ing. Jennifer Nathalia Zarabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS Ahoyadora, GPS, equipo fotografico.

OBSERVACIONES N.A.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda P.
Ing Jennifer Nathalia Zarabanda G.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Noviembre 30/23	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose
VEREDA:	Los Medios	**ACUEDUCTO:**	El cuevon.

ACTIVIDADES: Se lleva a cabo el transporte mular del material Vegetal destinado a la siembra con especies protectoras en el area de recarga hidrica de abastece al acueducto rural "el cuevon" de la vereda los medios en el municipio de Valle de San Jose.

PERSONAL: Isaac Pinto
Ing. Jose Ignacio Zarabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS : Equipo fotografico- mulas.

OBSERVACIONES : No se presentan inconvenientes.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda P.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Diciembre 1 /2023	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose
VEREDA:	los Medios-Valles	**ACUEDUCTO:**	El Cuevon. Piedra R.

ACTIVIDADES: Se lleva a Cabo la siembra de especies protectoras para la protección de nacimientos de agua que abastecen los acueductos rurales de el cuevon y piedra de rayo con especies referenciadas en las especificaciones tecnicas como Guayacan de Manizalez, Guayacan Roseado, Chachatruto, Aro, Cedro de altura, entre otros.

PERSONAL: Isaac Pinto, Reinal Salazar. Ing Jose Ignacio Zarabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS : Material Vegetal, Herramienta manual insumos. fertilizante- Hidroretenedor
Equipo fotografico

OBSERVACIONES :

Ing. Jose Ignacio Zarabanda.P.

RESPONSABLE.

FECHA:	Diciembre 2 /2023	**MUNICIPIO:**	Valle de San Jose -
VEREDA:	Piedra rallo - Med	**ACUEDUCTO:**	Piedra de rayo - Cuevon.

ACTIVIDADES: Se continua con la siembra de especies protectoras en los acueductos q' abastecen de agua a las comunidades de la vereda los médios en valle de San Jose y la vereda Piedra de rayo.
Se lleva a cabo la localizacion y replanteo en la vereda los

PERSONAL: Medios del sitio para el establecimiento del Sistema de recoleccion de aguas lluvias. Sitio la escuela de los medios.

MATERIALES Y EQUIPOS Cinta metrica, herramienta manual.

OBSERVACIONES : Se toma registro fotografico - Video.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda P.

ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE- ACODEMA
NIT: 809010058-4

FECHA:	Diciembre 4/2023	MUNICIPIO:	Charalá- Valle San J.
VEREDA:	Resguardo Piedra- Cu	ACUEDUCTO:	Casona, Piedra, Cuevon.

ACTIVIDADES: Se culmina la siembra en el acueducto de la casona (area de influencia- Nacimientos); se continua con la siembra de especies protectoras en los ni el area de recarga hidrica q' abastece al acueducto el cuevon, y se culmina la siembra en el area de influencia q' abastece al acueducto de Piedra de rayo.

PERSONAL: Isaac Pinto, Henrry Gomez, reinel Salazar, Ing Jose Ignacio Zarabanda.

MATERIALES Y EQUIPOS: Herramiento menor, equipo de fotografia.

OBSERVACIONES: se lleva a cabo la Georeferenciacion y polygonos de las areas sembradas.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda P.
Ing Jennifer Nathalia Zrabanda U.

FECHA:	Diciembre 5/2023	MUNICIPIO:	Valle de San Jose
VEREDA:	los Medios.	ACUEDUCTO:	El cuevon.

ACTIVIDADES: Se culmina la siembra de especies protectoras en el area de recarga hidrica q' abastece el acueducto del cuevon.
se lleva a cabo la localizacion y replanteo para la instalacion de los sistemas de recoleccion de aguas lluvias - Piedra rayo.

PERSONAL: Reinel Salazar, Ing. Jose Ignacio Zarabanda
Henrry Gomez, Ing. Jennifer Nathalia Z.

MATERIALES Y EQUIPOS Herramienta menor, equipo de fotografia y Video, cinta metrica.


OBSERVACIONES: se evidencia la presencia de hormiga arriera para la plantacion establecida en el area q' abastece, el acueducto el cuevon - Se solicita insumo para corregir el hecho.

RESPONSABLE. Ing. Jose Ignacio Zarabanda P
Ing. Jennifer Nathalia Zarabanda U.

CERTIFICADO PAGO DE TRANSPORTE DE VEHICULO

Yo JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO, identificado con cedula de ciudadanía No. 93367013, certifico que para el desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 01415- 2023 se movilizó el vehículo CAMIONETA NISSAN FRONTIER con placa HQW927 de la fecha 29 de octubre al 11 de diciembre por un valor de $ 423.936,00.

Atentamente,



JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO

CC.93367013

REP. LEGAL ACODEMA

NIT 809010058-4

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	2	25	2023	2	26	2024	2	25

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
85207230 - 606812416	HQW927	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	2488	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	NISSAN	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO
D22/NP300

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YD25436363T	3N6PD23Y6ZK925370	3N6PD23Y6ZK925370	1,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE ZARABANDA RIVERA	3219855686	CC	1110554212	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	85207230	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 572.300	$ 297.500	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 871.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero
Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del **Club Tu Beneficio Mundial**, donde obtendrás **descuentos y promociones** de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: **registro.tubeneficiomundial.com**

Solo tienes que registrarte y en el enlace recibirás un correo de forma automática, ábrelo y haz click en el botón **www.tubeneficiomundial.com** para disfrutarlos.

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Cívil Familiar

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- Bogotá: **(+601)** 327 47 12/13
- Nacional: 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10007390894

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HQW927	NISSAN	D22/NP300	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25-436363T	N	3N6PD23Y6ZK925370

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6PD23Y6ZK925370	N	3N6PD23Y6ZK925370	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ZARABANDA RIVERA JOSE IGNACIO	C.C. 1110554212

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
131

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
882013000106354

I/E
I

FECHA IMPORT.
09/08/2013

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE S.A.

FECHA MATRÍCULA
21/05/2014


FECHA EXP. LIC. TTO.
21/05/2014

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE





LT02002494702

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 93367013

NOMBRE

JOSE IGNACIO ZARABANDA PERDOMO

FECHA DE NACIMIENTO

12-10-1966

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

27-01-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL TTO/TTE [illegible]

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	27-01-2032	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	27-01-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

60947.0.0-29 08/21

LC03004260352
