Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

ACTA DE REUNIÓN

Tema:	Reunión entre el Supervisor y el Contratista de obra del contrato MP-2502-2023	**Fecha:**	15/12/2023
		Hora Inicial:	7:30 AM
Lugar:	Institución Educativa Santa Barbara- Sede Miguel Mercado. Institución Educativa Semilla de la Esperanza- Rodrigo de Bastidas. Institución Educativa Sebastián de Belalcázar sede La Dolores. Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar sede Principal. Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso sede Rafael Uribe Uribe.	**Hora Final:**	12:00 PM

CONTRATO**:**	MP-2502-2023
CONTRATISTA:	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ C.C. No. 79.356.655
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO GUENDICA No. 94.316.450
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($387.922.225)
VALOR DE LA ADICIÓN OTRO SI:	CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($125.839.655)
VALOR ADICIÓN MAYORES CANTIDADES:	SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 68.121.455)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($581.883.335)

FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO PALMIRA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante el reconocimiento de actas parciales, a precios unitarios sin fórmula de ajuste, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.
FECHA DE INICIO:	21 de septiembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo del presente contrato será de tres (3) meses sin exceder el quince (15) de diciembre de 2023, contados desde la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

CONSIDERACIONES:

El presente documento corresponde al ACTA DE RECIBO FINAL del contrato de obra MP-2502-2023, acta suscrita entre el Supervisor Carlos Eduardo Guendica y el Contratista Julio Ricardo Rojas Hernández.

1. ORDEN DEL DÍA

1.1. Explicación del motivo de la reunión.
1.2. Recorrido de inspección al sitio de las obras.
1.3. Cierre de la reunión, conclusiones.

2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

2.1. Se da inicio a la reunión con la presencia de todas las partes involucradas, el objetivo del encuentro, radica en la entrega de las obras de las obras realizadas en las Instituciones Educativas:

1. Institución Educativa Santa Barbara- Sede Miguel Mercado.
2. Institución Educativa Semilla de la Esperanza- Rodrigo de Bastidas.
3. Institución Educativa Sebastián de Belalcázar sede La Dolores.
4. Institución Educativa Nuestra Señora del Palmar sede Principal.
5. Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso sede Rafael Uribe Uribe.

Contempladas en el contrato de obra MP-2502-2023, celebrado entre el MUNICIPIO DE PALMIRA y JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ.

2.2 Los asistentes realizan recorrido de inspección por las Sedes Educativas en mención, donde se han realizado las obras de adecuación y mantenimiento, el supervisor Carlos Eduardo Guendica, indica las actividades realizadas en los frentes de trabajo, que se resumen de la siguiente manera:

- Preliminares.
- Enchapes y acabados.
- Instalaciones varias.
- Cerrajería.
- Instalaciones eléctricas.
- Cubierta.
- Cimentación y estructura.
- Cerramiento.
- Varios.

Así mismo, el supervisor añade que las obras realizadas están acorde al presupuesto y a las cantidades de obra contempladas en el contrato de obra MP-2502-2023.

3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

3.1. El día quince (15) del mes de diciembre del año 2023, se reunieron las siguientes personas: Carlos Eduardo Guendica identificado con C.C. No. 94.316.450, en representación de la Secretaría de Educación en su calidad de supervisor de obra, y el Contratista Julio Ricardo Rojas Hernández, identificado con cedula de ciudadanía C.C. No. 79.356.655, para dejar constancia del cumplimiento total del contrato en mención y proceder a realizar el recibo a satisfacción.

Para constancia del recorrido realizado y ejecución del contrato de obra MP-2502-2023 cuyo objeto era REALIZAR ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, se relacionan a continuación las actividades e ítems ejecutados y desarrollados en el contrato de obra, las cuales fueron recibidas a satisfacción y se relacionan a continuación:

PRESUPUESTO OFICIAL

MUNICIPIO DE PALMIRA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTUALIZACION		MAYORES (+) Y/O MENORES (-) CANTIDADES DE OBRA		
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES									
100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	81	16.972,00	$ 1.374.732	236,00	4.005.392,00	155	0	2.630.660,00
330602	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA CER	M/D	76	26.477,00	$ 2.006.647	120,79	3.198.112,00	45	0	1.191.465,00
200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI (corredor)	M2	16	99.730,00	$ 1.545.815	155,50	15.508.015,00	140	0	13.962.200,00
100103	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1	3.882.857,00	$ 3.882.857	1,00	3.882.857,00	0	0	-
100519	DESM REJA METALICA	M2	6	20.118,00	$ 116.684	30,80	619.634,00	25	0	502.950,00
100314	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	53	8.362,00	$ 445.695	78,30	654.745,00	25	0	209.050,00
100520	DESM.VENTANA EXISTENTE	M2	1	33.034,00	$ 39.641	8,20	270.879,00	7	0	231.238,00
150511	PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]	PTO	8	77.724,00	$ 621.792	8,00	621.792,00		0	-
100312	DEMOL. MESON CONCRETO	M2	24	45.750,00	$ 1.098.000	30,00	1.372.500,00	6	0	274.500,00
100516	DESM.POZUELO ACERO INOX.	UN	3	24.026,00	$ 72.078	6,00	144.156,00	3	0	72.078,00
APU 1	DESMONTE RED DE GAS EN 3/4 GALVANIZADO	ML	10	32.569,00	$ 325.690	10,00	325.690,00		0	-
	SUBTOTAL			-	$ 11.529.631					
	ENCHAPES Y ACABADOS									
200102	ALISTADO PISO 5 CM	M2	277	46.065,00	$ 12.760.005	277,00	12.760.005,00	0	0	-
190524	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD (pisos)	M2	277	86.169,00	$ 23.868.813	277,00	23.868.813,00	0	0	-
190106	REPELLO MURO 1:2 (muros)	M2	205	36.478,00	$ 7.459.751	239,50	8.736.481,00	35	0	1.276.730,00
290101	RELLENO LISTO EXTERIOR MUROS	M2	151	22.436,00	$ 3.394.567	216,30	4.852.907,00	65	0	1.458.340,00
290109	ESTUCO ACRLICO (columnas)	M2	167	28.000,00	$ 4.684.400	213,30	5.972.400,00	46	0	1.288.000,00
190524	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD muros (cocina-	M3	122	86.169,00	$ 10.469.975	121,51	10.469.975,00	0	0	-
140118	MURO LADRILLO CONCRETO #10 9.7x 6 x20	M2	51	100.905,00	$ 5.095.703	50,50	5.095.703,00	0	0	-
290619	KORAZA [3M]	M2	450	15.333,00	$ 6.899.850	822,00	12.603.726,00	372	0	5.703.876,00
	SUBTOTAL			-	$ 74.633.064					
	INSTALACIONES VARIAS									
250450	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	JGO	2	882.103,00	$ 1.764.206	3,00	2.646.309,00	1	0	882.103,00
160801	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	9	70.935,00	$ 638.415	25,00	1.773.375,00	16	0	1.134.960,00
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	9	102.065,00	$ 918.585	9,00	918.585,00	0	0	-
223004	MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304	ML	53	1.085.686,00	$ 57.893.794	59,32	64.407.910,00	6	0	6.514.116,00
250525	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA	UND	9	138.045,00	$ 1.242.405	9,00	1.242.405,00	0	0	-
250517	GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	2	58.119,00	$ 116.238	2,00	116.238,00	0	0	-
250712	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATA	UND	2	313.165,00	$ 626.330	2,00	626.330,00	0	0	-
APU 2	LAVA OLLAS DE PISO ENCHAPADO ,80X80CM CON PATA	UND	1	492.440,00	$ 492.440	1,00	492.440,00	0	0	-
250709	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	2	174.357,00	$ 348.714	6,00	1.046.142,00	4	0	697.428,00
APU 3	Tubería Hierro Galvanizado (HG) SCH-40 1/2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	ML	68	84.679,00	$ 5.758.172	68,00	5.758.172,00	0	0	-
APU 4	Punto de gas en cobre (Cu) 1/2" tipo L, tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.	UN	9	762.109,00	$ 6.858.981	9,00	6.858.981,00	0	0	-
	SUBTOTAL			-	$ 76.658.280					

	CERRAJERIA									
240208	DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO [->]	M2	53	136.853,00	$ 7.212.153	52,70	7.212.153,00	0	0	-
221805	REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2"x1,1/2" (reja seguridad)	M2	4	361.001,00	$ 1.451.224	4,02	1.451.224,00	0	0	-
221012	VENTANA ALUM.BASCULANTE P.38-31	M2	6	437.500,00	$ 2.537.500	5,80	2.537.500,00	0	0	-
222803	REJA SEGURIDAD ANGULO 1.1/ 8-MALLA #10 (comedor)	M2	50	166.989,00	$ 8.265.956	49,50	8.265.956,00	0	0	-
222803	REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2¨X1,1/2" <0,50M	M2	25	292.435,00	$ 7.310.875	25,00	7.310.875,00	0	0	-
220313	NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR. (puertas)	M2	2	416.223,00	$ 707.579	1,70	707.579,00	0	0	-
220405	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE (puertas)	UND	1	269.302,00	$ 269.302	1,00	269.302,00	0	0	-
290407	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	3	16.773,00	$ 57.028	38,40	644.083,00	35	0	587.055,00
290417	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	1	35.236,00	$ 35.236	9,00	317.124,00	8	0	281.888,00
	SUBTOTAL			-	$ 27.846.853					
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
170659	BALA PANEL LED 24W	UND	33	102.909,00	$ 3.395.997	33,00	3.395.997,00	0	0	-
170538	SALIDA S1 EMT	UND	45	187.571,00	$ 8.440.695	45,00	8.440.695,00	0	0	-
170725	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	4	266.073,00	$ 1.064.292	4,00	1.064.292,00	0	0	-
173002	TUBERIA EMT 1 1/4" (acometida)	ML	145	17.932,00	$ 2.600.140	145,00	2.600.140,00	0	0	-
173003	TUBERIA EMT 3/4	ML	229	20.052,00	$ 4.585.520	273,68	5.487.860,00	45	0	902.340,00
173012	ADAPTADOR EMT 3/4	UND	81	3.262,00	$ 264.222	96,00	313.152,00	15	0	48.930,00
173009	CURVA EMT 3/4	UND	72	4.173,00	$ 300.456	78,00	325.494,00	6	0	25.038,00
173006	UNION EMT 3/4	UND	186	6.540,00	$ 1.216.440	198,00	1.294.920,00	12	0	78.480,00
170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	543	7.700,00	$ 4.180.330	772,90	5.951.330,00	230	0	1.771.000,00
170724	SAL TOMA 120 EMT	UND	18	197.026,00	$ 3.546.468	18,00	3.546.468,00	0	0	-
170132	CABLE COBRE HF-ZH# 8	ML	313	15.532,00	$ 4.859.865	342,89	5.325.825,00	30	0	465.960,00
171212	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	3	318.248,00	$ 954.744	3,00	954.744,00	0	0	-
170910	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	3	373.436,00	$ 1.120.308	3,00	1.120.308,00	0	0	-
	SUBTOTAL			-	$ 36.529.477					
	CUBIERTA									
180441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM (cocina-comedor)	M2	175	107.247,00	$ 18.714.602	196,50	21.074.036,00	22	0	2.359.434,00
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	30	143.990,00	$ 4.319.700	30,00	4.319.700,00	0	0	-
180922	TEJA UPVC 3mm (extencion cubierta)	M2	9	84.000,00	$ 781.200	9,30	781.200,00	0	0	-
182020	PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.5MM C.16	ML	6	146.556,00	$ 908.647	6,20	908.647,00	0	0	-
150202	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	13	32.421,00	$ 421.473	13,00	421.473,00	0	0	-
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	40	143.990,00	$ 5.759.600	40,00	5.759.600,00	0	0	-
	SUBTOTAL			-	$ 30.905.222					
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA									
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	171	11.392,00	$ 1.950.310	171,20	1.950.310,00	0	0	-
140105	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M2	35	76.962,00	$ 2.693.670	35,00	2.693.670,00	0	0	-
200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	12	99.730,00	$ 1.196.760	12,00	1.196.760,00	0	0	-
140105	Muros en bloque estructural 12-24x24x12x6,5 cm, incluye mortero de pega . NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles	M2	30	275.300,00	$ 8.259.000	30,00	8.259.000,00	0	0	-
131114	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C	PTO	12	21.741,00	$ 260.892	12,00	260.892,00	0	0	-
130109	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KG	130	8.097,00	$ 1.052.610	130,00	1.052.610,00	0	0	-
	SUBTOTAL				$ 15.413.242					

	CERRAMIENTO										
100514	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	155	7.782,00	$ 1.206.210	155,00	1.206.210,00	0	0	-
100315	DEMOL.MURO LAD. SOGA	ML	121	5.034,00	$ 609.114	121,00	609.114,00	0	0	-
60810	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	75	22.668,00	$ 1.706.900	160,30	3.633.680,00	85	0	1.926.780,00
10215	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	63	1.242,00	$ 78.347	223,08	277.067,00	160	0	198.720,00
100619	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	62	42.058,00	$ 2.607.596	102,43	4.308.068,00	40,43159859	0	1.700.472,17
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	14	1.057.206,00	$ 14.748.024	13,95	14.748.024,00	0	0	-
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 240Mpa	KG	890	8.826,00	$ 7.855.140	2.243,28	19.251.368,00	1353,28427	0	11.944.086,96
130109	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KG	550	8.097,00	$ 4.453.350	1.535,00	12.428.895,00	985	0	7.975.545,00
173204	TUBO GALV 3 X3 MTS	UND	95	330.435,00	$ 31.391.325	95,00	31.391.325,00	0	0	-
300901	INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA	UND	62	23.943,00	$ 1.484.466	66,00	1.580.238,00	4	0	95.772,00
301105	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1,1/2"	ML	252	27.553,00	$ 6.943.356	297,00	8.183.241,00	45	0	1.239.885,00
301201	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	388	51.413,00	$ 19.922.538	387,50	19.922.538,00	0	0	-
300902	INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA	ML	388	19.605,00	$ 7.596.938	387,50	7.596.938,00	0	0	-
301211	CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS	ML	155	69.014,00	$ 10.697.170	155,00	10.697.170,00	0	0	-
	SUBTOTAL				$ 111.300.473					
	VARIOS									
100608	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	67	27.934	$ 1.871.582	129,00	3.603.485	62	0	1.731.911,86
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	419	2.947,00	$ 1.234.401	418,87	1.234.401,00	0	0	-
	SUBTOTAL				$ 3.105.983					
				TOTAL OBRAS	**$ 387.922.225,00**		456.043.680,00			68.121.455,00


TOTAL OBRAS CONTRACTUALES	**$ 387.922.225**
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	**$ 68.121.455**
VALOR TOTAL	**$ 456.043.680**

	ITEMS NO PREVISTOS LEGALIZADOS MEDIANTE OTROSI									
NP-1	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL EN CONCRETO CON DOBELAS EN GRAUTIN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M2		285.000,00				195		55.575.000
NP-2	ANCLAJE VARILLA DE REFUERZO 1/2	UN		18.000,00				750		13.500.000
NP-3	REFLECTORES 200W	UN		690.000,00				16		11.040.000
NP-4	TIMER 220 VOLTIOS	UN		150.000,00				2		300.000
NP-5	PACHA DE 2X20	UN		250.000,00				2		500.000
NP-6	SOPORTE POSTE DE REFLECTORES EN ESTRUCTURA METALICA A 4,5M	UN		2.450.000,00				2		4.900.000
NP-7	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI 0,60X0,60X,85	M3		1.348.139,70				2,30		3.105.000
NP-8	PLATINA DE ,30X,30 DE 0,4 MM	UN		145.000,00				4		580.000
NP-9	VIGA DE CORONA ,12X,15 CONCRETO 3000 PSI	ML		116.000,00				146		16.936.000
NP-10	COLUMNEAS 0,12X0,20X1,60 CONCRETO 3000 PSI	M3		1.057.206,00				2,45		2.590.155
NP-11	RECEBO COMPACTADP 90% PROCTOR MEJORAMIENTO DE PISO	M3		165.000,00				101,9		16.813.500
					SUBTOTAL					125.839.655

VALOR TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS	
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	**68.121.455,00**
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS (MAYORES CANTIDADES + NO PREVISTAS)	**125.839.655,00**
VALOR TOTAL	**193.961.110,00**
VALOR TOTAL CON OBRAS COMPLEMENTARIAS	**581.883.335,00**

En consecuencia, de lo anterior se declara recibo a satisfacción por parte de la Supervisión, y sin pendientes, el cumplimiento del objeto contractual con la formalización de la presente acta, y se realiza el RECIBO FINAL Y ENTREGA A SATISFACCIÓN del contrato de obra MP-2502-2023; se podrá iniciar el proceso de liquidación del contrato en cuestión.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BARBARA SEDE MIGUEL MERCADO

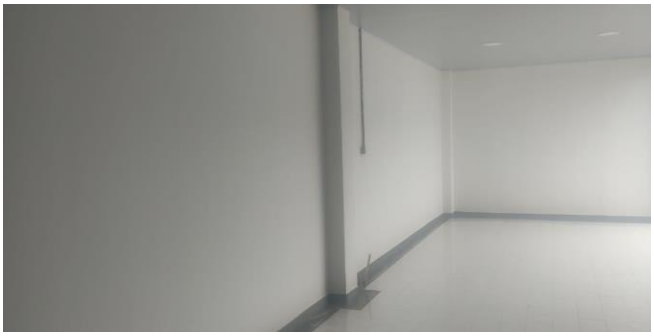



REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA-RODRIGO DE BASTIDAS.














REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEBASTIÁN DE BELALCÁZAR SEDE LA DOLORES.





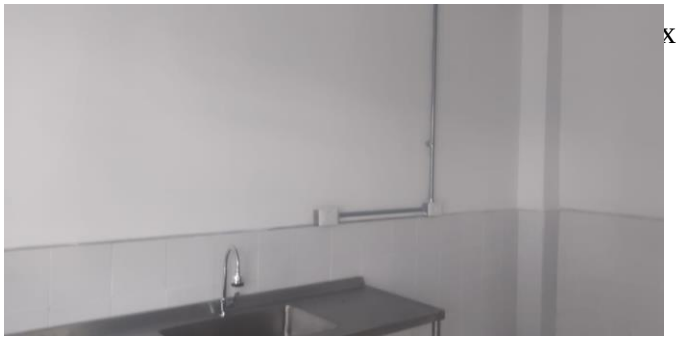

x





REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR SEDE PRINCIPAL.











REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TERESA CALDERÓN DE LASSO SEDE RAFAEL URIBE URIBE.





Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2023.

Leída la presente acta se somete a consideración y es aprobada por las partes, en constancia de lo anterior suscriben el acta de RECIBO FINAL Y ENTREGA A SATISFACCIÓN del contrato de obra:

FIRMAS:

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
CONTRATISTA

CARLOS EDUARDO GUENDICA
SUPERVISOR
ARQUITECTO – PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
