ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA		
NIT.	800102891-6		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S. R/L LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ		
NO IDENTIFICACIÓN	NIT No. 900.764.492-3		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO		
VALOR	OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($847.698.464) MDA. CTE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES		
PRORROGA NO 01	UN (1) MES		
TIEMPO TOTAL	CINCO (5) MESES		
INTERVENTOR	JAIME HERNANDO JAJOY Contrato de interventoría No. 007 del 28 de octubre de 2022		
SUPERVISOR	JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS		
FECHA DE INICIO	21 DE FEBRERO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE JUNIO DEL 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN NO 01:	24/05/2023	**PLAZO:**	30 DÍAS
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 A LA SUSPENSIÓN NO 01:	16/06/2023	**PLAZO:**	60 DÍAS
FECHA DE AMPLIACIÓN 02 A LA SUSPENSIÓN NO 01:	16/08/2023	**PLAZO:**	30 DÍAS
FECHA DE AMPLIACIÓN 03 A LA SUSPENSIÓN NO 01:	18/09/2023	**PLAZO:**	30 DÍAS
FECHA DE AMPLIACIÓN 04 A LA SUSPENSIÓN NO 01:	18/10/2023	**PLAZO:**	30 DÍAS
FECHA DE REINICIO NO 01:	14/11/2023		
FECHA DE PRORROGA NO 01:	11/12/2023	**PLAZO:**	30 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	10/01/2024		
PERIODO EJECUTADO	DESDE 15-12-2023 AL 26-12-2023		

En Mocoa a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2023, se reúnen Ing. **JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS,** Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal, en calidad de SUPERVISOR, **Ing. LUIS CARLOS SALAS RODRÍGUEZ** representante legal de la empresa **CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S**. y el Ing. **JAIME HERNANDO JAJOY**, identificado con NIT No 97472385-8, en calidad de **INTERVENTOR**, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO No 01					OBRA EJECUTADA EN ACTA DE RECIBO FINAL	
DESCRIPCION	**UN**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT EJE**	**V/R EJECUTADO**
1.0 PRELIMINARES						
1.10 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	M2	1.573,80	$ 3.137,000	$ 4.937.010,60	0,00	$ 0,00
2.0 EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS						
2.10 EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	854,02	$ 24.190,000	$ 20.658.743,80	0,00	$ 0,00
2.20 DEMOLICIONES DE PLACAS DE CONCRETO	M2	1.493,80	$ 48.428,000	$ 72.341.746,40	0,00	$ 0,00
2.30 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1.190,58	$ 34.682,000	$ 41.291.695,56	0,00	$ 0,00
3.0 ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO						
3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	M2	1.493,82	$ 14.366,000	$ 21.460.218,12	0,00	$ 0,00

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO No 01					OBRA EJECUTADA EN ACTA DE RECIBO FINAL	
DESCRIPCION	UN	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT EJE	V/R EJECUTADO
3.20 PEDRAPLÉN	M3	373,48	$ 110.517,370	$ 41.276.027,35	0,00	$ 0,00
3.30 SUBBASE GRANULAR	M3	298,75	$ 170.788,400	$ 51.023.034,50	0,00	$ 0,00
3.40 PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2	M3	218,18	$ 1.252.438,080	$ 273.256.940,29	31,05	$ 38.888.202,00
3.50 ACERO DE REFUERZO	KG	8.085,67	$ 11.122,000	$ 89.928.821,74	568,14	$ 6.318.854,00
3.60 JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO	ML	731,410	$ 18.939,150	$ 13.852.283,70	141,55	$ 2.680.837,00
3.70 SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	214,26000	$ 68.817,600	$ 14.744.858,98	57,00	$ 3.922.603,00
3.80 RECALCE POZOS DE INSPECCIÓN	UN	4,00	$ 523.446,000	$ 2.093.784,00	0,00	$ 0,00
4.0 ALCANTARILLADO PLUVIAL						
4.10 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	30,16	$ 34.808,000	$ 1.049.809,28	0,00	$ 0,00
4.20 SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE ACERO	UN	5,00	$ 2.223.513,000	$ 11.117.565,00	2,00	$ 4.447.026,00
4.30 CÁMARAS DE 2X2 DESDE H=1,00M HASTA H= 1,75M	UN	2,00	$ 5.304.015,000	$ 10.608.030,00	0,00	$ 0,00
4.40 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	136,51	$ 142.790,950	$ 19.492.392,58	0,00	$ 0,00
4.50 ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN	M3	16,50	$ 68.963,000	$ 1.137.889,50	0,00	$ 0,00
4.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 10"	ML	23,90	$ 109.428,000	$ 2.615.329,20	0,00	$ 0,00
4.70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 20"	ML	79,00	$ 429.544,000	$ 33.933.976,00	0,00	$ 0,00
ITEM NO PREVISTOS						
DEMOLICIÓN MANUAL DE ANDES (INCLUYE CORTES Y RETIRO DE MATERIAL)	M2	34,94	$ 49.750,48	$ 1.738.281,77	34,94	$ 1.738.282,00
REPOSICIÓN DE ANDENES	M2	34,94	$ 102.654,50	$ 3.586.748,23	34,94	$ 3.586.748,00
PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2 CON ACELERANTE	M3	50,72	$ 1.535.946,10	$ 77.903.186,19	11,84	$ 59.717.584,00
DEMOLICIÓN MANUAL CONCRETO REFORZADO	M3	0,74	$ 878.502,50	$ 650.091,85	0,00	$ 650.092,00
TOTAL COSTOS OBRA				**$ 810.698.464,00**		**$ 79.768.154,0**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 16.000.000,00		$ 2.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 16.000.000,00		$ 2.000.000,00
PLAN DE ATENCIÓN COVID 19				$ 5.000.000,00		$ 1.000.000,00
TOTAL, PLANES				$ 37.000.000,00		$ 5.000.000,00
COSTO TOTAL OBRA				**$ 847.698.464,00**		**$ 84.768.154,00**

Así mismo, el interventor se certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de ley con los aportes a seguridades sociales y parafiscales a las entidades a las que está obligado a aportar.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 847.698.464,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO	**$ 847.698.464,00**
V/R GIRADO EN CALIDAD DE PAGO ANTICIPADO OBRA	$ 0,00
V/R TOTAL PAGADO SEGÚN ACTA PARCIAL No 01	**$ 438.850.123,00**
V/R TOTAL PAGADO SEGÚN ACTA PARCIAL No 02	**$ 324.080.187,00**
V/R TOTAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	**$ 84.768.154,00**
V/R A GIRAR DE ACTA DE RECIBO FINAL	**$ 84.768.154,00**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR OBRA	$ 0,00

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Mocoa Putumayo, por los que en ella intervinieron.

JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Supervisor

LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S.
Contratista de Obra

JAIME HERNANDO JAJOY
Interventor

Elaboro: JAIME HERNANDO JAJOY

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102861-6
SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Alma Corazón y Vida
Alcaldía de Mocoa

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. :	CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 847.698.464 — OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MDA. CTE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S.
INTERVENTOR:	Ing. HENRY ANDRES CORREA OBANDO
SUPERVISOR(A):	ING. JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS

FECHA PRESENTE ACTA:	26 de Diciembre de 2023	
PERIODO ACTA:	DESDE 15-12-2023 AL 26-12-2023	
PLAZO INCIAL :	4 MESES	
PRORROGA No 01:	1 MES	
FECHA DE INICIO 1:	21/07/2023	
FECHA DE TERMINACION No 01:	20/06/2023	
FECHA DE SUSPENSION No 01:	PLAZO: 30 DIAS — 24/05/2023	
FECHA DE AMPLIACION 01 A LA SUSPENSIÓN No1	PLAZO: 60 DIAS — 16/06/2023	
FECHA DE AMPLIACION 02 A LA SUSPENSIÓN No1	PLAZO: 30 DIAS — 16/08/2023	
FECHA DE AMPLIACION 03 A LA SUSPENSIÓN No1	PLAZO: 30 DIAS — 18/09/2023	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 847.698.464,00
VALOR COBRADO ACTA PARCIAL No 01:		$ 438.850.123,00
VALOR COBRADO ACTA PARCIAL No 02:		$ 324.080.187,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:		$ 84.768.154,00
VALOR POR EJECUTAR:		$ 0,00
AMPLIACION 04 A LA SUSPENSIÓN No1	PLAZO: 30 DIAS	18/10/2023
FECHA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No 01:		14/11/2023
FECHA DE PRORROGA No 01	PLAZO: 30 DIAS	11/12/2023
FECHA DE TERMINACION		10/01/2024

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No. 01 DE FECHA 17/11/2023		ACTA PARCIAL No 01 DEL 13 DE JUNIO DE 2023		ACTA PARCIAL No 02 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023		EJECUCION PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1,00	PRELIMINARES														
1,10	LOCALIZACION Y REPLANTEO.	M2	1.581,74	$ 3.137,000	$ 4.961.918,00	1.573,80	$ 4.937.010,60	916,80	$ 2.876.002,00	657,00	$ 2.061.009,00	-	$ 0,00	1.573,80	$ 4.937.011,00
2,00	EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS														
2,10	EXCAVACION A MAQUINA	M3	840,76	$ 24.190,000	$ 20.337.984,00	854,02	$ 20.658.743,80	412,57	$ 9.980.068,00	441,45	$ 10.678.676,00	-	$ 0,00	854,02	$ 20.658.744,00
2,20	DEMOLICIONES DE PLACAS DE CONCRETO	M2	1.581,74	$ 48.428,000	$ 76.600.505,00	1.493,80	$ 72.341.746,40	916,80	$ 44.398.790,00	577,00	$ 27.942.956,00	-	$ 0,00	1.493,80	$ 72.341.746,00
2,30	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES	M3	1.295,45	$ 34.682,000	$ 44.928.797,00	1.190,58	$ 41.291.695,56	730,25	$ 25.326.531,00	460,33	$ 15.965.165,00	-	$ 0,00	1.190,58	$ 41.291.696,00
3,00	ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO														
3,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	M2	2.304,72	$ 14.366,000	$ 33.109.608,00	1.493,82	$ 21.460.218,12	916,82	$ 13.171.036,00	577,00	$ 8.289.182,00	-	$ 0,00	1.493,82	$ 21.460.218,00
3,20	PEDRAPLEN	M3	454,76	$ 110.517,370	$ 50.258.879,00	373,48	$ 41.276.027,35	229,23	$ 25.333.897,00	144,25	$ 15.942.131,00	-	$ 0,00	373,48	$ 41.276.027,00
3,30	SUBBASE GRANULAR	M3	316,73	$ 170.786,400	$ 54.093.810,00	298,75	$ 51.023.034,50	183,35	$ 31.314.053,00	115,40	$ 19.708.981,00	-	$ 0,00	298,75	$ 51.023.034,00
3,40	PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2	M3	284,72	$ 1.252.438,080	$ 356.594.170,00	218,18	$ 273.256.940,29	165,03	$ 206.689.856,00	22,10	$ 27.678.882,00	31,05	$ 38.888.202,00	218,18	$ 273.256.940,00
3,50	ACERO DE REFUERZO	KG	4.663,12	$ 11.122,000	$ 51.863.221,00	8.085,67	$ 89.928.821,74	4.249,69	$ 47.265.052,00	3.267,84	$ 36.344.916,00	568,14	$ 6.318.854,00	8.085,67	$ 89.928.822,00
3,60	JUNTAS DE EXPANSION Y SU RESPECTIVO SELLADO	ML	292,30	$ 18.939,150	$ 5.535.914,00	731,410	$ 13.852.283,70	237,33	$ 4.494.828,00	352,53	$ 6.676.619,00	141,55	$ 2.680.837,00	731,41	$ 13.852.284,00
3,70	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	338,64	$ 68.817,600	$ 23.304.392,00	214,26000	$ 14.744.858,98	75,26	$ 5.179.213,00	82,00	$ 5.643.043,00	57,00	$ 3.922.603,00	214,26	$ 14.744.859,00
3,80	RECALCE POZOS DE INSPECCION	UN	4,00	$ 523.446,000	$ 2.093.784,00	4,00	$ 2.093.784,00	1,00	$ 523.446,00	3,00	$ 1.570.338,00	-	$ 0,00	4,00	$ 2.093.784,00
4,00	ALCANTARILLADO PLUVIAL														
4,10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	34,09	$ 34.808,000	$ 1.186.605,00	30,16	$ 1.049.809,28	6,23	$ 216.854,00	23,93	$ 832.955,00	-	$ 0,00	30,16	$ 1.049.809,00
4,20	SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE ACERO	UN	5,00	$ 2.223.513,000	$ 11.117.565,00	5,00	$ 11.117.565,00	1,00	$ 2.223.513,00	2,00	$ 4.447.026,00	2,00	$ 4.447.026,00	5,00	$ 11.117.565,00
4,30	CAMARAS DE 2X2 DESDE H=1,00M HASTA H= 1,75M	UN	3,00	$ 5.304.015,000	$ 15.912.045,00	2,00	$ 10.608.030,00	-	$ 0,00	2,00	$ 10.608.030,00	-	$ 0,00	2,00	$ 10.608.030,00
4,40	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	107,72	$ 142.790,950	$ 15.381.441,00	136,51	$ 19.492.392,58	2,09	$ 298.433,00	134,42	$ 19.193.959,00	-	$ 0,00	136,51	$ 19.492.392,00
4,50	ARENA DE BASE PARA NIVELACION	M3	19,41	$ 68.963,000	$ 1.338.572,00	16,50	$ 1.137.889,50	0,91	$ 62.756,00	15,59	$ 1.075.133,00	-	$ 0,00	16,50	$ 1.137.890,00
4,60	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 10"	ML	30,00	$ 109.428,000	$ 3.282.840,00	23,90	$ 2.615.329,20	9,10	$ 995.795,00	14,80	$ 1.619.534,00	-	$ 0,00	23,90	$ 2.615.329,00
4,70	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 20"	ML	80,32	$ 429.544,000	$ 38.796.414,00	79,00	$ 33.933.976,00	-	$ 0,00	79,00	$ 33.933.976,00	-	$ 0,00	79,00	$ 33.933.976,00
ITEM NP	ITEM NO PREVISTOS														
INP 1	DEMOLICION MANUAL DE ANDES (INCLUYE CORTES Y RETIRO DE MATERIAL)	M2		$ 49.750,48		34,94	$ 1.738.281,77			-	$ 0,00	34,94	$ 1.738.282,00	34,94	$ 1.738.282,00
INP2	REPOSICION DE ANDENES	M2		$ 102.654,50		34,94	$ 3.586.748,23			-	$ 0,00	34,94	$ 3.586.748,00	34,94	$ 3.586.748,00
INP3	PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2 CON ACELERANTE	M3		$ 1.535.946,10		50,72	$ 77.903.186,19			38,88	$ 59.717.584,00	11,84	$ 18.185.602,00	50,72	$ 77.903.186,00
INP 4	DEMOLICION MANUAL CONCRETO REFORZADO	M3		$ 878.502,50		0,74	$ 650.091,85			0,740	$ 650.092,00		$ 0,00	0,74	$ 650.092,00
				TOTAL COSTOS OBRA	$ 810.698.464,00		$ 810.698.464,00		$ 420.350.123,00		$ 310.580.187,00		$ 79.768.154,0		$ 810.698.464,00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 16.000.000,00		$ 16.000.000,00		$ 8.000.000,00		$ 6.000.000,00		$ 2.000.000,0		$ 16.000.000,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 16.000.000,00		$ 16.000.000,00		$ 8.000.000,00		$ 6.000.000,00		$ 2.000.000,0		$ 16.000.000,00
				PLAN DE ATENCION COVID 19	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00		$ 2.500.000,00		$ 1.500.000,00		$ 1.000.000,0		$ 5.000.000,00
				TOTAL PLANES	$ 37.000.000,00		$ 37.000.000,00		$ 18.500.000,00		$ 13.500.000,00		$ 5.000.000,0		$ 37.000.000,00
				COSTO TOTAL OBRA	$ 847.698.464,00		847.698.464		$ 438.850.123,00		$ 324.080.187,00		$ 84.768.154,0		$ 847.698.464,00

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	10,00%
PORCENTAJE FINAL DE AVANCE FISICO OBRA	100,00%
PORCENTAJE FINAL DE AVANCE FINANCIERO	100,00%
VALOR COBRADO EN ACTA PARCIAL No 01 DEL 13 DE JUNIO DE 2023	$ 438.850.123,00
VALOR COBRADO EN ACTA PARCIAL No 02 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 324.080.187,00
VALOR EJECUTADO A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 84.768.154,00
VALOR NETO A PAGAR	$ 84.768.154,00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

LUIS CARLOS SOLIS RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. JAIME HERNANDO JAJOY
INTERVENTOR DE OBRA

Ing. JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de obra e Infraestructuray gestion del riesgo de desastres municipal
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.

MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Secretaría de Obras e Infraestructura y Gestion del Riesgo de desastres Municipal

Alcaldía de Mocoa

CANTIDADES DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO



CAPITULO:	**2,00**	**ESTRUCTURA PAVIMENTO**							**UNIDAD**		**M3**
ITEM	2,40	PLACA EN CONCRETO MR 40 KG/CM2 E=18CM									
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**REFER**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**	**CANT. EJECUTADA**
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**	
CALLE 11A FRENTE TERMINAL Y PARTE DE LA PLAZA DE MERCADO BARRIO BOLIVAR											
ENTRE k0+039 Y k0+040	1,00	7,30	0,18		1,31						1,31
k0+050	10,00	7,20	0,18		12,96						12,96
k0+060	10,00	7,20	0,18		12,96						12,96
k0+070	2,95	7,20	0,18		3,82						3,82
										TOTAL	**31,05**

Firma.
LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Firma.
Ing. JAIME HERNANDO JAJOY
CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.
MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Secretaría de Obras e Infraestructura y Gestion del Riesgo de desastres Municipal

Alcaldía de Mocoa

CANTIDADES DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO



CAPITULO:	**2,00**	**ESTRUCTURA PAVIMENTO**	**UNIDAD**	**KG**
ITEM	2,50	ACERO DE REFUERZO		

CALLE 11A FRENTE TERMINAL Y PARTE DE LA PLAZA DE MERCADO BARRIO BOLIVAR

DESCRIPCIÓN	PASADORES DE CARGA								CANASTILLA DE SOPORTE DE REFUERZO TRANSVERSAL				
	Ancho Via	DIS REFUERZO	Diam Pulgada	PESO MAT	UNXTRAMO	ML PASAD	CANT	PESO TOTAL	Diam	PESO MAT	ML X TRAMO	W	PESO TOTAL
	(M)	(M)		Kg	UN	m	un	Kg	MM	Kg	Kg		
	7,20	0,30	1	4,08	8,00	0,45	20,00	**293,76**	6,4 MM	0,25	83,20	**20,80**	**314,56**
												SUB TOTAL	**314,56**

DESCRIPCIÓN	PESO DEL ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL POR LONGITUD DE VIA											
	Ancho Via	LONG DE VIA	DIS. REF. (G)	LONG REF	UN EJE	ML	Diam	W.m: peso material x ml	DIST. CORTE (D.C)	UNIDADES CORTE	PESO KILOS X CORTE TRANSV.	PESO TOTAL
	(M)	(M)	(M)	(M)	UN	m	Pulg			UN		
		45,00	0,80	0,75	57,25	43	5/8	**1,55**		1,00		**64,71**
											SUB TOTAL	**64,71**

	TIPO	LONG SARDINEL	DIS. REF. (G)	LONG REF EN X	LONG REF EN Y	CANT	Diam	W.m: peso material x ml	PESO TOTAL
		(M)	(M)	(M)	UN	UN	Pulg		
BORDILLOS									-
FRENTE A PLAZA DE MERCADO		57		57,00		2,00	1/2	**1,00**	114,00
	GANCHOS		0,30	0,70		191,00	3/8	**0,56**	74,87
								SUB TOTAL	**188,87**
									SUB TOTAL **568,14**

Firma.
LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Firma.
Ing. JAIME HERNANDO JAJOY
CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.
MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Secretaría de Obras e Infraestructura y Gestion del Riesgo de desastres Municipal

Alcaldía de Mocoa

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**2,00**	**ESTRUCTURA PAVIMENTO**							**UNIDAD**	**ML**
ITEM	2,60	JUNTAS DE EXPANSION Y SU RESPECTIVO SELLADO								
								ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL		
DESCRIPCIÓN	**Ancho Via**	**LONG DE VIA**	**DIS. REF. (G)**	**LONG REF**	**UN CORTES**	**W.m: peso material x ml**		**DIST. CORTE (D.C)**	**No. De cortes con acero:**	**LONG TOTAL**
	(M)	**(M)**	**(M)**	**(M)**	**UN**				**UN**	
CALLE 11A FRENTE TERMINAL Y PARTE DE LA PLAZA DE MERCADO BARRIO BOLIVAR										
k0+010 AL K0+090		45,00								45,00
	7,20				11,16					80,35
	9,20				1,00					9,20
	ESQUINA				7,00					7,00
	8,10				2,00					
				SUB TOTAL						**141,55**

Firma.
LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Firma.
Ing. JAIME HERNANDO JAJOY
CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.
MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Secretaría de Obras e Infraestructura y Gestion del Riesgo de desastres Municipal

Alcaldía de Mocoa

CANTIDADES DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO



CAPITULO:	**2,00**	**ESTRUCTURA PAVIMENTO**	**UNIDAD**	**ML**
ITEM	2,70	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI		

DESCRIPCIÓN					ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL POR CORTE			
	Ancho Via	LONG DE SARDINEL	UNIDADES	LONG REF	DIST. CORTE (D.C)	No. De cortes con acero:	PESO KILOS X CORTE TRANSV.	LONG TOTAL
	(M)	(M)	(UN)	(M)		UN		
CALLE 11A FRENTE TERMINAL Y PARTE DE LA PLAZA DE MERCADO BARRIO BOLIVAR	IZQUIERDA	30,00						30,00
	DERECHA	27,00						27,00
							SUB TOTAL	**57,00**

Firma.
LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA


Firma.
Ing. JAIME HERNANDO JAJOY
CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.
MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Secretaría de Obras e Infraestructura y Gestion del Riesgo de desastres Municipal

Alcaldía de Mocoa

REGISTRO FOTOGRAFICO

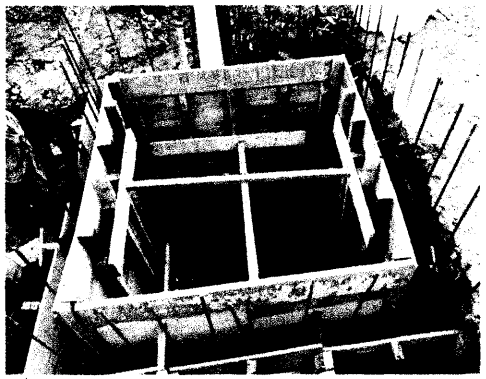

CANTIDADES DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**4,00**	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**				**UNIDAD**		**M2**
ITEM	4,20	SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE ACERO						
DESCRIPCIÓN		**SUMIDEROS**						**CANT. EJECUTADA**
		(M)			**(M)**			
TRAMO	**largo**	**Ancho**	**UN**	**espesor**	**Ancho**			
TERMINAL			2,00					2,00
							TOTAL	**2,00**

Firma.
LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Firma.
Ing. JAIME HERNANDO JAJOY
CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.

MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA

Secretaría de Obras e Infraestructura y Gestion del Riesgo de desastres Municipal

Alcaldía de Mocoa

CANTIDADES DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**ITEM NP**	**ITEM NO PREVISTOS**								**UNIDAD**		**M2**
ÍTEM	INP 1	DEMOLICION MANUAL DE ANDES (INCLUYE CORTES Y RETIRO DE MATERIAL)										
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**REFER**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**	**CANT. EJECUTADA**
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**			**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**	
ANDEN DERECHO SENTIDO NORTE ANTES DE ENTRADA TERMINL	26,00	0,35		9,10								9,10
ANDEN IZQUIERDO SENTIDO NORTE ANTES DE ENTRADA TERMINL	45,00	0,35		15,75								15,75
ANDEN DERECHO SENTIDO NORTE DESPUES DE ENTRADA TERMINAL	25,39	0,35		8,89								8,89
DEMOLICION ENTRADA VVIENDA FAMILIAR	1,20	1,00		1,20								1,20
											TOTAL	**34,94**

Firma.
LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Firma.
Ing. JAIME HERNANDO JAJOY
CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.

MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA

Secretaría de Obras e Infraestructura y Gestion del Riesgo de desastres Municipal

Alcaldía de Mocoa

CANTIDADES DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	ITEM NP	ITEM NO PREVISTOS								UNIDAD		M2
ÍTEM	INP 2	REPOSICION DE ANDENES										
DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	Espesor o Altura	AREA	VOL	CANT.	REFER	Can-X	Can-Y	Diam	Peso x ML	CANT. EJECUTADA
	(M)	(M)	(M)	M2	(M3)			Un	Un	Pulg	Kg	
ANDEN DERECHO SENTIDO NORTE ANTES DE ENTRADA TERMINL	26,00	0,35		9,10								9,10
ANDEN IZQUIERDO SENTIDO NORTE ANTES DE ENTRADA TERMINL	45,00	0,35		15,75								15,75
ANDEN DERECHO SENTIDO NORTE DESPUES DE ENTRADA TERMINAL	25,41	0,35		8,89								8,89
DEMOLICION ENTRADA VVIENDA FAMILIAR	1,20	1,00		1,20								1,20
											TOTAL	34,94

Firma.
LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Firma.
Ing. JAIME HERNANDO JAJOY
CONTRATISTA INTERVENTORIA


CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.
MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Secretaría de Obras e Infraestructura y Gestion del Riesgo de desastres Municipal

Alcaldía de Mocoa

CANTIDADES DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

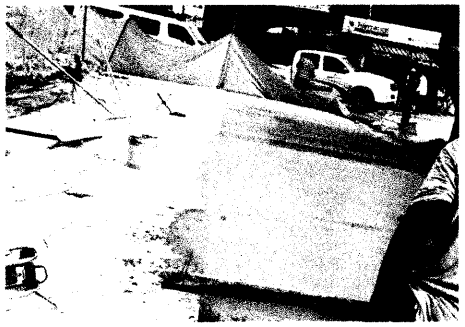

CAPITULO:	**ITEM NP**	**ITEM NO PREVISTOS**								**UNIDAD**	**M3**
ITEM	INP 3	PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2 CON ACELERANTE									
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**		**CANT. EJECUTADA**
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**Un**	**Pulg**	**Kg**		
CALLE 11A FRENTE TERMINAL Y PARTE DE LA PLAZA DE MERCADO BARRIO BOLIVAR											
k0+020	10,00	0,10	0,18		0,18						0,18
k0+039	9,00	7,20	0,18		11,66						11,66
										TOTAL	**11,84**

Firma.
LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Firma.
Ing. JAIME HERNANDO JAJOY
CONTRATISTA INTERVENTORIA
