Rad #: 2023-013136-E
Fecha: 2023-12-28 10:15:54
Folios: 91
Anexo: INFORME MENSUAL N 14 Y 15 DEL CONTRATO DE OBRA 543 DE 2022 REC PRESENCIAL ADJUNTAN UNA CARPETA CON 222 FOLIOS

9602

9602

Alcaldía de Madrid

Inter 899999325

Polideportivo Madrid

Madrid - Cundinamarca, 28 de Diciembre de 2023

Ingeniero:
HOLLMAN JOVANNY MENDEZ GONZALEZ
Secretario de infraestructura y servicios públicos
Alcaldía Madrid – Cundinamarca
Calle 5 No 4 – 74

CIM 0092-2023

REFERENCIA: INFORME MENSUAL No 14 y 15 DEL CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA".

Respetado Ingeniero

Por medio de la presente me permito remitir los informes mensuales No 14 que corresponde al periodo del 01 al 31 de Octubre de 2023 e informe mensual No 15 que corresponde al periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 del contrato de obra 543 – 2022

Lo anterior para fines pertinentes.

Cordialmente,

ZULAY YADIRA VASQUES PINO
R/L **UNIÓN TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022**
NIT 901.580.791-3

FOLIOS 222

Bogotá, 27 de Diciembre de 2023

Señores

ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO
UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022
Representante Legal.
Centro Comercial Bolivar OF. A10
Cucuta – Norte de Santander

ASUNTO: GCS-MAD-CO-543-075, INFORME MENSUAL No. 14 – OCTUBRE E INFORME MENSUAL No. 15 – NOVIEMBRE

REFERENCIA: CONTRATO No 543 de 2022, "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se remite los informes de obra mensual No.14 y 15 correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre para su respectiva revisión y aval, el cual contiene el informe de obra, SST con sus respectivos anexos

Agradezco la atención prestada, quedo

atento a su respuesta.Atentamente,

GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
C. C. No. 1.126.001.358 de Londres (ING)
Tarjeta Profesional No.25202-252504 CND
NIT: 900.653.937-2

Recibí
27 DIC 2023

INFORME MENSUAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

INFORME TECNICO No. 14

01 – 31 OCTUBRE 2023

MADRID, CUNDINAMARCA

2023

MADRID – CUNDINAMARCA

INFORME TECNICO No. 14

PERIODO: COTUBRE 01 DE 2023 – OCTUBRE 31 DE 2023

"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"

Elaboró: DIANA MARIA OLAYA ORTIZ	**Revisó:** DANIEL CAMILO PRADA MILLAN	**Revisó y aprobó:** JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
Cargo: Ing. Auxiliar	**Cargo:** Ing. Residente	**Cargo:** Representante Legal
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: 7/11/23	**Fecha:** 13/11/23	**Fecha:** 17/11/23

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 4
3. LOCALIZACIÓN 4
4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA 5
5. INFORME TECNICO 7
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
5.1.1. Valor de Actividades por Frentes 9
5.1.2. Porcentaje por Frentes 10
5.2. REGISTRO PERSONAL 12
5.2.1. PERSONAL 12
5.3. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO 13
5.4. DISEÑOS 13
5.5. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS 14
5.6. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA 14
5.7. REPORTE MULTAS Y SANCIONES 14
5.8. POLIZAS DEL CONTRATISTA 14
5.9. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO 15
5.10. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 15
5.11. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA 15
5.12. AFECTACIONES 16
5.12.1. CONDICIONES CLIMATICAS 16
5.12.2. VANDALISMO 16
6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS 16
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 17
7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN 17
7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS 21
7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA 21
7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS 29
8. CONCLUSIÓN 37

1. INTRODUCCIÓN

La alcaldía de Madrid - Cundinamarca, concluyo contratar a GCS CONTRUCCIONES S.A.S para la ejecución de las actividades establecidas en el contrato No 543 de 2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**

El presente informe surge de la rendición de cuentas para la entidad contratante y consigna todas las actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato, cumpliendo con los aspectos técnicos y contractuales.

2. OBJETIVO

Generar un informe de rendición de cuentas del contrato de obra No. 543 de 2022, dando cumplimiento a las condiciones generales establecidas en el contrato según los requerimientos y observaciones realizadas por parte de la Interventoría y Supervisión.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Madrid. Para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**



Coordenadas 4°43'50"N 74°15'50"O

4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	CO- 543 - 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MADRID (CUNDINAMARCA) NIT 899.999.325-8
CONTRATISTA	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.653.937-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
DIRECCIÓN	Calle 134 # 13-66
TELÉFONO	275 94 30
CORREO ELECTRÓNICO	gcs.contrucciones@hotmail.com
ACTA DE INICIO OBRA	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	MARTES 31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	LUNES 30 DE ENERO DE 2023
FECHA SUSPENSIÓN No.1	30 DICIEMBRE 2022
DURACIÓN SUSPENSIÓN No.1	UN (01) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.1	30 ENERO 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.1	02 MARZO 2023
FECHA SUSPENSIÓN No.2	21 FEBRERO 2023
DURACIÓN SUSPENSIÓN No.2	UN (01) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.2	21 MARZO 2023

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.2	30 MARZO 2023
PLAZO PRORROGA No.1	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1	30 MAYO 2023
PLAZO PRORROGA No.2	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2	30 JUNIO 2023
FECHA SUSPENSIÓN No.3	27 JUNIO 2023
DURACIÓN SUSPENSIÓN No.3	UN (1) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.3	27 JULIO 2023
AMPLIACIÓN No.1 SUSPENSIÓN No.3	UN (1) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.3 DE ACUERDO A AMPLIACIÓN No.1	27 AGOSTO 2023
AMPLIACIÓN No.2 SUSPENSIÓN No.3	QUINCE (15) DIAS
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.3 DE ACUERDO A AMPLIACIÓN No.2	11 SEPTIEMBRE 2023
AMPLIACIÓN No.3 SUSPENSIÓN No.3	DIEZ (10) DIAS
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.3 DE ACUERDO A AMPLIACIÓN No.3	21 SEPTIEMBRE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.3	24 SEPTIEMBRE 2023
PLAZO PRORROGA No.3	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.3	24 NOVIEMBRE2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.404.922.142,00 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

VALOR ADICIÓN No.1 POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$331.046.236 TRECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
VALOR ADICIÓN No.2 POLIDEPORTIVO ESCALLON POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$897.459.080,83 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.
VALOR TOTAL CON ADICIÓN No.1 Y No.2	$ 5.633.427.458,83 CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

5. INFORME TECNICO

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el transcurso del mes de OCTUBRE se llevaron a cabo las siguientes actividades de acuerdo a los diferentes frentes de trabajo:

A. Frente polideportivo del barrio Escallón:

Inicio de actividades: **16 de junio 2022**

- Excavación manual
- Acometida sanitaria
- Desmonte marco, puerta y parque infantil
- Desmonte de canales
- Bordillo en concreto

- Celosía angular para estructura de la cubierta de las graderias
- Baldosa cerámica piso – pared para los baños
- Remates Bocel Wing

B. Frente polideportivo del barrio San Luis:

Inicio de actividades: **22 de junio 2022**

- No se registran actividades para este frente en el transcurso del mes de OCTUBRE 2023

C. Frente polideportivo del barrio La Magnolia:

Inicio de actividades: **20 Julio 2022**

- Placa base en concreto
- Refuerzo malla electrosoldada
- Subbase granular
- Estuco
- Demolición placa piso
- Pañete liso muros
- Celosía tubular para el cerramiento
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento graderia
- Marcos y puertas para baños
- Desmonte aparatos parque infantil
- Baldosa cerámica piso – pared
- Estuco
- Placa Entrepiso lamina colaborante

D. Frente polideportivo barrio San Carlos

Inicio de actividades: **12 agosto 2022**

- Demolición muros
- Esmalte sobre lamina lineal y lamina llena
- Baranda metálica

- Instalación conexiones eléctricas
- Mantenimiento de placa en concreto
- Mantenimiento de graderías
- Pañete liso muros
- Anticorrosivo sobre lamina lineal y lamina llena para la estructura del parque infantil
- Pintura epóxica
- Dados en concreto
- Rehabilitación y limpieza estructura parque infantil
- Canal en lamina galvanizada cal 18; DS=100
- Pintura para fachada tipo koraza
- Marco y puerta

5.1.1. Valor de Actividades por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 1.137.922.029,00
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 1.726.304.623,93
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 1.754.400.300,07
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 1.014.800.505,83
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 5.633.427.458,83**

5.1.1.1. Valor de Actividades Ejecutadas por frente en el periodo del presente informe

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 77.933.639,28
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 129.646.251,25
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 0
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 211.118.663,75

5.1.1.2. Valor de Actividades Ejecutadas por frente acumulado

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 1.026.691.641,74
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 1.400.446.920,84
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 1.263.508.355,54
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 647.227.940,23

5.1.1.3. Valor de Actividades Ejecutadas General del proyecto

VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	**$ 418.698.554,27**
VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	**$ 4.337.874.858,35**

5.1.2. Porcentaje por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	20,20%
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	30,64%
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	31,14%
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	18,01%
	% TOTAL DEL PROYECTO	**100%**

5.1.2.1. Porcentaje Ejecución por Frentes en el periodo del presente informe

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	6,85%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	7,51%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	0%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	20,80%

5.1.2.2. Porcentaje Ejecución por Frentes acumulado

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	90,23%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	81,12%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	72,02%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	63,78%

5.1.2.3. Porcentaje Ejecución General del Proyecto

PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	7,02%
PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	72,73%

Nota: Los porcentajes de avance de obra de cada uno de los frentes de trabajo y el de avance general disminuyen con relación a los reportados en el informe anterior, esto debido a que se contempla las adiciones realizadas al contrato. **[$ 5.633.427.458,83 = 100%]**

5.2. REGISTRO PERSONAL

El personal vinculado a la obra contó con la entrega de los elementos de protección de seguridad industrial, además contaron con la afiliación, pagos de seguridad social y parafiscales, salud (EPS), riesgos laborales (ARL), pensión (AFP), caja de compensación, SENA e ICBF.

5.2.1. PERSONAL

El personal del contratista – GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, en obra en el periodo del presente informe, está compuesto por:

- Director de Obra: Javier Antonio González Arenas
- Ingeniero Residente de Obra: Daniel Camilo Prada Millán
- Asesor eléctrico: Carlos Julio Acevedo Ferreiro
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo: Daniel Mauricio Oler Restrepo
- Topógrafo: Leonel Eduardo López Duran
- Coordinador de Obra: José Lamus Rodríguez
- Asesor Estructural: Nicolas Alfonso Correa Duarte

ADMINISTRATIVO – OPERATIVO					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DESAFILIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Ing Auxiliar	Diana María Olaya Ortiz	1.073.176.550	26/09/2023		
SOLDADORES					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DESAFILIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Soldador	Donis David Carbono Bastidas	7.572.127	26/09/2023		
Soldador	Elkin Fabian Silva Cortés	91.517.987	26/09/2023		
Soldador	Anderson Eduardo Silva Cortés	1.102.718.418	26/09/2023		
Soldador	Jhoan Ferney Morales Sarmiento	1.102.717.910	26/09/2023		
Soldador	Cristian Favian Romero Villalba	1.102.721.147	26/09/2023		
Soldador	Eduardo Javier de Avila Torres	12.687.722	26/09/2023		
Soldador	Esteban David Cortés Romero	1.007.156.619	26/09/2023	1/10/2023	
Soldador	Nestor Favian López Garcia	1.096.800.079	26/09/2023		
Soldador	Mario Andres Bautista	1.096.247.138	12/10/2023		
	Vargas				
Soldador	Celso Steven Hernández Quevedo	1.073.150.231	12/10/2023		

5.3. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO

A continuación, se encuentra el listado de maquinaria y equipo empleado que se encuentran en obra y en los diferentes frentes a desarrollar:

Cantidad	Descripción
5	Pulidora
4	Barra
4	Picas
4	Pala
10	Andamio (sección)
1	Vibro compactador (rana)
1	Vibrador concreto
2	Tronzadora

5.4. DISEÑOS

Las modificaciones en los diseños de los polideportivos presentados a interventoria y supervisión:

Frente polideportivo Escallón:

- Ubicación de las graderías: A borde con las columnas de la cubierta
- Ubicación de la placa de piso: Centrada con relación a la cubierta
- Acceso al polideportivo: dos (2) entradas
    - Entrada principal
    - Entrada de mayor dimensión al respaldo del arco de la parte frontal

Frente polideportivo San Luis:

- Niveles de la tarima: Nivel 0 = -0,4m por temas de seguridad con relación a la altura.
- Diseño de la cubierta del polideportivo

Frente polideportivo La Magnolia:

- Accesos al polideportivo
  - Calle 8°: puerta principal para ingresar al polideportivo
  - Cruce entre calle 8° y 9°: ingreso parque infantil
  - Acceso polideportivo por la carrera 4
- Diseño cimentación muro de cerramiento
- Baños al costado de las graderías

Frente polideportivo San Carlos:

- Dimensiones cerramiento: Lateral colindante con el predio de la iglesia

5.5. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Los ensayos realizados, así como los resultados de estos mismos, fueron anexados en las cuentas de cobro 1 y 2 (11/11/2022 y 20/02/2023). Los ensayos realizados después de esta fecha, serán anexadas en la siguiente cuenta de cobro.

5.6. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA

Se anexa copia de la bitácora de obra durante el periodo de ejecución del presente informe. (ANEXO No. 1)

5.7. REPORTE MULTAS Y SANCIONES

No se reportaron multas ni se adelantaron procesos de sanciones durante el periodo del presente informe.

5.8. POLIZAS DEL CONTRATISTA

Las pólizas se encuentran cargadas en la plataforma del SECOP

5.9. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO

- El contratista cuenta con una oficina en el barrio Escallón (Carrera 10° # 15-29), de igual manera se está almacenando el material, herramientas de construcción y demás elementos en bodega, que se encuentra ubicada en el mismo barrio, en el predio colindante (parqueadero). Además, se cuenta con personal para celaduría en el horario nocturno.
- En el polideportivo San Carlos, el contratista cuenta con el alquiler de una (1) bodega ubicada en el frente del polideportivo (Carrera 21 6B Sur), para el almacenamiento de equipo y herramientas.
- Para los frentes del polideportivo La Magnolia y San Luis, las herramientas, equipo y materiales que se requieran son transportados desde el frente del polideportivo del barrio Escallón.

5.10. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

En el periodo del presente informe no se reportan residuos provenientes de demoliciones. Los desechos que se generan en obra, como las lonas del cemento, son recolectadas en bolsas de basura para posteriormente ser retiradas por el camión de la basura.

5.11. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

Frente polideportivo Escallón:

Se evidencia la presencia de un cuerpo de agua colindante con el cerramiento del polideportivo por la parte posterior y a la mediania con el predio correspondiente con el parqueadero, el cual, en el periodo del presente informe, no causo inconvenientes en la obra.

Frente polideportivo San Luis:

En el área de influencia de este frente, no se presenta ningún cuerpo de agua.

Frente polideportivo La Magnolia:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

Frente polideportivo San Carlos:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

5.12. AFECTACIONES

5.12.1. CONDICIONES CLIMATICAS

En el mes de OCTUBRE se presentaron días con fuertes lluvias, las cuales afectaron el desarrollo de actividades relacionadas con soldadura y trabajos en alturas y exteriores (Anexo No. 2)

5.12.2. VANDALISMO

En el periodo del presente informe no se reporta el hurto de material y herramientas en los diferentes frentes de trabajo.

6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS

En el periodo del presente informe No se registran inspecciones de obra en los diferentes frentes de trabajo.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

- Excavación manual - Acometida red suministro y red sanitaria



- Desmonte aparatos parque infantil



- Bordillo en concreto



- Desmonte canales






- Celosía angular








- Baldosa ceramica piso – pared / Remates Bocel Wing









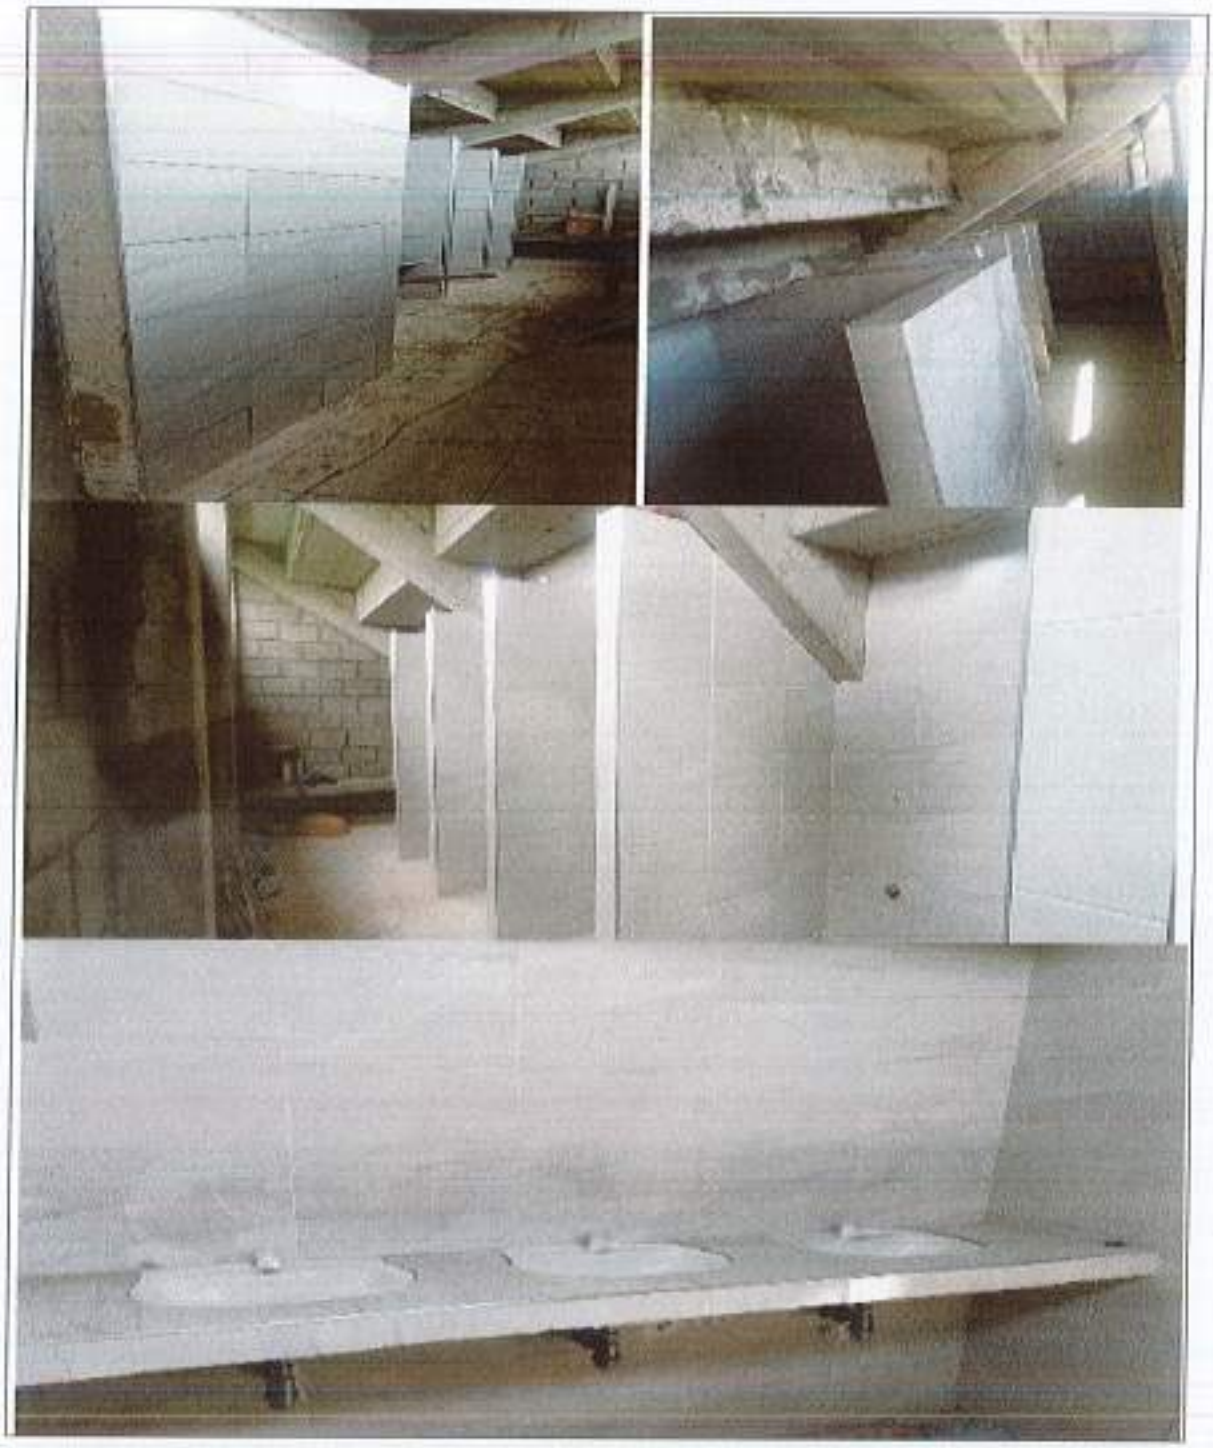


7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS

No se registran actividades para este frente en el transcurso del mes de OCTUBRE 2023

7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA

- Placa base en concreto – Refuerzo malla electrosoldada

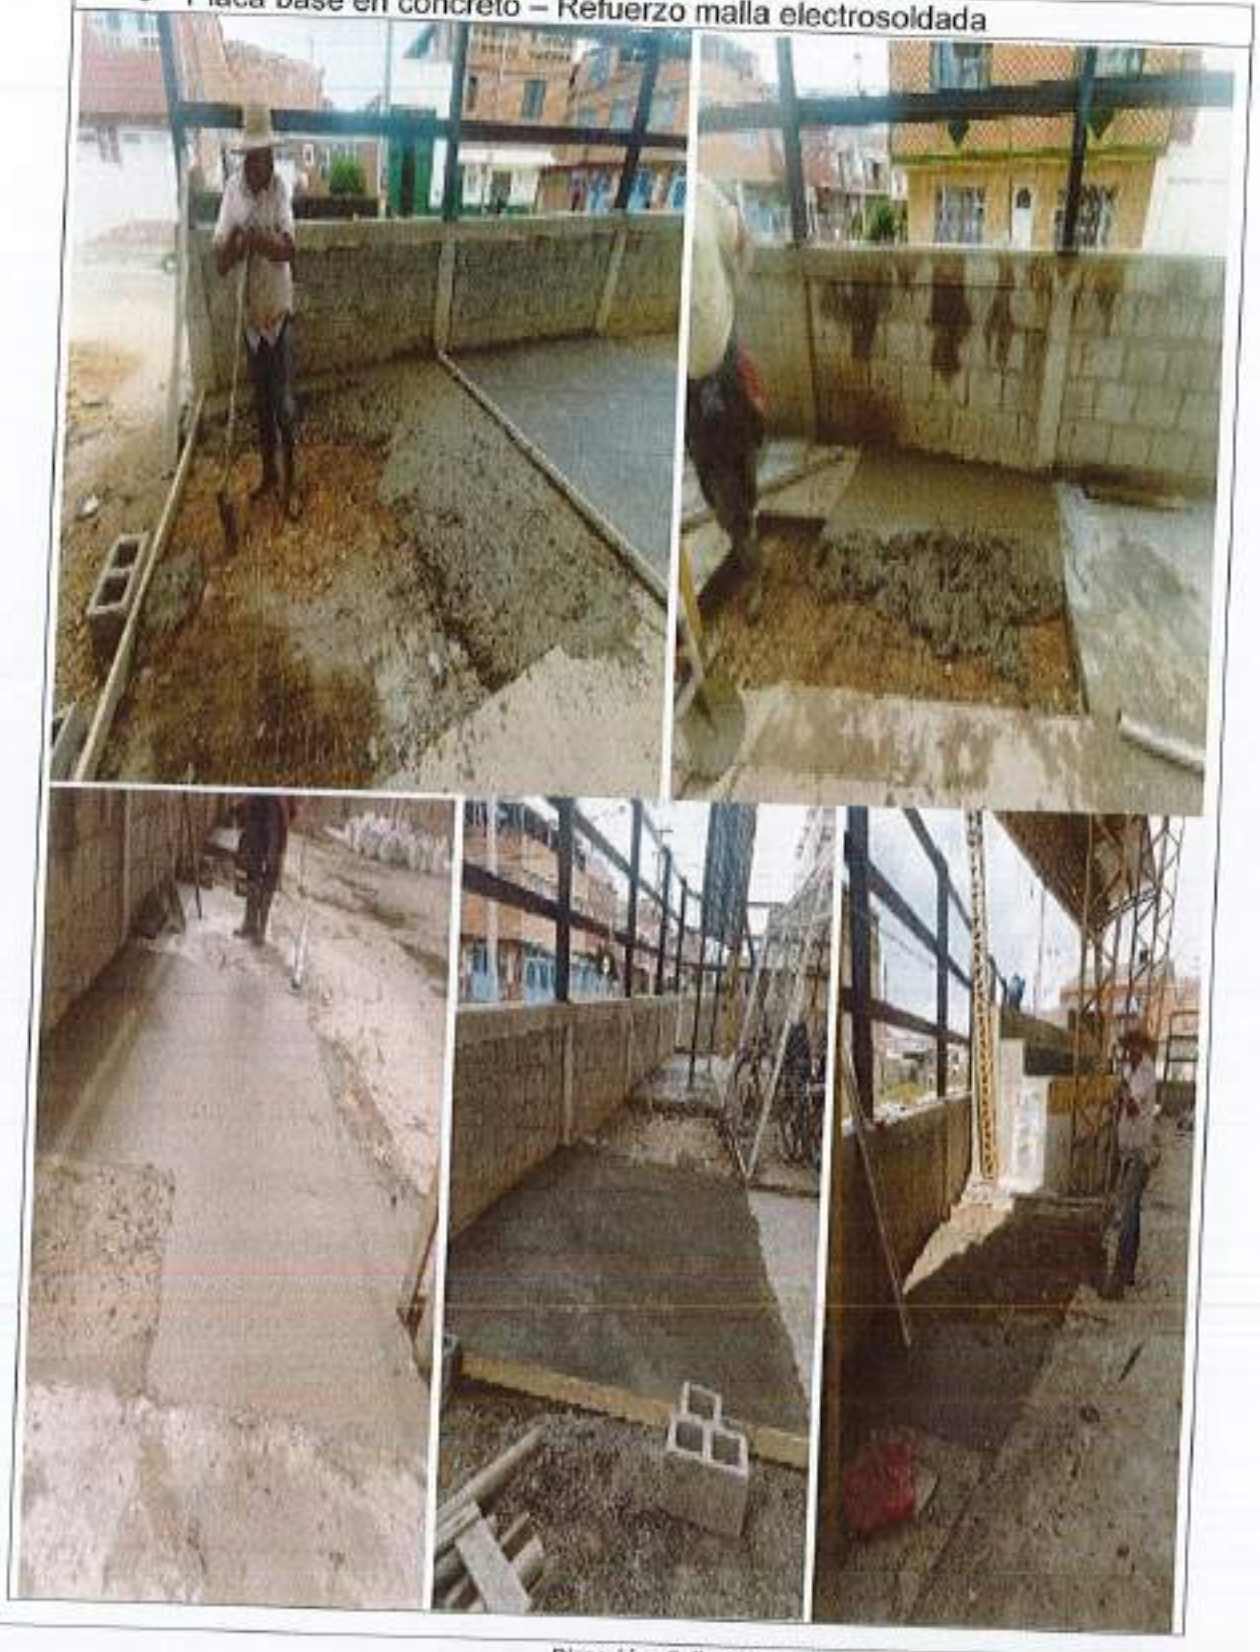

- Subbase granular






- Demolición placa piso







- Pañete liso muros




- Desmonte aparatos parque infantil




- Entrepiso lamina colaborante







- Celosía tubular






- Marcos y puertas



- Red y acometida sanitaria





- Baldosa ceramida piso – pared / Remates bocel wing





- Estuco




- Instalación conexiones electricas



7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS

- Esmalte sobre lamina lineal y lamina llena

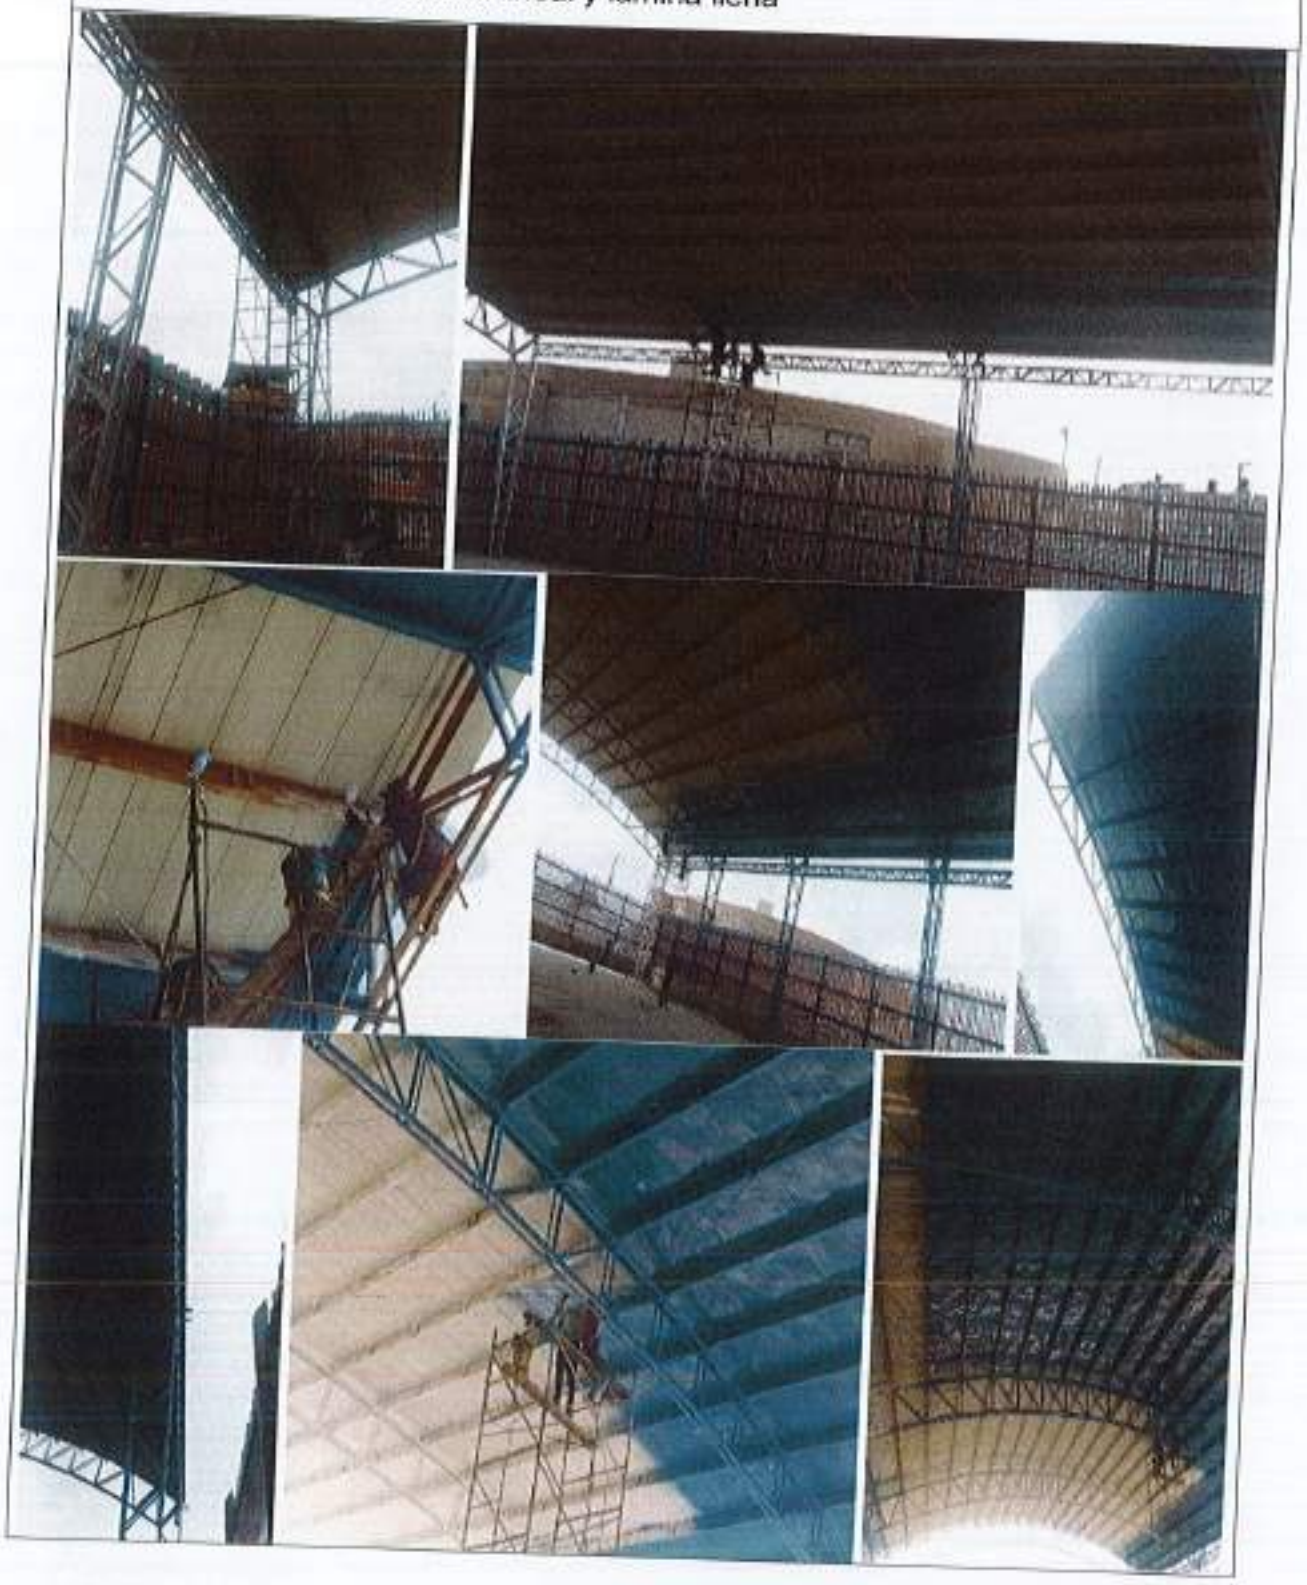

- Baranda metálica





- Instalación conexiones eléctricas









Demolición muros





- Mantenimiento de placa en concreto








- Mantenimiento de graderías



- Pañete liso muros

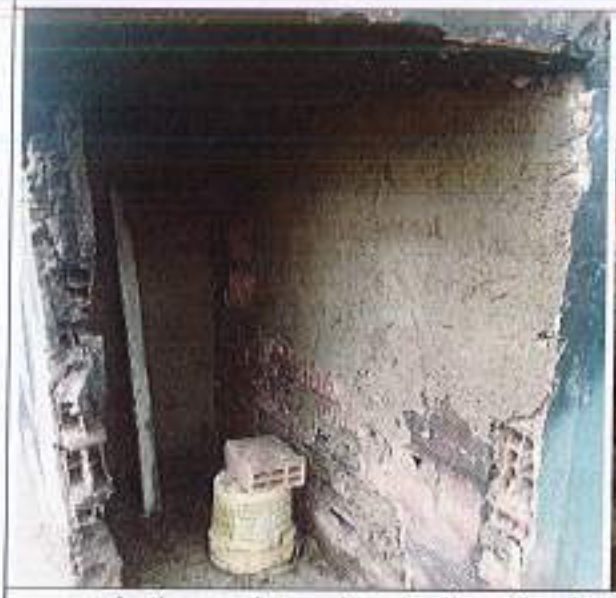


- Anticorrosivo sobre lamina lineal y lamina llena para la estructura del parque infantil




- Pintura epóxica





- Dados en concreto





- Rehabilitación y limpieza estructura parque infantil







Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com

- Canal en lámina galvanizada cal 18; DS=100






- Pintura para fachada tipo koraza



- Marco y Puerta





8. CONCLUSIÓN

Se concluye que el proyecto referente al contrato de obra No. 543 de 2022 que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".** suscrito entre la Alcaldía de Madrid (CUNDINAMARCA) y GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, presento el avance de ejecución de las actividades contratadas respecto al mes de OCTUBRE y las obras que a su vez fueron ejecutadas de conformidad con la interventoría y la supervisión por parte del municipio.

ANEXO 1.
BITACORA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

042 - 2022.

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MANGUERA, ESCALERA, EPA CUCI Y EPA CARGOS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, CUNDINAMARCA

OBRA:
CONSTRUCCION CERRAMIENTO- ADECUACION- CERRAMIENTO

FRENTE:
POLIDEPORTIVO BARRIO
LOS CARGOS

FECHA INICIO
14 AGO 2022

30 Septiembre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores
Ayudantes Soldadores
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. Equipo soldadura Barbanias
Actividades de obra
1. Mantenimiento para estructura de la cubierta
2. Esmalte para estructura de la cubierta
3. Detalle para Esmalte de los postes del Cerramiento (f)

02 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado Tarde Lluvias

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores
Ayudante Soldadura
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Barbanias
Actividades de obra
1. Mantenimiento y Esmalte para estructura de la Cubierta
2. Detalle para esmalte de los postes del cerramiento. (f)

05 octubre 2023 Estado del Clima
Personal en obra
Resultado de actividades
Resultado de intervenciones
Saldo de hoy
Acumulado Saldos
Maquinaria y equipo
Herramienta menor Perdidas
Detalles de obra
1. Observaciones para la ejecución de la obra
2. Detalles para resolver de la parte del campamento

06 octubre 2023 Estado del Clima
Personal en obra
Resultado de obra
Resultado de intervenciones
Saldo de hoy
Acumulado Saldos
Maquinaria y equipo
Herramienta menor Perdidas
Detalles de obra
1. Observaciones para la ejecución de la obra
2. Detalles de resolver de la parte del campamento

07 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Soldadores
- Ayudantes soldadores

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Pardomos

Actividades de obra
1. Anticorrosivo para la estructura de la cubierta
2. Detalles del esmalte de los postes del cerramiento

09 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado, tarde lluvioso

Personal en obra
- Residente de obra.
- Residente de interventoría.
- Soldadores.
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
- Herramiento menor Pardomos.

Actividades de obra:
1. Esmalte para la estructura de la cubierta.
2. Esmalte para la cubierta

16 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Soldadores
- Ayudantes Soldadores

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Pardomos

Actividades de obra
1. Esmalte para la estructura y la cubierta
2. Detalle del esmalte de los postes del cerramiento

11 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Soldadores
- Ayudantes de Soldadura

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Pardomos

Actividades de obra.
1. Aplicación de esmalte para la cubierta y la estructura
2. Detalle de esmalte de los postes de colores del cerramiento

12 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado, Tarde Nublado

Personal en obra
- Residente de obra
- Asistente de residente
- Soldadores
- Ayudantes Soldadores

Maquinaria y Equipo
- Herramiento menor — Andamios

Actividades de obra
1. Aplicación de anticorrosivo para la estructura de la cubierta
2. Aplicación de esmalte para la estructura y cubierta
3. Detalle pintura de perfiles de cerramiento

D mm f

13 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado, Tarde Nublada

Personal en obra
- Residente de obra
- Asistente de residente
- Soldadores
- Ayudantes de Soldadura

Maquinaria y Equipo:
- Herramiento menor — Andamios

Actividades de obra.
1. Aplicación de anticorrosivo para la estructura de la cubierta
2. Aplicación de Esmalte para la cubierta y la estructura
3. Corte de perfiles para la baranda
4. Detalle de esmalte para perfiles de cerramiento

D mm f

14 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Asistente de residente
- Soldadores
- Ayudantes Soldadores

Maquinaria y Equipo
- Herramiento menor — Andamios

Actividades de obra
1. Esmalte para la cubierta y la estructura

D mm f

17 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Asistente de residente
- Soldadores — Maestro de obra
- Ayudantes Soldadura — Ayudantes de obra

Maquinaria y Equipo.
- Herramiento menor — Andamios

Actividades de obra.
1. Esmalte para la cubierta y la estructura
2. Desmontaje de muros del cuarto electrico
3. Pañete de muros internos del cuarto electrico

D mm f

16 octubre 2023 Estado del Clima
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de instrumentista
Soldadores
Ayudantes de soldadura
Maestro de obra
Ayudantes de obra
Maquinaria y Equipo
Amoladora pequeña. Andamios Equipo soldadura
Actividades de obra
1. Pisos en bloque N°4 para el cuarto electrico
2. Pañete liso muros para cuarto electrico
3. Esmalte para cubierta y estructura
4. Barandas para graderias.

Dany JS

19 octubre 2023 Estado del Clima
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de instrumentista
Maestro de obra - Ayudantes de obra
Soldadores - Ayudantes soldadura
Electricista
Ayudante electri...
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Andamios Equipo Soldadura
Actividades de obra
1. Mantenimiento gradenes → estan terminados, pendiente
3 pintura epoxica para huellas y contrahuellas
2. Pintura tipo marte para respaldo graderias.
3. Baranda metalica para graderias.
4. Conexiones electricas para cuarto electrico
5. la cubierta.

Dany JS

20 octubre 2023 Estado del Clima
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de instrumentista
Maestro de obra - Ayudantes de obra
Soldadores - Ayudantes Soldadores
Electricista - Ayudante electricista
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo soldadura Andamios
Actividades de obra
1. Pintura epoxica para huellas y contrahuellas graderias
2. Pintura tipo marte para respaldo graderias.
3. Conexiones electricas - cuarto electrico y cubierta
4. Rehabilitacion y limpieza porque entrabil.

Dany JS

21 octubre 2023 Estado del Clima
Soleado

Personal en obra
Residente de obra - instrumentista
Maestro de obra - Ayudantes de obra
Soldadores - Ayudantes de obra
Electricista - Ayudante electricista
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo soldadura Andamios
Actividades de obra
1. Conexiones electricas para cubierta y cuarto electrico
2. Pruebas de electrico
3. Rehabilitacion y limpieza porque entrabil.
4. Baranda para graderias
5. Pintura tipo marte para respaldo gradenes y cuarto electrico
6. Muro y pisos cuarto electrico
7. Pintura epoxica para graderias JS

Dany

octubre 202
Estado del Clima
Nublado
Tarde Lluvia
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Ayudantes de obra
Soldadores - Ayudantes de soldadores
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo Soldadura Andamios
Actividades de obra
1. Instalación de Canales para la cubierta
2. Dados en concreto para parales parque infantil
3. Retahilo tarrisa parque infantil
4. Detalle esmalte parales cerramiento

24 octubre 2023
Estado del Clima
Nublado
Tarde Lluvia
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Ayudantes de obra
Soldadores - Ayudantes de Soldadores
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo Soldadura Andamios
Actividades de obra
1. Instalación Canales de la cubierta
2. Dados en concreto para parales parque infantil
3. Detalle esmalte para parales de Cerramiento
4. Retahilo tarrisa y limpieza parque infantil

25 octubre 2023
Estado del Clima
Nublado
Tarde Lluvia
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Ayudantes de obra
Soldadores - Ayudantes de Soldadores
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo Soldadura Andamios
Actividades de obra
1. Instalaciones canales para cubierta
2 Dados en concreto y retahilo tarrisa de parque infantil
3. Detalle esmalte para parales de cerramiento

26 octubre 2023
Estado del Clima
Nublado con lluvia
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obras
Ayudantes de obra
Ayudantes Soldadores
Trabajadores Reforzamiento Placa
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Andamios
Actividades de obra
1. Detalle esmalte para parales Cerramiento
2 Limpieza placa Concha polideportivo
3. Anticorrosivo para estructura parque infantil (mal)
4. Retahilo para detalles parque infantil (mal)

27 octubre 2023 — Estado del clima: nublado ratos

Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Ayudante de obra
Ayudantes de Soldadores
Trabajadores para el reforzamiento de placa

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor — Andamios

Actividades de obra:
1. Demolición para pozos infantil
2. Reforzamiento para pozos infantil
3. Limpieza de placa concha

28 octubre 2023 — Estado del clima: nublado sin lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Ayudante de obra
Ayudantes de Soldadores

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor — Andamios

Actividades de obra:
1. Limpieza placa concha
2. Anticorrosivo para pozos infantil
3. Detalle esmalte para parches de cerramiento

30 octubre 2023 — Estado del clima: nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Ayudantes de obra
Trabajadores para el reforzamiento de placa

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor

Actividades de obra:
1. Mantenimiento placa en concreto
2. Cerramos en concreto

31 octubre 2023 — Estado del clima: Soleado tras de lluvias

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Ayudantes de obra
Ayudantes Soldadores
Trabajadores para el reforzamiento de placa

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor — Andamios

Actividades de obra:
1. Mantenimiento placa en concreto
2. Cerramos en concreto
3. Detalle esmalte para el cerramiento (parches de colores)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESTRELLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA.

OBRA:
CONSTRUCCION - OBRA NUEVA - ADECUACION - CERRAMIENTO

FRENTE:
POLIDEPORTIVO BARRIO LA MAGNOLIA

FECHA INICIO:
20 JUL 2022.

02 octubre 2023. Estado del clima: Soleado
Personal en obra. Tarde Ventosa
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra - oficial de obra - Ayudantes
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor
Actividades de obra
1. Demolicion placa piso
2. Pañete los muros.
3. Formaleteo placa entre piso bancos.
4. Retiro puertas y marco existente cuarto Electrico.

03 octubre 2023 Estado del clima: Soleado
Personal en obra Tarde Ventosa
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra - oficial de obra - Ayudantes
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor
Actividades de obra
1. Demolicion placa piso.
2. Sobrecimiento gradas
3. Formaleteo Placa entre piso.
4. Desmontar accesorios porque vitrual

04 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra - oficial de obra - Ayudantes

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor - Mezcladora

Actividades de obra
1. Corte con disco diamantado
2. Demolición de placa
3. Retiro de malla electrosoldada
4. Fundición Placa base en concreto
5. Subbase granular

D m P

05 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado / Toda la jornada Lluvia

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra - oficial de obra - Ayudantes

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor - Mezcladora

Actividades de obra
1. Formaleteo placa entre piso
2. Fundir concreto para placa de entrepiso
3. Demolición placa base
4. Subbase granular

Se reporta visita del Alcalde en compañía de su equipo de trabajo y secretaria de transportes con el fin de observar el avance de la obra

D m P

06 octubre 2023 — Estado del Clima: Lluvia toda la jornada

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra - oficial de obra - Ayudantes de obra

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor - Mezcladora

Actividades de obra
1. Subbase granular debidamente compactada
2. Retiro de malla electrosoldada
3. Fundición concreto para placa por secciones. Placa concha demolida por cuenta del contratista

D m P

07 octubre 2023 — Estado del Clima: Lluvia Para / Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra - oficial de obra - Ayudantes de obra

Maquinaria y Equipo
1. Corte con disco diamantado
2. Demolición Placa base
3. Subbase granular
4. Retiro de malla electrosoldada
5. Fundición concreto placa base para secciones placa concha.

D m P

04 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado tarde Lluviosa

Personal en obra
Residente de obra
Residente de intervencion
Maestro de obra
Ayudantes de obra
Soldadores
Maquinaria y Equipo
Herramientas menor - Equipo Soldadura
Actividades de obra:
- Pañete liso muros

nos toca la parte de tarrajeo se abarca todas las paredes externas y muros en el polideportivo cuatro

2. limpieza pared respaldo gradenes
3. instalacion marcos y puertas para baños

D mf

10 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de intervencion
Maestro de obra
Ayudantes de obra
Soldadores
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo Soldadura
Actividades de obra:
1. mantenimiento gradenes
2. Pañete liso gradenes
3. Excavacion manual para Acometida agua, luvia y red sanitaria
4. inicio instalacion porcelana de colores para el cerramiento

D mf

11 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de intervencion
Maestro de obra
Ayudantes de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo Soldadura
Actividades de obra
1. Pañete liso paredes respaldo y rostado gradenes
2. Sobrecimiento, malla y Fundicion concreto placa piso
3. Colocacion red agua lluvia y red sanitaria.
4. instalacion porcelana de color.

D mf

12 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado Tarde lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de intervencion
Maestro de obra — Soldador
Ayudante de obra — Ayudantes Soldador
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo Soldadura
Actividades de obra
1. instalacion porcelana de color para el cerramiento del polideportivo
2. Sobrecimiento
3. Malla electrosoldada
4. Placa base en concreto
5. Fundicion concreto para tapas cajas de inspeccion (incluye otras reforzes)

D mf

13 octubre 2023 — Estado del Clima
Personal en obra — Soldado
Residente de obra — Jaime Mamani
Residente de interventoria
Soldadores - Ayudantes soldadura.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo de Soldadura
Actividades de obra
1 Reseldo la pertilleria de cerramiento instalada previamente
2. instalacion de pertileria de colores para el cerramiento del polideportivo

14 octubre 2023 — Estado del Clima
Personal en obra — Soldado
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldador - Ayudantes Soldadura
Maquinaria y Equipo
Herramientas menor — Equipo Soldadura
Actividades de obra.
1 instalacion pertileria de colores del cerramiento del polideportivo

17 octubre 2023 — Estado del clima
Personal en obra — Soldado
Residente de obra — Jaime Mamani
Residente de interventoria
Soldador
Ayudantes soldador.
Maestro de obra
Ayudante de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo Soldadura — Taller Ceramico
Actividades de obra
1 instalacion pertileria de colores del cerramiento
2 cortes instalacion baldosa ceramica para paredes de Banos
3. Reseldo pertileria instalada

18 Octubre 2023 — Estado del Clima
Personal en obra — Soldado
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldador - Ayudantes.
Maestro de obra - Ayudante
Maquinaria y Equipo
Herramientas menor — Equipo Soldadura — Taller Ceramico
Actividades de obra
1 instalacion Baldosa ceramica para las paredes de los banos
2 instalacion pertileria de colores para el cerramiento de l polideportivo

19 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoría
Soldadores
Ayudantes
Maestro de obra
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor — Equipo Soldadora — Carta Caseta
Actividades de obra:
1. instalacion Baldosa ceramica para paredes de los baños.
2. instalacion perfileria de colores del cerramiento
3. Resoldar perfileria instalada previamente

D mf

20 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoría
Soldadores
Ayudantes soldador.
Maquinaria y equipo
Herramienta menor — Equipo soldadora
Actividades de obra:
1. instalacion perfileria de colores del cerramiento del polideportivo

D mf

21 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado — todo soldado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Soldador
Ayudantes soldador.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo Soldadora
Actividades de obra:
1. Resoldar perfileria previamente instalada
2. instalar perfileria de colores para el cerramiento del polideportivo

D mf

23 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado — todo soldado en Obra

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Soldador
Ayudantes soldador.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo Soldadora
Actividades de obra:
1. instalar perfileria de colores para el cerramiento del polideportivo.
2. Resoldar perfileria previamente instalada

D mf

26 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado Parte Nuboso

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldador
Ayudantes Soldador
Maestro de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo Soldadura
Actividades de obra
1. instalacion pertileria de colores para el cerramiento del polideportivo
2. Estuco para los paredes de baños

DMP

26 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado Parte Nuboso

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldador
Ayudantes soldador
Maestro de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo Soldadura
Actividades de obra
1. instalacion pertileria de colores del cerramiento del polideportivo
2. Estuco para paredes del baño

DMP

26 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado con lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldador
Ayudantes Soldador
Maestro de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo Soldadura
Actividades de obra
1. Resoldar pertileria cerramiento instalado
2. instalacion pertileria de colores del cerramiento
3. Estuco para paredes de los baños

DMP

27 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado con lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldador
Ayudantes de soldador
Electricista
Ayudante electricista
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo Soldadura
Actividades de obra
1. instalacion pertileria de colores para el cerramiento
2. Resoldar pertileria cerramiento
3. inicio instalaciones electricas para los baños.

DMP

28 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado con lluvia

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Soldador
- Ayudante soldador

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor — Equipo Soldadura

Actividades de obra
1. instalación perfilería de colores para el cerramiento del polideportivo

1 mnp

30 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado tarde lluviosa

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Soldador
- Ayudantes Soldador
- Electricista
- Ayudante electricista

Maquinaria y equipo
- Herramienta menor — Equipo Soldadura

Actividades de obra
1. instalación perfilería de colores para el cerramiento del polideportivo
2. Resoldar perfilería previamente instalada
3. instalación conexiones eléctricas para bancas

1 mnp

31 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado tarde nublado con lluvia

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Soldador
- Ayudantes Soldador
- electricista
- Ayudante electricista

Maquinaria y equipo
- Herramienta menor — Equipo de Soldadura

Actividades de obra
1. instalación perfilería de colores para el cerramiento del polideportivo
2. instalación conexiones eléctricas

1 mnp

Powered by Camtic

CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE LOS BARRIOS LA ARBOLEDA, ESCALÓN, SAN LUIS Y SAN PEDRO EN MUNICIPIO DE NUEVO CUSCATLANCA

OBRA:
CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA - ADECUACIÓN - CERRAMIENTO

TIPO:
PAVIMENTOS (PARA CALLES)

FECHA INICIO:
10 JUN 2022

24 Junio 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Soldadores
Ayudantes de soldadura
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo de Soldadura
Actividades de obra.
1. Soldar pasadores previamente instalados.
2. Instalación de pasadores de cáñamo del cerramiento.
3. Anticorrosivo y esmalte para pasadores del cerramiento.

02 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
Residente de obra — Jefe Unico
Residente de interventoría
Soldadores — Maestro de obra
Ayudantes de Soldadura — Ayudantes de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo de Soldadura
Actividades de obra
1. Desmonte arenosos porque intantil
2. Corte de pavimento angular para colocación de la cabeza de los pasadores
3. Apoyar, recto y nivelado de acero para pasadores

05 octubre 2023 — estado del clima
Personal en obra — Estado
Residente de obra — Turno Soldadura
Residente de interventoría
Soldadores — Maestro de obra
Ayudantes de Soldadura — Ayudantes de obra
Maquinaria y Equipo
Herramientas menor — Equipo de Soldadura
Actividades de obra
1. Corte y Soldadura para pertiles angulares para la estructura de la cubierta de los graderios.
2- Desmonte de canales
3. Corte, figuración y anclaje de acero
4. Fundición de concreto para bordillo.

Dump

06 octubre 2023 — Estado del Clima
Personal en obra — Soldado
Residente de obra
Residente de interventoría
Soldadores — Maestro de obra
Ayudantes de soldadura — Ayudantes de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo de Soldadura
Actividades de obra
1. Excavación manual para acometida de Sanitarios y acometida de red de suministro
2. Corte, Soldadura y anclaje para colocar angulos de la estructura de la cubierta de los graderios.
3. Presentación de Suministro.

Dump

05 octubre 2023 — Estado del Clima
Personal en obra — Soldado
Residente de obra — Turno Soldado
Residente de interventoría
Soldadores — Maestro de obra
Ayudante de Soldadura — Ayudantes de obra
Maquinaria y Equipo
Herramientamenor — Equipo de Soldadura
Actividades de obra
1. Anticorrosivo y esmalte para pertiles de la estructura de la cubierta.
2. instalacion de placas para las columnas de la estructura de la cubierta de las graderias
3. Excavacion y acometida Sanitaria.
4. Desmonte de canales existentes

Dump

06 octubre 2023 — Estado del Clima
Personal en obra — Soldado con poco Humor
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores — Maestro de obra
Ayudantes de Soldadura — Ayudantes de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo de Soldadura — Ayudantes
Actividades de obra
1. Desmonte de canales existentes.
2. Anclaje de acero y fundicion de concreto para bordillo
3. Cortes Soldadura de tapas para perfiles del cerramiento
4. Anticorrosivo y esmalte pertiles angulos.
5. instalacion y Montaje columnas de la estructura de la cubierta de las graderias.

Dump

07 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado, Frio
Personal en obra — Sabado
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores — Maestro de obra
Ayudantes de Soldadura — Ayudantes de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo de Soldadura — Naturales
Actividades de obra
1. instalacion de Vigas de la estructura de la cubierta de los graderios
2. Pinture de Acero y Fundicion de concreto para bordillo

07 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado, Tarde Lluvia
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores — Maestro de obra
Ayudantes de soldadura
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo de Soldadura — Naturales
Actividades de obra
1. Desmonte de bajantes
2. Soldador pestañeria de cerramiento e instalacion de Vigas de la estructura de la cubierta de los graderios

10 octubre 2023 — estado del Clima: Nublado
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores — Maestro de obra
Ayudantes de Soldadura
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo de Soldadura
Actividades de obra:
1. Ceramica para piso de los banos
2. Corte y soldadura para tapas de los pozos del Cerramiento.

11 octubre 2023 — estado del Clima: Soleado
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores — Maestro de obra
Ayudantes de soldadura
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo de Soldadura — Naturales
Actividades de obra:
1. Ceramica para piso de los Banos.
2. Corte y Soldadura de tapas de pozos de cerramiento
3. Anticorrosivo y esmalte de pozos del cerramiento.
4. Desmonte de pasamanos

12 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado, Tarde lluvioso

Personal en obra.
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Soldadores — Maestro de obra
- Ayudantes Soldadores

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Equipo de Soldadura — Andamios

Actividades de obra.
1. Cerámica para pisos de los baños
2. Desmonte de bajantes
3. Instalación de vigas tallantes de la estructura de la cubierta de las graderías

D

13 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado, Tarde lluvioso

Personal en obra.
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Soldadores — Maestro de obra
- Ayudantes Soldadores

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Equipo de Soldadura

Actividades de obra.
1. Cerámica piso-pared de los baños
2. Corte y Soldadura de tapas para portalevas del Cargamento.
3. Anticorrosivo y esmalte para portaleva del cargamento
4. Resoldar estructura de la cubierta de las graderías

D

11 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Soldadores — Maestro de obra
- Ayudantes Soldadores

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Equipo de Soldadura — Andamios

Actividades de obra:
1. Corte y Soldadura de tapas
2. Desmonte de rejillas y bajantes
3. Cerámica para piso-pared de los baños

D

13 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado, Tarde Soldadura

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Soldadores — Maestro de obra
- Ayudantes de Soldadores

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Equipo de Soldadura — Corte Cerámica

Actividades de obra
1. Batidora Cerámica piso-pared para los baños
2. Corte y Soldadura de tapas y portales del Cargamento
3. Anticorrosivo y esmalte portaleva Cargamento

D

16 octubre 2023 estado del Clima
Personal en obra Soleado
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores Maestro de obra
Ayudantes Soldadores
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo de Soldadura Corte Ceramica
Actividades de obra
1. Baldosa ceramica piso - pared
2. Cortar y Soldar tapas y perfiles Cerramiento

19 octubre 2023 Estado del Clima
Personal en obra Soleado
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores Maestro de obra
Ayudantes de Soldadores
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo de Soldadura Corte Ceramica
Actividades de obra
1. Ceramica para piso - pared de los baños.
2. Resoldar perfileria cerramiento instalada anteriormente.
3 Cortar tapas y perfiles para cerramiento

20 octubre 2023 estado del Clima
Personal en obra Soleado
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores Maestro de obra
Ayudantes de Soldadores
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo de Soldadura Corte Ceramica
Actividades de obra.
1. Baldosa Ceramica para piso - pared de los baños.
2. Remates Excel varios
3. Resoldar perfileria instalada anteriormente
4. Cortar y Soldar tapas y perfiles de Cerramiento

21 octubre 2023 Estado del Clima
Personal en obra Soleado
Residente de obra Turno Nublado
Residente de interventoria
Soldadores Maestro de obra
Ayudantes de Soldadores
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Equipo de Soldadura Corte Ceramica
Actividades de obra.
1. Baldosa - Ceramica para piso pared de los baños.
2. Remates Excel varios
3. Anticorrosivo y thinner para perfileria Soldada Cerramiento.

23 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado / Tarde Nublado

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de seguridad y salud
- Maestro de obra

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor: Corte Ceramica

Actividades de obra:
1. Baldosa Ceramica piso-pared para los baños
2. Remates bocel wing

25 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado / Tarde Nublado

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de seguridad y salud
- Maestro de obra

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor: Corte Ceramica

Actividades de obra:
1. Baldosa Ceramica piso-pared para los baños
2. Remates bocel wing

24 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado / Tarde Lluviosa

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de seguridad y salud
- Maestro de obra

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor: Corte Ceramica

Actividades de obra:
1. Ceramica para baños piso-pared
2. Remates Bocel wing
3. instalaciones hidraulicos

26 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado con Lluvia

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de seguridad y salud
- Maestro de obra

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor: Corte Ceramica

Actividades de obra:
1. Baldosa Ceramica piso-pared para los baños
2. Remates bocel wing

27 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado con lluvia.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Corte Ceramica.
Actividades de obra.
1. Baldosa Ceramica piso-pared para los baños
2. Remates Bocel wing p

28 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado con lluvia

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoría.
Maestro de obra.
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor Corte Ceramica.
Actividades de obra.
1. Baldosa Ceramica para piso-pared de los baños
2. Remates Bocel Wing p

30 octubre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra.
Soldadores
Ayudantes de Soldadores
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo Soldadura.
Actividades de obra
1. Pantalla de acero y anclajes metálicos para levantamiento
2. Corte de pintura para figuras de la cubierta de los graderios
p

31 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleado. Toda la jornada.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Ayudantes Soldadores
Soldador
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Equipo Soldadura
Actividades de obra
1. Fundición Concreto para mesones de lavamanos de los baños.
2. Antigrafitis para figuras de la estructura de la cubierta de los graderios p

1

CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA ARGELIA, ESCALÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MEDIO CONGUMETA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA -
ADECUACIÓN - CERRAMIENTO

FRENTE:

POLIDEPORTIVO BARRIO SAN LUIS

FECHA INICIO:

22 JUN 2022

130

02 octubre - 31 octubre 2023.


No se reportan actividades para este frente en el transcurso de este periodo.

Powered by Genia

62

ANEXO 2.
REPORTE DE LLUVIAS

Tiempo observado en octubre de 2023 en Madrid

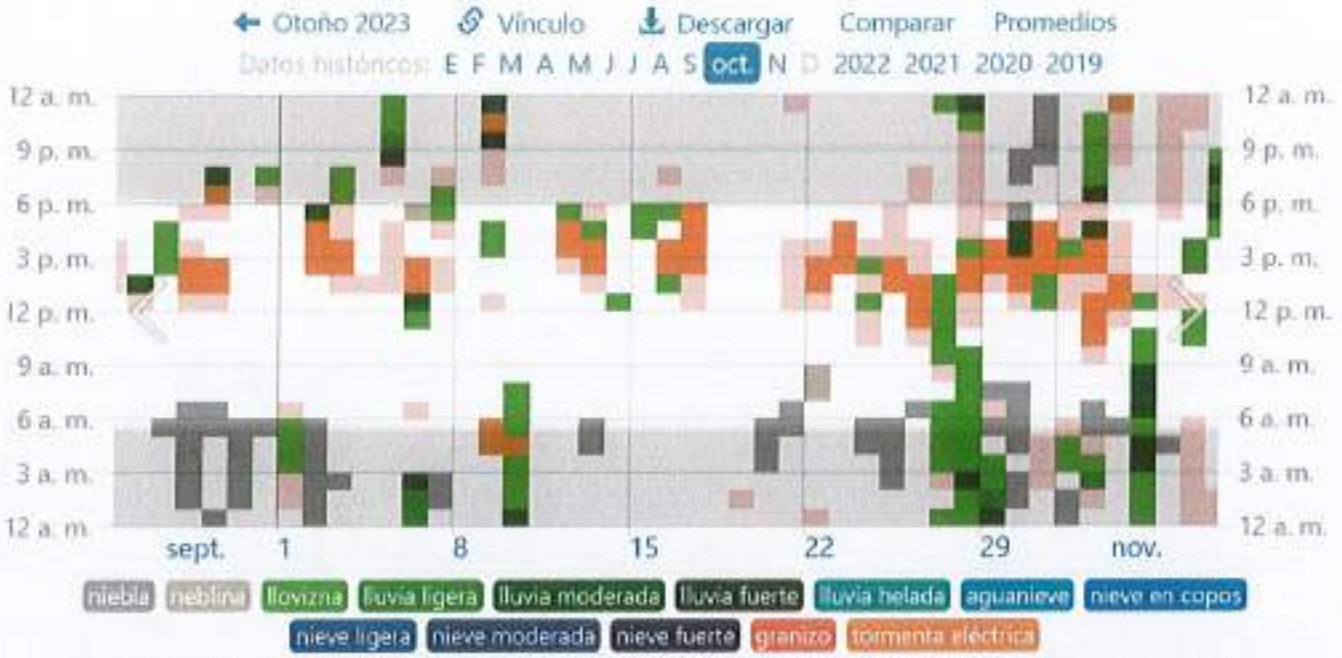

El tiempo observado por hora, codificado por color por categoría (en orden de gravedad). Si hay múltiples informes, se muestra el código más drástico.

© WeatherSpark.com

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

PERIODO 01 DE OCTUBRE – 31 DE OCTUBRE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

MADRID, CUNDINAMARCA

2023

DATOS DE ENTRADA

OBJETO: CONTRADO 543 .2022 "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

TIEMPO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2022

ALCANCE

Aplica al total de los colaboradores y encargados de la ejecución del "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

OBJETIVOS

Capacitar al personal de trabajo en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST aplicados durante la ejecución del proyecto.

Establecer las medidas mínimas de seguridad en el trabajo para la realización de las actividades propias del objeto del contrato de obra.

CONTENIDO

ALCANCE 2
OBJETIVOS 2
1. DEFINICIONES 4
2. MANEJO DE HERRAMIENTAS 5
3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 5
3.1. Protección de la cabeza 5
3.2. Protección de los pies 5
3.3. Protección de las manos y piel 6
3.4. Protección de la vista 6
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA 7
5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL 8
6. INDUCCIÓN 8
7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 8
3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP 12
3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES 13
5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES 13
4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 13
6. CONCLUSIONES 15

1. DEFINICIONES

Caso: Un evento registrable en una población o grupo de estudio de una enfermedad en particular, un trastorno de la salud o una condición bajo investigación.

COVID-19: Siglas de Coronavirus 2019 (enfermedad por coronavirus 2019), es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus denominado SARS-CoV-2, que se ha diseminado desde China o más de 170 países alrededor del mundo, incluida Colombia.

Emergencia de salud pública: Evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de la enfermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada.

Derrumbe: Desprendimiento de una porción de suelo o roca de una excavación y su desplazamiento súbito hacia la excavación por caída o deslizamiento.

Espacio confinado: Cuando los medios de entrada y salida son restringidos, con el espacio adecuado para permitir las labores por el personal.

Excavación: Es el corte, depresión, cavidad o zanja hecha mecánica o manualmente con el fin de remover tierra, arena, grava, rajón, recebo u otro material.

Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de un año para calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar sistemas de prevención y protección, elaborar especificaciones de trabajo, proyectos o productos acorde con lo establecido a la normativa.

Sistema de protección: Significa un método (inclinación, puntales, entibados o niveles escalonados) para proteger a los trabajadores de un derrumbe, de materiales que podrían caer o rodar en la excavación o por el colapso de estructuras colindantes.

Suelo: Es el material no consolidado o semi consolidado compuesto de la mezcla de partículas de diferentes tamaños, diferentes minerales y en diferentes cantidades y clases de materias orgánicas los cuales se encuentran sobre la corteza terrestre.

Zanja, trinchera: Excavación estrecha realizada en la tierra donde generalmente la profundidad es superior al ancho de esta.

Trabajo en Alturas: Se refiere a todas y cada una de las actividades que se desarrollan a partir de 1,5m de altura donde se establece el uso de sistemas de

protección tales como cuerdas, líneas de vida o arneses

2. MANEJO DE HERRAMIENTAS

Las diferentes actividades establecidas para la ejecución de los cuatro (4) Polideportivos del Municipio de Madrid Cundinamarca, requieren del uso de una serie de herramientas y equipos los cuales tienen la capacidad de afectar al personal de trabajo en función del uso que se le pueda dar. La ejecución del proyecto requiere del funcionamiento de una serie de maquinaria y equipos que de no ser direccionadas las indicaciones al personal que se va a hacer a cargo, pueden derivar en lesiones para el personal de trabajo:

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Las condiciones de trabajo en la construcción son tales que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la planificación del proyecto y el diseño de tareas, se necesitara algún tipo de protección personal EPP, como lo son cascos, protección de la vista y los oídos, botas y guantes, sin embargo el uso de EPP tiene sus desventajas tales como; algunas formas de EPP son incómodas y hacen más lento el trabajo, se necesita mayor supervisión para asegurar que los obreros usen lo elementos de protección.

3.1. Protección de la cabeza

Los objetos que caen, las izadas por las grúas y los ángulos sobresalientes se dan por todas partes en las obras de construcción, una herramienta pequeña o un perno que cae a 10 o 20 metros de altura puede causar lesiones graves o incluso la muerte, las heridas en la cabeza se producen cuando el obrero trabaja o se desplaza inclinado hacia adelante, cuando endereza el cuerpo después de haberse inclinado.

Los cascos de seguridad resguardan la cabeza efectivamente contra la mayoría de esos riesgos y es preciso usar casco constantemente en la obra, sobre todo en las áreas donde se está realizando el trabajo más arriba.

3.2. Protección de los pies

Las lesiones de los pies se dividen en dos categorías principales; las causadas por la penetración de clavos que no han sido sacados o doblados en la planta del pie, y las debidas a aplastamientos del pie por caída de herramientas o materiales. Ambas pueden minimizarse usando calzado protector, la clase de zapatos o de botas

protectoras dependerá de la índole del trabajo (por ejemplo, la presencia de agua subterránea en la obra) pero todo calzado protector debe tener suela impenetrable y capellada con una puntera de acero.

3.3. Protección de las manos y piel

Las manos son sumamente vulnerables a las lesiones accidentales, y en la construcción manos y muñecas sufren más lastimaduras que ninguna otra parte del cuerpo. Sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas, luxaciones, esguinces, amputaciones y quemaduras, que en su mayoría son evitables con mejores técnicas y equipo de trabajo manual, con el uso de protección adecuada como guantes o manoplas.

3.4. Protección de la vista

Los fragmentos y esquirlas, el polvo o la radiación son causas de muchas lesiones de la vista en las siguientes tareas:

- El picado, corte, perforación, labrado o afirmado de piedra, concreto y ladrillo con herramientas de mano o automáticas.
- El corte y soldadura de metales

Algunos de estos riesgos se pueden eliminar de modo definitivo por medio de resguardos adecuados en las máquinas, extractores de aire o un mejor diseño de tareas. En muchos casos, como por ejemplo el labrado y corte de piedra, la protección personal (anteojos de seguridad o visera) es la única solución práctica. A veces los obreros conocen los riesgos que corren y sus consecuencias si sufren daño en los ojos, pero no utilizan protección.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA

ID		CARGO	NOMBRE	CC
DR	1	Dir. Obra	Javier Antonio Gonzalez Arenas	1.126.001.358
ING	1	ING. Residente	Daniel Camilo Prada Millán	1.098.651.957
AEL	1	AS. Electrico	Carlos Julio Acevedo Ferreiro	91.043.063
SS	1	PR. Seguridad y Salud	Daniel Mauricio Oler Restrepo	71.664.413
TP	1	Topografo	Leonel Eduardo López Duran	1.102.721.369
CO	1	Coordinador de Obra	José Lamus Rodríguez	1.020.776.092
AES		AS. Estructural	Nicolas Alfonso Correa Duarte	1.090.425.817

ADMINISTRATIVO – OPERATIVO

CARGO	NOMBRE	CC	ESTADO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Ing Auxiliar	Diana María Olaya Ortiz	1.073.176.550	26/09/2023		

SOLDADORES

CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Soldador	Donis David Carbono Bastidas	7.572.127	26/09/2023		
Soldador	Elkin Fabian Silva Cortés	91.517.987	26/09/2023		
Soldador	Anderson Eduardo Silva Cortés	1.102.718.418	26/09/2023		
Soldador	Jhoan Ferney Morales Sarmiento	1.102.717.910	26/09/2023		
Soldador	Cristian Favian Romero Villalba	1.102.721.147	26/09/2023		
Soldador	Eduardo Javier de Avila Torres	12.687.722	26/09/2023		
Soldador	Esteban David Cortés Romero	1.007.156.619	26/09/2023	1/10/2023	
Soldador	Nestor Favian López Garcia	1.096.800.079	26/09/2023		
Soldador	Mario Andres Bautista	1.096.247.138	12/10/2023		

	Vargas				
Soldador	Celso Steven Hernández Quevedo	1.073.150.231	12/10/2023		

En la anterior tabla, se relaciona el personal del contratista del mes de diciembre; se incluye a las personas que se contrataron, y por diversos motivos se desvincularon en el transcurso del mismo mes, motivos los cuales también se exponen en la misma tabla, en la columna denominada "Observaciones".

Anexo 1. Afiliaciones ARL

Anexo 2. Planillas de seguridad social

5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL

El personal es apto para realizar las respectivas labores como ayudantes, oficiales y maestros de acuerdo con entrevista laboral realizada por coordinador de obras y empresa.

6. INDUCCIÓN

El maestro de obra realizo inducción, acerca del manejo de equipos, maquinaria y herramientas con acompañamiento de personal SST, a cada uno de los ayudantes y oficiales que ingresan y estarán ejecutando las actividades de mayor complejidad, como es el caso de:

- Manejo de las pulidoras
- Manejo de compresores
- Manejo de andamios

7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el periodo del mes de diciembre se realizaron actividades de capacitación, charlas y calistenia a todo el personal activo en los diferentes frentes de trabajo (San Luis, Escallón, Magnolia y San Carlos) ejecutados al iniciar labores brindando temas como:

- Manejo manual de cargas
- Lesiones pequeñas
- La seguridad responsabilidad de todos

- Manejo de extintores
- Uso de EPP
- Peligro mecánico
- Peligro locativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co





Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Durante el mes de diciembre se hizo entrega al personal de los siguientes elementos de protección personal:

- Guantes: se entregaron guantes de seguridad
- Gafas de seguridad
- Tapa oídos de inserción

El manejo de los equipos empleados en el periodo del presente informe estuvo a cargo del siguiente personal:

Pulidoras

- Donis David Carbono – Soldador
- Elkin Silva Cortés – Soldador
- Anderson Silva Cortés – Soldador
- Jhoan Morales Sarmiento – Soldador
- Cristian Romero Villalba – Soldador
- Eduardo Javier de Avila – Soldador
- Esteban Cortés Romero – Soldador
- Nestor López Garcia - Soldador
- Mario Andres Bautista Vargas – Soldador
- Celso Steven Hernández Quevedo

Andamios

- Donis David Carbono – Soldador
- Elkin Silva Cortés – Soldador
- Anderson Silva Cortés – Soldador
- Jhoan Morales Sarmiento – Soldador
- Cristian Romero Villalba – Soldador
- Eduardo Javier de Avila – Soldador
- Esteban Cortés Romero – Soldador
- Nestor López Garcia - Soldador
- Mario Andres Bautista Vargas – Soldador
- Celso Steven Hernández Quevedo

Compresor

- Donis David Carbono – Soldador
- Elkin Silva Cortés – Soldador

- Anderson Silva Cortés – Soldador
- Jhoan Morales Sarmiento – Soldador
- Cristian Romero Villalba – Soldador
- Eduardo Javier de Avila – Soldador
- Esteban Cortés Romero – Soldador
- Nestor López Garcia - Soldador
- Mario Andres Bautista Vargas – Soldador
- Celso Steven Hernández Quevedo

Demoledor y tronzadora

No se emplearon

El personal restante, solo empleo herramienta menor.

3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES

Se realiza inspección del uso de los elementos de protección del personal actual de la obra, encontrando que la mayoría están utilizando los EPP durante sus labores; para el personal que, por motivos de incomodidad u olvido que no estaban usando sus elementos de protección, se les informo de la importancia del uso de estos y el cumplimiento de este.

5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES

PROYECTO: **CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022** "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se ausento ya sea por enfermedad general o diligencias personales, en el periodo del presente informe.

No se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo en los frentes de los polideportivos activos: Escallón, San Luis y La Magnolia. Por otro lado, algunos de los trabajadores se ausentaban constantemente y no presentaron incapacidad o excusa valida.

DATOS DE AUSENTISMO LABORAL MES DE OCTUBRE						
NOMBRE	Ausencia por causa de salud	No. Horas de ausencia por EL	Ausencia por EL	No. de horas de ausencia citas médicas	No. de horas diligencias personales	No. total de horas ausentismo
Diana María Olaya Ortiz	0	0	0	0	0	0
Donis David Carbono Bastidas	0	0	0	0	0	0
Elkin Fabian Silva Cortés	0	0	0	0	0	0
Anderson Eduardo Silva Cortés	0	0	0	0	0	0
Jhoan Ferney Morales Sarmiento	0	0	0	0	0	0
Cristian Favian Romero Villalba	0	0	0	0	0	0
Eduardo Javier de Avila Torres	0	0	0	0	0	0
Esteban David Cortés Romero	0	0	0	0	0	0
Nestor Favian Lopez Garcia	0	0	0	0	0	0
Mario Andres Bautista Vargas	0	0	0	0	0	0
Celso Steven Hernandez Quevedo	0	0	0	0	0	0

Durante el periodo contemplado en el presente informe, ningún trabajador solicitó permisos para atender diligencias personales.

6. CONCLUSIONES

Se informo al personal los peligros que se pueden generar en obra y la importancia del uso de los EPP para el resguardo de su salud y bienestar.

Hasta la fecha de finalización del periodo del presente informe, no se han reportado ni accidentes ni incidentes laborales o ausencias por enfermedad laboral.

Al finalizar las labores diarias, se realiza el almacenamiento de herramientas y equipos en bodega, dejando organizado el espacio donde se desarrollan las labores de obra.

DANIEL MAURICIO OLIER RESTREPO
Profesional en seguridad salud y trabajo

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

PERIODO 01 DE NOVIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

MADRID, CUNDINAMARCA

2023

DATOS DE ENTRADA

OBJETO: CONTRADO 543 .2022 "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

TIEMPO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2022

ALCANCE

Aplica al total de los colaboradores y encargados de la ejecución del "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

OBJETIVOS

Capacitar al personal de trabajo en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST aplicados durante la ejecución del proyecto.

Establecer las medidas mínimas de seguridad en el trabajo para la realización de las actividades propias del objeto del contrato de obra.

CONTENIDO

ALCANCE 2
OBJETIVOS 2
1. DEFINICIONES 4
2. MANEJO DE HERRAMIENTAS 5
3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 5
3.1. Protección de la cabeza 5
3.2. Protección de los pies 5
3.3. Protección de las manos y piel 6
3.4. Protección de la vista 6
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA 7
5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL 8
6. INDUCCIÓN 8
7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 8
3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP 11
3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES 12
5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES 12
4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 12
6. CONCLUSIONES 14

1. DEFINICIONES

Caso: Un evento registrable en una población o grupo de estudio de una enfermedad en particular, un trastorno de la salud o una condición bajo investigación.

COVID-19: Siglas de Coronavirus 2019 (enfermedad por coronavirus 2019), es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus denominado SARS-CoV-2, que se ha diseminado desde China o más de 170 países alrededor del mundo, incluida Colombia.

Emergencia de salud pública: Evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de la enfermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada.

Derrumbe: Desprendimiento de una porción de suelo o roca de una excavación y su desplazamiento súbito hacia la excavación por caída o deslizamiento.

Espacio confinado: Cuando los medios de entrada y salida son restringidos, con el espacio adecuado para permitir las labores por el personal.

Excavación: Es el corte, depresión, cavidad o zanja hecha mecánica o manualmente con el fin de remover tierra, arena, grava, rajón, recebo u otro material.

Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de un año para calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar sistemas de prevención y protección, elaborar especificaciones de trabajo, proyectos o productos acorde con lo establecido a la normativa.

Sistema de protección: Significa un método (inclinación, puntales, entibados o niveles escalonados) para proteger a los trabajadores de un derrumbe, de materiales que podrían caer o rodar en la excavación o por el colapso de estructuras colindantes.

Suelo: Es el material no consolidado o semi consolidado compuesto de la mezcla de partículas de diferentes tamaños, diferentes minerales y en diferentes cantidades y clases de materias orgánicas los cuales se encuentran sobre la corteza terrestre.

Zanja, trinchera: Excavación estrecha realizada en la tierra donde generalmente la profundidad es superior al ancho de esta.

Trabajo en Alturas: Se refiere a todas y cada una de las actividades que se desarrollan a partir de 1,5m de altura donde se establece el uso de sistemas de

protección tales como cuerdas, líneas de vida o arneses

2. MANEJO DE HERRAMIENTAS

Las diferentes actividades establecidas para la ejecución de los cuatro (4) Polideportivos del Municipio de Madrid Cundinamarca, requieren del uso de una serie de herramientas y equipos los cuales tienen la capacidad de afectar al personal de trabajo en función del uso que se le pueda dar. La ejecución del proyecto requiere del funcionamiento de una serie de maquinaria y equipos que de no ser direccionadas las indicaciones al personal que se va a hacer a cargo, pueden derivar en lesiones para el personal de trabajo:

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Las condiciones de trabajo en la construcción son tales que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la planificación del proyecto y el diseño de tareas, se necesitara algún tipo de protección personal EPP, como lo son cascos, protección de la vista y los oídos, botas y guantes, sin embargo el uso de EPP tiene sus desventajas tales como; algunas formas de EPP son incómodas y hacen más lento el trabajo, se necesita mayor supervisión para asegurar que los obreros usen lo elementos de protección.

3.1. Protección de la cabeza

Los objetos que caen, las izadas por las grúas y los ángulos sobresalientes se dan por todas partes en las obras de construcción, una herramienta pequeña o un perno que cae a 10 o 20 metros de altura puede causar lesiones graves o incluso la muerte, las heridas en la cabeza se producen cuando el obrero trabaja o se desplaza inclinado hacia adelante, cuando endereza el cuerpo después de haberse inclinado.

Los cascos de seguridad resguardan la cabeza efectivamente contra la mayoría de esos riesgos y es preciso usar casco constantemente en la obra, sobre todo en las áreas donde se está realizando el trabajo más arriba.

3.2. Protección de los pies

Las lesiones de los pies se dividen en dos categorías principales; las causadas por la penetración de clavos que no han sido sacados o doblados en la planta del pie, y las debidas a aplastamientos del pie por caída de herramientas o materiales. Ambas pueden minimizarse usando calzado protector, la clase de zapatos o de botas

protectoras dependerá de la índole del trabajo (por ejemplo, la presencia de agua subterránea en la obra) pero todo calzado protector debe tener suela impenetrable y capellada con una puntera de acero.

3.3. Protección de las manos y piel

Las manos son sumamente vulnerables a las lesiones accidentales, y en la construcción manos y muñecas sufren más lastimaduras que ninguna otra parte del cuerpo. Sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas, luxaciones, esguinces, amputaciones y quemaduras, que en su mayoría son evitables con mejores técnicas y equipo de trabajo manual, con el uso de protección adecuada como guantes o manoplas.

3.4. Protección de la vista

Los fragmentos y esquirlas, el polvo o la radiación son causas de muchas lesiones de la vista en las siguientes tareas:

- El picado, corte, perforación, labrado o afirmado de piedra, concreto y ladrillo con herramientas de mano o automáticas.
- El corte y soldadura de metales

Algunos de estos riesgos se pueden eliminar de modo definitivo por medio de resguardos adecuados en las máquinas, extractores de aire o un mejor diseño de tareas. En muchos casos, como por ejemplo el labrado y corte de piedra, la protección personal (anteojos de seguridad o visera) es la única solución práctica. A veces los obreros conocen los riesgos que corren y sus consecuencias si sufren daño en los ojos, pero no utilizan protección.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA

ID		CARGO	NOMBRE	CC
DR	1	Dir. Obra	Javier Antonio Gonzalez Arenas	1.126.001.358
ING	1	ING. Residente	Daniel Camilo Prada Millán	1.098.651.957
AEL	1	AS. Electrico	Carlos Julio Acevedo Ferreiro	91.043.063
SS	1	PR. Seguridad y Salud	Daniel Mauricio Oler Restrepo	71.664.413
TP	1	Topografo	Leonel Eduardo López Duran	1.102.721.369
CO	1	Coordinador de Obra	José Lamus Rodriguez	1.020.776.092
AES		AS. Estructural	Nicolas Alfonso Correa Duarte	1.090.425.817

ADMINISTRATIVO – OPERATIVO					
CARGO	NOMBRE	CC	ESTADO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Ing Auxiliar	Diana María Olaya Ortiz	1.073.176.550	26/09/2023		
SOLDADORES					
CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Soldador	Elkin Fabian Silva Cortés	91.517.987	26/09/2023		
Soldador	Donis David Carbono Bastidas	7.572.127	26/09/2023	1/11/2023	
Soldador	Anderson Eduardo Silva Cortés	1.102.718.418	26/09/2023		
Soldador	Jhoan Ferney Morales Sarmiento	1.102.717.910	26/09/2023		
Soldador	Cristian Favian Romero Villalba	1.102.721.147	26/09/2023	1/11/2023	
Soldador	Mario Andres Bautista Vargas	1.096.247.138	12/10/2023		
Soldador	Celso Steven Hernandez Quevedo	1.073.150.231	12/10/2023		

En la anterior tabla, se relaciona el personal del contratista del mes de diciembre; se incluye a las personas que se contrataron, y por diversos motivos se desvincularon en el transcurso del mismo mes, motivos los cuales también se exponen en la misma tabla, en la columna denominada "Observaciones".

Anexo 1. Afiliaciones ARL

Anexo 2. Planillas de seguridad social

5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL

El personal es apto para realizar las respectivas labores como ayudantes, oficiales y maestros de acuerdo con entrevista laboral realizada por coordinador de obras y empresa.

6. INDUCCIÓN

El maestro de obra realizo inducción, acerca del manejo de equipos, maquinaria y herramientas con acompañamiento de personal SST, a cada uno de los ayudantes y oficiales que ingresan y estarán ejecutando las actividades de mayor complejidad, como es el caso de:

- Manejo de las pulidoras
- Manejo de compresores
- Manejo de andamios

7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el periodo del mes de diciembre se realizaron actividades de capacitación, charlas y calistenia a todo el personal activo en los diferentes frentes de trabajo (San Luis, Escallón, Magnolia y San Carlos) ejecutados al iniciar labores brindando temas como:

- Manejo manual de cargas
- Lesiones pequeñas
- La seguridad responsabilidad de todos
- Manejo de extintores
- Uso de EPP
- Peligro mecánico
- Peligro locativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co





Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Durante el mes de diciembre se hizo entrega al personal de los siguientes elementos de protección personal:

- Guantes: se entregaron guantes de seguridad
- Gafas de seguridad
- Tapa oídos de inserción

El manejo de los equipos empleados en el periodo del presente informe estuvo a cargo del siguiente personal:

Pulidoras

- Elkin Silva Cortés – Soldador
- Anderson Silva Cortés – Soldador
- Jhoan Morales Sarmiento – Soldador
- Cristian Romero Villalba – Soldador
- Mario Andres Bautista Vargas
- Celso Steven Hernandez Quevedo

Andamios

- Elkin Silva Cortés – Soldador
- Anderson Silva Cortés – Soldador
- Jhoan Morales Sarmiento – Soldador
- Mario Andres Bautista Vargas
- Celso Steven Hernandez Quevedo

Compresor

- Elkin Silva Cortés – Soldador
- Anderson Silva Cortés – Soldador
- Jhoan Morales Sarmiento – Soldador
- Mario Andres Bautista Vargas
- Celso Steven Hernandez Quevedo

Demoledor y tronzadora

No se emplearon

El personal restante, solo empleo herramienta menor.

3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES

Se realiza inspección del uso de los elementos de protección del personal actual de la obra, encontrando que la mayoría están utilizando los EPP durante sus labores; para el personal que, por motivos de incomodidad u olvido que no estaban usando sus elementos de protección, se les informo de la importancia del uso de estos y el cumplimiento de este.

5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES

POYECTO: **CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022** "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se ausento ya sea por enfermedad general o diligencias personales, en el periodo del presente informe.

No se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo en los frentes de los polideportivos activos: Escallón, San Luis y La Magnolia. Por otro lado, algunos de los trabajadores se ausentaban constantemente y no presentaron incapacidad o excusa valida.

DATOS DE AUSENTISMO LABORAL MES DE NOVIEMBRE						
NOMBRE	Ausencia por causa de salud	No. Horas de ausencia por EL	Ausencia por EL	No. de horas de ausencia citas médicas	No. de horas diligencias personales	No. total de horas ausentismo
Diana María Olaya Ortiz	0	0	0	0	0	0
Elkin Fabian Silva Cortés	0	0	0	8	0	8
Anderson Eduardo Silva Cortés	0	0	0	0	0	0
Jhoan Ferney Morales Sarmiento	0	0	0	0	4	0
Cristian Favian Romero Villalba	0	0	0	0	0	0
Donis David Carbono Bastidas	0	0	0	0	0	0
Mario Andres Bautista Vargas	0	0	0	0	0	0
Celso Steven Hernandez Quevedo	0	0	0	0	0	0

Durante el periodo contemplado en el presente informe, el trabajador Jhoan Morales solicitó permiso para atender diligencias personales.

6. CONCLUSIONES

Se informo al personal los peligros que se pueden generar en obra y la importancia del uso de los EPP para el resguardo de su salud y bienestar.

Hasta la fecha de finalización del periodo del presente informe, no se han reportado ni accidentes ni incidentes laborales o ausencias por enfermedad laboral.

Al finalizar las labores diarias, se realiza el almacenamiento de herramientas y equipos en bodega, dejando organizado el espacio donde se desarrollan las labores de obra.

DANIEL MAURICIO OLIER RESTREPO
Profesional en seguridad salud y trabajo

ANEXO 3.
PLANILLAS SEGURIDAD

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900E30072	SOS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 29A # 13 - 57 OFC 903	7955312	gisk.sosconstrucciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - Aportes de 200 o			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APE
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				316	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	30/11/2023	72636059	$56.075.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

o EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CO55	EPS-S Capresoca	901543211-0	48.000	0		0		0	30	1.000	0	49.000	2
2001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	126.000	0		0		0	30	2.600	0	128.600	3
5003	Salud Total EPS	800130907-4	396.300	0		0		0	30	7.900	0	404.200	12
5002	Sanitas EPS	800251440-6	850.600	0		0		0	30	17.700	0	868.300	30
5008	Compensar EPS	830008143-7	207.900	0		0		0	30	6.000	0	213.900	7
5010	EPS Sura	800088702-2	1.500	0		0		0	20	100	0	1.700	1
5017	Famisanar EPS	830003564-7	946.800	0		0		0	20	31.900	0	962.600	39
5037	Nueva EPS	900156264-2	1.541.700	0		0		0	20	30.600	0	1.572.300	66
5040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-9	1.600	0		0		0	20	100	0	1.700	1
5041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	794.600	0		0		0	20	15.800	0	810.400	21
5042	EPS-COOSALUD	900226715-3	46.400	0		0		0	20	1.000	0	47.400	1
5046	SALUD MIA EPS	900854264-1	1.600	0		0		0	20	100	0	1.700	1
5C01	DUSAKAWI EPS	824001398-1	55.700	0		0		0	20	1.200	0	56.900	2
5C03	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "AIC"	817001773-2	1.600	0		0		0	20	100	0	1.700	1
5C05	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-1	410.000	0		0		0	20	8.200	0	418.200	12
5C07	EPS-S Mutual Ser	830037236-7	92.800	0		0		0	20	1.800	0	94.700	2
5C18	EPS-S Emssanar	900215285-8	1.008.500	0		0		0	20	31.100	0	1.039.600	43
5C24	EPS-S Cajacopi	900226715-3	430.100	0		0		0	20	8.900	0	439.720	11
5C62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	66.600	0		0		0	20	1.300	0	67.900	1
5001	Fondo Sol y Sal Min Salud	891857738-1	10.800	0		0		0	20	300	0	11.200	1

TOTALES PENSIÓN

o AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
031	Protección (MD + Proteccion)	800229739-0	4.111.800	0	0	0	0	20	81.800	0	4.193.400	20
031	Porvenir	800224808-6	29.731.400	0	0	0	0	20	410.900	0	30.132.300	138
031	Old Mutual	800256969-3	185.600	0	0	0	0	20	3.700	0	189.280	1
031	Colfondos	800227940-4	1.373.000	0	0	0	0	20	37.300	0	1.400.900	6
034	Colpensiones	900336004-7	2.596.600	0	0	0	0	20	51.930	0	2.648.130	17

TOTALES RIESGOS LABORALES

o ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
11	ARL SURA	800820789-5	12.159.200				12.159.200	20	241.100	12.400.200			121.980	12.400.300	218

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	8[illegible]37-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 36A # 10 - 97 OFC 903	7[illegible]6	[illegible]@gcsconstrucciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
UNICA	5 - Menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				215	3
					TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	30/10/2023	72026229	$36.976.000	

TOTALES CAJAS

Cajas CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CF24	Compensar Caja	8[illegible]842-7	2.488.600	20	46.900	2.535.500	77
CF33	Caja Piloto Norte	8[illegible]606-1	3.807.100	20	71.400	3.878.500	102
CF39	Cajasan	8[illegible]106-1	1.291.900	20	25.700	1.317.500	37

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISS, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	28	7.359.520	7.800.000
Pensión	5	28.950.000	28.246.000
Riesgos Laborales	1	12.109.200	12.400.500
CCF	3	7.359.520	7.800.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	28	55.957.200	34.876.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 9

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900600537-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 12 - 67 OFC 903	7063210	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Empleador			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI		Si

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VAC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				216	0
2023-11	2023-10	E	30/11/2023	72838039	TOTAL A PAGAR	
					$94.075.600	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente en el exterior	IGE	IRL	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	LPA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cód. Docente	Cód. CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
MONTOYA GOMEZ MARIA FERNANDA	1	0																																										
GARZON ROMERO ERIK SANTIAGO	1	0																																										
ARDILA ARGOTH CARLY	1	0																																									
RODRIGUEZ DOMINGUEZ NATALI ANDREA	1	0																																									
LOZANO MENDOZA ROCIO	1	0																																									
MIRANDA MEJIA EDWARDO	1	0																																									
SANTANDER RODRIGUEZ CESAR ROBERTO	1	0																																									
GOMEZ PRADO KEVIN DUBYCER	1	0																																									
[illegible]	1	0																																									
ACOSTA GRAHAM ARLET	0	0																																									
IMBACHI GARCIA ZIDOLFO	1	0				X																																					
MORALES HERNANDEZ JHON ARMANDO	1	0																																									
SUAREZ DIAZ JUAN CAMILO	1	0																																									
CABALLERO GUARNIZO SAMIR ADRIAN	1	0																																									
MIRANDA ROLAND MOISES	1	0				X																																					
TRIANA CONTRERAS LUIS EDUARDO	1	0				X	X																																				
MACHADO ORTIZ JOSE LUIS	1	0				X																																					
MUÑOZ GORDILLO BRICETH DANIELA	1	0				X	X																																				
ARNEDO MENDOZA JHOANA FERNANDO	1	0				X	X																																				
CORTES ROMERO STEFANY DAVID	1	0				X																																					
GALEANO PORTILLO JESUS ESTEBAN	1	0				X	X																																				
ALVEAR SANTANDER DANIELA ROCIO	1	0																																									
MARMOLEJO VELEZ JORGE ARLEY	1	0																																									
GARZON ALFONSO CRISTIAN ADOLFO	1	0																																									
VARGAS RUBIO MOLI CRISTIAN FELIPE	1	0				X																																				
MOSQUERA OLAYA JOSE ALEJANDRO	1	0				X																																				
MONTAÑO PATO ANGELO ALESSANDRO	1	0				X	X																																				
GOMEZ MUÑOZ INGRY DAYANA	1	0																																									
RODRIGUEZ HERRERA ALEXANDRA ALBERTO	1	0				X																																				
BALLESTEROS LUNA JUAN JOSE	1	0				X	X																																				
PORTILLA DIAZ ALEJANDRO	1	0				X	X																																				
MENDEZ CARDENAS JUAN FELIPE	1	0				X																																				
ARENA ACOSTA WILMAR EDUARDO	1	0				X	X																																				
GOMES RODRIGUEZ EVER DANIEL	1	0				X																																				
MONTERROSAS PINEDA DANIEL ESTEBAN	1	0				X	X																																			
SILVA GARCIA FUCLEIS	1	0				X	X																																				
PALOMEA ROJA JUAN GABRIEL	1	0																																									
SANTANA OSPINOSA DELIA	1	0																																								
LOPEZ M. DIAZ JUAN DAVID	1	0																																								
PACHECO ESKAL OVIEDO FRANCISCO	1	0																																								

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900831937-2	SGS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 20A # 13 - 97 OFC 903	7966319	gsc.serviciosconstrucciones@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	5 - menos de 200 s		SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI		N

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FORM. PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
PERIODO SALUD	PERIODO PORMENARIS				216	0
2023-11	2023-10	E	30/11/2023	72026329	TOTAL A PAGAR	
					$56,976,600	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES															POSICIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				PCF			PARAFISCALES					
	Apellidos y Nombres	Tipo Cot.	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Actividad Alto Riesgo Pensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días Reportados	Cod. ARP	IBC ARP	Cotización	Valor Ref. Aporte Afiliado	Valor Ref. Aporte Empleador	Fecha (extraordinaria de cotización)	Fecha (extraordinaria de cotización)	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización Sin Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Días Cotizados	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	RAMIRO LOPEZ JHOS FREDY	1	0																		30	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF04	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
2	MIRIAM ESCAMILLA ANDRES FELIPE	1	0			X															5	20178	38,667	5,334	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,756	CCF24	38,667	1,100	0	0	0	0	0
3	MORA TORRES JHOSEP FERLEY	1	0																		30	230301	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
4	ARIAS VARON JOHAN SEBASTIAN	1	0			X															5	230201	607,334	84,200	0	0	0	0	EPS041	607,334	24,200	14-11	607,334	5	40,000	CCF24	607,334	26,000	0	0	0	0	0
5	HERNANDEZ QUINTERO CESAR ESTEBAN	1	0			X															5	230201	734,667	101,800	0	0	0	0	CPS037	734,667	29,400	14-11	734,667	5	47,000	CCF24	734,667	29,400	0	0	0	0	0
6	PLATA ORTIZ DIANA MARIA	1	0																		30	230301	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
7	OLIVARI SUAREZ JOEL RAFAEL	1	0																		30	230301	479,667	66,400	0	0	0	0	EPS041	479,667	19,200	14-11	479,667	5	33,000	CCF24	479,667	19,200	0	0	0	0	0
8	PATIÑO TORRES ROBIN YOVANI	1	0																		30	230301	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
9	PATIÑO TORRES VICTOR ALFONSO	1	0																		30	230301	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
10	PERNIA MUNOZ JOSE MIGUEL	1	0																		30	230301	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
11	ROSERO ENRIQUEZ CARLOS MARINO	1	0																		30	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
12	MARTINEZ GONZALEZ JORGE CAMILO	1	0																		30	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
13	CHACATAN CASTRO JESUS JAVIER	1	0																		30	230201	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS037	2,500,000	100,000	14-11	2,500,000	5	174,800	CCF24	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
14	VELA JUAN SEBASTIAN PINZON	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
15	MARTINEZ MANRIQUE MARIO ALBERTO	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
16	PINCHAO CABRERA DIANA ANDREA	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
17	TRIANA DE LA CRUZ JUAN DAVID	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
18	VITAL VIVA MICHAEL ALBER	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
19	ROMERO MARTINEZ JOSE GERVELIO	1	0																		30	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
20	ESPINOSA MEDINA DARIO FERNANDO	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
21	ESPINOSA MEJIA JOHN ALEXANDER	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
22	DIAZ DEL CASTILLO VILLOTA WILMER FERNANDO	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
23	GUARIN RODRIGUEZ OSCAR LEONEL ARTURO	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
24	OROZCO DANIALAL Colombia	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
25	PASTRANA DIAZ VICTOR ALFONSO	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
26	ZAMBRANO MENDEZ ANDERSON GIOVANNI	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
27	VILLOTA DIAZ JHONATAN ESMITH	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
28	OROZCO DELGADO JEFERSON ESTIVEN	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
29	HIDALGO CABANOVA ANDERSON SANTIAGO	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
30	CARVAJAL RIVERA FREDDY ALEJANDRO	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
31	ROJAS ANDRADE CRISTIAN DANILO	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
32	GUARAMATAN MANTILLA RUBEN DARIO	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
33	SUAREZ DELGADO LEO JAVSHER JAIME	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
34	LAGOS SANTIDAD MIGUEL ANGEL	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
35	GABRIELLO QUINTERO CRISTIAN DAVID	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
36	OROZCO ZARATE ESTIVEN	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
37	NOVA JIMENEZ JOSE ANGEL	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
38	SALA LIPEN ANDERSON JESUS	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
39	JACANAMEJOY DAVID CLAUDIA MARINA	1	0																		5	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
40	MELO MELLER YANET	1	0																		30	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
41	PANA OLIVERIO	1	0																		0	230201	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	
NI	900853507-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 603	7998319	gcs.construcciones@hotmail.com	CRONOGRAMA PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA ENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D - Demás de 200 c	-		SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VRR
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				216	0
2023-11	2023-10	E	30/11/2023	72826038	TOTAL A PAGAR	
					$56.975.500	

OR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																						PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Apellidos y Nombres	Afiliado	Activo	Suspendido	Cotiza Exterior	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Otros	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor total a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización	Cod. ARL	IBC ARL	Días a Cotizar	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	LIBARDO LUCAS	1	D																			220307	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	0	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	PEÑA URIBE ELIAS	1	D																			230207	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	0	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	CAMP RINCON RAFAEL	1	D																			230307	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	0	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	SERRUDO CRUZ JOSE DAVID	1	D																				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	LOPEZ CONTRERAS YEISON DARIO	1	D																			230911	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	ESPAÑA TORRES OSCAR OSWALDO	1	D																			25-14	1,200,000	192,000	0	0	0	0	CPS001	1,200,000	48,000	14-11	1,200,000	5	48,000	CCF24	1,200,000	48,000	0	0	0	0	0
	GUTIERREZ DIAZ DEISY FANNY	1	D																			25-14	1,880,000	300,800	0	0	0	0	CPS001	1,880,000	75,200	14-11	1,880,000	5	75,200	CCF24	1,880,000	75,200	0	0	0	0	0
	ARANGO RAMIREZ JOSE WILFREDO	1	D																			230207	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	ZABALETA RODRIGUEZ ORLEN LUIS	1	D			X																230207	270,667	43,307	0	0	0	0	MIN001	270,667	10,200	14-11	270,667	5	10,800	CCF25	270,667	10,800	0	0	0	0	0
	LAGOS MIGUEL ANGEL	1	D																			230307	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	PORTILLA JURADO JOSE ISAAC	1	D																			230307	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	PINZON GOMEZ JOHAN SEBASTIAN	1	D																			230307	1,750,000	280,000	0	0	0	0	EPS037	1,750,000	70,000	14-11	1,750,000	5	70,000	CCF24	1,750,000	70,000	0	0	0	0	0
	ROMERO VILLAMIZAR CRISTIAN FAVIAN	1	D																			230307	1,750,000	280,000	0	0	0	0	EPS037	1,750,000	70,000	14-11	1,750,000	5	70,000	CCF24	1,750,000	70,000	0	0	0	0	0
	BRUCE MENDOZA ADRIC ALBERTO	1	D																			230307	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	GARCIA VELASQUEZ CRISTIAN RONALDO	1	D																			230307	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	FERNANDEZ MORALES GERMAN DAVID	1	D																			230307	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	SUESCUN AGUDELO EDELSON RAMIRO	1	D																			230307	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	MORALES SARABANDO DIONAI ROMEO	1	D																			25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	JEREZ CORTES ANDERSON EDUARDO	1	D																			230307	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	MORALES CASTRO WILMER JAVIER	1	D																			230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	TORO ALVAREZ RAISA DARIZ	1	D																			230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	MILLO MORALES CRISTIAN ALONSO	1	D																			230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	ROMO ORTEGA VICTOR MANUEL	1	D																			230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	TORO PANTOJA SARAH ARLEY	1	D																			230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	ARIAS GONZALEZ HAROLD DANIEL	1	D																			230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	ROJAS HERRERA OMAR FERNANDO	1	D																			230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	LOPEZ GARCIA HECTOR RAFAEL	1	D			X																230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	TORO DIAZ AMPARO DAVID	1	D			X	X															230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	BADILLO ROMERO LAMBER	1	D				X															230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	MUÑOZ CASTRO MARCO DE JESUS	1	D				X															230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	ROSERO ALVEAR ANDERSON DAVID	1	D				X															230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	TACO ALVEAR ANDRUS DAVID	1	D				X															230307	38,667	6,187	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,547	14-11	38,667	5	1,547	CCF24	38,667	1,547	0	0	0	0	0
	RODRIGUEZ PORRAS JOAN SEBASTIAN	1	D																			230307	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	46,400	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900852037-2	GDS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7565318	gds.construcciones@hotmail.com	ERONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA ENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÓNICA	D – ciertos de 200 o			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	D

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VRC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2/19	0
					TOTAL A PAGAR	
0929-11	2003-10	E	30/11/2020	73606709	$5u,97u,uuu	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																		PERIODO						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
	Apellidos y Nombres	Afiliado	Aportes	Extranjero	Cotiz. Aportes	Dependiente	ING	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INC	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización UPC Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	[redacted]	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	PINEDA DECORIA CECAR IVAN	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	DIAZ RIBERACHE MYER ANCIZAR	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	[redacted]	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	HURTADO POSADA JHON TRIGGER	1	D			0	X	X																0	0	0	0	0																	
	LOAL BALLESTEROS EDITH EMILIO	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	NIETO CASTRO MARK ELL CARMINA	1	D			0	X	X																0	0	0	0	0																	
	DIAZ HERALES JHON SEBASTIAN	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	RODA LASA DANILO RENATO	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	PEÑA PAI DANILO	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	EDGOMAR LOPEZ LEONARDO FRANCO	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	CUARTIN LOPEZ MYRIAM ALEXIS	1	D			0																		0	0	0	0	0																	
	[redacted]	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	GOYES CORTES YILBER FABIAN	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	MUÑOZ NARANJO JOSE MANUEL	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	MENA RENTERIA MATEO JAMEAL	1	D			0	X	X																0	0	0	0	0																	
	MONTALVAZ RENJIFO ROSMIRA	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	GARCIA PAI ANCIZAR	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	MORA CANCEDO CRISTOPHER DANILO	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	ZAMORANO ROMERO JOSE ISRAEL	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	ARVIDO FIGUEROA JOHAN SEBASTIAN	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	MEJIA RODRIGUEZ NELIS RAQUEL	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	HERRERA OSORIO JOEL DAVID	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	[redacted]	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	[redacted]	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	[redacted]	1	D			0	X																	0	0	0	0	0																	
	LOPEZ DEPAVIEGA JOHN HENRY	1	E			0	X																	0	0	0	0	0																	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	8000535137-2	GCR CONSTRUCCIONES S.A.S.		CALLE 26A # 12 - 57 OFC 903	7065319	gcr.contratacion@hotmail.com	ESONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D – Hasta de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI		N

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APO
					219	3
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	30/11/2023	72026339	$20,976,500	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Apellidos y Nombres	Prilacion	Ausilios	Incapacidad General	Licencia Maternidad	Dias Cotizados	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/UPC Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	JARAMILLO RODRIGUEZ NELSON ORLANDO	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS010	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF05	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	CONTRERAS PRIETO WILMAR	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	SANCHEZ JIMENEZ ANGEL ENRIQUE	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	COLONIA MORENO EDILBERTO	1	D			2	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	612,000	23,200	14-11	612,000	3	36,000	CCF24	612,000	22,000	0	0	0	0	0
	BARRIOS BARAHONA ANGELINO	1	D			0																231901	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	SANCHEZ PEÑALOZA HUMBERTO	1	D			2	X															230901	612,000	132,000	0	0	0	0	EPS002	612,000	52,200	14-11	612,000	3	36,000	CCF24	612,000	22,000	0	0	0	0	0
	MADRID SEDOYA WILTER	1	D			0																231901	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	OLIVO RESTREPO DANIEL MAURICIO	1	D			0																231101	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	PEREZ PEREZ JORGE ELIECER	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	SANCHEZ MARTINEZ MISAEL	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS034	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	CARDENAS SANTANA DIANA DAVID	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	FLOREZ ORTIZ ANDRES CAMILO	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	SANABRIA MARCO ANTONIO	1	D			2	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	270,667	10,800	14-11	270,667	3	74,800	CCF24	270,667	10,000	0	0	0	0	0
	SANABRIA MAYORGA JOSEPH GUILLERMO	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	ARIAS GUALTA WILSON ALBERTO	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	FIGUEROA DIAZ CRISTOBAL ESTANISLAO	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	MENDOZA PAEZ RAFAEL MANUEL	1	D			2	X																	0	0	0	0	0	0	EPS010	270,667	10,800	14-11	270,667	3	74,800	CCF24	270,667	10,000	0	0	0	0	0
	JURADO NIETO CARLOS ALFREDO	1	D			0																231001	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	SERRANO NIETO LUIS ANTONIO	1	D			2	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	771,104	27,800	14-11	771,104	3	53,800	CCF24	771,104	27,800	0	0	0	0	0
	SERRANO VILLALOBOS JUAN DE JESUS	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF05	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	MEZA LOMBANA LUIS ENRIQUE	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS011	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	ALVAREZ LOPEZ WILLIAM FERNANDO	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	SANDUCA SARMIENTO NESTOR ANDRES	1	D			0																230201	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS037	2,000,000	86,400	14-11	2,000,000	1	10,000	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
	MIRANDA FERNANDEZ ROMEO ENRIQUE	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	CCF24	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	VIVERA VALENCIA LIBARDO APOLINAR	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS010	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	VILLEGAS SARMIENTO EDUARDO ELEAZAR	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0
	PELA SANTANDER JOSE	1	D			0																230201	1,160,000	165,600	0	0	0	0	EPS034	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	80,600	CCF24	1,160,000	80,600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8[illegible]07-2	GDS CONSTRUCCIONES S.A.S.	CALLE 29A # 13 - 97 OFC 903	7[illegible]19	gds.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	3 – cierre de [illegible]			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	N

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					218	3
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	09/11/2023	72606330	550.570.500	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																						PENSIONES						SALUD			RIESGOS LABORALES								PARAFISCALES				
	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero sin residencia	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP							Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Tarifa pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días a Cotizar	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Tarifa CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	GUEVARA [illegible] JULIO CESAR	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	MEJIA MORALES-RAMIRO MEJIA	1	0																								23[illegible]	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	PONTILLO QUINTERO EDWARDS DAMIR	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	CAJ015	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	OYUELA SANTAMARIA ANTONIO	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	SOS019	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	MORALES PANTELEON-DALIA [illegible]	1	0			X																					23CC[illegible]	96.667	6.200	0	0	0	0	CCF[illegible]	96.667	1.000	14-11	96.667	5	3.700	CCF32	96.667	1.000	0	0	0	0	0
6	HERNANDEZ [illegible] ALVARO [illegible]	1	0																								23CC[illegible]	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	TORO [illegible] JOSE WILLIAM	1	0																								23CC[illegible]	1.160.000	160.400	0	0	0	0	CAJ[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	SOS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	LADOS LOPEZ HELENA [illegible]	1	0																								25-14	1.160.000	154.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	PINTOR PONTILLO EDUARDO [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	CAJ[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	ALVAREZ [illegible] JOSE	1	0			X	X																				23CC01	96.667	6.200	0	0	0	0	CCF[illegible]	96.667	1.000	14-11	96.667	5	3.700	CCF32	96.667	1.000	0	0	0	0	0
12	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	SOS019	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	CAJ024	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	DIAZ MARTINEZ OSCAR ORLANDO	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS024	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	LOZANO [illegible] OSCAR ENRIQUE	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS024	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								25-14	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CARREÑO GOMEZ NELSON	1	0																								25-14	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	QUINTANA MORALES ARGEMIRO	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	OLIVA CORTES [illegible] PARRA	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
20	QUEVEY TRUJILLO ALVARO	1	0			X	X																				25-14	96.667	6.200	0	0	0	0	EPS050	96.667	1.000	14-11	96.667	5	3.700	CCF24	96.667	1.000	0	0	0	0	0
21	RAMOS CASTRO RAMIRO HERNAN	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	CCF062	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	RAMIREZ [illegible] JURADO OLIVERIO	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	SOS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	CAJ[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
24	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.700	CCF24	96.667	1.000	0	0	0	0	0
25	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
26	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	SOS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
27	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
28	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
29	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
30	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
31	[illegible] [illegible] [illegible]	1	0																								23CC01	1.160.000	160.400	0	0	0	0	EPS[illegible]	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.600	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900623617-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 28A # 13 - 97 OFC 903	7966316	gcs.contratos.laines@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ADECUADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				216	0
2023-11	2023-10	E	29/11/2023	73826339	TOTAL A PAGAR	
					$30,970,000	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Apellidos y Nombres	Tipo	Núm	Tipo Doc	Extranj	Colombiano	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Nivel de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
ALFARO MORENO CRISTIAN FELIPE	1	0			0																	230301	1,160,000	180,400	0	0	0	0	EPS047	1,160,000	86,400	14-11	1,160,000	3	86,400	CAFY05	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ARDILA CALLEJAS OSCAR EDUARDO	1	0			0	X																230301	140,607	6,200	0	0	0	0	EPS040	39,667	1,800	14-11	39,667	3	2,760	CCF05	39,667	1,600	0	0	0	0	0
BARRIO GARCIA JOSE PEDRO	1	0			0	X																20-19	39,667	2,200	0	0	0	0	EPS037	39,667	1,800	14-11	39,667	3	2,760	CCF24	39,667	1,600	0	0	0	0	0
CACERES CHINCHILLA ALEJANDRA	1	0			0	X																230301	1,281,667	172,225	0	0	0	0	EPS037	1,660,667	49,400	14-11	1,281,667	3	75,400	CCF05	1,281,667	49,400	0	0	0	0	0
CHICAIZA RUEDA RAFAEL	1	0			0	X																20-19	39,667	2,200	0	0	0	0	EPS111	39,667	1,800	14-11	39,667	3	2,760	CCF39	39,667	1,600	0	0	0	0	0
CRASCOS RAMIREZ JOSE MIGUEL	1	0			0	X																230301	1,281,667	172,225	0	0	0	0	EPS041	1,660,667	51,400	14-11	1,281,667	3	75,400	CCF05	1,281,667	49,400	0	0	0	0	0
CRUZ PATIÑO DIEGO ALEXANDER	1	0			0	X																230301	1,281,667	172,225	0	0	0	0	EPS037	1,660,667	49,400	14-11	1,281,667	3	75,400	CCF24	1,281,667	49,400	0	0	0	0	0
HERCTOYA PEREZ ANGELMIRO	1	0			0	X																230301	773,334	121,600	0	0	0	0	EPS037	773,334	31,200	14-11	773,334	3	54,600	CCF39	773,334	31,000	0	0	0	0	0
PARRA MORAL SIMEON ENRIQUE	1	0			0	X																230301	773,334	121,600	0	0	0	0	EPS037	773,334	31,200	14-11	773,334	3	54,600	CCF39	773,334	31,000	0	0	0	0	0
SANCHEZ MORENO OSCAR JAVIER	1	0			0	X																230301	813,000	128,000	0	0	0	0	EPS037	813,000	32,800	14-11	813,000	3	57,400	CCF24	813,000	32,600	0	0	0	0	0
SIERRA BOLIVAR LUIS EDUARDO	1	0			0	X																20-14	180,334	21,000	0	0	0	0	EPS039	180,334	7,200	14-11	180,334	3	12,600	CCF24	180,334	7,200	0	0	0	0	0
SIERRA ALVAREZ CARLOS GIOVANNI	1	0			0	X																230301	734,667	113,600	0	0	0	0	EPS078	734,667	29,400	14-11	734,667	3	51,200	CCF05	734,667	29,400	0	0	0	0	0
SOSA ROJAS FERNANDO DAVID	1	0			0	X	X															230301	39,667	6,200	0	0	0	0	EPS041	39,667	1,800	14-11	39,667	3	2,760	CCF24	39,667	1,600	0	0	0	0	0
CASTRILLON ADRIANA	1	0			0	X	X															230301	39,667	6,200	0	0	0	0	EPS041	39,667	1,800	14-11	39,667	3	2,760	CCF24	39,667	1,600	0	0	0	0	0
SANABRIA MAYORGA RYSH ANTONIO	1	0			0	X																230301	276,667	42,400	0	0	0	0	EPS040	276,667	10,800	14-11	276,667	3	19,200	CCF24	276,667	10,800	0	0	0	0	0
ARDINEZ MENDOZA JHON JAIRO	1	0			0	X																230301	686,000	111,400	0	0	0	0	EPS041	686,000	27,000	14-11	686,000	3	48,000	CCF24	686,000	27,000	0	0	0	0	0
ROJAS SUANCA LUIS ALBERTO	1	0			0	X																230301	39,667	6,200	0	0	0	0	EPS040	39,667	1,800	14-11	39,667	3	2,760	CCF05	39,667	1,600	0	0	0	0	0
CASTELLANOS SUAREZ HENRY	1	0			0	X																230301	39,667	6,200	0	0	0	0	EPS040	39,667	1,800	14-11	39,667	3	2,760	CCF05	39,667	1,600	0	0	0	0	0
CASTRILLON CARLOS ANDRES	1	0			0	X																230301	425,334	66,700	0	0	0	0	EPS037	425,334	17,100	14-11	425,334	3	29,700	CCF39	425,334	17,100	0	0	0	0	0
GRAOS SUAREZ ARLEY FERNANDO	1	0			0	X																230301	276,667	42,400	0	0	0	0	EPS037	276,667	10,800	14-11	276,667	3	19,200	CCF24	276,667	10,800	0	0	0	0	0
GUALDRON AMAYILLA SERGIO	1	0			0	X																230301	276,667	42,400	0	0	0	0	EPS041	276,667	10,800	14-11	276,667	3	19,200	CCF24	276,667	10,800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1128381559	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS		CLL 41 A 6 25 AP 1112	2759453	JAGA_91_28@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-10	2023-10	1	24/11/2023	72320884	TOTAL A PAGAR	
					$276,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Tipo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCO	Sanitas EPS	800251440-6	150,000	0		0		0	0	1,200	0	151,200	1

TOTALES PENSIÓN

Tipo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
PENS	Colpensiones	900336004-7	192,000	0	0	0	0	0	1,000	0	193,000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Tipo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Norte Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
I-23	Positiva Seguros	860011153-6	29,200				29,300	6	300	29,600			200	29,800	1

TOTALES CAJAS

Tipo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradores	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOC, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150,000	151,200
Pensión	1	192,000	193,000
Riesgos Laborales	1	29,300	29,800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	371,300	374,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1126567359	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS	CLL 61 A E 28 AP 1112	2758450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.	S

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	1	24/11/2023	72202684	$374.400	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN BENEFICIARIOS																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Apellidos y Nombres	Tipo Doc	Núm Doc	Tipo Cot	Subtipo Cot	Extranjero	Int	Hijo	Cón	Pad	Her	Pad	Pad	Nie	Pad	Hijo	Hijo	Hijo	Hijo	Hijo	Hijo	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días Lab Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	CC	0	1	0	N																23-14	1.200.000	160.000	0	0	0	0	EPS020	1.200.000	150.000	14-23	1.200.000	0	34.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8999004334	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS	CARRERA 10 No. 5 - 68	7152827841	electricoconstruccionesl@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	S

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	10/11/2023	73228891	$1,077,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

...go EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
...037	Nueva EPS	900156264-2	46.496	0		0		0	0	0	0	46.900	1
...004	EPS-S Colsalud	800256716-5	92.896	0		0		0	0	0	0	92.900	2

TOTALES PENSIÓN

...go AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
...001	Protección (IND + Protección)	800227725-0	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1
...001	Porvenir	800224808-6	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1
...-54	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

...go ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
...-11	ARL SURA	800688792-5	242.400				242.400	0	0	242.400			2.424	242.400	1

TOTALES CAJAS

...go CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
...CF80	Confenalco Santander	890201578-7	139.200	0	0	139.200	2

TOTALES PARAFISCALES

...r Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor Antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	139.200	139.200
Pensión	3	556.800	556.800
Riesgos Laborales	1	242.400	242.400
CCF	1	139.200	139.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.077.600	1.077.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	[redacted]	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS	CARRERA 80 No. 5 - 88	[redacted]	[redacted]	
FORMA ENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
UCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	3
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	10/11/2023	72336591	$1,027,000	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Apellidos y Nombres	Tipo de cotizante	Subtipo	Extranjero no obligado a cotizar a pensión	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo de pensiones de solidaridad	Fondo de pensiones de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	QUINTERO GUALDRON DIEGO GIOVANY	1	0		N																25-14	1,160,000	160,400	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	3	46,400	CCF40	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	BARRERA ROJERO FABIAN RAMIRO	1	0		N																23030*	1,160,000	160,400	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	3	46,400	CCF40	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	ASTUDITO PEREIRA CARLOS JULIO	1	0		N																23030*	1,160,000	160,400	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	3	46,400	CCF40	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RALES DEL APORTANTE

ion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	8	CONTECOR SAS	3 - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024783	SI

RALES DE LA LIQUIDACION

do	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-11	222039463	94914403765	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCO DE OCCIDENTE		$184,500

ON DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
dificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
CONTECOR (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
adjo: OFICINA (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
A Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-01	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	
Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0	

RALES DEL APORTANTE

Ver	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
	9	CONTECOR SAS	0 - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 108 49-48 Torre 3 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.C.	7014783	SI

RALES DE LA LIQUIDACION

de	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-11	323019453	94916021	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCO DE OCCIDENTE		$284,500

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
STRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$185,600
R	230101	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$185,600
STRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$6,100
	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$6,100
STRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$46,400
AR	CCF24	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$46,400
STRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$46,400
	EPS005	800,251,440	4	1	$46,400	$0	$46,400
				1	$284,500	$0	$284,500

ERALES DEL APORTANTE

ion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		LOPEZ SORIA LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 [illegible]	BOGOTA D.C -BOGOTA D.C	[illegible]	No

ERALES DE LA LIQUIDACION

de	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCO DE OCCIDENTE	0	$140,300

ON DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
tificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
NCIPAL (1 Afiliados)				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$4,560		$0	$0	
ajor PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$4,560		$0	$0	
A D.C Depto: BOGOTA D.C (1 Afiliados)				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$4,560		$0	$0	
[illegible]	LOPEZ [illegible]	[illegible]	30	$1,200,000	$192,000	SFS037	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$4,560	0	$0	$0	
Afiliados(1)				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$4,560		$0	$0	

ERALES DEL APORTANTE

ión	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		LOPEZ DARAN LEONEL FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 #141-59	BOGOTA D.C -BOGOTA D.C	7252055	No

ERALES DE LA LIQUIDACION

do	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
221-10	320986413	1480924671	I	2023/11/10	2023/11/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
TRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
	230101	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
TRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
TRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
S	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$0	$0	$150,000
				1	$348,300	$0	$0	$348,300

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-11-07 la empresa INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS con documento de identificación NI 901043519 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CORREA DUARTE NICOLAS ALFONSO identificado con CC-1090425817, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901043519	INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
28153311	E	2023-11-07	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890500516	CCF37	Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	30
