INFORME MENSUAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

INFORME TECNICO No. 15

01 – 30 NOVIEMBRE 2023

MADRID, CUNDINAMARCA


2023

MADRID – CUNDINAMARCA

INFORME TECNICO No. 15

PERIODO: NOVIEMBRE 01 DE 2023 – NOVIEMBRE 30 DE 2023

"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"

Elaboró: DIANA MARIA OLAYA ORTIZ	**Revisó:** DANIEL CAMILO PRADA MILLAN	**Revisó y aprobó:** JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
Cargo: Ing. Auxiliar	**Cargo:** Ing. Residente	**Cargo:** Representante Legal
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 
Fecha: 12/12/23	**Fecha:** 18/12/23	**Fecha:** 25/12/23

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 4
3. LOCALIZACIÓN 4
4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA 5
5. INFORME TECNICO 8
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 8
5.1.1. Valor de Actividades por Frentes 11
5.1.2. Porcentaje por Frentes 13
5.2. REGISTRO PERSONAL 14
5.2.1. PERSONAL 14
5.3. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO 15
5.4. DISEÑOS 15
5.5. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS 16
5.6. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA 16
5.7. REPORTE MULTAS Y SANCIONES 16
5.8. POLIZAS DEL CONTRATISTA 17
5.9. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO 17
5.10. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 17
5.11. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA 17
5.12. AFECTACIONES 18
5.12.1. CONDICIONES CLIMATICAS 18
5.12.2. VANDALISMO 18
6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS 18
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 19
7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN 19
7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS 26
7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA 26
7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS 42
8. CONCLUSIÓN 49

1. INTRODUCCIÓN

La alcaldía de Madrid - Cundinamarca, concluyo contratar a GCS CONTRUCCIONES S.A.S para la ejecución de las actividades establecidas en el contrato No 543 de 2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**


El presente informe surge de la rendición de cuentas para la entidad contratante y consigna todas las actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato, cumpliendo con los aspectos técnicos y contractuales.

2. OBJETIVO

Generar un informe de rendición de cuentas del contrato de obra No. 543 de 2022, dando cumplimiento a las condiciones generales establecidas en el contrato según los requerimientos y observaciones realizadas por parte de la Interventoría y Supervisión.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Madrid. Para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**

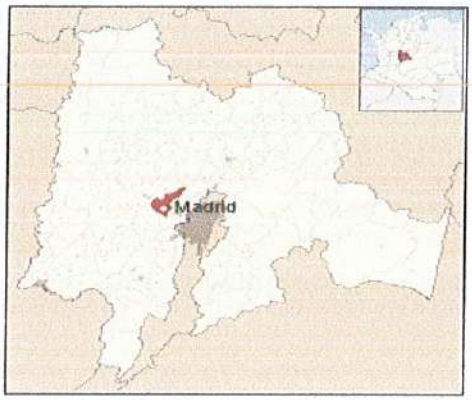

Coordenadas 4°43'50"N 74°15'50"O

4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	CO- 543 - 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MADRID (CUNDINAMARCA) NIT 899.999.325-8
CONTRATISTA	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.653.937-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
DIRECCIÓN	Calle 134 # 13-66
TELÉFONO	275 94 30
CORREO ELECTRÓNICO	gcs.contrucciones@hotmail.com
ACTA DE INICIO OBRA	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	MARTES 31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	LUNES 30 DE ENERO DE 2023
FECHA SUSPENSIÓN No.1	30 DICIEMBRE 2022
DURACIÓN SUSPENSIÓN No.1	UN (01) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.1	30 ENERO 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.1	02 MARZO 2023
FECHA SUSPENSIÓN No.2	21 FEBRERO 2023
DURACIÓN SUSPENSIÓN No.2	UN (01) MES

FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.2	21 MARZO 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.2	30 MARZO 2023
PLAZO PRORROGA No.1	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1	30 MAYO 2023
PLAZO PRORROGA No.2	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.2	30 JUNIO 2023
FECHA SUSPENSIÓN No.3	27 JUNIO 2023
DURACIÓN SUSPENSIÓN No.3	UN (1) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.3	27 JULIO 2023
AMPLIACIÓN No.1 SUSPENSIÓN No.3	UN (1) MES
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.3 DE ACUERDO A AMPLIACIÓN No.1	27 AGOSTO 2023
AMPLIACIÓN No.2 SUSPENSIÓN No.3	QUINCE (15) DIAS
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.3 DE ACUERDO A AMPLIACIÓN No.2	11 SEPTIEMBRE 2023
AMPLIACIÓN No.3 SUSPENSIÓN No.3	DIEZ (10) DIAS
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No.3 DE ACUERDO A AMPLIACIÓN No.3	21 SEPTIEMBRE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No.3	24 SEPTIEMBRE 2023
PLAZO PRORROGA No.3	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.3	24 NOVIEMBRE2023

PLAZO PRORROGA No.4	VEINTE (20) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.4	13 DICIEMBRE 2023
PLAZO PRORROGA No.5	DIEZ (10) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.5	23 DICIEMBRE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.404.922.142,00 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS
VALOR ADICIÓN No.1 POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$331.046.236 TRECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
VALOR ADICIÓN No.2 POLIDEPORTIVO ESCALLON POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$897.459.080,83 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.
VALOR TOTAL CON ADICIÓN No.1 Y No.2	$ 5.633.427.458,83 CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

5. INFORME TECNICO

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el transcurso del mes de NOVIEMBRE se llevaron a cabo las siguientes actividades de acuerdo a los diferentes frentes de trabajo:

A. Frente polideportivo del barrio Escallón:

Inicio de actividades: **16 de junio 2022**

- Limpieza de estructura de cubierta con hidrolavadora
- Pañete liso muros
- Mesones en concreto 2500PSI, e=0,1m (inc. Refuerzo)
- Remates bocel wing aluminio
- Rejilla sifón con sosco 4.5cm x 3.
- Suministro e instalación orinal de llave (incluye grifería)
- Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)
- Suministro e instalación lavamanos de empotrar incluye grifería
- Ventana en aluminio corrediza
- Baranda metálica en tubo estructural de 2" incluye esmalte y anticorrosivo
- Vidrio esmerilado incoloro 4 mm
- Tablero parciales 12 circuitos (incluye tacos de 30a)
- Salida lámpara emt completa
- Acometida sanitaria 6"
- N.P-1. Limpieza de estructura metálica con hidrolavadora
- N.P-23. Canal en lámina galvanizada cal 18; ds=100
- N.P-24. Desmonte de iluminarias (doble altura)
- N.P-36. Salida toma doble emt completa
- N.P-39. Teja sin traslapo
- N.P-42. Lampara hermetica led 2x18w sylvania o similar (incluye cable)

B. Frente polideportivo del barrio San Luis:

Inicio de actividades: **22 de junio 2022**

- Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
- Subbase granular (norma INVIAS 320)
- Placa base concreto 0.15 2500 PSI
- Refuerzo malla electrosoldada
- Acero figurado 60000 PSI
- Baranda metálica en tubo estructural de 2" incluye esmalte y anticorrosivo
- Reflector 200w
- Salida lámpara emt completa
- Lámpara a prueba de humedad tipo tortuga
- Acometida aérea 10 m pvc
- Canal en lámina galvanizada cal 18; ds=100
- Bordillo de 15x35 cm en concreto de 3000 PSI
- Teja sin traslapo
- Suministro e instalación de panel led redondo de sobreponer 12w

C. Frente polideportivo del barrio La Magnolia:

Inicio de actividades: **20 Julio 2022**

- Limpieza de estructura de cubierta con hidrolavadora
- Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
- Baranda metálica en tubo estructural de 2" incluye esmalte y anticorrosivo
- Tablero parciales 12 circuitos (incluye tacos de 30a)
- Reflector 200w
- Salida lámpara emt completa
- Mantenimiento de placa en concreto
- Mantenimiento de gradería en concreto

- Red sanitaria pvc 6"
- Celosía tubular para polideportivo, astm-4500 grado c, incluye: correas, contravientos, tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura y platinaría. Contempla también: fabricación, suministro, montaje
- N.P-1. Limpieza de estructura metálica con hidrolavadora
- N.P-3. Anticorrosivo lamina lineal
- N.P-4. Escarificación de gradas
- N.P-5. Pintura epóxica
- N.P-6. Pintura epóxica (lineal)
- N.P-7. Pañete liso 1:4, e=1.5 cm (incluye adherente para concreto viejo a nuevo)
- N.P-11. Demarcación con pintura tipo tráfico e=0.10 m
- N.P-23. Canal en lámina galvanizada cal 18; ds=100
- N.P-24. Desmonte de luminarias (doble altura)
- N.P-30. Pintura para fachada tipo koraza ó similar (incluye blanqueamiento)
- N.P-31. Pintura para fachada tipo koraza ó similar (incluye blanqueamiento)
- N.P-41. Recubrimiento sintetico para piso
- N.P-42. Lampara hermetica led 2x18w sylvania o similar (incluye cable)
- N.P-49. Suministro e instalación de panel led redondo de sobreponer 12w
- N.P-61. Suministro e instalación de techo falso en pvc lamina blanco brillante

D. Frente polideportivo barrio San Carlos

Inicio de actividades: **12 agosto 2022**

- Empradización (incluye 10 cm de tierra negra)
- Estructura en perfiles lámina delgada (lámina cr), para cerramiento, incluye: correas, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura y platinería. contempla también: fabricación, suministro y montaje
- Bajante aguas lluvias pvc 4"
- Línea a tierra tablero general (varilla cooper well)

- Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento
- Malla nylon petrolizada voleibol
- Cancha múltiple tubo a.n. incl. tablero acrílico con rodachines y cilindro para movilizar (par)
- Soporte malla voleibol con tensor
- Demarcación con pintura tipo tráfico e=0.10 m
- Suministro e instalación de lonas de columpio, cadenas y rodamiento (columpios existentes)
- Suministro e instalación de rodadero long. 2,40
- Suministro e instalación de tubo túnel
- Cárcamo con rejilla en concreto de 3000 psi incluye acero de refuerzo
- Tubería Conduit emt galvanizada de 1/2"
- Cable cobre No. 12
- Salida toma doble emt completa
- Alambrón cable cobre desnudo de 2/0 incluye soportes de sujeción, tubería y bajantes hasta punto de conexión
- Recubrimiento sintético para piso
- Suministro e instalación de bala led 18w circular

5.1.1. Valor de Actividades por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 1.137.922.029,00
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 1.726.304.623,93
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 1.754.400.300,07
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 1.014.800.505,83
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 5.633.427.458,83**

5.1.1.1. Valor de Actividades Ejecutadas por frente en el periodo del presente informe

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 97.027.756,77
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 218.779.877,78
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 49.485.099,69
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 334.506.551,11

5.1.1.2. Valor de Actividades Ejecutadas por frente acumulado

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 1.123.719.398,51
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 1.619.226.798,62
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 1.312.993.455,23
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 981.734.491,34

5.1.1.3. Valor de Actividades Ejecutadas General del proyecto

VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	**$ 699.799.285,35**
VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	**$ 5.037.674.143,70**

5.1.2. Porcentaje por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	20,20%
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	30,64%
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	31,14%
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	18,02%
	% TOTAL DEL PROYECTO	**100%**

5.1.2.1. Porcentaje Ejecución por Frentes en el periodo del presente informe

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	8,53%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	12,67%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	2,82%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	32,96%

5.1.2.2. Porcentaje Ejecución por Frentes acumulado

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	98,75%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	93,80%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	74,84%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	96,74%

5.1.2.3. Porcentaje Ejecución General del Proyecto

PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	12,42%
PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	89,42%

5.2. REGISTRO PERSONAL

El personal vinculado a la obra contó con la entrega de los elementos de protección de seguridad industrial, además contaron con la afiliación, pagos de seguridad social y parafiscales, salud (EPS), riesgos laborales (ARL), pensión (AFP), caja de compensación, SENA e ICBF.

5.2.1. PERSONAL

El personal del contratista – GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, en obra en el periodo del presente informe, está compuesto por:

- Director de Obra: Javier Antonio González Arenas
- Ingeniero Residente de Obra: Daniel Camilo Prada Millán
- Asesor eléctrico: Carlos Julio Acevedo Ferreiro
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo: Daniel Mauricio Oler Restrepo
- Topógrafo: Leonel Eduardo López Duran
- Coordinador de Obra: José Lamus Rodríguez
- Asesor Estructural: Nicolas Alfonso Correa Duarte

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA

ID		CARGO	NOMBRE	CC
DR	1	Dir. Obra	Javier Antonio Gonzalez Arenas	1.126.001.358
ING	1	ING. Residente	Daniel Camilo Prada Millán	1.098.651.957
AEL	1	AS. Electrico	Carlos Julio Acevedo Ferreiro	91.043.063
SS	1	PR. Seguridad y Salud	Daniel Mauricio Oler Restrepo	71.664.413
TP	1	Topografo	Leonel Eduardo López Duran	1.102.721.369
CO	1	Coordinador de Obra	José Lamus Rodríguez	1.020.776.092
AES		AS. Estructural	Nicolas Alfonso Correa Duarte	1.090.425.817

ADMINISTRATIVO – OPERATIVO					
CARGO	NOMBRE	CC	ESTADO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Ing Auxiliar	Diana María Olaya Ortiz	1.073.176.550	26/09/2023		

SOLDADORES					
CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Soldador	Elkin Fabian Silva Cortés	91.517.987	26/09/2023		
Soldador	Donis David Carbono Bastidas	7.572.127	26/09/2023	1/11/2023	
Soldador	Anderson Eduardo Silva Cortés	1.102.718.418	26/09/2023		
Soldador	Jhoan Ferney Morales Sarmiento	1.102.717.910	26/09/2023		
Soldador	Cristian Favian Romero Villalba	1.102.721.147	26/09/2023	1/11/2023	
Soldador	Mario Andres Bautista Vargas	1.096.247.138	12/10/2023		
Soldador	Celso Steven Hernandez Quevedo	1.073.150.231	12/10/2023		

5.3. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO

A continuación, se encuentra el listado de maquinaria y equipo empleado que se encuentran en obra y en los diferentes frentes a desarrollar:

Cantidad	Descripción
5	Pulidora
4	Barra
4	Picas
4	Pala
10	Andamio (sección)
1	Vibro compactador (rana)
1	Vibrador concreto
2	Tronzadora

5.4. DISEÑOS

Las modificaciones en los diseños de los polideportivos presentados a interventoría y supervisión:

Frente polideportivo Escallón:

- Ubicación de las graderías: A borde con las columnas de la cubierta
- Ubicación de la placa de piso: Centrada con relación a la cubierta
- Acceso al polideportivo: dos (2) entradas
    - Entrada principal
    - Entrada de mayor dimensión al respaldo del arco de la parte frontal

Frente polideportivo San Luis:

- Niveles de la tarima: Nivel 0 = -0,4m por temas de seguridad con relación a la altura.
- Diseño de la cubierta del polideportivo

Frente polideportivo La Magnolia:

- Accesos al polideportivo
    - Calle 8°: puerta principal para ingresar al polideportivo
    - Cruce entre calle 8° y 9°: ingreso parque infantil
    - Acceso polideportivo por la carrera 4
- Diseño cimentación muro de cerramiento
- Baños al costado de las graderías

Frente polideportivo San Carlos:

- Dimensiones cerramiento: Lateral colindante con el predio de la iglesia

5.5. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Los ensayos realizados, así como los resultados de estos mismos, fueron anexados en las cuentas de cobro 1 - 2 y 3 (11/11/2022 - 20/02/2023 - 08/10/2023). Los ensayos realizados después de esta fecha, serán anexadas en la liquidación del contrato.

5.6. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA

Se anexa copia de la bitácora de obra durante el periodo de ejecución del presente informe. (ANEXO No. 1)

5.7. REPORTE MULTAS Y SANCIONES

No se reportaron multas ni se adelantaron procesos de sanciones durante el periodo del presente informe.

5.8. POLIZAS DEL CONTRATISTA

Las pólizas se encuentran cargadas en la plataforma del SECOP

5.9. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO

- El contratista cuenta con una oficina en el barrio Escallón (Carrera 10° # 15-29), de igual manera se está almacenando el material, herramientas de construcción y demás elementos en bodega, que se encuentra ubicada en el mismo barrio, en el predio colindante (parqueadero). Además, se cuenta con personal para celaduría en el horario nocturno.
- En el polideportivo San Carlos, el contratista cuenta con el alquiler de una (1) bodega ubicada en el frente del polideportivo (Carrera 21 6B Sur), para el almacenamiento de equipo y herramientas.
- Para los frentes del polideportivo La Magnolia y San Luis, las herramientas, equipo y materiales que se requieran son transportados desde el frente del polideportivo del barrio Escallón.

5.10. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

En el periodo del presente informe no se reportan residuos provenientes de demoliciones. Los desechos que se generan en obra, como las lonas del cemento, son recolectadas en bolsas de basura para posteriormente ser retiradas por el camión de la basura.

5.11. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

Frente polideportivo Escallón:

Se evidencia la presencia de un cuerpo de agua colindante con el cerramiento del polideportivo por la parte posterior y a la medianía con el predio correspondiente con el parqueadero, el cual, en el periodo del presente informe, no causo inconvenientes en la obra.

Frente polideportivo San Luis:

En el área de influencia de este frente, no se presenta ningún cuerpo de agua.

Frente polideportivo La Magnolia:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua. .

Frente polideportivo San Carlos:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

5.12. AFECTACIONES

5.12.1. CONDICIONES CLIMATICAS

En el mes de NOVIEMBRE se presentaron días con fuertes lluvias, las cuales afectaron el desarrollo de actividades relacionadas con soldadura y trabajos en alturas y exteriores (Anexo No. 2)

5.12.2. VANDALISMO

En el periodo del presente informe no se reporta el hurto de material y herramientas en los diferentes frentes de trabajo.

6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS

En el periodo del presente informe No se registran inspecciones de obra en los diferentes frentes de trabajo.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

- Limpieza de estructura de cubierta con hidrolavadora






- Pañete liso muros


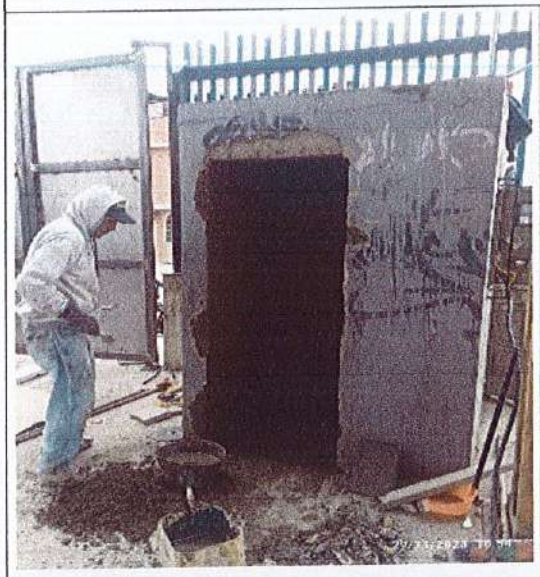
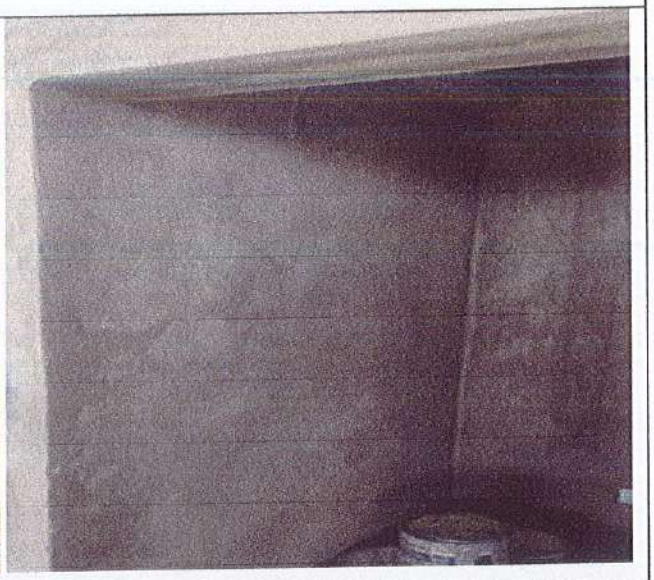



- Mesones en concreto 2500PSI, e=0,1m (inc. Refuerzo)



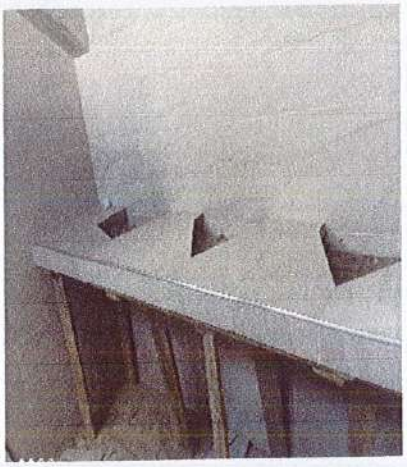

- Remates bocel wing aluminio

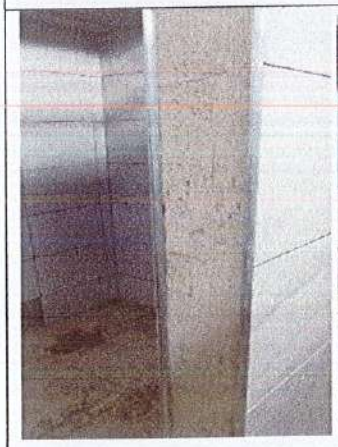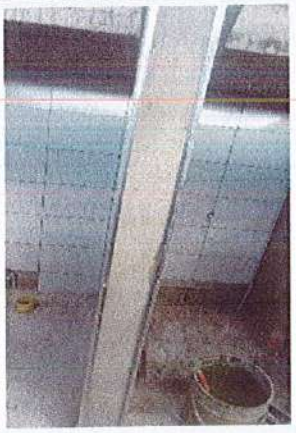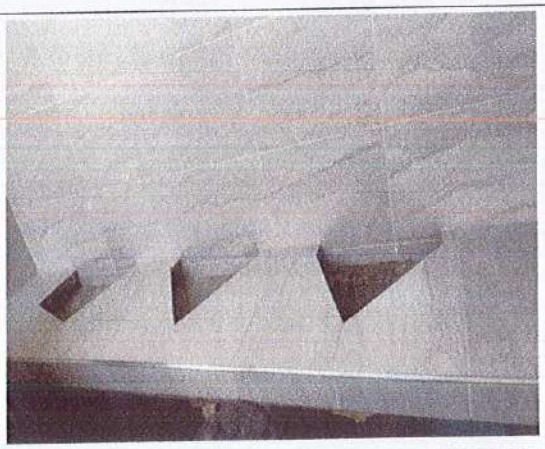- Rejilla sifón con sosco 4.5cm x 3.



- Suministro e instalación orinal de llave (incluye grifería)



- Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)



- Suministro e instalación lavamanos de empotrar incluye grifería



- Ventana en aluminio corrediza



- Baranda metálica en tubo estructural de 2" incluye esmalte y anticorrosivo




- Vidrio esmerilado incoloro 4 mm




- Tablero parciales 12 circuitos (incluye tacos de 30a)



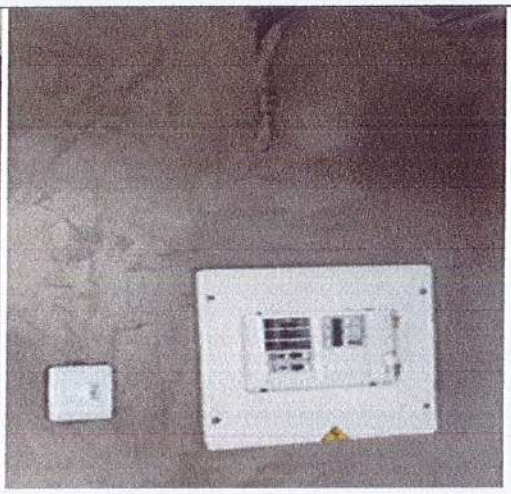

- Salida lámpara emt completa

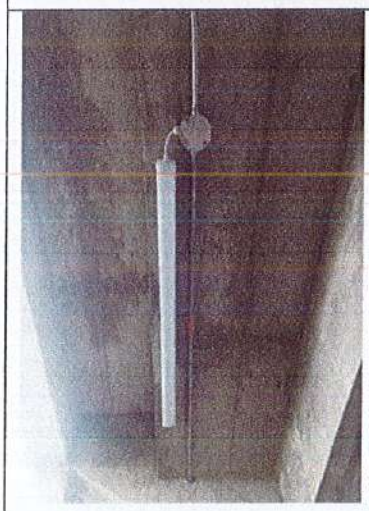




- Acometida sanitaria 6"




- N.P-1. Limpieza de estructura metálica con hidrolavadora



- N.P-23. Canal en lámina galvanizada cal 18; ds=100

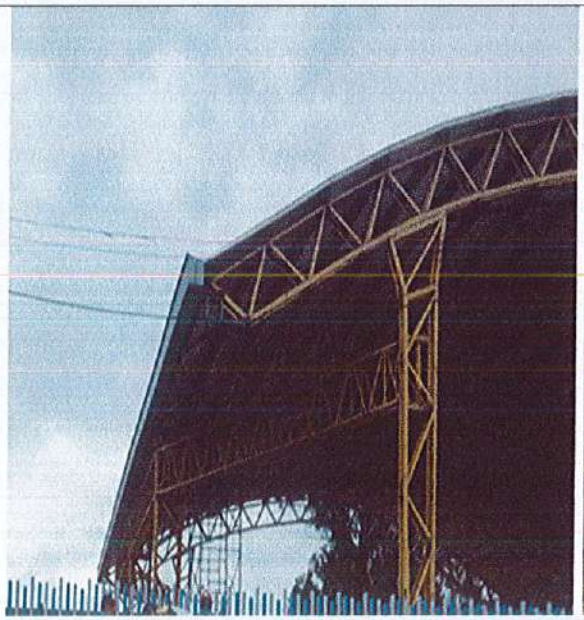


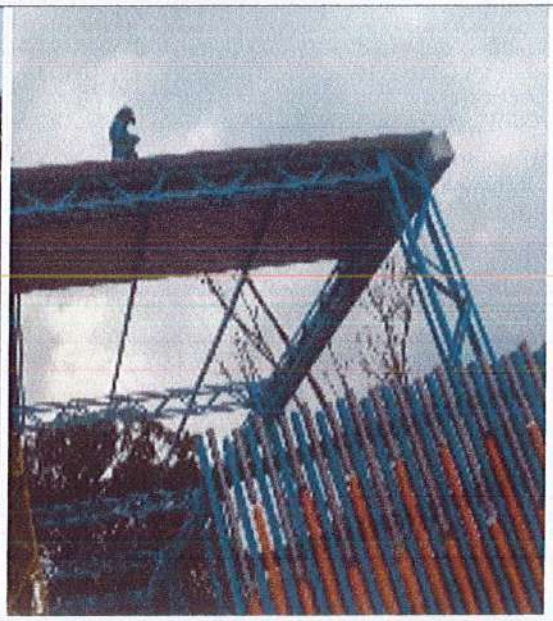

- N.P-24. Desmonte de iluminarias (doble altura)






- N.P-36. Salida toma doble emt completa

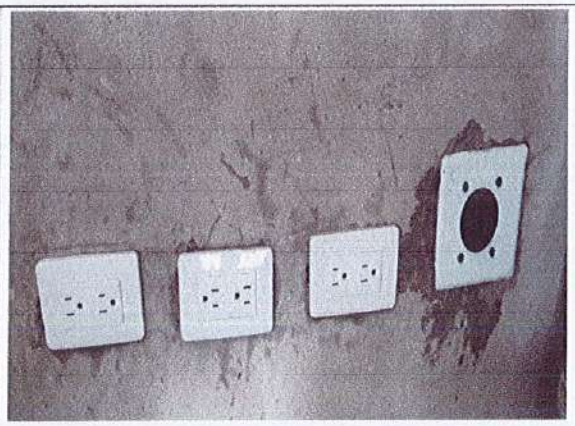- N.P-39. Teja sin traslapo




- N.P-42. Lampara hermetica led 2x18w sylvania o similar (incluye cable)

7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS

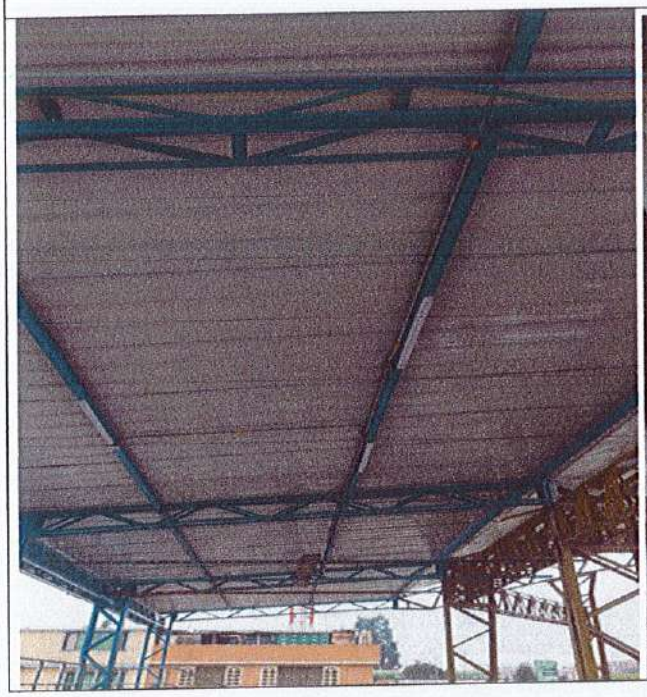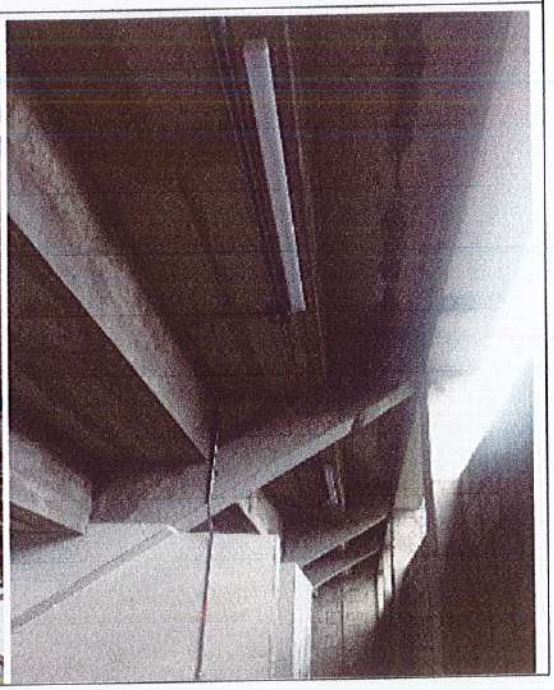
- Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)

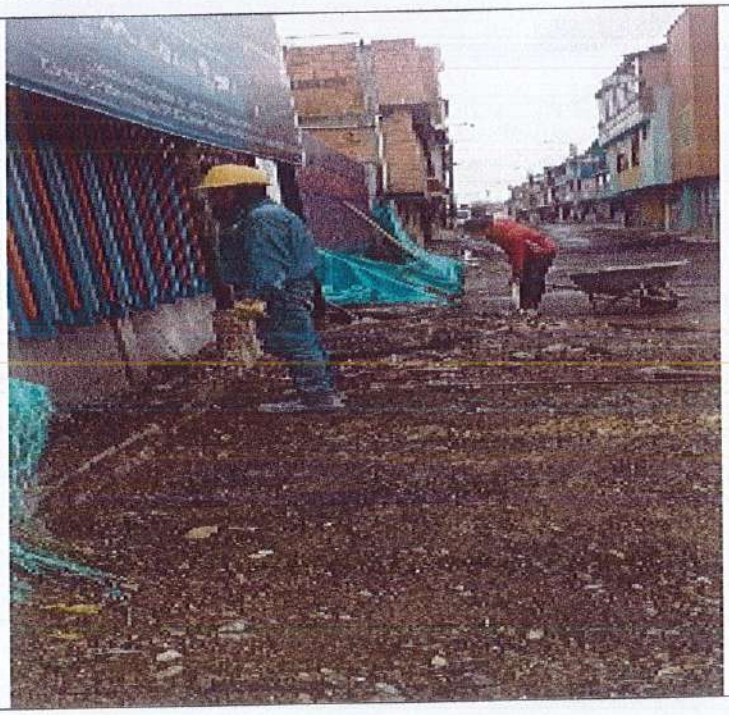

- Subbase granular (norma INVIAS 320)





- Placa base concreto 0.15 2500 PSI

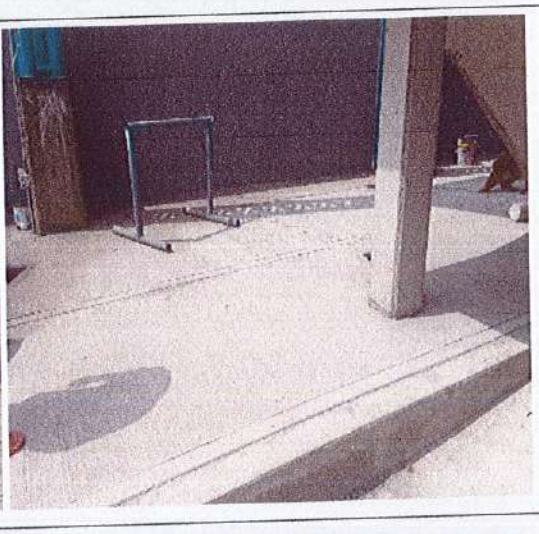- Refuerzo malla electrosoldada




- Acero figurado 60000 PSI

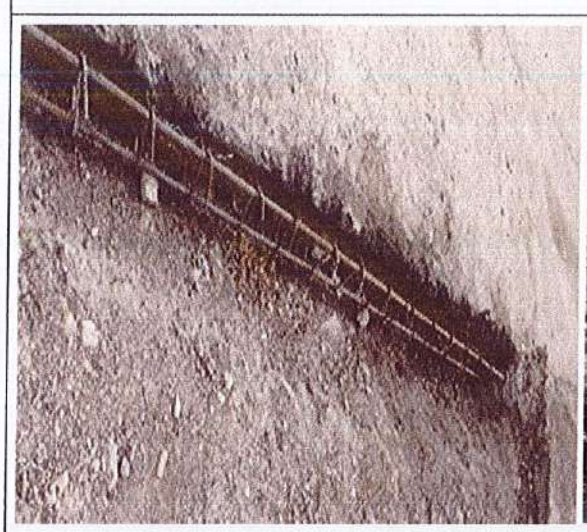


- Baranda metálica en tubo estructural de 2" incluye esmalte y anticorrosivo




- Reflector 200w



- Salida lámpara emt completa



- Lámpara a prueba de humedad tipo tortuga



- Acometida aérea 10 m pvc



- Canal en lámina galvanizada cal 18; ds=100





- Bordillo de 15x35 cm en concreto de 3000 PSI






- Teja sin traslapo





- Suministro e instalación de panel led redondo de sobreponer 12w

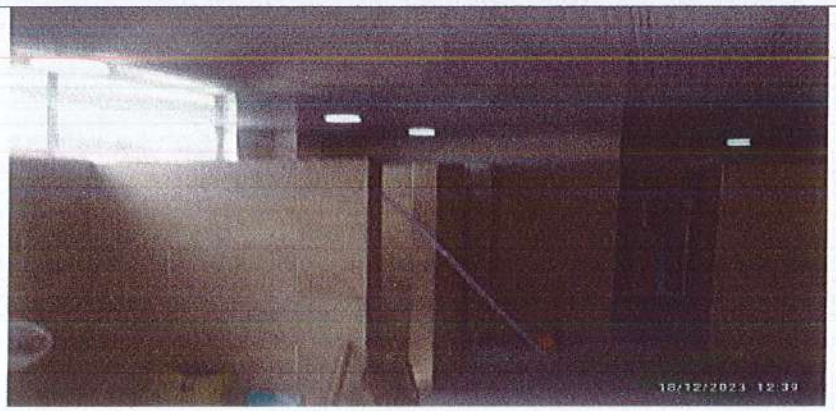



7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA

- Limpieza de estructura de cubierta con hidrolavadora



- Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)

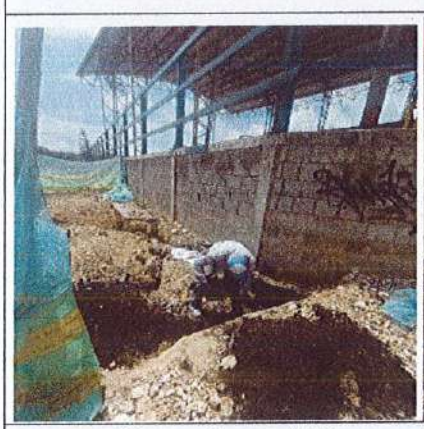


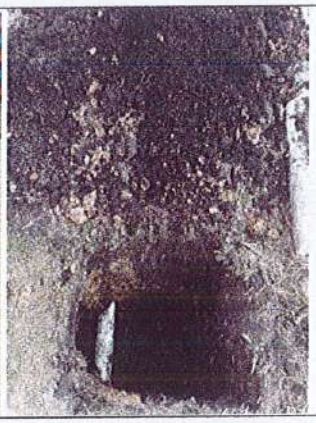

- Baranda metálica en tubo estructural de 2" incluye esmalte y anticorrosivo




- Tablero parciales 12 circuitos (incluye tacos de 30a)

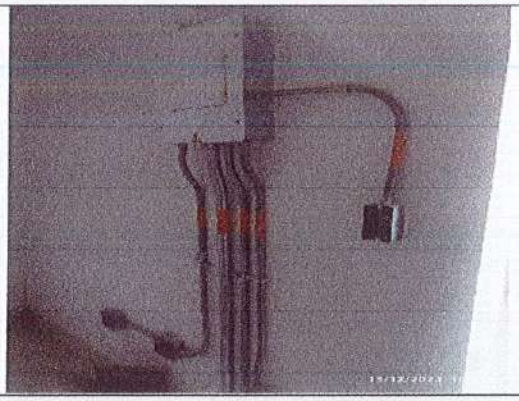

- Reflector 200w



- Salida lámpara emt completa







- Mantenimiento de placa en concreto



- Mantenimiento de gradería en concreto



- Red sanitaria pvc 6"





- Celosía tubular para polideportivo, astm-4500 grado c, incluye: correas, contravientos, tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura y platinaría. Contempla también: fabricación, suministro, montaje





- N.P-1. Limpieza de estructura metálica con hidrolavadora

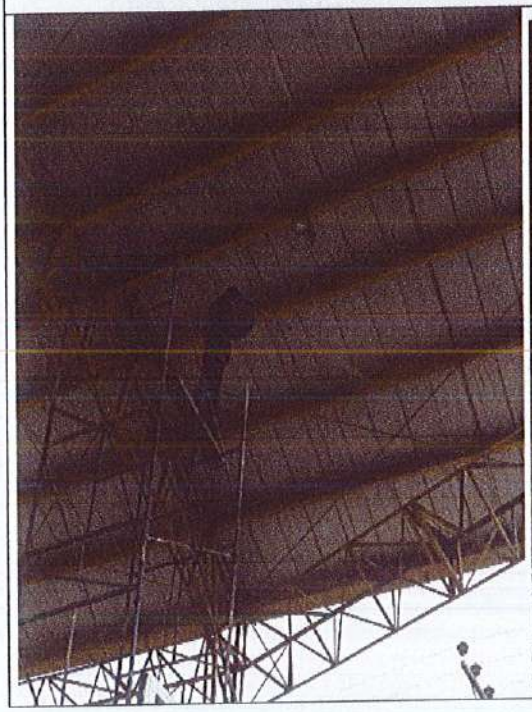

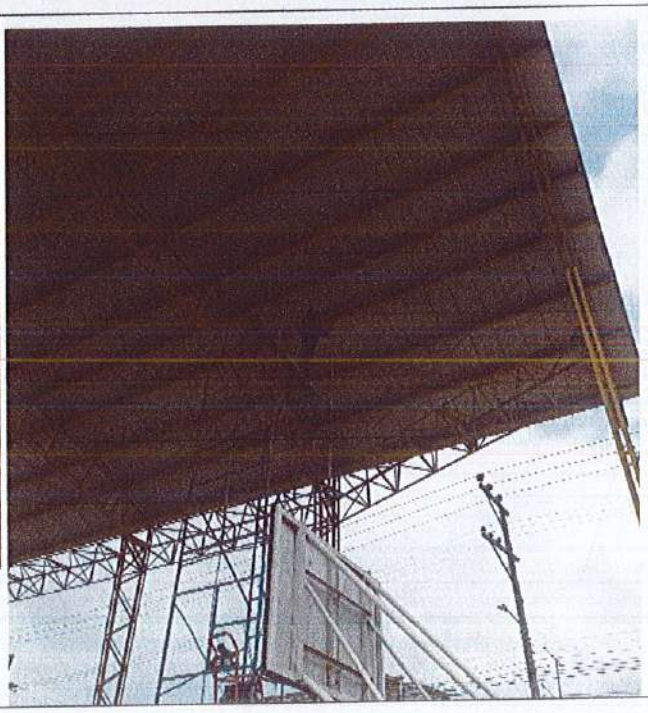

- N.P-3. Anticorrosivo lamina lineal





- N.P-4. Escarificación de gradas




- N.P-5 y 6. Pintura epóxica





- N.P-7. Pañete liso 1:4, e=1.5 cm (incluye adherente para concreto viejo a nuevo)




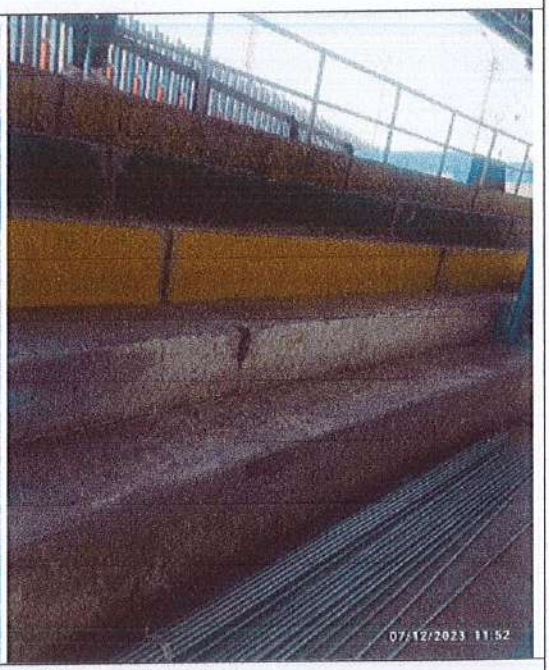

- N.P-11. Demarcación con pintura tipo tráfico e=0.10 m




- N.P-23. Canal en lámina galvanizada cal 18; ds=100

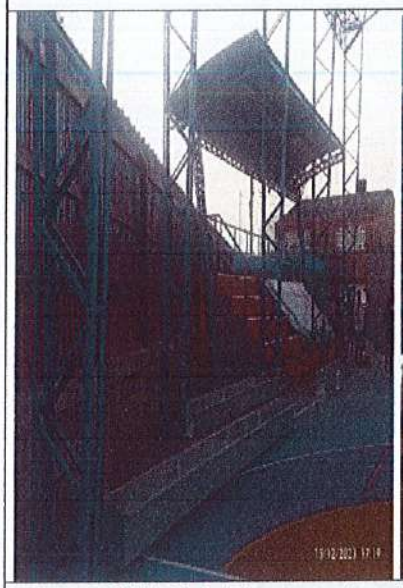




- N.P-24. Desmonte de luminarias (doble altura)

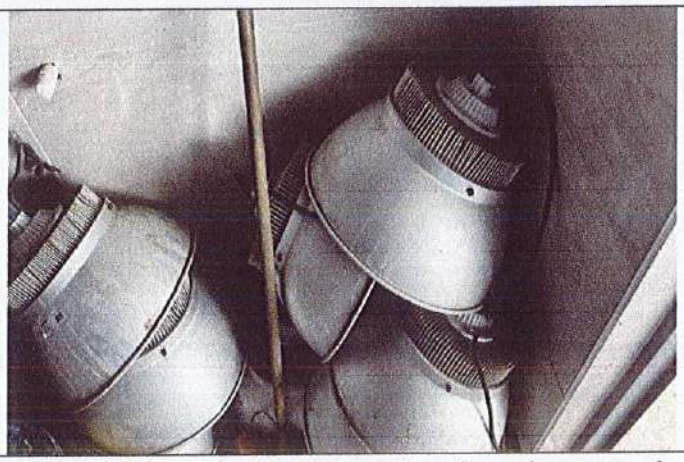

- N.P-30 y 31. Pintura para fachada tipo koraza ó similar (incluye blanqueamiento)

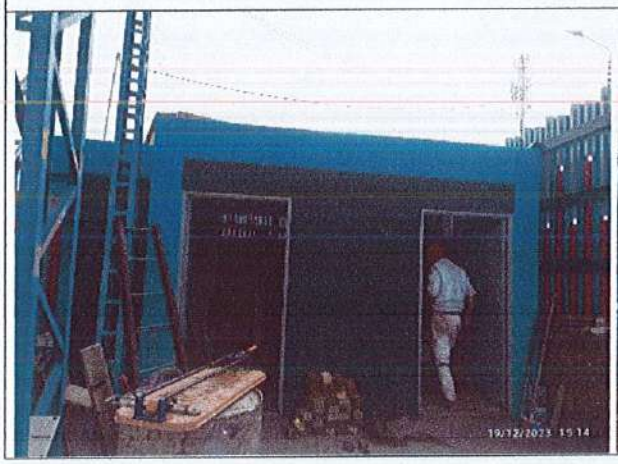


- N.P-41. Recubrimiento sintetico para piso







- N.P-42. Lampara hermetica led 2x18w sylvania o similar (incluye cable)



- N.P-49. Suministro e instalación de panel led redondo de sobreponer 12w



- N.P-61. Suministro e instalación de techo falso en pvc lamina blanco brillante



7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS

- Empradización (incluye 10 cm de tierra negra)




- Estructura en perfiles lámina delgada (lámina cr), para cerramiento, incluye: correas, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura y platinería. contempla también: fabricación, suministro y montaje





- Bajante aguas lluvias pvc 4"

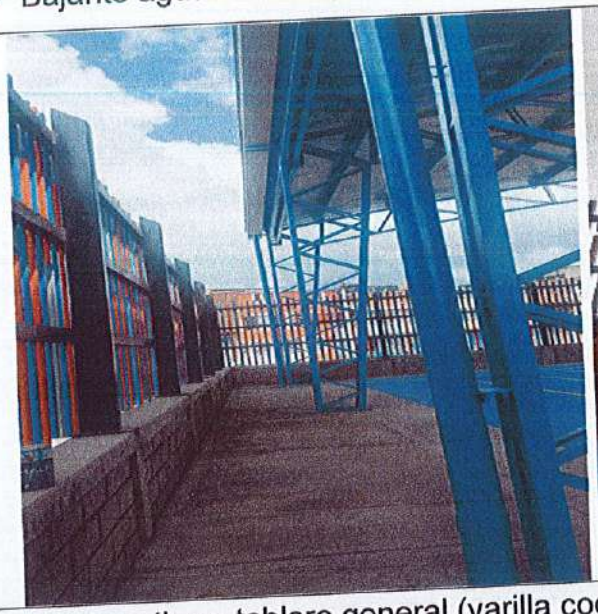


- Línea a tierra tablero general (varilla cooper well)





- Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento



- Malla nylon petrolizada voleibol



- Cancha múltiple tubo a.n. incl. tablero acrílico con rodachines y cilindro para movilizar (par)

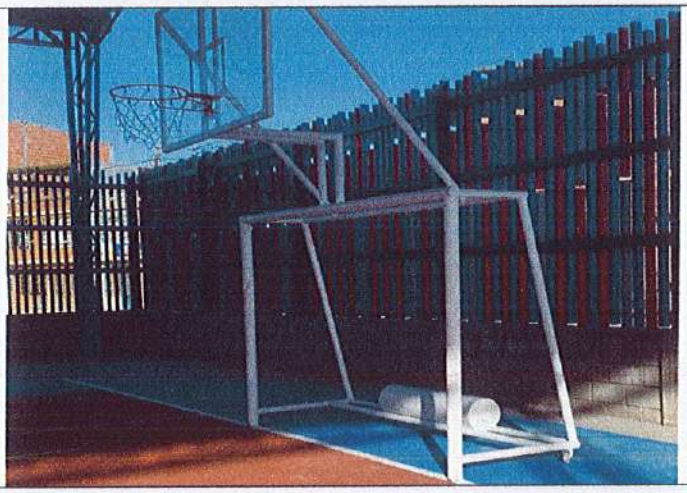

- Soporte malla voleibol con tensor



- Demarcación con pintura tipo tráfico e=0.10 m



- Suministro e instalación de lonas de columpio, cadenas y rodamiento (columpios existentes)




- Suministro e instalación de rodadero long. 2,40



- Suministro e instalación de tubo túnel



- Cárcamo con rejilla en concreto de 3000 psi incluye acero de refuerzo

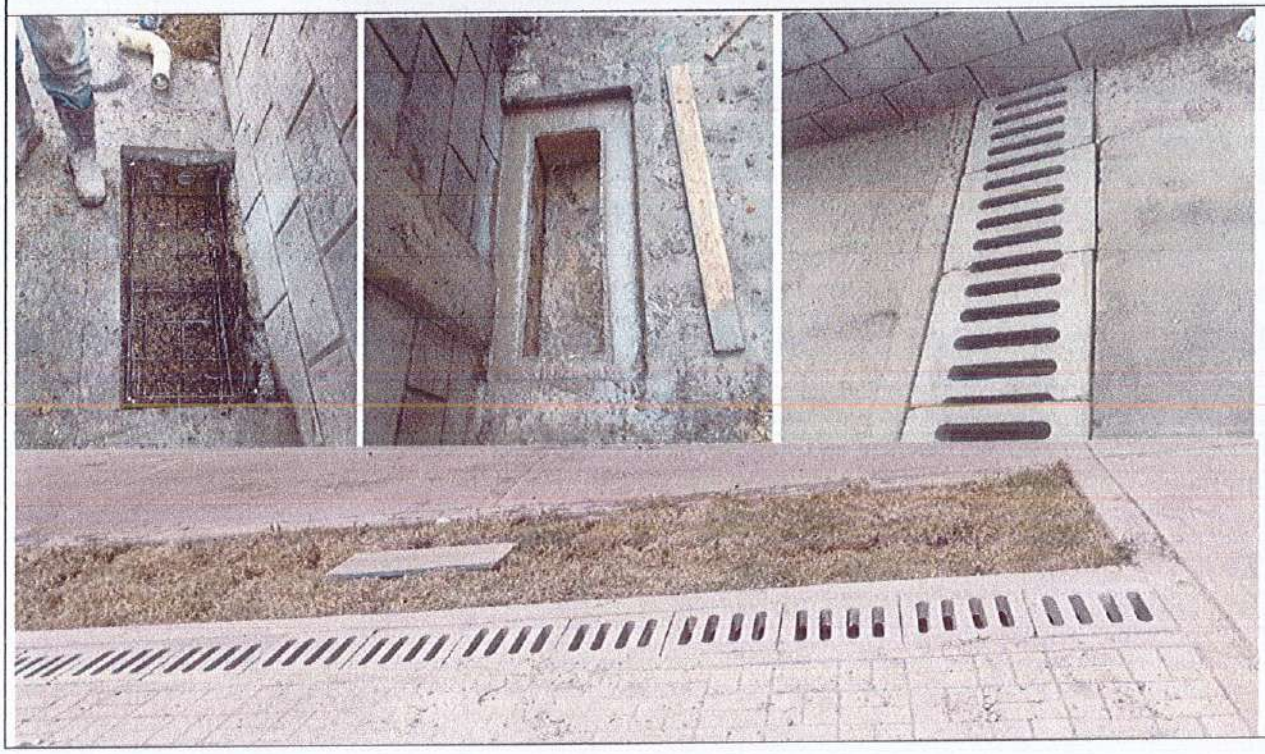

- Tubería Conduit emt galvanizada de 1/2" y Cable cobre No. 12




- Salida toma doble emt completa




- Alambrón cable cobre desnudo de 2/0 incluye soportes de sujeción, tubería y bajantes hasta punto de conexión




- Recubrimiento sintético para piso




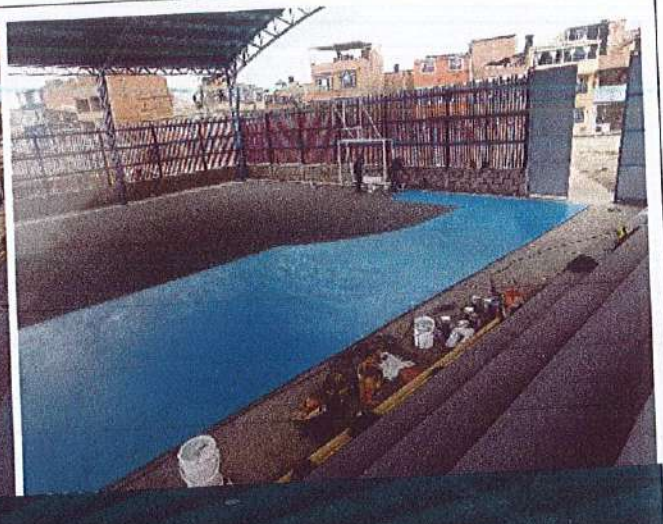



- Suministro e instalación de bala led 18w circular



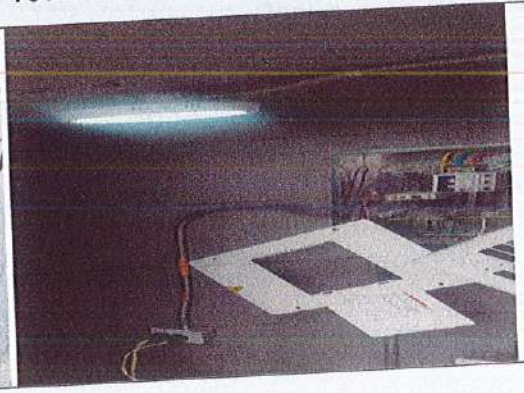

8. CONCLUSIÓN

Se concluye que el proyecto referente al contrato de obra No. 543 de 2022 que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".** suscrito entre la Alcaldía de Madrid (CUNDINAMARCA) y GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, presento el avance de ejecución de las actividades contratadas respecto al mes de NOVIEMBRE y las obras que a su vez fueron ejecutadas de conformidad con la interventoría y la supervisión por parte del municipio.

Debido a las condiciones climáticas presentadas en los meses de octubre y noviembre y a las afectaciones que estas generaron en el desarrollo de las actividades de obra relacionadas con trabajos en alturas y soldadura, se prorroga el contrato por un termino de veinte (20) días con el fin de subsanar las afectaciones presentadas.

ANEXO 1.
BITACORA

CONTRATO OBRA PUBLICA

S-13 - 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGDALENA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

OBRA:
CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA - ADECUACION - CERRAMIENTO

FRENTE:
POLIDEPORTIVO BARRIO SAN LUIS

FECHA INICIO:
22 JUN 2022

02 octubre – 31 octubre 2023.
No se reportan actividades para este frente en el transcurso de este periodo.

01 Noviembre – 11 Noviembre
No se reportan actividades en el transcurso de este tiempo para este frente

14 Noviembre 2023 Estado del Clima Soleado
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obras
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor. Pendientes
Actividades de obra
· Pañete liso
· Pintura para fachada tipo Koraza (se empieza aplicando de blanco todas a las paredes)

15 Noviembre 2023 Estado del Clima
Soleado
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Pudimos
Actividades de obra
1. Excavacion manual
2. Cinta para fundida tipo terraza

16 Noviembre 2023 Estado del Clima
Soleado
Parte Nublado
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Pudimos
Actividades de obra
1. Cinta para fundida tipo terraza en parte del muro Colindante con viviendas.
2. Demolicion placa en concreto via colindante para conexion de acometidas
3 Excavacion manual

17 Noviembre 2023. Estado del Clima
Soleado
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Ayudantes de obra.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor.
Actividades de obra
1. Excavacion manual via colindante con. polideportivo, para conexiones de acometidas Sanitaria, aguas lluvia y de suministro
2. Caja de inspeccion
3. Relleno — Subbase

18 Noviembre 2023 Estado del Clima.
Nublado
Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
Ayudantes de obra.
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor.
Actividades de obra.
1. Demolicion Placa en concreto via colindante a polideportivo, para conexion de acometidas
2. Excavacion manual.
3 instalacion red sanitaria, red aguas lluvia y red suministro (acometidas)
4. Relleno — Subbase.

20 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado, Tarde Lluvioso

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- Soldadores
- Ayudantes Soldadores

Maquinaria y Equipo
- Andamios Herramienta menor Equipos Soldadura

Actividades de obra
1. Pintura para fachada tipo texture para muro colindante con viviendas.
2. instalacion de correas faltantes de la cubierta
3. instalacion de arriostramientos y contraventos de la cubierta

21 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- Soldadores y Ayudantes de Soldadores

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Equipos Soldadura Andamios

Actividades de obra
1. Pintura para Fachada tipo texture para el muro
2. instalacion de arriostramientos y contraventos de la estructura de la cubierta

22 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Soleado, Tarde Lluvioso

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra. 3 Ayudantes
- Soldadores y Ayudantes

Maquinaria y Equipo: Andamios. Equipos Soldadura. Herramienta menor

Actividades de obra
1. Fundir concreto para placa de losa (interventoria y cumplimiento espacio publico)
2. Pintura para fachada tipo Koraza
3. instalacion de arriostramientos y contraventos de la estructura de la cubierta

23 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Tarde Lluvioso, Nublado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra.
- Soldadores y Ayudantes

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Equipos Soldadura Andamios

Actividades de obra
1. Pintura para fachada tipo Koraza
2. instalacion contraventos, tensores y arriostramientos de la estructura de la cubierta.
3. instalacion aparatos Sanitarios.

NOTA: se reporta visita de Alcalde junto a su equipo de trabajo

24 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Soldadores y Ayudantes
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Equipo soldadura Andamios
Actividades de obra
1. instalacion aparatos sanitarios para baños de la tarima
2. instalacion de canales de la cubierta

25 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado — Tarde Soleada

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Soldadores y Ayudantes
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor — Equipo Soldadores Andamios
Actividades de obra
1. instalacion aparatos Sanitarios (lavamanos)
2. instalación de canales de la cubierta.
3. instalacion de marco y vidrio de las ventanas de los baños de la tarima

27 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores y Ayudantes — Maestro de obra
Electrico y Ayudantes
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Andamios — E. Soldadura
Actividades de obra
1. instalacion de canales para la cubierta.
2. instalacion de teja para cubierta del polideportivo
3. instalaciones electricas baños + Acometida electrica
4. Detalles enchape baños.

28 Noviembre 2023 — Estado del Cl. Soleado. Tarde Nubl.

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Soldadores y Ayudantes
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor Andamios — E. Soldadura
Actividades de obra.
1. instalacion Teja para cubierta del Polideportivo

29 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado con lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Soldadores y Ayudantes
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor. Andamios E. Soldadura.
Actividades de obra
1. Baranda Metalica
2. Teja Para cubierta.

30 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Dia. Lluvioso

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Soldadores.
Ayudantes Soldadores.
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor Andamios E. Soldadura.
Actividades de obra.
1. Teja cubierta.
2. Baranda Metalica

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

OBRA:
CONSTRUCCION: OBRA NUEVA - ADECUACION - CERRAMIENTO

FRENTE:
POLIDEPORTIVO BARRIO LA MAGNOLIA

FECHA INICIO:
20 JUL 2022

31 octubre 2023 — Estado del Clima: Soleada tarde nublada con lluvia

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Soldador
- Ayudantes Soldador
- electricista
- Ayudante electricista

Maquinaria y equipo
- Herramienta menor
- Equipo de Soldadura

Actividades de obra
1. instalacion perfileria de colores para el cerramiento del polideportivo
2. instalacion conexiones electricas

JD mf jp

01 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
- Residente de obra - Director de obra.
- Residente de interventoria.
- Soldadores

se reporto visita del Alcalde con su equipo de trabajo

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor
- Equipo soldadura

Actividades de obra
1. Resoldar perfileria instalada del cerramiento

JD mf jp

02 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado tarde lluviosa

Personal en obra
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Soldador.
- Ayudantes de Soldador.
- Maestro de obra.
- Ayudante de obra.

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor
- Equipo Soldadura

Actividades de obra
1. instalacion perfileria de colores para el cerramiento
2. inicio instalacion techo cielo raso en Pvc para los baños.

JD mf jp

03 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado tarde lluviosa

Personal en obra
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Soldador.
- Ayudantes de Soldador.
- Maestro de obra
- Ayudante de obra.

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor
- Equipo de Soldadura

Actividades de obra.
1. instalacion techo cielo raso Pvc para los baños.
2. instalacion perfileria de colores para el cerramiento.

JD mf jp

08 Noviembre 2023 Estado del Clima Lluvia

Personal en obra.
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Soldadores
- Ayudantes soldadores
- Maestro de obra
- Ayudantes de obra

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Equipo Soldadura Carretera

Actividades de obra.
1. Demolición asfalto para instalacion red sanitaria y red Suministro.
2. Excavacion - Acometida suministro ½ y Sanitaria 6"
3. instalacion Perfileria de colores de cerramiento.

09 Noviembre 2023 Estado del Clima Soleado

Personal en obra.
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Soldadores
- Ayudantes Soldadores
- Maestro de obra
- Ayudantes de obra

Maquinaria y Equipo.
- Herramienta menor. Equipo Soldadura

Actividades de obra.
1. Excavacion y red Sanitaria para acometida red aguas lluvia y red Sanitaria
2. Fundicion dados en concreto para parales de la estructura del parque infantil.
3. Desmonte canales y bajantes y resoldar perfileria

10 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado con lluvia

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Soldadores – Ayudantes Soldadores

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor — Equipo Soldadura hidrolavadora

Actividades de obra
1. Limpieza estructura y cubierta del polideportivo
2. Desmonte de canales y bajantes

D mf

11 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo
- Andamios — Hidrolavadora

Actividades de obra
1. Limpieza estructuras de cubiertas y limpieza de Cubiertas del polideportivo (rancho y graderias)

D mf

14 Noviembre 2023 — Estado del Clima: soleado

Personal en obra.
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Soldadores
- Ayudantes Soldadores

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor. — Equipo de soldadura

Actividades de obra.
1. instalacion perfileria de colores del cerramiento del polideportivo.

D mf

15 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Soleado tarde nublado con lluvia

Personal en obra
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Soldadores
- Ayudantes Soldadura

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor. — compresor Equipo Soldadura
- Andamios

Actividades de obra.
1. instalacion perfileria de colores del cerramiento.
2. Resoldar perfileria cerramiento
3. Inicio aplicacion anticorrosivo a la estructura de la cubierta.

D mf

11 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra.
- Residente de obra
- Residente de interventoria.
- Soldadores
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Equipo de Soldadura Andamios

Actividades de obra:
1. instalacion perfileria de colores.
2. Resoldar perfileria Cerramiento
3. Anticorrosivo para la estructura.

17 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra.
- Residente de obra
- Residente de interventoria.
- Soldadores.
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Equipo Soldadura Andamios

Actividades de obra:
1. Resoldar perfileria de colores del cerramiento
2. Anticorrosivo para la estructura

18 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Soldadores y Ayudantes

Maquinaria y Equipo:
- Herramientas menor Equipo Soldadura Andamios

Actividades de obra:
1. Aplicacion de anticorrosivo para la estructura de la cubierta.
2. Resoldar perfileria del cerramiento
3. Retallar esmalte de pintileria del cerramiento.

20 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado con lluvia

Personal en obra.
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Soldadores y Ayudantes

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Equipo Soldadura Andamios

Actividades de obra
1. Aplicacion de anticorrosivo para la estructura de cubiertas.
2. Resoldar perfileria de cerramiento y detalle de esmalte de la misma

21 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Soldadores y Ayudantes.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor E. Soldadores Andamios
Actividades de obra
1. Resoldar y detallar esmalte perfileria del cerramiento.
2. Aplicar anticorrosivo y esmalte a la estructura de las cubiertas.

22 Noviembre 2023 — Estado del Clima: soleado Tarde lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores y Ayudantes.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Andamios E. Soldadores
Actividades de obra
1. Resoldar y detallar esmalte de perfileria del cerramiento
2. Aplicar anticorrosivo y esmalte a las estructuras de la cubierta

23 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado con lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores y Ayudantes.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Andamios. E Soldadores
Actividades de obra
1. Resoldar perfileria del cerramiento.
2. Detallar esmalte de perfileria de cerramiento
3. Aplicacion de esmalte y anticorrosivo para las estructuras de las cubiertas.

24 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria
Soldadores y Ayudantes
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Andamios E. Soldadores
Actividades de obra:
1. Resoldar y detallar esmalte de perfileria de cerramiento
2. Aplicacion de anticorrosivo y esmalte para estructuras de cubiertas.

25 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado Tarde soleada

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores y Ayudantes
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Andamios 6 soldadores
Actividades de obra
1. Detallar esmalte perfiles de rodeos del cerramiento
2. Inicio instalacion de baranda metalica
3. Anticorrosivo y esmalte para las estructuras de la cubierta.

27 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria
Soldadores y Ayudantes
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Andamios 6 Soldadores.
Actividades de obra
1. Aplicacion de esmalte para estructuras de las cubiertas.
2. Baranda metalica para graderias.
3. Detallar esmalte de perfileria de cerramiento.

29 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Soleado Tarde lluvia

Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria
Soldadores y Ayudantes
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Andamios 6 Soldadores
Actividades de obra
1. Anticorrosivo y esmalte para estructuras de las cubiertas.
2. Baranda Metalica para graderias.
3. Detalles perfileria Cerramiento (soldadura y esmalte)

29 Noviembre 2023. — Estado del Clima: Nublado con lluvia

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Soldadores y Ayudantes.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Andamios.
Actividades de obra.
1. Esmalte para las estructuras de las cubiertas
2. Detalle esmalte para perfileria del cerramiento.

105

30 Noviembre 2023 — estado del clima Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Ayudantes soldadores
Personal de recubrimiento pvc
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Andamios
Actividades de obra
1. Limpieza placa concha
2. Mantenimiento placa concha
3. Detalle esmalte perfileria de colores del cerramiento.

Powered by CamSc

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

542 - 2022.

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

OBRA:
CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA - ADECUACIÓN - CERRAMIENTO

FRENTE:
POLIDEPORTIVO BARRIO SAN CARLOS

FECHA INICIO
12 AGO 2022.

01 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra.
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Ayudantes Soldadores.
- Trabajadores para el recubrimiento de placa

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Andamios.

Actividades de obra.
1. Mantenimiento de placa.
2. Detalle esmalte perfiles cerramiento.

D

02 Noviembre. 2023 — Estado del Clima: Nublado tarde lluvioso

Personal en obra
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Ayudantes Soldadores.
- Trabajadores Recubrimiento

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Andamios

Actividades de obra:
1. Mantenimiento de placa
2. Detalle esmalte perfiles cerramiento.

D

03 Noviembre. 2023 — Estado del Clima: Nublado tarde lluvioso

Personal en obra
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Ayudantes Soldadores.
- Trabajadores Recubrimiento

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Andamios.

Actividades de obra:
1. Mantenimiento de placa.
2. Detalle esmalte perfiles cerramiento

D

04 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado con lluvia

Personal en obra
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Ayudantes Soldadores
- Trabajadores Recubrimiento

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Andamios.

Actividades de obra:
1. Mantenimiento de placa.
2. Detalle esmalte perfiles cerramiento

D

07 Noviembre 2023 Estado del Clima Soleado

Personal en obra.
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Trabajadores Recubrimiento.
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Andamios.

Actividades de obra.
1. Esmalte para estructura parque infantil.
2. Recubrimiento Sintetico para placa Cancha.

08 Noviembre 2023 Estado del Clima. Nublado

Personal en obra.
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Trabajadores Recubrimiento.
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Andamios.

Actividades de obra:
1. Esmalte para estructura parque infantil.
2. Recubrimiento Sintetico para placa cancha del polideportivo.

09 Noviembre 2023 Estado del Clima. Soleado

Personal en obra.
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Trabajadores Recubrimiento.
- Soldadores.
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor Andamios E. Soldadura.

Actividades de obra
1. Cancha multiple.
2. Recubrimiento sintetico para placa cancha.

10 Noviembre 2023 Estado del Clima Nublado con lluvia.

Personal en obra.
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Trabajadores Recubrimiento.
- Soldadores.
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo.
- Herramienta menor Equipo Soldadura Andamios.

Actividades de obra
1. Cancha multiple.
2. Recubrimiento Sintetico para placa.

11 Noviembre 2023. Estado del Clima. Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Trabajadores Recubrimiento.
Soldadores.
Ayudantes Soldadores.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. E. Soldadora Andamios.
Actividades de obra
1. Cancha multiple.
2. Recubrimiento sintetico para placa

D mf

14 Noviembre 2023. Estado del Clima. Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Trabajadores recubrimiento.
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor.
Actividades de obra:
1. Recubrimiento sintetico para placa.
2. Demarcacion Cancha polideportivo.

D mf

15 Noviembre 2023. Estado del Clima. Soleado Tarde Nublado.

Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria.
Trabajadores Recubrimiento.
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor.
Actividades de obra:
1. Demarcación Cancha del polideportivo.

D mf

16 Noviembre 2023 Estado del Clima. Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Trabajadores Recubrimiento. electrico.
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor. Andamios.
Actividades de obra.
1. Recubrimiento pasos.
2. instalaciones electricas Cubierta cancha.
y cuarto electrico. Graderia.

D mf

20 Noviembre 2023 Estado del Clima. Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente interventoria.
Ayudantes Soldadores.
Electrico y Ayudantes.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Andamios.
Actividades de obra.
1. Detallar esmalte cerramiento.
2. Detallar Adoquin. (instalacion)
3. instalacion sistema apantallamiento

21. Noviembre 2023 estado del Clima. Soleado.

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro y ayudantes.
Electrico y ayudantes.
Ayudantes soldadura.
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Andamios.
Actividades de obra:
1. Acabados Cerramiento (esmalte perfiles)
2. Acabados : zona urbana.
3. instalacion sistema apantallamiento.

22 Noviembre 2023 Estado del Clima soleado.

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra y Ayudantes.
Ayudantes Soldadores.
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Andamios.
Actividades de obra.
1. Detalles Cerramiento (esmalte perfiles)
2. Detalles parque infantil e instalacion de accesorios.

23 Noviembre 2023 Estado del clima Soleado.

Personal en obra.
Maestro de obra y Ayudantes.
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor.
Actividades de obra.
1. Empradizacion zona urbana.
2. Detalles cerramiento, zona urbana y parque infantil.
3. Limpieza general polideportivo.

25 Noviembre. 2023 Estado del Clima Soleado.

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Personal de apoyo a la supervision

Se realiza inauguración del polideportivo por parte de la supervisión (Alcaldia de Madrid) y el Alcalde. Se hace entrega parcial con pendientes:

1. Aviso Metalico.
2. Canoa en Acero inoxidable.
3. Certificación cuenta electrica.

CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

OBRA:
CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA - ADECUACIÓN - CERRAMIENTO.

FRENTE:
POLIDEPORTIVO BARRIO ESCALLÓN.

FECHA INICIO:
16 JUN 2022

01 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Director de obra.
Maestro de obra.
Soldador.
Ayudantes Soldador.

nota: Se reporta visita del Alcalde con su equipo de trabajo.

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Equipo Soldadora.

Actividades de obra
1. instalacion accesorios de los baños.
2. Esmalte para correas de la estructura de la cubierta de las graderias.

D mnf

02 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
Soldadores.
Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Equipo Soldadora. Corte Ceramico

Actividades de obra:
1. instalacion accesorios de los baños.
2. Baldosa Ceramica para los mesones.
3. instalacion de correas para la estructura de la cubierta de las graderias.

D mnf

03 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
Soldadores.
Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Equipo Soldadora. Corte Ceramico

Actividades de obra:
1. instalacion accesorios baños.
2. Ceramica para mesones de los baños.
3. instalacion de correas para la estructura de la cubierta de los graderios.

D mnf

04 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Nublado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
Soldadores.
Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Equipo Soldadora.

Actividades de obra.
1. instalacion de correas para la estructura de la cubierta de los graderios.
2. instalacion de accesorios para los baños.

D mnf

07 noviembre 2023 Estado del clima
Soleado

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria
electricista.
Ayudante electricista.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor.
Actividades de obra.
1. instalaciones electricaos para los baños.

08 Noviembre 2023 Estado del Clima
Nublado

Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria
electricista.
Ayudante electricista.
Soldadores
Ayudantes Soldadora.
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. Equipo Soldadora.
Actividades de obra:
1. instalacion conexiones electricas.
2. instalacion canal calibre 18 DS=100

09 Noviembre 2023 Estado del Clima
Soleado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
electricista
Ayudante electricista.
Soldadores
Ayudantes Soldadora.
Maquinaria y Equipo:
1. Herramienta menor Equipo Soldadora
Actividades de obra:
1. instalacion conexiones electricas.
2. instalacion canal calibre 18 DS=100
3. inicio instalacion teja sin traslapo para la Cubierta de los graderios.

10 Noviembre 2023 Estado del Clima
Nublado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Soldadores. electricista
Ayudantes Soldadores. Ayudante electricista.
Maquinaria y Equipo:
Andamios Equipo Soldadora.
Actividades de obra
1. instalacion conexiones electricos de los baños.
2. instalacion teja sin traslapo para la Cubierta de los graderios.

11 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Soldadores.
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
- Indamips — Equipo Soldadura.

Actividades de obra:
1. instalacion teja sin traslapo para la cubierta de las gradenas.

Dmf

14 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Soldadores
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor — Equipo de Soldadura.

Actividades de obra:
1. instalacion de baranda para graderios
2. instalacion perfileria de colores del Cerramiento.

Dmf

15 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Soldadores
- Ayudantes Soldadores

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor — Equipo Soldadura.

Actividades de obra:
1. instalacion de perfileria de Color del Cerramiento al respaldo de las graderias.
2. Baranda para las graderias.

Dmf

16 Noviembre 2023 — Estado del Clima: Soleado, Tarde Nublado.

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Soldadores:
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor — Equipo Soldadura.

Actividades de obra:
1. instalación baranda para graderias.
2. Resoldar perfileria Cerramiento instalada anteriormente.
3. instalacion perfileria de colores del Cerramiento al respaldo de las graderias.

Dmf

17 Noviembre 2023

Estado del Clima.
Soleado.

Personal en obra.
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Soldadores.
- Ayudantes Soldadores.

Maquinaria y Equipo.
- Herramienta menor Equipo Soldadura.


Actividades de Obra.
1. instalacion portoteria de colores del cerramiento.
2. Resoldar portoteria de colores instalada anteriormente.
3. Elaboracion de portones del cerramiento.

(1)

ANEXO 2.
REPORTE DE LLUVIAS

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gcs.construcciones@hotmail.com

Tiempo observado en noviembre de 2022 en Madrid

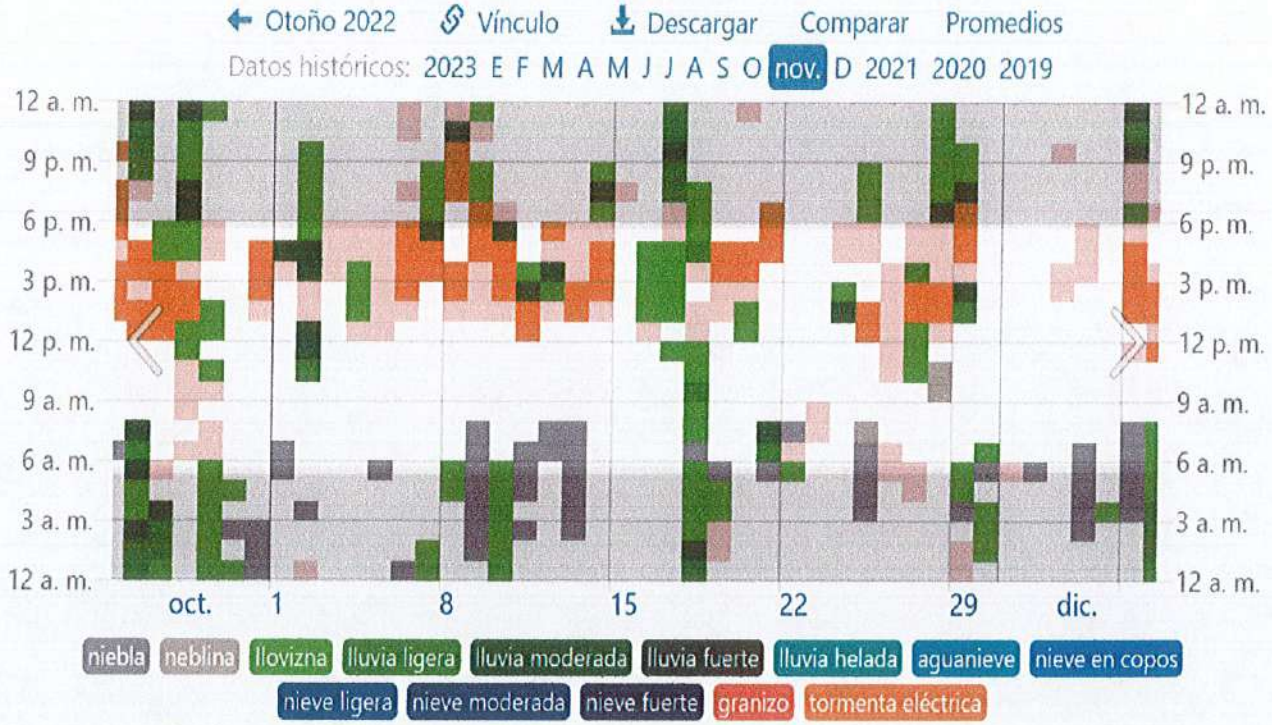

El tiempo observado por hora, codificado por color por categoría (en orden de gravedad). Si hay múltiples informes, se muestra el código más drástico.

© WeatherSpark.com

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

PERIODO 01 DE NOVIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

MADRID, CUNDINAMARCA

2023

DATOS DE ENTRADA

OBJETO: CONTRADO 543 .2022 "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

TIEMPO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2022

ALCANCE

Aplica al total de los colaboradores y encargados de la ejecución del "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

OBJETIVOS

Capacitar al personal de trabajo en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST aplicados durante la ejecución del proyecto.

Establecer las medidas mínimas de seguridad en el trabajo para la realización de las actividades propias del objeto del contrato de obra.

CONTENIDO

ALCANCE 2
OBJETIVOS 2
1. DEFINICIONES 4
2. MANEJO DE HERRAMIENTAS 5
3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 5
3.1. Protección de la cabeza 5
3.2. Protección de los pies 5
3.3. Protección de las manos y piel 6
3.4. Protección de la vista 6
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA 7
5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL 8
6. INDUCCIÓN 8
7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 8
3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP 11
3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES 12
5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES 12
4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 12
6. CONCLUSIONES 14

1. DEFINICIONES

Caso: Un evento registrable en una población o grupo de estudio de una enfermedad en particular, un trastorno de la salud o una condición bajo investigación.

COVID-19: Siglas de Coronavirus 2019 (enfermedad por coronavirus 2019), es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus denominado SARS-CoV-2, que se ha diseminado desde China o más de 170 países alrededor del mundo, incluida Colombia.

Emergencia de salud pública: Evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de la enfermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada.

Derrumbe: Desprendimiento de una porción de suelo o roca de una excavación y su desplazamiento súbito hacia la excavación por caída o deslizamiento.

Espacio confinado: Cuando los medios de entrada y salida son restringidos, con el espacio adecuado para permitir las labores por el personal.

Excavación: Es el corte, depresión, cavidad o zanja hecha mecánica o manualmente con el fin de remover tierra, arena, grava, rajón, recebo u otro material.

Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de un año para calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar sistemas de prevención y protección, elaborar especificaciones de trabajo, proyectos o productos acorde con lo establecido a la normativa.

Sistema de protección: Significa un método (inclinación, puntales, entibados o niveles escalonados) para proteger a los trabajadores de un derrumbe, de materiales que podrían caer o rodar en la excavación o por el colapso de estructuras colindantes.

Suelo: Es el material no consolidado o semi consolidado compuesto de la mezcla de partículas de diferentes tamaños, diferentes minerales y en diferentes cantidades y clases de materias orgánicas los cuales se encuentran sobre la corteza terrestre.

Zanja, trinchera: Excavación estrecha realizada en la tierra donde generalmente la profundidad es superior al ancho de esta.

Trabajo en Alturas: Se refiere a todas y cada una de las actividades que se desarrollan a partir de 1,5m de altura donde se establece el uso de sistemas de

protección tales como cuerdas, líneas de vida o arneses

2. MANEJO DE HERRAMIENTAS

Las diferentes actividades establecidas para la ejecución de los cuatro (4) Polideportivos del Municipio de Madrid Cundinamarca, requieren del uso de una serie de herramientas y equipos los cuales tienen la capacidad de afectar al personal de trabajo en función del uso que se le pueda dar. La ejecución del proyecto requiere del funcionamiento de una serie de maquinaria y equipos que de no ser direccionadas las indicaciones al personal que se va a hacer a cargo, pueden derivar en lesiones para el personal de trabajo:

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Las condiciones de trabajo en la construcción son tales que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la planificación del proyecto y el diseño de tareas, se necesitara algún tipo de protección personal EPP, como lo son cascos, protección de la vista y los oídos, botas y guantes, sin embargo el uso de EPP tiene sus desventajas tales como; algunas formas de EPP son incómodas y hacen más lento el trabajo, se necesita mayor supervisión para asegurar que los obreros usen lo elementos de protección.

3.1. Protección de la cabeza

Los objetos que caen, las izadas por las grúas y los ángulos sobresalientes se dan por todas partes en las obras de construcción, una herramienta pequeña o un perno que cae a 10 o 20 metros de altura puede causar lesiones graves o incluso la muerte, las heridas en la cabeza se producen cuando el obrero trabaja o se desplaza inclinado hacia adelante, cuando endereza el cuerpo después de haberse inclinado.

Los cascos de seguridad resguardan la cabeza efectivamente contra la mayoría de esos riesgos y es preciso usar casco constantemente en la obra, sobre todo en las áreas donde se está realizando el trabajo más arriba.

3.2. Protección de los pies

Las lesiones de los pies se dividen en dos categorías principales; las causadas por la penetración de clavos que no han sido sacados o doblados en la planta del pie, y las debidas a aplastamientos del pie por caída de herramientas o materiales. Ambas pueden minimizarse usando calzado protector, la clase de zapatos o de botas

protectoras dependerá de la índole del trabajo (por ejemplo, la presencia de agua subterránea en la obra) pero todo calzado protector debe tener suela impenetrable y capellada con una puntera de acero.

3.3. Protección de las manos y piel

Las manos son sumamente vulnerables a las lesiones accidentales, y en la construcción manos y muñecas sufren más lastimaduras que ninguna otra parte del cuerpo. Sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas, luxaciones, esguinces, amputaciones y quemaduras, que en su mayoría son evitables con mejores técnicas y equipo de trabajo manual, con el uso de protección adecuada como guantes o manoplas.

3.4. Protección de la vista

Los fragmentos y esquirlas, el polvo o la radiación son causas de muchas lesiones de la vista en las siguientes tareas:

- El picado, corte, perforación, labrado o afirmado de piedra, concreto y ladrillo con herramientas de mano o automáticas.
- El corte y soldadura de metales

Algunos de estos riesgos se pueden eliminar de modo definitivo por medio de resguardos adecuados en las máquinas, extractores de aire o un mejor diseño de tareas. En muchos casos, como por ejemplo el labrado y corte de piedra, la protección personal (anteojos de seguridad o visera) es la única solución práctica. A veces los obreros conocen los riesgos que corren y sus consecuencias si sufren daño en los ojos, pero no utilizan protección.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA

ID		CARGO	NOMBRE	CC
DR	1	Dir. Obra	Javier Antonio Gonzalez Arenas	1.126.001.358
ING	1	ING. Residente	Daniel Camilo Prada Millán	1.098.651.957
AEL	1	AS. Electrico	Carlos Julio Acevedo Ferreiro	91.043.063
SS	1	PR. Seguridad y Salud	Daniel Mauricio Oler Restrepo	71.664.413
TP	1	Topografo	Leonel Eduardo López Duran	1.102.721.369
CO	1	Coordinador de Obra	José Lamus Rodríguez	1.020.776.092
AES		AS. Estructural	Nicolas Alfonso Correa Duarte	1.090.425.817

ADMINISTRATIVO – OPERATIVO					
CARGO	NOMBRE	CC	ESTADO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Ing Auxiliar	Diana María Olaya Ortiz	1.073.176.550	26/09/2023		
SOLDADORES					
CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Soldador	Elkin Fabian Silva Cortés	91.517.987	26/09/2023		
Soldador	Donis David Carbono Bastidas	7.572.127	26/09/2023	1/11/2023	
Soldador	Anderson Eduardo Silva Cortés	1.102.718.418	26/09/2023		
Soldador	Jhoan Ferney Morales Sarmiento	1.102.717.910	26/09/2023		
Soldador	Cristian Favian Romero Villalba	1.102.721.147	26/09/2023	1/11/2023	
Soldador	Mario Andres Bautista Vargas	1.096.247.138	12/10/2023		
Soldador	Celso Steven Hernandez Quevedo	1.073.150.231	12/10/2023		

En la anterior tabla, se relaciona el personal del contratista del mes de diciembre; se incluye a las personas que se contrataron, y por diversos motivos se desvincularon en el transcurso del mismo mes, motivos los cuales también se exponen en la misma tabla, en la columna denominada "Observaciones".

Anexo 1. Afiliaciones ARL

Anexo 2. Planillas de seguridad social

5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL

El personal es apto para realizar las respectivas labores como ayudantes, oficiales y maestros de acuerdo con entrevista laboral realizada por coordinador de obras y empresa.

6. INDUCCIÓN

El maestro de obra realizo inducción, acerca del manejo de equipos, maquinaria y herramientas con acompañamiento de personal SST, a cada uno de los ayudantes y oficiales que ingresan y estarán ejecutando las actividades de mayor complejidad, como es el caso de:

- Manejo de las pulidoras
- Manejo de compresores
- Manejo de andamios

7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el periodo del mes de diciembre se realizaron actividades de capacitación, charlas y calistenia a todo el personal activo en los diferentes frentes de trabajo (San Luis, Escallón, Magnolia y San Carlos) ejecutados al iniciar labores brindando temas como:

- Manejo manual de cargas
- Lesiones pequeñas
- La seguridad responsabilidad de todos
- Manejo de extintores
- Uso de EPP
- Peligro mecánico
- Peligro locativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co





Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Durante el mes de diciembre se hizo entrega al personal de los siguientes elementos de protección personal:

- Guantes: se entregaron guantes de seguridad
- Gafas de seguridad
- Tapa oídos de inserción

El manejo de los equipos empleados en el periodo del presente informe estuvo a cargo del siguiente personal:

Pulidoras

- Elkin Silva Cortés – Soldador
- Anderson Silva Cortés – Soldador
- Jhoan Morales Sarmiento – Soldador
- Cristian Romero Villalba – Soldador
- Mario Andres Bautista Vargas
- Celso Steven Hernandez Quevedo

Andamios

- Elkin Silva Cortés – Soldador
- Anderson Silva Cortés – Soldador
- Jhoan Morales Sarmiento – Soldador
- Mario Andres Bautista Vargas
- Celso Steven Hernandez Quevedo

Compresor

- Elkin Silva Cortés – Soldador
- Anderson Silva Cortés – Soldador
- Jhoan Morales Sarmiento – Soldador
- Mario Andres Bautista Vargas
- Celso Steven Hernandez Quevedo

Demoledor y tronzadora

No se emplearon

El personal restante, solo empleo herramienta menor.

3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES

Se realiza inspección del uso de los elementos de protección del personal actual de la obra, encontrando que la mayoría están utilizando los EPP durante sus labores; para el personal que, por motivos de incomodidad u olvido que no estaban usando sus elementos de protección, se les informo de la importancia del uso de estos y el cumplimiento de este.

5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES

POYECTO: **CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022** "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se ausento ya sea por enfermedad general o diligencias personales, en el periodo del presente informe.

No se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo en los frentes de los polideportivos activos: Escallón, San Luis y La Magnolia. Por otro lado, algunos de los trabajadores se ausentaban constantemente y no presentaron incapacidad o excusa valida.

DATOS DE AUSENTISMO LABORAL MES DE NOVIEMBRE						
NOMBRE	Ausencia por causa de salud	No. Horas de ausencia por EL	Ausencia por EL	No. de horas de ausencia citas médicas	No. de horas diligencias personales	No. total de horas ausentismo
Diana María Olaya Ortiz	0	0	0	0	0	0
Elkin Fabian Silva Cortés	0	0	0	8	0	8
Anderson Eduardo Silva Cortés	0	0	0	0	0	0
Jhoan Ferney Morales Sarmiento	0	0	0	0	4	0
Cristian Favian Romero Villalba	0	0	0	0	0	0
Donis David Carbono Bastidas	0	0	0	0	0	0
Mario Andres Bautista Vargas	0	0	0	0	0	0
Celso Steven Hernandez Quevedo	0	0	0	0	0	0

Durante el periodo contemplado en el presente informe, el trabajador Jhoan Morales solicitó permiso para atender diligencias personales.

6. CONCLUSIONES

Se informo al personal los peligros que se pueden generar en obra y la importancia del uso de los EPP para el resguardo de su salud y bienestar.

Hasta la fecha de finalización del periodo del presente informe, no se han reportado ni accidentes ni incidentes laborales o ausencias por enfermedad laboral.

Al finalizar las labores diarias, se realiza el almacenamiento de herramientas y equipos en bodega, dejando organizado el espacio donde se desarrollan las labores de obra.

DANIEL MAURICIO OLIER RESTREPO
Profesional en seguridad salud y trabajo

ANEXO 3.
PLANILLAS SEGURIDAD

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7966319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				224	0
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	73236328	TOTAL A PAGAR	
					$62.375.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

o EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
7C55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1
6001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	128.000	0		0		0	3	400	0	128.400	2
6002	Salud Total EPS	800130907-4	480.500	0		0		0	3	1.500	0	482.000	19
6005	Sanitas EPS	800251440-6	940.000	0		0		0	3	2.800	0	942.800	23
6008	Compensar EPS	860066942-7	324.200	0		0		0	3	1.000	0	325.200	9
6010	EPS Sura	800088702-2	7.800	0		0		0	3	100	0	7.900	2
6017	Famisanar EPS	830003564-7	942.900	0		0		0	3	2.800	0	945.700	31
6037	Nueva EPS	900156264-2	1.564.300	0		0		0	3	4.600	0	1.568.900	43
6041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	879.800	0		0		0	3	2.600	0	882.400	23
6042	EPS COOSALUD	900226715-3	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1
6046	SALUD MIA EPS	900914254-1	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1
6C34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	24.800	0		0		0	3	100	0	24.900	1
6IC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	92.800	0		0		0	3	300	0	93.100	2
6IC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	510.400	0		0		0	3	1.500	0	511.900	11
6C07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	48.000	0		0		0	3	200	0	48.200	2
6C18	EPS-S Emssanar	901021565-8	1.378.000	0		0		0	3	4.100	0	1.382.100	36
6C24	EPS-S Coosalud	900226715-3	560.000	0		0		0	3	1.700	0	561.700	14
6C62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	69.600	0		0		0	3	300	0	69.900	2
6001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN

o AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
6201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.365.500	0	0	0	0	3	12.800	0	4.378.300	28
6801	Porvenir	800224808-8	22.480.300	0	0	0	0	3	65.600	0	22.545.900	155
6901	Old Mutual	800253055-2	185.600	0	0	0	0	3	600	0	186.200	1
6001	Colfondos	800227940-6	1.590.000	0	0	0	0	3	4.700	0	1.594.700	10
6114	Colpensiones	900336004-7	3.710.500	0	0	0	0	3	10.900	0	3.721.400	26

TOTALES RIESGOS LABORALES

o ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
6111	ARL SURA	800803790-5	13.587.000				13.587.000	3	39.700	13.626.700			135.870	13.626.700	224

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				224	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	73236328	$62.375.200	

TOTALES CAJAS

go CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CF24	Compensar Caja	860066942-7	3.220.800	3	9.400	3.230.200	100
CF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	3.621.600	3	10.600	3.632.200	89
CF39	Cajasan	890200106-1	1.294.300	3	3.800	1.298.100	35

TOTALES PARAFISCALES

r Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	19	8.136.700	8.161.500
Pensión	5	32.331.900	32.426.500
Riesgos Laborales	1	13.587.000	13.626.700
CCF	3	8.136.700	8.160.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	28	62.192.300	62.375.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				224	0
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	73236328	TOTAL A PAGAR	
					$62.375.200	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza Exterior	Extranjero	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
MONTOYA GOMEZ MARIA FERNANDA	1	0			S	X															230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF39	38,667	1,600	0	0	0	0	0
GARCIA ROMERO ERIK SANTIAGO	1	0			S	X															230201	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS008	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
ARDILA ARRIETA CINDY	1	0			S	X															230201	38,667	6,200	0	0	0	0	ESSC97	38,667	1,600	14-11	38,667	1	300	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
LOZANO MENDOZA ADOLFO	1	0			S	X															230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MIRANDA MELO JUANDIEGO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SANTANDER RODRIGUEZ DEIMAN NORBEY	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MORALES HERNANDEZ JHON ARMANDO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
CABALLERO QUINTANILLA SAMIR ADRIAN	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MIRANDA BOLAÑO MOISES	1	0			S																230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,600	14-11	38,667	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ALVEAR SANTANDER DANIELA ROCIO	1	0			S	X															230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	38,667	5	2,700	CCF30	38,667	1,600	0	0	0	0	0
BARBOSA ALFONSO GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MOSQUERA OLAYA JOSE FLORENTINO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,600	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
OSPINA LADINO INGRY DAYANA	1	0			S																230301	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	38,667	5	2,700	CCF30	38,667	1,600	0	0	0	0	0
REDONDO VANEGAS ALGEMIRO ALBERTO	1	0			S																230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,800,000	72,000	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
GUELGUA JESUS EDUARDO	1	0			S																25-14	1,600,000	256,000	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,800,000	5	125,300	CCF24	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0
ACOSTA GEOVANNY ARLEY	1	0			S																230201	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS002	1,800,000	64,000	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
GOYES RODRIGUEZ EVER DANILO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS008	1,800,000	72,000	14-11	1,600,000	1	8,400	CCF24	1,600,000	64,000	0	0	0	0	0
PALMERA AVILA JUAN GABRIEL	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,800,000	1	9,400	CCF24	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0
SANTANA OBREGON DELIA	1	0			S																25-14	2,000,000	320,000	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
LOPEZ FLOREZ JUAN DAVID	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	2,000,000	80,000	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MARMOLEJO VELEZ JERSY ARLEY	1	0			S																25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	2,000,000	5	139,200	CCF35	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
MORA TORRES JINSON FERLEY	1	0			S																230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
TRIVIÑO HERNANDEZ HECTOR ALBEIRO	1	0			S	X															230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	38,667	1,900	14-11	1,160,000	1	8,100	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
OLAYA ORTIZ DIANA MARIA	1	0			S	X															230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	38,667	5	2,700	CCF35	38,667	1,600	0	0	0	0	0
ROMERO CELEITA MILLER DUVAN	1	0			S																230201	1,082,667	173,300	0	0	0	0	EPS017	38,667	1,800	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MERINO CARDENAS JUAN FELIPE	1	0			S	X	X														230301	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS041	1,082,667	43,400	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
PISMAG MUÑOZ JOSE MEDARDO	1	0			S																230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS008	1,700,000	68,000	14-11	1,082,667	5	75,400	CCF24	1,082,667	43,400	0	0	0	0	0
ROSERO DORADO CARLOS MARINO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	38,667	1,600	14-11	1,700,000	5	118,400	CCF24	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
MARTINEZ CORDOBA JOSE CAMILO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
ZAMBRANO ERASO ANDERSON GIOVANNI	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
PACHECO DOVAL OVEI FRANCISCO	1	0			S																230301	2,500,000	400,000	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ROMERO LOPEZ JHON FREDY	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	2,500,000	100,000	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
GETIAL YELA RICHARD ALBER	1	0			S																25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC15	1,160,000	46,400	14-11	2,500,000	5	174,000	CCF35	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
CHAZATAR CASTRO JESUS JAVIER	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
YELA JURADO YENNY FRANCIA	1	0			S																230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
GUANGA RODRIGUEZ GUILLERMO ARTURO	1	0			S																230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
PATIÑO TORRES ELMER YOVANY	1	0			S																230301	1,200,000	192,000	0	0	0	0	ESSC15	1,160,000	46,400	14-11	1,300,000	5	80,500	CCF35	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
PATIÑO TORRES VICTOR ALFONSO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,200,000	48,000	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
LAGOS BASTIDAS MIGUEL ANGEL	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,200,000	5	83,500	CCF35	1,200,000	48,000	0	0	0	0	0
																					230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
																					230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
																					230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensarmiplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 224 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	73236328	$62.375.200

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano exterior	Dominicilio	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RIL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	MARTINEZ BENAVIDES JAIRO ALBEIRO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC19	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	REALPE NASTACUAS JOSE CARVELIO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	ESPINOSA MELO DARIO FERNANDO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS305	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	PINCHAO CABRERA DIANA ANDREA	1	0		S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC19	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	TRUJILLO DE LA CRUZ IVAN DARIO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	VILLOTA DIAZ JHONATAN ESMITH	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	ORREGO DELGADO JEFERSON STIVEN	1	0		S	X																230301	38.667	8.200	0	0	0	0	ESSC18	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF35	38.667	1.600	0	0	0	0	0
	ROJAS ANDRADE CRISTIAN CAMILO	1	0		S	X																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS305	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	GUALMATAN MENESES RUBEN DARIO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	OROZCO CARVAJAL GIOVANNI	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	BASTIDAS DIAZ VICTOR ALFONSO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	BAEZ DELGADILLO JAYDHER JHAIR	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	CABALLERO QUINTERO CESAR DUVAN	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	SINUCO ZARATE SERGIO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	HERNANDEZ MORALES GERMAN DAVID	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	ESPINOSA MELO JOHN ALEXANDER	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC19	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	DIAZ DEL CASTILLO VILLOTA WILMER FERNANDO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	SILVA CORTES ANDERSON EDUARDO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	NOVA JIMENEZ JOSE ANGEL	1	0		S																	230301	1.750.000	289.000	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	CALA LEON ANDERSON JESUS	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	5	121.800	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
	PRADA GOMEZ JOHAN SEBASTIAN	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	HIDALGO CASANOVA ANDERSON DARIO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	CARRASCAL RIVERA FREDDY ALEJANDRO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS042	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	GARCIA VELASQUEZ CRISTIAN FERNERY	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	JACANAMEJOY DEJOY CLAUDIA MIREYA	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	MELO MILLER YAIR	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	PANA GILBERTO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS042	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	BECERRA AGREDO DERLEN FABIAN	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	MORALES SARMIENTO JHOAN FERNEY	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	LUNA RINCON RAFAEL	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	LOPEZ CONTRERAS YEYSON DARIO	1	0		S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	ZAPATA TORRES OSCAR ORLANDO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	QUINTERO DIAZ DUWAN FERNEY	1	0		S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	ROMERO VILLALBA CRISTIAN FAVIAN	1	0		S	X																25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	SINUCO MONCADA JORGE ALBEIRO	1	0		S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS001	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	1	5.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
	LAGOS MIGUEL ANGEL	1	0		S																	230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF39	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
	PORTILLA JURADO JOSE ISAAC	1	0		S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
	JARAMILLO RODRIGUEZ WILSON ORLANDO	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	SANABRIA MAYORGA EUDES VIANEY	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC19	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	URARIYU LUCAS	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
	IPUANA URARIYU JAVIER	1	0		S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF35	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
																						230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
																						230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC1	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
																													EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					224	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	73236328	$62.375.200	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CONTRERAS PRIETO WLADIMIR	1	0		S																		230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SANCHEZ JIMENEZ ANGEL ENRIQUE	1	0		S																		230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MENDOZA PAEZ RAFAEL MANUEL	1	5		S	X																		0	0	0	0	0	0	EPS005	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
JURADO GETIAL CARLOS ALFREDO	1	0		S																		231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ARAQUE RAMIREZ JOSE EXPEDITO	1	0		S																		230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ZABALETA RODRIGUEZ ERLEN ELIT	1	0		S																		230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	MIND01	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
COCOMA MORENO EDILBERTO	1	5		S																			0	0	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
BARROS BARRAGAN ANCIZAR	1	0		S																		231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SANCHEZ PEÑALOZA HUMBERTO	1	0		S																		230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MADRID BEDOYA WALTER	1	0		S																		231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ARIAS GUAVITA WILSON ALBERTO	1	0		S																		231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
FERNANDEZ CASTIBLANCO DOMICIANO	1	0		S																		231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SANCHEZ MARTINEZ MISAEL	1	0		S																		230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
CARBONO BASTIDAS DONS DAVID	1	0		S	X																	230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS041	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
ALDANA ORTIZ ANDRES CAMILO	1	0		S																		231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SAAVEDRA MARCO ANTONIO	1	5		S	X																		0	0	0	0	0	0	EPS006	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
SERNA ARRIETA LUIS ANTONIO	1	5		S	X																		0	0	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
ESPINAL VILLALOBOS ELKIN DE JESUS	1	0		S	X																	230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF39	38,667	1,600	0	0	0	0	0
ALMANZA LOPEZ WILLIAM FERNANDO	1	0		S																		230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF39	38,667	1,600	0	0	0	0	0
GUAQUETA BARRAGAN NESTOR ANDRES	1	0		S																		230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
NEGRETE FERNANDEZ RONDI ENRIQUE	1	0		S																		230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS001	2,000,000	80,000	14-11	2,000,000	1	10,560	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
ILVIRA VALENCIA LIBARDO APOLINAR	1	0		S																		230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	CCFC55	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
OLIER RESTREPO DANIEL MAURICIO	1	0		S																		25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC15	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
PEREZ PEREZ JORGE ELIECER	1	0		S																		230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
YELA SANTANDER JOSE	1	0		S																		230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF36	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SOLARTE JULIO CESAR	1	0		S																		230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC19	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
HERNANDEZ JURADO ALVARO FIDEL	1	0		S																		230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
TORO RIASCOS JOSE WILLIAN	1	0		S																		230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
PALACIOS CIFUENTES ASDRUBAL	1	0		S	X																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC16	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MEZA LOMBANA LUIS ENRIQUE	1	0		S																		231001	889,334	142,300	0	0	0	0	EPS041	889,334	35,600	14-11	889,334	5	61,900	CCF24	889,334	35,600	0	0	0	0	0
MORA MORALES RAMIRO FABIAN	1	0		S																		230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
PORTILLO QUINTERO EDINNSON DANNY	1	0		S																		230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ORTEGA MAYA MANUEL ANTONIO	1	0		S	X																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC15	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
RODRIGUEZ PANTOJA HECTOR ANIBAL	1	0		S																		230301	38,667	6,200	0	0	0	0	ESSC15	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF35	38,667	1,600	0	0	0	0	0
																						230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PO	NÚMERO	DATOS DEL APORTANTE					
NI	900653937-2	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
RMA ITACIÓN	CLASE APORTANTE	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ICA	B – menos de 200 c	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
				SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				224	0
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	73236328	TOTAL A PAGAR	
					$62.375.200	

COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Extranjero	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
VALLEJOS ZAMBRANO SEGUNDO CLEMENCIO	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
PANTOJA PORTILLO SEGUNDO ENRIQUE	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
LUQUE DURAN CESAR ENRIQUE	1	0																			25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MARMOLEJO GIRALDO RIGOBERTO	1	0																			25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
CARREÑO GOMEZ WILSON	1	0																			230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
QUINTANA MORALES ERMINSON	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
VALLEJOS MORILLO SERVIO TULIO	1	0																			25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
LAGOS LOPEZ HILDER LIBARDO	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
PAREDES DELGADO JUANITO OLIVERIO	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
RENDILES LEAL FRANKLIN JOSE	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC07	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
REYES ASCANIO JOSE RAFAEL	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ALFANO MORENO ESTEBAN ALFONSO	1	0																			230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
HERRERA ARIZA HUVER ALONSO	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
DIAZ MARTINEZ CESAR ORLANDO	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
RODRIGUEZ PORRAS JOSE BERNARDO	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SANCHEZ INDIAS WILLIAM	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF35	38,667	1,600	0	0	0	0	0
GOYES CORTES YILBER FABIAN	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ESCOBAR LOPEZ LEONARDO FRANCO	1	0																		X	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SILVA CORTES EIDIN FABIAN	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
BRAVO CASTRO RAMIRO GERMAN	1	0																			230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS041	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF35	38,667	1,600	0	0	0	0	0
CRUZ PATIÑO DAGO ALEXANDER	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MORENO YATE ANGELO GUISEPPE	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
NUEZ HERNANDEZ CRISTIAN FELIPE	1	0																		X	230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	ESSC62	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SANCHEZ MORENO OSCAR JAVIER	1	0																		X	230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
LUIS GONZALEZ DANILO ENRIQUE	1	0																			231001	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS017	2,000,000	80,000	14-11	2,000,000	5	139,200	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
GOMEZ RINCON WILSON	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
NUEZ MELENDEZ DIOMAR DE JESUS	1	0																			230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
																					230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
																					230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS008	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	1	6,100	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
																					230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
PO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
RMA NTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				224	0
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	73236328	TOTAL A PAGAR	
					$62.375.200	

COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Apellidos y Nombres	Actividad	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
MORA LARA DANILO FERNEY	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
LEAL BALLESTEROS ELVER EMILIO	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
PARRA BERNAL GERSON ENRIQUE	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
CAICEDO CAMACHO ALEJANDRO	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
RIASCOS RIASCOS JOSE ANGEL	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
HERNANDEZ QUEVEDO CELSO STEVEN	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
DIAZ MORALES JHON SEBASTIAN	1	0		S	X																230301	38,667	6,200	0	0	0	0	ESSC18	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF35	38,667	1,600	0	0	0	0	0
ZAMBRANO REALPE JOSE ISMAEL	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPSIC5	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
JURADO REALPE JOHAN SEBASTIAN	1	0		S	X																230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS005	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF35	38,667	1,600	0	0	0	0	0
MACHADO ORTIZ JOSE LUIS	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SILVA GARCIA ELIECER	1	0		S	X																230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS005	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF39	38,667	1,600	0	0	0	0	0
REINA PAI CAMILO	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPSIC5	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
BAUTISTA VARGAS MARIO ANDRES	1	0		S																	230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS005	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF39	38,667	1,600	0	0	0	0	0
REINA PORTILLA WILLIAR OMAR	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPSIC5	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
BACCA ALVAREZ CARLOS JHOVANI	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MONTOYA PEREZ ANGELMIRO	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPSIC5	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
JURADO MENESES JHONIER FERNANDO	1	0		S	X																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC18	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
IMBAQUI VACA DERLYN	1	0		S	X																230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
CAICEDO PORTILLO JESUS ESTEBAN	1	0		S	X																230301	38,667	6,200	0	0	0	0	ESSC18	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF35	38,667	1,600	0	0	0	0	0
MEJIA RODRIGUEZ KELIS RAQUEL	1	0		S																	230301	38,667	6,200	0	0	0	0	ESSC18	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF35	38,667	1,600	0	0	0	0	0
CASTRILLON CARLOS ANDRES	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
NASTACUAZ REALPE ROIMAN	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
GARCIA PAI ÁNCIZAR	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPSIC5	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF39	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
GUALDRON MANTILLA SERGIO	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPSIC5	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
GRASS SUAREZ ARLEY FERNANDO	1	0		S	X																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
OLIVAR BARRIOS JOSE RAFAEL	1	0		S																	230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
URARIYU DAVID	1	0		S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPSIC1	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				224	0
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	73236328	TOTAL A PAGAR	
					$62.375.200	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
ARCINIEGAS MENDOZA JHON JAIRO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ARIAS VARON JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
PARRA BOLIVAR LUIS EDUARDO	1	0			S																25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS008	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
BALLESTEROS LUNA JUAN JOSE	1	0			S	X															230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS017	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
PORTILLA DIAZ IVAN ARTURO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
LOPEZ SEPULVEDA JOHN FERNEY	1	0			S	X															230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS037	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
HERRERA OSORIO JOSE DAVID	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
SANABRIA MAYORGA FREDY ANTONIO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
CASTELLANOS SUAREZ FREDY	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
RUEDA SEPULVEDA CARLOS ANDRES	1	0			S	X															25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
HERNANDEZ HERRERA DIEGO ALEJANDRO	1	0			S	X															230301	1,121,334	179,500	0	0	0	0	EPS017	1,121,334	44,900	14-11	1,121,334	5	78,100	CCF24	1,121,334	44,900	0	0	0	0	0
CAMPOS LEON BRAYAN	1	0			S	X	X														230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS002	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF35	38,667	1,600	0	0	0	0	0
MUÑOZ YAGUAPAZ JOSE MANUEL	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
MORA CAICEDO CRISTHIAM CAMILO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
VARGAS AMAYA LUBIN	1	0			S	X	X														230301	38,667	6,200	0	0	0	0	ESSC24	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF39	38,667	1,600	0	0	0	0	0
ACOSTA GUALTERO LIBARDO	1	0			S	X															25-14	1,121,334	179,500	0	0	0	0	ESSC24	1,121,334	44,900	14-11	1,121,334	5	78,100	CCF39	1,121,334	44,900	0	0	0	0	0
AMAYA BRAVO ADRIANO	1	0			S	X	X														25-14	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS002	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF35	38,667	1,600	0	0	0	0	0
TORRES ORTIZ MARTIN MANUEL	1	0			S	X															231001	889,334	142,300	0	0	0	0	EPS017	889,334	35,600	14-11	889,334	5	61,900	CCF24	889,334	35,600	0	0	0	0	0
CAMPOS LEON YULI PAOLA	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS048	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
ROJAS BUENO LUIS ALBERTO	1	0			S																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,600	CCF35	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
QUINTERO GARCIA CARLOS ALBERTO	1	0			S	X															230301	850,667	136,200	0	0	0	0	EPS017	850,667	34,100	14-11	850,667	5	59,300	CCF24	850,667	34,100	0	0	0	0	0
DAVILA VELEZ ROBINSON	1	0			S	X															25-14	850,667	136,200	0	0	0	0	EPS037	850,667	34,100	14-11	850,667	5	59,300	CCF24	850,667	34,100	0	0	0	0	0
MANRIQUE TORRES OSCAR ALBEIRO	1	0			S	X															25-14	657,334	105,200	0	0	0	0	EPS017	657,334	26,300	14-11	657,334	5	45,800	CCF24	657,334	26,300	0	0	0	0	0
BOHORQUEZ CALDERON FREDDY	1	0			S	X															25-14	657,334	105,200	0	0	0	0	EPS017	657,334	26,300	14-11	657,334	5	45,800	CCF24	657,334	26,300	0	0	0	0	0
NIETO GOMEZ CHRISTIAN CAMILO	1	0			S	X	X														230201	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS017	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
RAMIREZ VANEGAS JOHAN SEBASTIAN	1	0			S	X															230301	1,121,334	179,500	0	0	0	0	EPS037	1,121,334	44,900	14-11	1,121,334	5	78,100	CCF24	1,121,334	44,900	0	0	0	0	0
BARRIOS RODRIGUEZ JULIAN ANDRES	1	0			19	K															230301	618,667	99,000	0	0	0	0	EPS034	618,667	24,800	14-11	618,667	5	40,100	CCF24	618,667	24,800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				224	0
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	7323632B	TOTAL A PAGAR	
					$62.375.200	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	MASMELA RAYO EDUVERNY	1	0		S	X																230301	580,000	92,800	0	0	0	0	EPS017	580,000	23,200	14-11	580,000	5	40,400	CCF24	580,000	23,200	0	0	0	0	0
	BARRIOS BARRAGAN RENEN	1	0		S	X																230301	580,000	92,800	0	0	0	0	ESSC62	580,000	23,200	14-11	580,000	5	40,400	CCF24	580,000	23,200	0	0	0	0	0
	HERNANDEZ CRUZ DIEGO ARMANDO	1	0		S	X																25-14	386,667	61,900	0	0	0	0	EPS008	386,667	15,500	14-11	386,667	5	27,000	CCF24	386,667	15,500	0	0	0	0	0
	BOGOTA GAONA JESUS MARIA	1	0		S	X																25-14	889,334	142,300	0	0	0	0	EPS017	889,334	35,600	14-11	889,334	5	61,900	CCF24	889,334	35,600	0	0	0	0	0
	HERNANDEZ HERRERA WALTER ANDRES	1	0		S	X																230201	850,667	136,200	0	0	0	0	EPS002	850,667	34,100	14-11	850,667	5	59,300	CCF24	850,667	34,100	0	0	0	0	0
	GARRIDO GOMEZ HEISEMBERG	1	0		S	X																230301	386,667	61,900	0	0	0	0	EPS002	386,667	15,500	14-11	386,667	5	27,000	CCF24	386,667	15,500	0	0	0	0	0
	SALAZAR BASTIDAS RICARDO ALDEMAR	1	0		S	X																230301	348,000	55,700	0	0	0	0	ESSC18	348,000	14,000	14-11	348,000	5	24,300	CCF35	348,000	14,000	0	0	0	0	0
	SANCHEZ LEON DANIEL ALEXANDER	1	0		S	X																230301	348,000	55,700	0	0	0	0	EPS041	348,000	14,000	14-11	348,000	5	24,300	CCF24	348,000	14,000	0	0	0	0	0
	ROBLES LEON ANGEL GABRIEL	1	0		S	X																230301	348,000	55,700	0	0	0	0	EPS041	348,000	14,000	14-11	348,000	5	24,300	CCF24	348,000	14,000	0	0	0	0	0
	MEDRANO ESTRADA RAFAEL DARIO	1	0		S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	EPS002	657,334	26,300	14-11	657,334	5	45,800	CCF24	657,334	26,300	0	0	0	0	0
	AGUDELO BARBOSA NEYER IVAN	1	0		S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	EPS008	657,334	26,300	14-11	657,334	5	45,800	CCF24	657,334	26,300	0	0	0	0	0
	PICO VEGA RUMENEGUI DANAYFER	1	0		S	X																230301	116,000	18,600	0	0	0	0	EPS010	116,000	4,700	14-11	116,000	5	8,100	CCF35	116,000	4,700	0	0	0	0	0
	CUBILLOS SILVA TADEO	1	0		S	X																230201	116,000	18,600	0	0	0	0	EPS037	116,000	4,700	14-11	116,000	5	8,100	CCF24	116,000	4,700	0	0	0	0	0
	GARZON FIGUEROA VERIZ	1	0		S	X																230301	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS017	77,334	3,100	14-11	77,334	5	5,400	CCF24	77,334	3,100	0	0	0	0	0
	MENA CASTRO WALBERTO JOSE	1	0		S	X	X															230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS017	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
	GUEVARA PASIVE JHONATAN FERNEY	1	0		S	X																230301	386,667	61,900	0	0	0	0	EPS017	386,667	15,500	14-11	386,667	5	27,000	CCF24	386,667	15,500	0	0	0	0	0
	CRUZ ESPITIA IVAN ALFREDO	1	0		S	X																230301	386,667	61,900	0	0	0	0	EPS017	386,667	15,500	14-11	386,667	5	27,000	CCF24	386,667	15,500	0	0	0	0	0
	GARCIA MARTINEZ ORLANDO	1	0		S	X																230301	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS017	77,334	3,100	14-11	77,334	5	5,400	CCF24	77,334	3,100	0	0	0	0	0
	NOVOA BELTRAN JOSE HERIBERTO	1	0		S	X																25-14	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS017	77,334	3,100	14-11	77,334	5	5,400	CCF24	77,334	3,100	0	0	0	0	0
	GARCIA TIQUE MODESTO	1	0		S	X																25-14	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS037	77,334	3,100	14-11	77,334	5	5,400	CCF24	77,334	3,100	0	0	0	0	0
	MOGOLLON HERIBERTO	1	0		S	X																25-14	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS002	77,334	3,100	14-11	77,334	5	5,400	CCF24	77,334	3,100	0	0	0	0	0
	HERNANDEZ REQUENA EDGAR RAFAEL	1	0		S	X																230301	348,000	55,700	0	0	0	0	EPS037	348,000	14,000	14-11	348,000	5	24,300	CCF35	348,000	14,000	0	0	0	0	0
	HERRERA DAZA EDWIN OSWALDO	1	0		S	X																230301	116,000	18,600	0	0	0	0	EPS017	116,000	4,700	14-11	116,000	5	8,100	CCF24	116,000	4,700	0	0	0	0	0
	RAMIREZ GARCIA HUMBERTO	1	0		S	X																230301	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS002	77,334	3,100	14-11	77,334	5	5,400	CCF24	77,334	3,100	0	0	0	0	0
	CADENA PARRA ORLANDO	1	0		S	X																25-14	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS017	77,334	3,100	14-11	77,334	5	5,400	CCF24	77,334	3,100	0	0	0	0	0
	VARGAS CARVAJAL DANIEL SANTIAGO	1	0		S	X	X															230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS002	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF24	38,667	1,600	0	0	0	0	0
	PICO LANDAZABAL MOISES	1	0		S	X																230301	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS037	77,334	3,100	14-11	77,334	5	5,400	CCF35	77,334	3,100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				224	0
2023-12	2023-11	E	15/12/2023	73236328	TOTAL A PAGAR	
					$62.375.200	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
TELLO PLATA JOHAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230201	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS010	77.334	3.100	14-11	77.334	5	5.400	CCF24	77.334	3.100	0	0	0	0	0
ALDANA VANEGAS RUBER ERNEY	1	0			S	X																25-14	77.334	12.400	0	0	0	0	ESSC24	77.334	3.100	14-11	77.334	5	5.400	CCF24	77.334	3.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS	CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM	
FORMA SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-11	2023-11	I	15/12/2023	73187324	TOTAL A PAGAR	
					$425.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

o EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
005	Sanitas EPS	800251440-6	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN

o AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	0	0	0	192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

o ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
23	Positiva Seguros	860011153-6	83.600				83.600	0	0	83.600			836	83.600	1

TOTALES CAJAS

go CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	1	83.600	83.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	425.600	425.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS	CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-11	2023-11	I	15/12/2023	73187324	TOTAL A PAGAR	
					$425.600	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Residente	IRP	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AUP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	57	0			N																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	150.000	14-23	1.200.000	5	83.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900930439-4	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS	CARRERA 10 No. 5 - 08	3132857941	electricaconstrucciones@yahoo.com	
FORMA SENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
UCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	72437168	TOTAL A PAGAR	
					$1.077.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

o EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
C24	EPS-S Coosalud	900226715-3	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2

TOTALES PENSIÓN

o AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1
301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1
14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0	0	185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

o ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
11	ARL SURA	890903790-5	242.400				242.400	0	0	242.400			2.424	242.400	3

TOTALES CAJAS

go CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CF40	Comfenalco Santander	890201578-7	139.200	0	0	139.200	3

TOTALES PARAFISCALES

r Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	139.200	139.200
Pensión	3	556.800	556.800
Riesgos Laborales	1	242.400	242.400
CCF	1	139.200	139.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.077.600	1.077.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	9009304439-4	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS		CARRERA 10 No. 5 - 08	3132857941	electricaconstrucciones@yahoo.com	
FORMA SENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	72437168	TOTAL A PAGAR	
					$1.077.000	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
n	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Radicado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	QUINTERO GUALDRON OSCAR GIOVANY	1	0			0																	25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF40	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	CARREÑO ACEVEDO FABIAN ANDRES	1	0			0																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF40	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
	ACEVEDO PEREIRA CARLOS JULIO	1	0			0																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF40	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ERALES DEL APORTANTE

ión	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	8	CONTECOR SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024783	SI

ERALES DE LA LIQUIDACION

do	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-12	315340309	94599280525	E	2023/12/11	2023/12/04	BANCO DE OCCIDENTE		$284,500

ON DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
tificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
NTECOR (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
bajo: OFICINA (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
A Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
20776092	LAMUS JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	
Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0	

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

ERALES DEL APORTANTE

ión	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	8	CONTECOR SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024783	SI

ERALES DE LA LIQUIDACION

do	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-12	315340309	94599280525	E	2023/12/11	2023/12/04	BANCO DE OCCIDENTE		$284,500

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
STRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$185,600
R	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$185,600
STRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$6,100
	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$6,100
STRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$46,400
AR	CCF24	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$46,400
STRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$46,400
	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$46,400
				1	$284,500	$0	$284,500

901

ERALES DEL APORTANTE

ión	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		LOPEZ DURAN LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 #141-59	BOGOTA D.C -BOGOTA D.C	7352055	No

ERALES DE LA LIQUIDACION

do	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
023-11	311064823	9499106361	I	2023/12/13	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

ON DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
ificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
NCIPAL (1 Afiliados)				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0	
bajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0	
A D.C Depto: BOGOTA D.C (1 Afiliados)				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0	
12721369	LOPEZ LEONEL	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0	
Afiliados(1)				$1,200,000	$192,900			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0	

LES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		LOPEZ DURAN LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 #141-59	BOGOTA D.C -BOGOTA D.C	7352055	No

LES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
alud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-11	311064823	9499106361	I	2023/12/13	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
MPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
ADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$0	$0	$150,000
				1	$348,300	$0	$0	$348,300

801

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-11
Período Salud : 2023-12

Se certifica que en la fecha 2023-12-05 la empresa INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS con documento de identificación NI 901043519 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CORREA DUARTE NICOLAS ALFONSO identificado con CC-1090425817, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901043519	INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
28383774	E	2023-12-05	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890500516	CCF37	Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	30
