REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
INFORME DE INTERVENTORIA SEMANAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME SEMANA No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 19 DE OCTUBRE DE 2023	Y EL 28 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO	Realizar la Interventoría a las obras de mejoramiento del Acueducto La Leonera Cabecera.		
LOCALIZACIÓN	Cabecera – Corregimiento La Leonera		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSTRUCCION	
CONTRATO No.:	**4182.010.26.1.547-2023**	CONTRATO No.:	**4182.010.26.1.528-2023**
CONTRATISTA:	**EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**	CONTRATISTA:	**JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ**
PLAZO INICIAL:	**TRES (03) MESES**	PLAZO INICIAL:	**TRES (03) MESES**
FECHA DE INICIACIÓN:	**22 DE SEPTIEMBRE DE 2023**	FECHA DE INICIACIÓN:	**19 DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**22 DE DICIEMBRE DE 2023**	FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:	
VALOR INICIAL:	**$ 93.073.891.oo**	VALOR INICIAL :	**$ 1.066.688.087.oo**
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:		VALOR ACTUALIZADO:	
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
SEGUROS DEL ESTADO S.A	DESDE	HASTA		**SEGUROS DEL ESTADO S.A**	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO 45-44-101151814	21/092023	22/06/2028	$ 18,614,778.20	CUMPLIMIENTO (ANEXO 0) 45-44-101150948	12/09/2023	12/08/2024	$ 320,006,426.10
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 430 47 994000052293	21/09/2023	22/12/2026	$ 7,445,911.28	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (ANEXO 0) 45-44-101150948	12/09/2023	12/02/2027	$ 85,335,046.96
CALIDAD DEL SERVICIO 430 47 994000052293	22/12/2023	22/12/2028	$ 18,614,778.00	CALIDAD DEL SERVICIO (ANEXO 0) 45-44-101150948	12/09/2023	13/09/2028	$ 213,337,617.40
				RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (ANEXO 0) 45-40-101086712	12/09/2023	12/02/2024	$ 232,000,000.00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSTRUCCION		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

4. CURVA "S"

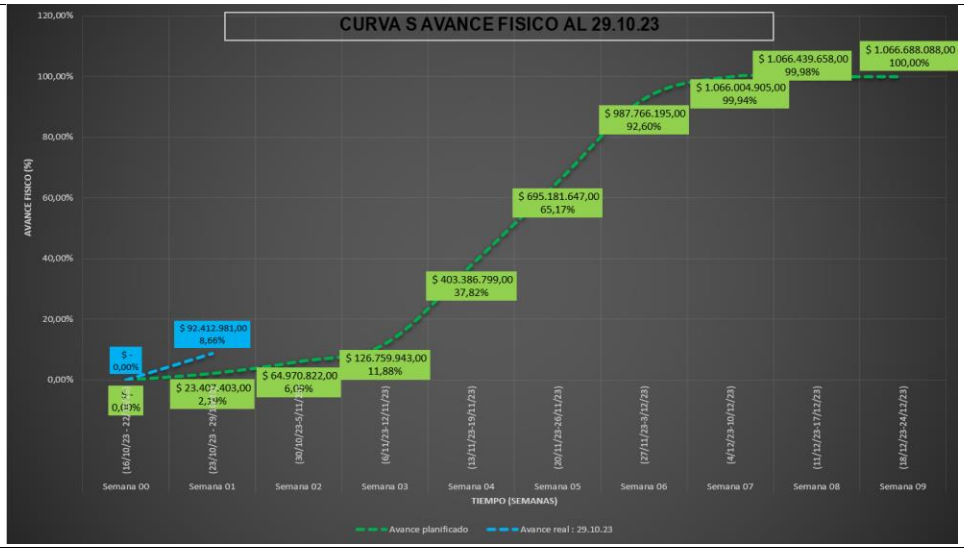

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NO SE EVIDENCIAN ACTIVIDADES NO PREVISTAS O DE MAYORES CANTIDADES

6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA

1. Localización:
La figura 1 presenta la localización del Área de Prestación de Servicio – APS del sistema de Acueducto de la vereda La Leonera - Corregimiento Felidia, objeto de intervención con la actividad: "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA, ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI".
La zona de intervención se localiza en el Corregimiento de La Leonera, en las veredas Leonera Cabecera, El Pajui y La Cajita, ubicadas al nor-occidente del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus coordenadas planas aproximadas en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS CALI son: N873372, E1049592 y sus correspondientes coordenadas geográficas 3°27´3.54764" N, 76°37´52.71929" W.



Figura 1. Localización general Cali – La Leonera

2. Levantamiento Censo de suscriptores:

Esta actividad ha sido culminada y ya se cuenta con la actualizacion del listado de suscriptores, son 350 de acuerdo con el presupuesto.

3. Avance de obras:

Ya se realizaron las labores de excavación para la reposición de tubería PVC de 4" RDE 13,5 en los primeros 1.200 ml ,esta excavación se realizó en los predios de Marlen Glater, Julio Meza, Andrés Dominguez y Stephanía Ramírez Mejía. También se realizaron las labores de excavación, instalación de collarines con su registro de incorporación y la manguera PF+UAD D=1/2" en 150 domiciliarias.



4. Revisión de planos, presupuestos y cantidades
Estamos en el proceso de revisión de planos, presupuestos y cantidades para hacer los ajustes respectivos.

AVANCE

Se puede realizar una valoración en porcentaje de avance de las actividades ejecutadas donde se observa un avance del **8,66% en las actividades.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
INTERVENTOR
