REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
INFORME DE INTERVENTORIA SEMANAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME SEMANA No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 30 DE OCTUBRE DE 2023	Y EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO	Realizar la Interventoría a las obras de mejoramiento del Acueducto La Leonera Cabecera.		
LOCALIZACIÓN	Cabecera – Corregimiento La Leonera		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE CONSTRUCCION**	
CONTRATO No.:	**4182.010.26.1.547-2023**	CONTRATO No.:	**4182.010.26.1.528-2023**
CONTRATISTA:	**EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**	CONTRATISTA:	**JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ**
PLAZO INICIAL:	**TRES (03) MESES**	PLAZO INICIAL:	**TRES (03) MESES**
FECHA DE INICIACIÓN:	**22 DE SEPTIEMBRE DE 2023**	FECHA DE INICIACIÓN:	**19 DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**22 DE DICIEMBRE DE 2023**	FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:	
VALOR INICIAL:	**$ 93.073.891.oo**	VALOR INICIAL :	**$ 1.066.688.087.oo**
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:		VALOR ACTUALIZADO:	
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
SEGUROS DEL ESTADO S.A	DESDE	HASTA		**SEGUROS DEL ESTADO S.A**	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO 45-44-101151814	21/092023	22/06/2028	$ 18,614,778.20	CUMPLIMIENTO (ANEXO 0) 45-44-101150948	12/09/2023	12/08/2024	$ 320,006,426.10
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 430 47 994000052293	21/09/2023	22/12/2026	$ 7,445,911.28	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES (ANEXO 0) 45-44-101150948	12/09/2023	12/02/2027	$ 85,335,046.96
CALIDAD DEL SERVICIO 430 47 994000052293	22/12/2023	22/12/2028	$ 18,614,778.00	CALIDAD DEL SERVICIO (ANEXO 0) 45-44-101150948	12/09/2023	13/09/2028	$ 213,337,617.40
				RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (ANEXO 0) 45-40-101086712	12/09/2023	12/02/2024	$ 232,000,000.00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE CONSTRUCCION**		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

4. CURVA "S"

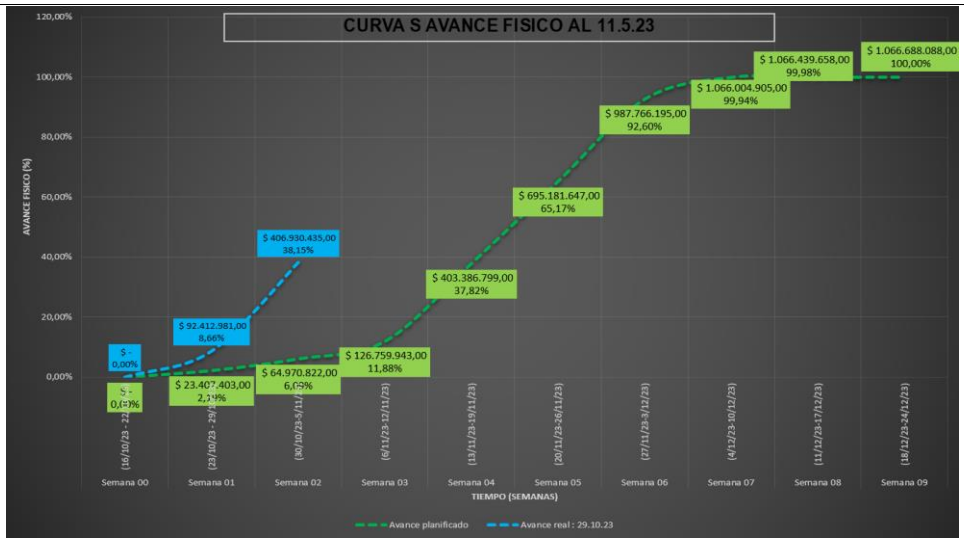

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se está revisando el presupuesto y las condiciones de la obra para determinar las mayores o menores cantidades y los items no previstos que se deben ejecutar

6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA

1. Localización:
La figura 1 presenta la localización del Área de Prestación de Servicio – APS del sistema de Acueducto de la vereda La Leonera - Corregimiento Felidia, objeto de intervención con la actividad: "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA, ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI".
La zona de intervención se localiza en el Corregimiento de La Leonera, en las veredas Leonera Cabecera, El Pajui y La Cajita, ubicadas al nor-occidente del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus coordenadas planas aproximadas en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS CALI son: N873372, E1049592 y sus correspondientes coordenadas geográficas 3°27´3.54764" N, 76°37´52.71929" W.

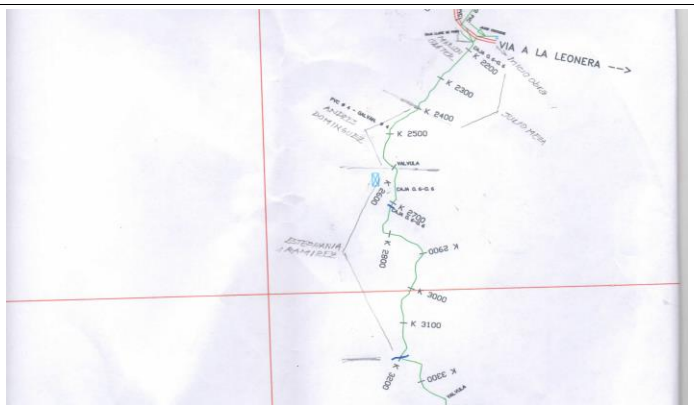


Figura 1. Localización general Cali – La Leonera

2. Levantamiento Censo de suscriptores:

De acuerdo con la información suministrada por la Señora Emilse Barco, directora del Acueducto de La Leonera se generó un nuevo listado y se está revisando y actualizando el listado de suscriptores, son 350 de acuerdo con el presupuesto.

3. Avance de obras:
El señor Andrés Dominguez no había dado el permiso correspondiente, razón por la cual se realizó una reunión en dicho predio con representantes de La UAESP, el contratista, La interventoría y la Directora del Acueducto La Leonera, ya se dió el permiso por parte del propietario y se realizaron las labores de excavación para la reposición de tubería PVC de 4" RDE 13,5 en ese predio. También se continuó con las labores de excavación, instalación de collarines con su registro de incorporación y la manguera PF+UAD D=1/2" en 100 domiciliarias para un total de 250 domiciliarias.



4. Revisión de planos, presupuestos y cantidades
Seguimos en el proceso de revisión de planos, presupuestos y cantidades para hacer los ajustes respectivos.

AVANCE

Se puede realizar una valoración en porcentaje de avance de las actividades ejecutadas donde se observa un avance del **38,15% en las actividades.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
INTERVENTOR
