CSPICHINDÉ - 510 - 004 – 2023

Santiago de Cali, 19 de diciembre de 2023

Señores
JAIME DUQUE INGENIERIA
Ing. Jaime Eduardo Duque Gutiérrez
Interventor
Calle 42N # 7-71 Casa 2D
Santiago de Cali

Referencia: **"CONTRATO No. 4182.010.26.1.510-2023" "REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LOMAS DE LA CAJITA, EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ".**

Asunto: **Solicitud de Suspensión**

Cordial saludo.

Por medio del presente, el **CONSORCIO PICHINDÉ**, con NIT 901739292-5, manifiesta que, debido a las condiciones climáticas adversas presentadas en los últimos meses del 2023, no podrá terminar al 100% las actividades del contrato en referencia, razón por la cual solicita la suspensión del contrato por 30 días, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Los episodios de lluvias torrenciales que han venido afectando la zona montañosa del distrito, donde se encuentra ubicado el corregimiento de Pichindé, han afectado directamente la actividad de excavación, rellenos y compactación de los mismos, debido a que dichas actividades no se pueden realizar en condiciones de saturación del terreno, imposibilitando las excavaciones y el uso del material excavado para realizar los rellenos y su posterior compactación.
2. El proyecto se encuentra ubicado en zona de ladera de los parques nacionales, la intensidad y duración de los episodios de lluvias son mayores a los de la zona plana.
3. Difícil acceso a la zona de trabajo, donde la vía presenta pendientes superiores al 30% lo que dificulta el movimiento del personal, materiales y equipos requeridos para la ejecución de una de las actividades del proyecto.
4. Durante los meses de octubre y noviembre del 2023 se presentaron precipitaciones por encima del promedio histórico, lo cual afectó de manera significativa el avance de las obras.

Para precisar lo expuesto, es necesario mencionar que según el reporte hidro climatológico del mes de octubre de 2023 publicado en el portal de la CVC, se reportan registros de lluvias por encima del promedio histórico del 19% y mencionan lo siguiente: "Durante todo el mes de octubre, las precipitaciones

en el departamento estuvieron por encima de los promedios históricos. La cantidad acumulada de lluvia promedio 228mm en toda la región, en comparación con el promedio climatológico histórico para octubre, que es de 179mm. Esto indica que la región experimentó un exceso de lluvias en comparación con el promedio histórico para el Valle del Cauca, a pesar de la influencia del fenómeno del niño".

Estos reportes coinciden con las predicciones realizadas por el IDEAM para el mes de octubre, en el cual pronosticaron lo siguiente: "en el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría por encima de lo normal."

A continuación, se anexa Tabla No 1 Información Red de Monitoreo de la CVC en la cual se observa que los registros de la Estación PICHINDE del mismo corregimiento, y en la cual se puede observar que la precipitación acumulada en octubre de 2023 fue de 228 mm, este registro comparado con el promedio histórico para el mes de octubre el cual está por los 179 mm, presento un incremento de 49 mm.

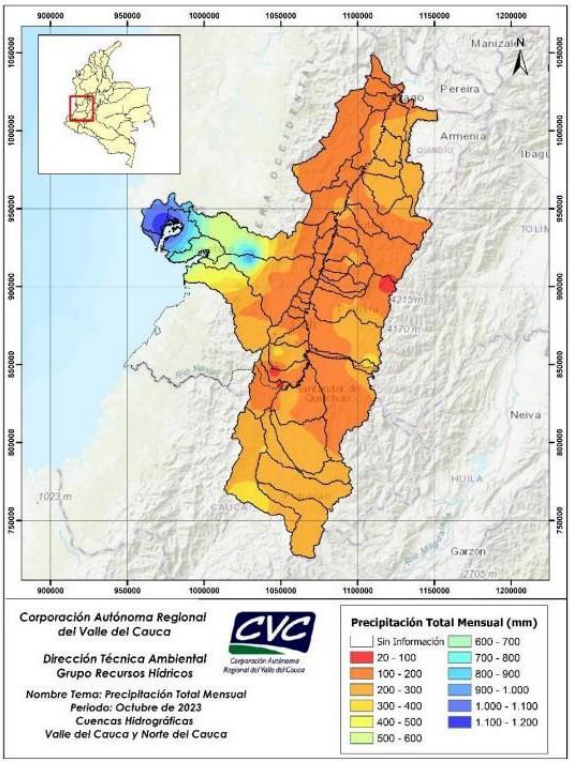


Imagen 1. Precipitación mensual acumulada– octubre 2023.(CVC)

Estación	Precipitación acumulada octubre (mm)	Climatología histórica octubre (mm)	Porcentaje acumulado de precipitación (%)
LOS CHORROS	151	49	307
PUERTO MALLARINO	149	61	244
PUENTE SALINAS	128	71	180
LA SORPRESA	223	125	178
DAGUA-BENDICIONES	932	529	176
EL PLACER	184	105	175
ATUNCELA	181	105	172
GUAICONDO	206	123	167
PUERTA DAGUA	198	119	166
PANCE - CHORRERA	287	174	165
NAPOLES	229	144	159
PALO - PUERTO TEJADA	128	84	152
EL VERGEL	181	121	150
LOS TAMBOS	277	190	146
CAÑAVERALEJO-EDIFICIO	218	153	143
RIOFRIO	248	175	142
NAVARRO	180	130	138
LILI - SAN SEBASTIAN	267	198	135
LOS CEIBOS	210	156	135
OCACHE	200	155	129
MIRAVALLES	251	197	127
CHAMBU	265	208	127
PICHINDE	228	179	127
LA BALSA	308	245	126
ACAA PAVAS	152	121	126
LOS ALPES	334	267	125
CAÑAVERALEJO PG	197	159	124
FELIDIA	186	151	123
EL TAMBO	337	274	123
COLEGIO SAN JUAN BOSC	166	135	123
LA TERESITA	239	202	118
LA FONDA CANTA CLARO	254	216	117
HERACLIO URIBE	285	244	117
LOS MINCHOS	205	176	116
PLANTA RIO CAUCA	136	117	116
EL TOPACIO	384	333	115
EL COMINAL	210	183	115
PAN DE AZUCAR	331	289	115
PLANTA RIO CALI	158	139	113
SAN BERNARDO	192	171	112
TENERIFE	150	139	108
EL CARMELO	236	223	106
PUENTE PIEDRA	155	148	105
PESCADOR - LA TESALIA	158	153	103
ANACARO	166	161	103
LA INDUSTRIA	170	166	102
EL PORVENIR - PESCADO	151	152	99

Tabla. 1 Información por estación de la red de monitoreo. Fuente GRH.

Motiva la solicitud, lo anteriormente expuesto, además, las fuertes lluvias presentadas en el corregimiento Pichindé que han generado atrasos en el avance normal de la obra, en las actividades como las excavaciones, rellenos compactados, se han visto muy afectadas por las condiciones climáticas, además de esto, tenemos una placa huella en concreto con unas pendientes superiores al 30%, lo que dificulta y hace imposible el transporte de materiales y/o equipos en obra.

Como soporte a esta solicitud, se adjunta el **REPORTE HIDROCLIMATOLOGICO – OCTUBRE 2023** de la CVC, y el **BOLETIN PREDICCIÓN CLIMATICA – NOVIEMBRE 2023.**

Cordialmente.

Ing. Diego Mauricio Estrada Chávez
R.L. Consorcio Pichindé
