Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CORTE MENSUAL Nº 01

CONTRATISTA

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

ADECUACIONES CUARTO DE RESIDUOS EDIFICIO CALLE 72

CONTRATO Nº 173 DE 2019

LISTA DE CHEQUEO PARA RECEPCION DE CUENTAS

CORTE Nº 01

ADECUACIÓN CUARTO DE RESIDUOS ED. CALLE 72

CORTES CONTRATO CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Nº 173 de 2019

1. **Factura de Venta** que debe contener los requisitos mínimos legales exigidos por la DIAN., por separado para la obra civil y la dotación o mobiliario	X
- Nombres y Apellidos o Razón Social del contratista	X
- Número del Nit	X
-	X
- Denominación del Documento como Factura de Venta	X
- Número de Factura	X
- Resolución de Autorización de la DIAN para emitir la factura (no anterior a dos años, debe contener el rango que incluya el número de la factura)	X
- Fecha de emisión de la factura	X
- Integrantes del Consorcio o Unión temporal identificando el nombre o Razón social, NIT y el porcentaje de participación	
- Detalle o Descripción del cobro indicando el Número del contrato, corte de obra o de mobiliario, base de liquidación y porcentaje de interventoría, etc.	X
- Detalle de los valores facturados (Discriminar el A.I.U. y el Iva y la amortización del anticipo o pago anticipado)	
2. Cumplido Técnico expedido por el supervisor del Contrato. Para los contratos firmados con posterioridad al 01 de agosto de 2014, se debe adjuntar tambien el formato definido en el anexo Nro. 4, de la resolución 4132, del 31 de julio de 20	X
3. Certificación de Pago al día de aportes de seguridad social y parafiscales, indicando que la base de cotización para seguridad efectivamente aportada corresponde con la propuesta económica del contrato, debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público Titulado ó Revisor Fiscal del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes, adjuntar copia de la tarjeta profesional de los contadores que firman la certificación, así como el certificado de vigencia de la misma.	X
4. Balance Financiero del Contrato, donde se refleje el valor ejecutado por Corte de Obra, el descuento efectuado por concepto del Pago Anticipado, el saldo por ejecutar y el valor a pagar, documento suscrito por el Representante legal o el Residente del consorcio o union temporal contratista y avalado por Supervisor del Contrato	X
5. Acta de Corte de Obra, suscrita por el Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal contratista y aprobada por el Supervisor del Contrato	X
6. Acta de Corte de Obra Mensual , suscrita por el Representante legal o El Residente de la obra (Contratista) y aprobada por el Supervisor del contrato	X
7. Los demás requisitos que se establecan la cláusula forma de pago del contrato principal y/o sus modificaciones	

CUMPLIDO CONTRATO CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 173 DE 2019
CONTRATO DE OBRA

CORTE DE OBRA Nº 01

El suscrito Arquitecto Juan Carlos Alvarez Orjuela, Técnico de la División de Estudios y Diseños de la Unidad de Infraestructura Física en apoyo a la Unidad Administrativa, como supervisor del contrato N°173 de 2019

Hace constar que la firma INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S, identificado con Nit. Nº 900.960.149-1, ha cumplido con los compromisos y responsabilidades contemplados en el contrato Carta de Aceptación de la oferta No. 173 del 2019 suscrito con La Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto es "*Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.*", teniendo como base las actividades plasmadas según Acta Mensual de corte de obra N° 1, el cual se anexa a la presente. Este Corte de obra corresponde al periodo entre el 06 de diciembre y el 17 de diciembre de 2019.

El presente cumplido se expide a los 17 días del mes de diciembre de 2019, como soporte de la primera (1) acta parcial del contrato anteriormente mencionado. Se anexa factura Nº 118 por valor a pagar neto de $41'005.181,62 incluido todos los impuestos de ley, por componente de obra civil.

Es importante resaltar que el presente corte incluye actividades netamente del componente de OBRA CIVIL.

La presente certificación se emite por parte de la entidad al contratista de obra, teniendo en cuenta que este proyecto no posee Interventoría externa.

JUAN CARLOS ALVAREZ O.
Técnico - División de Diseño
Unidad de Infraestructura Física en apoyo a la Unidad Administrativa
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Supervisor del Contrato

FACTURA DE VENTA

No. 118

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
NIT:900.960.149-1 Régimen Común
No somos grandes contribuyentes

Abstenerse de aplicar retención en la fuente
nos acogemos a los beneficios
Numeral 1 Art.7 ley de la ley 1429/2010

Cra. 32#8-76 Sur Bogotá Colombia
Tels: 3583967 - 3183696612
www.intecpys.com - intecpys@gmail.com

Resolución Dian No. 18762009133489
Fecha: 2018/07/11
Actividad Económica No. 3314/4321/4330
Numeración Autorizada
del 89 al 2000

CLIENTE : NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
NIT / C.C. : 800.093.816-3
DIRECCIÓN Calle 72 No. 7-96

FECHA FACTURA: 13 de Diciembre de 2019
CIUDAD : Bogota D.C
FORMA DE PAGO: Pagos parciales

CONCEPTO: Aceptacion de la oferta No. 173 de 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	De acuerdo a cantidades ejecutadas, revisadas y aprobadas en el Acta Corte mensual No.1 Adjunto a la presente Factura	UND	1	32.556.714,27	32.556.714,27
				Administracion 17%	5.534.641,43
				Imprevistos 3%	976.701,43
				Utilidad 5%	1.627.835,71
				Iva 19%	309.288,79
				VALOR TOTAL	41.005.181,62

Son: Cuarenta y un millones cinco mil ciento ochenta y un pesos con sesenta y dos centavos

Observaciones: Hacer caso omiso a los beneficios del Numeral 1 Art. 7 de la ley 1429/201

SUBTOTAL	
RTE. FUENTE	
I.V.A	
RTE. ICA	
TOTAL	

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Nit. 900.960.149-1

RECIBÍ DE CONFORMIDAD
Nombre y Cédula

La presente factura de Venta constituye Título Valor en los términos de la ley 1231 de 2008.Esta factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, conforme con el artículo 774 del Código de Comercio. La mora en la cancelación de la facturas le ocasionara un interés monetario a tasa de interés vigente.

Diegral Publicidad Nit: 79.535.544-2 Tel: 311 230 94 38

INTEC
PROYECTOS Y SERVICIOS

CERTIFICACIONES PARAFISCALES

Yo Juan Manuel Novoa Tobón , en calidad de Representante Legal de la sociedad Intec Proyectos y Servicios S.A.S, con NIT: 900.960.149, identificado con cédula de ciudadanía No.1.032.493.382 de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Juan Manuel Novoa Tobón
Representante Legal
Intec Proyectos y Servicios S.A.S
NIT: 900.960.149-1

Fecha: Se expide a los 13 días del mes Diciembre de 2019

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptacio 173 del 07 de noviembre de 2019
OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 01 | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 13/12/2019**

CONTRATISTA	: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	**VR.INICIAL OBRA**	: $ 59.909.624,00	**LOCALIZACIÓN**	: BOGOTÁ D.C.
		VR. ADICIONAL No.	: $ 0,00		
		VR. ADICIONAL No.	: $ 0,00	**FECHA INICIACIÓN**	: 06/12/2019
NIT	: 900.960.149-1	**VR. TOTAL**	: $ 59.909.624,00	**PLAZO INICIAL**	: 9 días
DIRECCIÓN	: Cra 32 No. 8-76 Sur			**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	: 16 días
TELÉFONO	: 5713015899	**PAGO ANTICIPADO 30%**	: $ 0,00	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
INTERVENTOR	: N/A	**LEGALIZADO ACTA No.1**	: $ 0,00	**PLAZO TOTAL**	: 25 días
		LEGALIZADO ACTA No.2	: $ 0,00	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
NIT	:	**SALDO POR LEGALIZAR**	: $ 0,00	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
DIRECCIÓN	:				:
TELÉFONO	:			**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL**	: 31/12/2019

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
1.1.1	Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m incluye trasiego y disposición provisional en sitio designado dentro del edificio.	ML	20,00	$ 7.469,00	$ 149.380,00
1.1.2	Desmonte de lámparas de sobreponer.	UN	12,00	$ 4.200,00	$ 50.400,00
1.1.3	Desmonte de ventanería metálica.	UN	5,00	$ 5.419,00	$ 27.095,00
1.1.4	Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y met. (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).	ML	50,00	$ 1.599,00	$ 79.950,00
1.1.5	Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble.	M2	31,06	$ 14.200,00	$ 441.108,80
1.1.6	Demolición muros en mampostería e=0.15 (incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).	M2	11,00	$ 9.391,00	$ 103.301,00
1.1.7	Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).	ML	25,00	$ 6.821,00	$ 170.525,00
1.2.1	Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.	M2	76,82	$ 22.500,00	$ 1.728.360,00
1.2.2	Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega.	ML	15,00	$ 24.839,00	$ 372.585,00
1.2.3	Suministro e instalación de muro en Drywall e= 0,12 mt, Doble cara, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza), perfilería galvanizada. Pintura 3 manos tipo 1.	M2	5,00	$ 49.373,00	$ 246.865,00
1.2.4	Suministro e instalación de muro y dintel en Drywall Una Cara, incluye Pintura 2 manos, tipo 1.	ML	5,00	$ 38.000,00	$ 190.000,00
1.3.3	Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.	M2	153,63	$ 8.256,00	$ 1.268.385,79
1.3.4	Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm.	ML	15,00	$ 6.206,00	$ 93.090,00
1.3.5	Filos y dilataciones en pañetes.	ML	25,00	$ 1.901,00	$ 47.525,00
1.4.1	Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.	M2	370,63	$ 4.232,00	$ 1.568.514,82
1.4.5	Filos y dilataciones en estuco.	ML	195,00	$ 2.041,00	$ 397.995,00
1.4.2	Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes.	M2	522,99	$ 7.800,00	$ 4.079.290,80
1.4.3	Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos.	ML	55,00	$ 2.924,00	$ 160.820,00
1.4.8	Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.	ML	45,00	$ 12.263,00	$ 551.835,00
1.4.4	Resane de Placa, Techo y Muros.	M2	155,00	$ 9.838,00	$ 1.524.890,00
1.4.9	Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Micro esferas).	M2	185,98	$ 28.476,00	$ 5.295.852,58
1.4.10	Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. línea 0.12m y 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril).	ML	178,4	$ 2.445,00	$ 436.188,00
1.4.11	Demarcación metros cuadrado en pintura tipo trafico base solvente color azul 16 mils para primera capa. (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas).	M2	39	$ 26.230,00	$ 1.022.970,00
1.5.1	Suministro e instalación de placa de contrapiso E=0.125m.	M2	2	$ 52.092,00	$ 104.184,00
1.5.2	Suministro y aplicación de alistado de piso con mortero impermeabilizado. Espesor entre 2 y 4cm en zonas húmedas.	M2	166	$ 16.531,00	$ 2.744.146,00
1.5.3	Suministro e instalación de Poceta de aseo en mampostería, enchapada en cerámica.	UN	1	$ 210.617,00	$ 210.617,00
1.5.4	Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito.	M2	206	$ 13.318,00	$ 2.743.508,00
1.5.5	Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3.	ML	48	$ 14.172,00	$ 680.256,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	13,27	$ 99.113,63
	8,00	$ 33.600,00
	0,00	$ 0,00
	40,00	$ 63.960,00
	31,06	$ 441.108,80
	-5,96	$ 55.970,36
	8,90	$ 60.706,90
	11,66	$ 262.455,75
	11,13	$ 276.458,07
	5,00	$ 246.865,00
	5,00	$ 190.000,00
	15,26	$ 125.984,91
	-8,95	$ 55.543,70
	-40,34	$ 76.686,34
	201,94	$ 854.593,15
	129,66	$ 264.636,06
	222,99	$ 1.739.290,80
	55,00	$ 160.820,00
	45,00	$ 551.835,00
	45,00	$ 442.710,00
	15,98	$ 454.932,58
	178,40	$ 436.188,00
	39,00	$ 1.022.970,00
	2,00	$ 104.184,00
	166,00	$ 2.744.146,00
	1,00	$ 210.617,00
	206,00	$ 2.743.508,00
	48,00	$ 680.256,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
6,73	$ 50.266,37	0,00	$ 0,00	6,73	$ 50.266,37
4,00	$ 16.800,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 16.800,00
5,00	$ 27.095,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 27.095,00
10,00	$ 15.990,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 15.990,00
0,00	$ 0,00				
16,96	$ 159.271,36				
16,10	$ 109.816,10				
65,15	$ 1.465.904,25				
3,87	$ 98.126,93				
0,00	$ 0,00				
0,00	$ 0,00				
138,37	$ 1.142.400,88				
23,95	$ 148.633,70				
65,34	$ 124.211,34				
168,70	$ 713.921,47				
65,34	$ 133.358,94				
300,00	$ 2.340.000,00				
0,00	$ 0,00				
0,00	$ 0,00				
110,00	$ 1.082.180,00				
170,00	$ 4.840.920,00				
0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
0,00	$ 0,00				
0,00	$ 0,00				
0,00	$ 0,00				
0,00	$ 0,00				

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptacio 173 del 07 de noviembre de 2019
OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 01 | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 13/12/2019**

CONTRATISTA	: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	**VR.INICIAL OBRA**	: $ 59.909.624,00	**LOCALIZACIÓN**	: BOGOTÁ D.C.
		VR. ADICIONAL No.	: $ 0,00		
NIT	: 900.960.149-1	**VR. ADICIONAL No.**	: $ 0,00	**FECHA INICIACIÓN**	: 06/12/2019
DIRECCIÓN	: Cra 32 No. 8-76 Sur	**VR. TOTAL**	: $ 59.909.624,00	**PLAZO INICIAL**	: 9 días
TELÉFONO	: 5713015899			**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	: 16 días
INTERVENTOR	: N/A	**PAGO ANTICIPADO 30%**	: $ 0,00	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
		LEGALIZADO ACTA No.1	: $ 0,00	**PLAZO TOTAL**	: 25 días
NIT	:	**LEGALIZADO ACTA No.2**	: $ 0,00	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
DIRECCIÓN	:	**SALDO POR LEGALIZAR**	: $ 0,00	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
TELÉFONO	:				:
				FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 31/12/2019

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
1.6.3	Suministro e instalación de puerta metálica cal 18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad.	UN	2	$ 510.000,00	$ 1.020.000,00	0,00	$ 0,00		2,00	$ 1.020.000,00				
1.6.1	Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5 2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (incluye puerta con pasador y manija).	M2	25,744	$ 202.145,00	$ 5.204.020,88	7,57	$ 1.531.046,23		18,17	$ 3.672.974,65				
1.6.4	Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.	UN	2	$ 226.283,00	$ 452.566,00	-2,00	$ 452.566,00		4,00	$ 905.132,00				
1.6.2	Suministro e Instalación de Ventana corrediza en aluminio, con vidrio 6mm templado (incluye todos los elementos de fijación).	M2	1,175	$ 277.518,00	$ 326.083,65	1,18	$ 326.083,65		0,00	$ 0,00				
1.7.1	Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2".	ML	35	$ 14.393,00	$ 503.755,00	35,00	$ 503.755,00		0,00	$ 0,00				
1.7.2	Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=2".	UN	35	$ 9.025,00	$ 315.875,00	35,00	$ 315.875,00		0,00	$ 0,00				
1.7.3	Suministro e instalación de Puntos hidráulicos poceta aseo.	UN	2,00	$ 26.087,00	$ 52.174,00	2,00	$ 52.174,00		0,00	$ 0,00				
1.7.4	Suministro e instalación de tapa registro de 20*20 cms ubicadas en válvulas de registro tipo cortina.	UN	2,00	$ 25.186,00	$ 50.372,00	2,00	$ 50.372,00		0,00	$ 0,00				
1.7.5	Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", suministro e instalación.	UN	2,00	$ 29.423,00	$ 58.846,00	2,00	$ 58.846,00		0,00	$ 0,00				
1.7.6	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 2".	ML	36,00	$ 14.716	$ 529.776,00	36,00	$ 529.776,00		0,00	$ 0,00				
1.7.7	Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo.	UN	2,00	$ 33.366	$ 66.732,00	2,00	$ 66.732,00		0,00	$ 0,00				
1.7.8	Suministro e instalación de salida sifón, suministro e instalación.	UN	2,00	$ 34.241,00	$ 68.482,00	2,00	$ 68.482,00		0,00	$ 0,00				
1.7.9	Suministro e instalación de rejilla 5" x 3" con sosco.	UN	2,00	$ 20.516,00	$ 41.032,00	2,00	$ 41.032,00		0,00	$ 0,00				
1.8.1	Suministro e instalación de acometida en 3X8 F + 1x8 N + 1x10T desde tablero Eléctrico de distribución de piso a tableros control NORMAL, REGULADO E ILUMINACIÓN en piso. Incluye bornas.	ML	19,00	$ 24.247,00	$ 460.693,00	19,00	$ 460.693,00		0,00	$ 0,00				
1.8.3	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2".	UN	6,00	$ 51.882,00	$ 311.292,00	6,00	$ 311.292,00		0,00	$ 0,00				
1.8.2	Suministro e instalación de salida interruptor conmutable doble.	UN	8,00	$ 34.004,00	$ 272.032,00	8,00	$ 272.032,00		0,00	$ 0,00				
1.8.4	Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores (uña y auto desforre).	UN	1,00	$ 63.176,00	$ 63.176,00	1,00	$ 63.176,00		0,00	$ 0,00				
1.8.5	Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de Halógeno, toma tipo normal con polo a tierra certificada, identificación y conectores (uña y auto desforre) entre 3 y 5 metros.	UN	6,00	$ 60.619,00	$ 363.714,00	6,00	$ 363.714,00		0,00	$ 0,00				
1.8.6	Suministro e instalación de salida para luminaria de techo alambre homologado libre de halógeno calibre 12 (panel led 60x60 o similar). Incluye toma corriente. No incluye tubería en EMT.	UN	15,00	$ 63.176,00	$ 947.640,00	15,00	$ 947.640,00		0,00	$ 0,00				
1.8.7	Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.	UN	15,00	$ 87.000,00	$ 1.305.000,00	15,00	$ 1.305.000,00		0,00	$ 0,00				
1.8.8	Suministro e instalación de interruptor doble tipo Luminex, certificado, incluye caja, cable y accesorios.	UN	8,00	$ 33.050,00	$ 264.400,00	8,00	$ 264.400,00		0,00	$ 0,00				
1.8.9	Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC.	ML	130,00	$ 2.066,00	$ 268.580,00	130,00	$ 268.580,00		0,00	$ 0,00				
1.8.10	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje.	ML	45,00	$ 12.610,00	$ 567.450,00	45,00	$ 567.450,00		0,00	$ 0,00				
1.8.11	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp.	UN	8,00	$ 37.476,00	$ 299.808,00	8,00	$ 299.808,00		0,00	$ 0,00				
1.8.12	Suministro e instalación de Tablero circuitos Normales y alumbrado 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos.	UN	2,00	$ 263.951,00	$ 527.902,00	2,00	$ 527.902,00		0,00	$ 0,00				
1.8.13	Reinstalación lámparas.	UN	8,00	$ 30.098,00	$ 240.784,00	8,00	$ 240.784,00		0,00	$ 0,00				
1.9.1	Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor.	M2	235,00	$ 900,00	$ 211.500,00	235,00	$ 211.500,00		0,00	$ 0,00				
1.9.2	suministro e instalación de membrana en PVC para Impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable	M2		$ 133.374,94	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00				
1.9.3	Sellamiento de poros con SIKA top seal 107 mejor o similar para impermeabilización tanque de agua potable	M2		$ 33.392,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.9.4	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (60 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental	M3	27,97	$ 18.373,00	$ 513.822,99	13,97	$ 256.600,99		14,00	$ 257.222,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 257.222,00
						0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N.P. 1.1	Suministro e instalación de placa de contrapiso esmaltada.	M2	0	$ 58.820,20	$ 0,00	-242,00	$ 14.234.487,27		242,00	$ 14.234.487,27	0,00	$ 0,00	242,00	$ 14.234.487,27
						0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019
OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 01 | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 13/12/2019**

CONTRATISTA	:	**INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S**
NIT	:	**900.960.149-1**
DIRECCIÓN	:	**Cra 32 No. 8-76 Sur**
TELÉFONO	:	**5713015899**
INTERVENTOR	:	**N/A**
NIT	:	
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 59.909.624,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 59.909.624,00**
PAGO ANTICIPADO 30%	:	**$ 0,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 0,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	BOGOTÁ D.C.
FECHA INICIACIÓN	:	06/12/2019
PLAZO INICIAL	:	9 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	16 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	25 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	31/12/2019

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRA EJECUTADA		
			0,00 $ 0,00		$ 0,00	0,00 $ 0,00	0,00 $ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		**$ 41.797.146,11**		**$ 9.240.431,84**	**$ 32.556.714,27**	**$ 0,00**	**$ 14.601.860,64**
A. I. U.							
ADMINISTRACIÓN	(17%)	$ 7.105.514,84		$ 1.570.873,41	$ 5.534.641,43	$ 0,00	$ 2.482.316,31
IMPREVISTOS	(3%)	$ 1.253.914,38		$ 277.212,96	$ 976.701,43	$ 0,00	$ 438.055,82
UTILIDAD	(5%)	$ 2.089.857,31		$ 462.021,59	$ 1.627.835,71	$ 0,00	$ 730.093,03
IVA	(19%)	$ 397.072,89		$ 87.784,10	$ 309.288,79	$ 0,00	$ 138.717,68
A. TOTAL OBRA CIVIL		**$ 52.643.505,53**		**$ 11.638.323,91**	**$ 41.005.181,62**	**$ 0,00**	**$ 18.391.043,48**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptaci[illegible]173 del 07 de noviembre de 2019
OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 01 | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 13/12/2019**

CONTRATISTA	: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	**VR.INICIAL OBRA**	: $ 59.909.624,00	**LOCALIZACIÓN**	: BOGOTÁ D.C.
		VR. ADICIONAL No.	: $ 0,00		
NIT	: 900.960.149-1	**VR. ADICIONAL No.**	: $ 0,00	**FECHA INICIACIÓN**	: 06/12/2019
DIRECCIÓN	: Cra 32 No. 8-76 Sur	**VR. TOTAL**	: $ 59.909.624,00	**PLAZO INICIAL**	: 9 días
TELÉFONO	: 5713015899			**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	: 16 días
INTERVENTOR	: N/A	**PAGO ANTICIPADO 30%**	: $ 0,00	**ADICIONAL EN PLAZO No. 2**	:
		LEGALIZADO ACTA No.1	: $ 0,00	**PLAZO TOTAL**	: 25 días
NIT	:	**LEGALIZADO ACTA No.2**	: $ 0,00	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	:
DIRECCIÓN	:	**SALDO POR LEGALIZAR**	: $ 0,00	**FECHA REINICIACIÓN No.**	:
TELÉFONO	:				:
				FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 31/12/2019

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	OBRA EJECUTADA

MOBILIARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
2.1	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, La superficie será en madera tipo tablex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	1	$ 510.000,00	$ 510.000,00		1,00	$ 510.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2	ESTANTE FIJO: Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 6 entrepaños con refuerzos inferiores en altura mas piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UN	5	$ 320.000	$ 1.600.000,00		5,00	$ 1.600.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.3	ESCRITORIO RECTO DE 1,50 X 0,80 SIN CAJONERA: La superficie serán en madera tipo tablex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. Los costados se conectaran por medio de vigas metálicas en todo el perímetro de la superficie reforzado por una viga en la mitad, para su estabilidad. Adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro.	UN	2	$ 446.532	$ 893.064,00		2,00	$ 893.064,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.4	Suministro y puesta en sitio de **LOCKER METÁLICO** de 200cm de altura x 120cm de largo x 0,30cm de fondo, Terminación en pintura electroestática con 16 puestos, cada uno llevará manija plásitica, portacandado, celosia de ventilación.	UN	1	$ 810.038	$ 810.038,00		1,00	$ 810.038,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.5	Bicicletero. Soporte metálico para fijar en pared de 25cm x 15cm con numeración en vinilo adhesivo acabado en Pintura electrostática, protector en caucho.	UN	6	$ 52.500	$ 315.000,00		6,00	$ 315.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.6	Suministro e instalación de señal informativa en polietileno y en cinta o vinilo reflectivo foto luminiscente de 12 horas. Tamaño 50cm de altura. Incluye limpieza de área a intervenir. El tiempo de letra se definirá después de adjudicado el contrato.	UN	5	$ 90.640	$ 453.200,00		5,00	$ 453.200,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.7	Suministro e instalación de señal informativa fondo en polietileno azul y letras blancas, frente en reflectivo y textos impresión digital tamaño 35cm de ancho x 25cm de alto con logotipo del Consejo Superior de la Judicatura y según diseño suministrado por esta entidad.	UN	40	$ 38.117	$ 1.524.680,00		40,00	$ 1.524.680,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO					**$ 6.105.982,00**			**$ 6.105.982,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IVA	**(19%)**				$ 1.160.136,58			$ 1.160.136,58		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
B. TOTAL MOBILIARIO					**$ 7.266.118,58**			**$ 7.266.118,58**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019
OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 01 | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 13/12/2019**

CONTRATISTA	:	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	VR.INICIAL OBRA	:	$ 59.909.624,00	LOCALIZACIÓN : BOGOTÁ D.C.
			VR. ADICIONAL No.	:	$ 0,00	
			VR. ADICIONAL No.	:	$ 0,00	FECHA INICIACIÓN : 06/12/2019
NIT		: 900.960.149-1	VR. TOTAL	:	$ 59.909.624,00	PLAZO INICIAL : 9 días
DIRECCIÓN		: Cra 32 No. 8-76 Sur				ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 16 días
TELÉFONO		: 5713015899	PAGO ANTICIPADO 30%	:	$ 0,00	ADICIONAL EN PLAZO No. 2 :
INTERVENTOR	:	N/A	LEGALIZADO ACTA No.1	:	$ 0,00	PLAZO TOTAL : 25 días
			LEGALIZADO ACTA No.2	:	$ 0,00	FECHA SUSPENSIÓN No. :
NIT	:		SALDO POR LEGALIZAR	:	$ 0,00	FECHA REINICIACIÓN No. :
DIRECCIÓN	:					:
TELÉFONO	:					FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 31/12/2019

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	OBRA EJECUTADA		
VALOR TOTAL (A + B)	$ 59.909.624,11	$ 18.904.442,49	$ 41.005.181,62	$ 0,00	$ 18.391.043,48
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO (0%)			$ 0,00		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA			$ 41.005.181,62		

A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA **$ 41.005.181,62** **SON:** Cuarenta y un millones cinco mil ciento ochenta y un pesos con sesenta y dos centavos

Juan Manuel Novoa Tobón
Representante Legal
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
CONTRATISTA

Arq. Juan Carlos Alvarez Orjuela
Unidad de Infraestructura Física
Dirección Ejecutiva de administración Judicial
Supervisor

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de infraestructura Fisica

ACTA PARCIAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**DIRECCION TERRIT**	BOGOTA - CUNDINAMARCA	**ACTA N°**	1	**VALOR ACTA**	**$41.005.181,62**
		PERIODO MES	Diciembre	**FECHA DE ELABORACION**	13	12	2019

CONTRATO DE OBRA N°	173 2019	**PLAZO INICIAL**	9 DIAS	**PLAZO ACUMULADO**	9 DIAS
OBJETO	Realizar las obras civiles para la contrucción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sotano 2 del edificio de la calle 72 No.7-96			**PLAZO DE SUSPENSION**	
CONTRATISTA	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	**FECHA DE INICIACION**	06/12/2019	FECHA DE VENCIMIENTO	
		FECHA PRORROGA Nº1			
		FECHA PRORROGA Nº2			
GESTOR TECNICO DE CONTRATO	Arq Juan Carlos Alvarez Orjuela	**FECHA PRORROGA Nº3**		VALOR ADICION N° 1	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°		**VALOR INICIAL (inculido IVA)**	**$59.909.624**	VALOR TOTAL DE ADICIONES	$ -
INTERVENTORIA		**VALOR TOTAL CTO ACUMULADO**	**$59.909.624**		

VALOR TOTAL BASICO		VALOR ACUMULADO OBRA	**$18.904.442,38**
IVA DEL 16%	$0	VALOR ACTA Nº1	**$41.005.181,62**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**$0**	VALOR PARCAL ACUMULADO	**$59.909.624**
	VERDADERO		

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA	$59.909.624
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$59.909.624

VALOR PARCIAL ACUMULADO DE OBRA	**$59.909.624**
% AVANCE ACUMULADO	68,45%

Juan Manuel Novoa Tovon
Representante Legal
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS
CONTRATISTA

VoBo

Arq. Juan Carlos Alvarez Orjuela
Supervisor
Unidad de Infraestructura Fisica

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial
Unidad de Infraestructura Física

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. Aceptación de la oferta No. 173 de 2019

OBJETO Realizar las obras civiles para la contrucción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sotano 2 del edificio de la calle 72 No. 7-96

CONTRATISTA INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

CONSULTOR INTERVENTORIA

VALOR INICIAL $ 59.909.624,00
ADICIONAL EN VALOR No. 1 $ -
VALOR TOTAL $ 59.909.624,00
FECHA DE INICIACIÓN 06/12/2019
ADICIÓN EN PLAZO No. 1
ADICIÓN EN PLAZO No. 2
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 15/12/2019
PERIODO DEL CORTE 06 de diciembre a 13 de diciembre de 2019

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

CONCEPTO	MES/AÑO	TIPO	VALOR EJECUTADO	DESCUENTO (PAGO ANTICIPADO 30%)	VALOR DEL ACTA Y/O FACTURAS	SALDO POR PAGAR
Acta No.1	dic-19		$41.005.182		$41.005.182	
TOTALES			$41.005.182	$0	$41.005.182	$18.904.442

SALDO POR EJECUTAR	$18.904.442

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	TIPO	FECHA	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
TOTALES			$0	$0	$59.909.624

SALDO POR PAGAR	$59.909.624
VALOR A LIBERAR	$18.904.442

Juan Manuel Novoa Tobon
Representante Legal
Intec Proyectos y Servicios S.A.S
CONTRATISTA

Arq Juan Carlos Alvarez Orjuela
Unidad de infraestructura Física
Dirección Ejecutiva de administración Judicial
Supervisor del Contrato

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM N°:	1.1.1	DESCRIPCION ITEM	CERRAMIENTO EN LONA MAMPOSTERIA VERDE — UND: M2

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

CERRAMIENTO

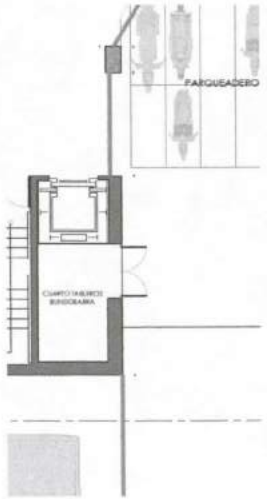

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	3,15	1,00		3,15
	1,00	3,58	1,00		3,58
				SUBTOTAL	6,73
				VIENEN	-
				TOTAL	6,73

OBSERVACIONES:	REVISOR Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR Firma:	Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS	Vo. Bo. INTEC Carlos Gutierrez Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM Nº:	1.1.2	DESCRIPCION ITEM	Desmonte de lámparas de sobreponer.

UND: UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LAMPARAS DESMONTADAS

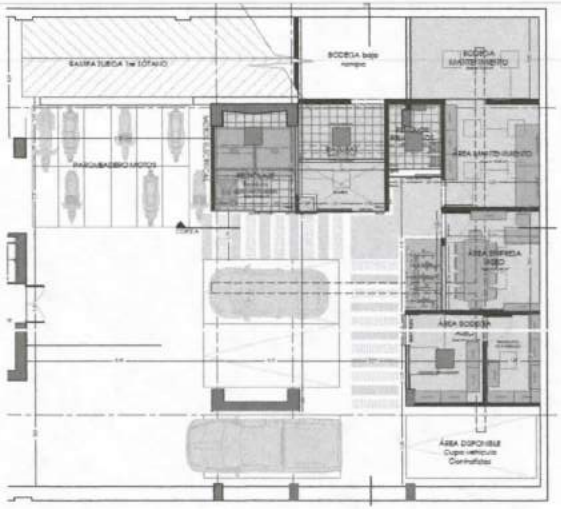

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	1,00	1,00		1,00
	1,00	1,00	1,00		1,00
	1,00	1,00	1,00		1,00
	1,00	1,00	1,00		1,00
			SUBTOTAL		4,00
			VIENEN		-
			TOTAL		4,00

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	**PRELIMINARES**	
ITEM Nº:	1.1.3	**DESCRIPCION ITEM**	Desmonte de ventanería metálica.

UND: UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

VENTANERIA DESMONTADAS

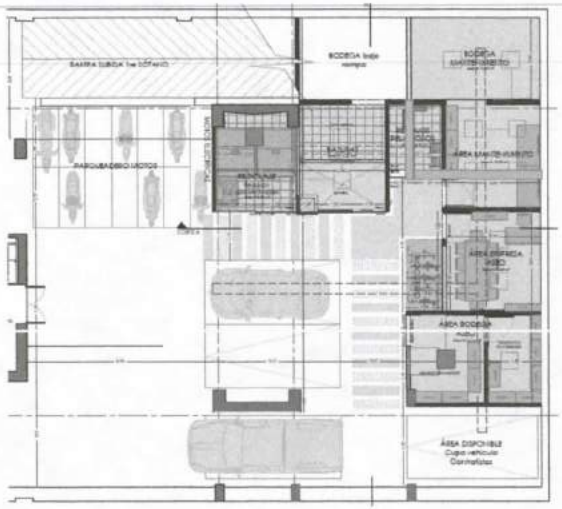

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	1,00	1,00		1,00
	1,00	1,00	1,00		1,00
	1,00	1,00	1,00		1,00
	1,00	1,00	1,00		1,00
	1,00	1,00	1,00		1,00
			SUBTOTAL		5,00
			VIENEN		-
			TOTAL		5,00

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Marlen Gutierrez
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM Nº:	1.1.4	DESCRIPCION ITEM	Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y met.

UND: ML

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA DESMONTADA

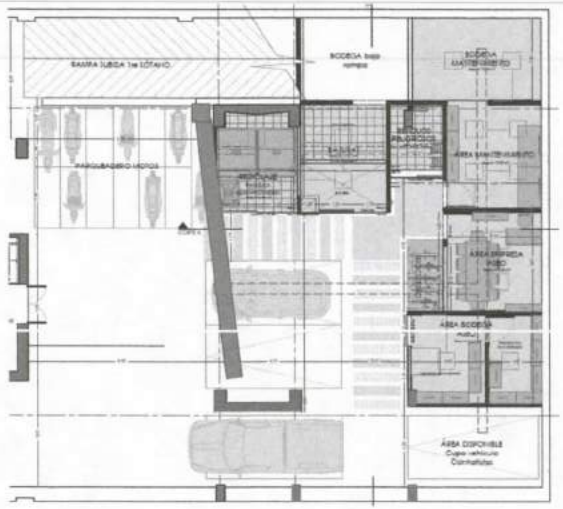

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	10,00	1,00		10,00
				SUBTOTAL	10,00
				VIENEN	-
				TOTAL	10,00

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Marlen Gutierrez
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	**PRELIMINARES**	
ITEM Nº:	1.1.6	**DESCRIPCION ITEM**	Demolición muros en mampostería e=0.15 (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial).

UND: M2

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DEMOLICION

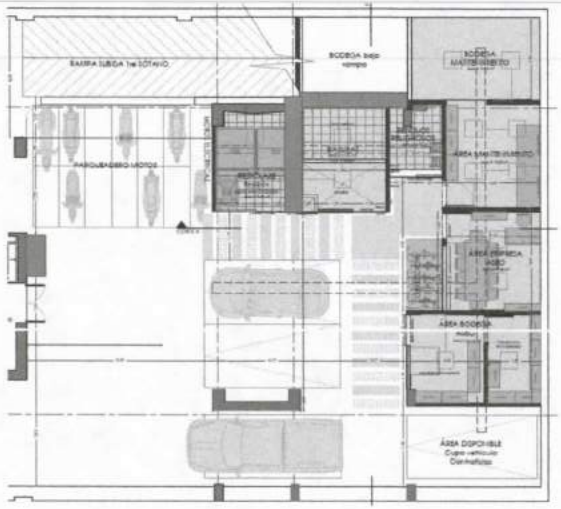

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	3,00	1,36		4,08
	2,00	7,30	0,40		5,84
	2,00	8,80	0,40		7,04
				SUBTOTAL	16,96
				VIENEN	-
				TOTAL	16,96

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Marlen Gutierrez
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM Nº:	1.1.7	DESCRIPCION ITEM	Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial). UND: ML

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

REGATA CON PULIDORA

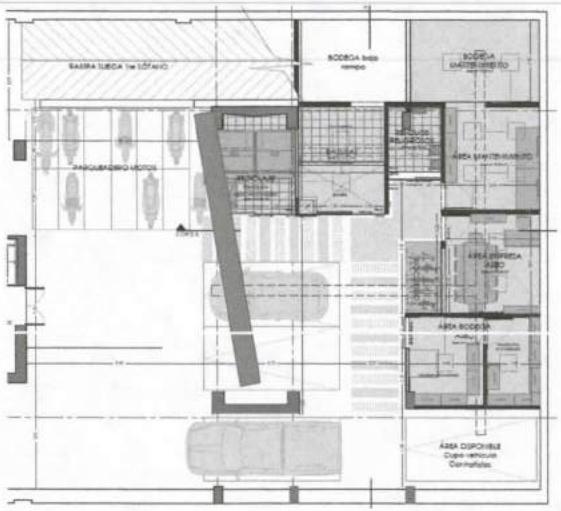

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	7,30	1,00		7,30
	1,00	8,80	1,00		8,80
				SUBTOTAL	16,10
				VIENEN	-
				TOTAL	16,10

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM N°:	1.2.1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega. UND: M2

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

MAMPOSTERIA



DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	2,65	1,80		4,77
	1,00	2,80	1,74		4,87
	1,00	0,79	2,13		1,68
	1,00	1,80	1,16		2,09
	1,00	3,33	2,19		7,29
	1,00	0,88	1,53		1,35
	1,00	1,42	1,70		2,41
	1,00	2,75	2,09		5,75
	1,00	3,23	2,14		6,91
	1,00	2,60	1,75		4,55
	1,00	4,62	2,14		9,89
	1,00	2,03	2,14		4,34
	1,00	4,32	2,14		9,24
			SUBTOTAL		65,15
			VIENEN		-
			TOTAL		65,15

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Marlon Gutierrez
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM Nº:	1.2.2	DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega. UND: M2

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

MAMPOSTERIA

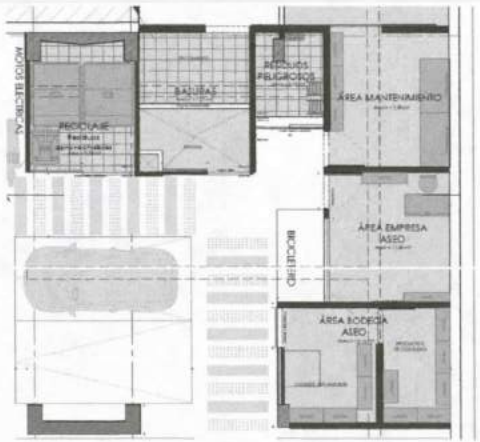



DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	1,74	1,00		1,74
	1,00	2,14	1,00		2,14
				SUBTOTAL	3,88
				VIENEN	-
				TOTAL	3,88

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Marlon Gutierrez
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM Nº:	1.3.3	DESCRIPCION ITEM	Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros.
UND:	M2		

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PANETE EN MUROS

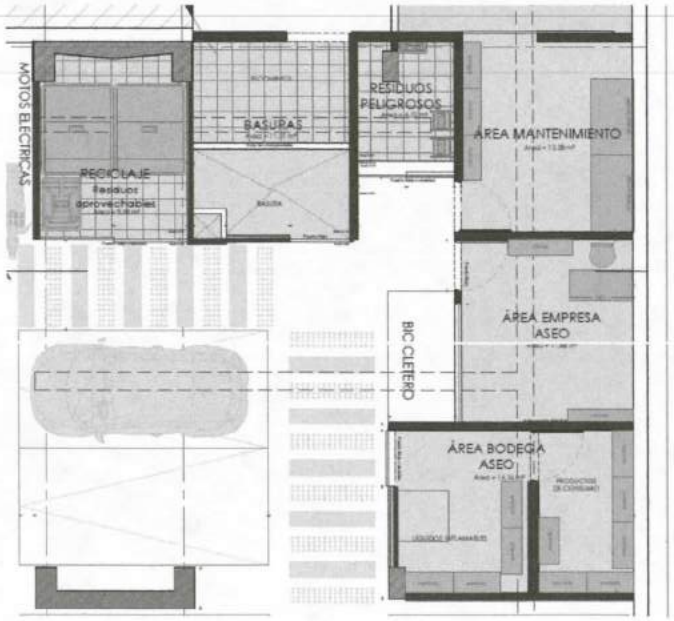

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	2,00	2,65	1,8		9,54
	2,00	2,8	1,74		9,74
	2,00	0,79	2,13		3,37
	2,00	1,8	1,16		4,18
	2,00	3,33	2,19		14,59
	1,00	0,88	1,53		1,35
	2,00	1,42	1,7		4,83
	2,00	2,75	2,09		11,50
	2,00	3,23	2,14		13,82
	2,00	2,6	1,75		9,10
	2,00	4,62	2,14		19,77
	2,00	2,03	2,14		8,69
	2,00	4,32	2,14		18,49
	2,00	2,2	2,14		9,42
			SUBTOTAL		138,37
			VIENEN		-
			TOTAL		138,37

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo.Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo.Bo. INTEC
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	**PRELIMINARES**	
ITEM Nº:	**1.3.4**	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm. — UND: ml

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PANETE EN MUROS

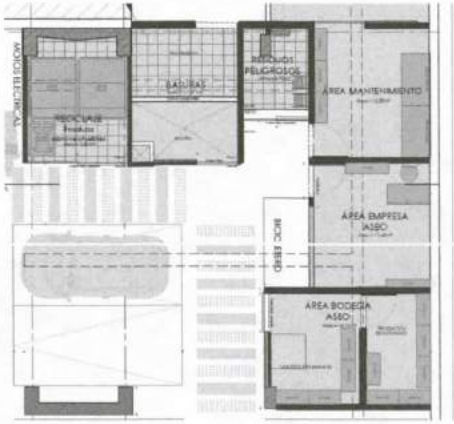

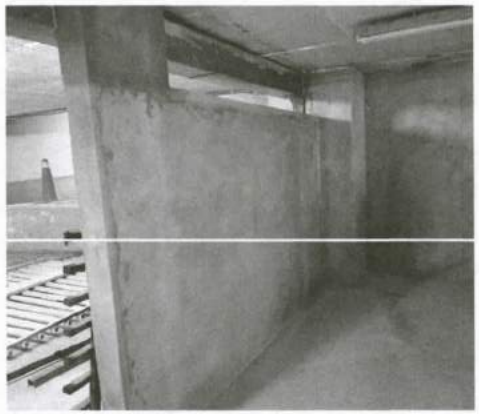

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	2,14	1		2,14
	1,00	2,14	1		2,14
	1,00	2,14	1		2,14
	1,00	2,14	1		2,14
	1,00	1,20	1		1,20
	1,00	2,14	1		2,14
	1,00	2,14	1		2,14
	1,00	2,14	1		2,14
	1,00	2,15	1		2,15
	1,00	2,53	1		2,53
	1,00	0,45	1		0,45
	1,00	2,64	1		2,64
					-
					-
				SUBTOTAL	23,95
				VIENEN	-
				TOTAL	23,95

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Marlon Gutierrez
Firma: DIRECTOR DE OBRA

12

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM Nº:	1.3.5	DESCRIPCION ITEM	Filos y dilataciones en pañetes. UND: ml

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PANETE EN MUROS



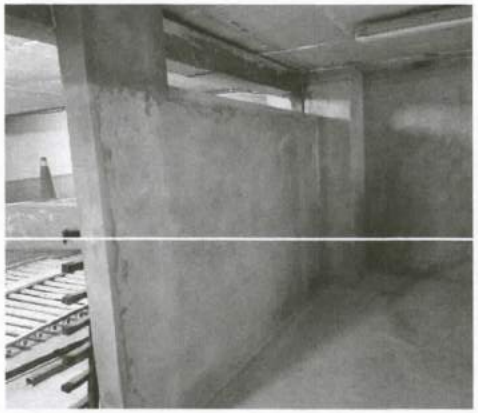

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	2,64	1		2,64
	1,00	2,64	1		2,64
	1,00	47,3	1		47,30
	1,00	2,95	1		2,95
	1,00	2,15	1		2,15
	1,00	2,15	1		2,15
	1,00	2,53	1		2,53
	1,00	2,53	1		2,53
	1,00	0,45	1		0,45
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	65,34
				VIENEN	-
				TOTAL	65,34

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Marlen Gutierrez
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM Nº:	1.4.1	DESCRIPCION ITEM	Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos.
UND:	M2		

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ESTUCO

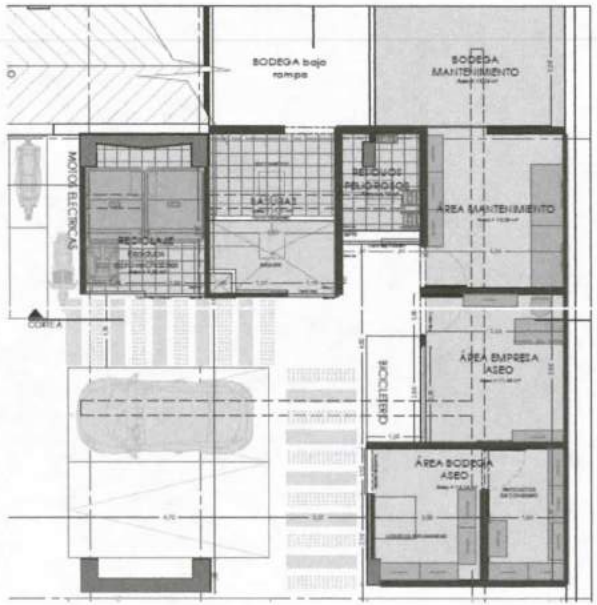

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	2,00	2,65	1,8		9,54
	2,00	2,8	1,74		9,74
	2,00	0,79	2,13		3,37
	2,00	1,8	1,16		4,18
	2,00	3,33	2,19		14,59
	1,00	0,88	1,53		1,35
	2,00	1,42	1,7		4,83
	2,00	2,75	2,09		11,50
	2,00	3,23	2,14		13,82
	2,00	2,6	1,75		9,10
	2,00	4,62	2,14		19,77
	2,00	2,03	2,14		8,69
	2,00	4,32	2,14		18,49
	2,00	2,2	2,14		9,42
	1,00	3,80	2,14		8,13
	1,00	3,15	2,14		6,74
	1,00	3,60	2,14		7,70
	1,00	3,62	2,14		7,75
			SUBTOTAL		168,70
			VIENEN		-
			TOTAL		168,70

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM Nº:	1.4.2	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes. UND: M2

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PINTURA

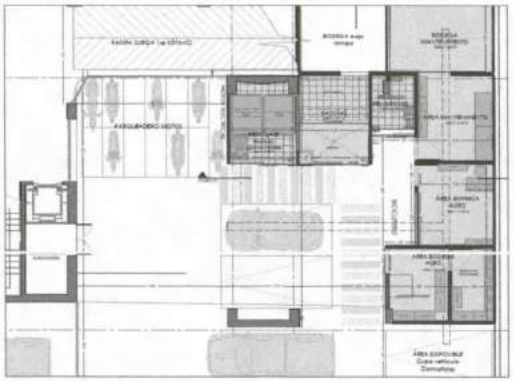

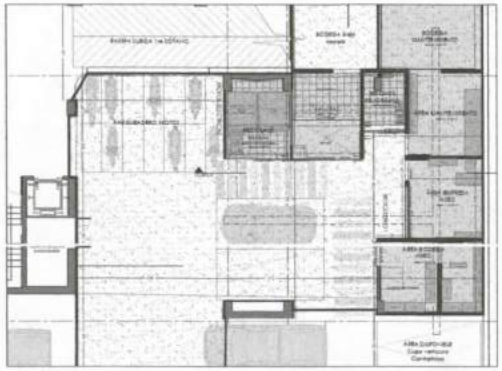

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	2,00	2,65	1,8		9,54
	2,00	2,8	1,74		9,74
	2,00	0,79	2,13		3,37
	2,00	1,8	1,16		4,18
	2,00	3,33	2,19		14,59
	1,00	0,88	1,53		1,35
	2,00	1,42	1,7		4,83
	2,00	2,75	2,09		11,50
	2,00	3,23	2,14		13,82
	2,00	2,6	1,75		9,10
	2,00	4,62	2,14		19,77
	2,00	2,03	2,14		8,69
	2,00	4,32	2,14		18,49
	2,00	2,2	2,14		9,42
	1,00	3,80	2,14		8,13
	1,00	3,15	2,14		6,74
	1,00	3,60	2,14		7,70
	1,00	3,62	2,14		7,75
	1,00	3,00	4,30		12,90
	1,00	3,30	2,00		6,60
	1,00	13,60	6,40		87,04
	1,00	5,00	4,96		24,80
				SUBTOTAL	300,04
				VIENEN	-
				TOTAL	300,04

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Firma: DIRECTOR DE OBRA

24

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM Nº:	1.4.4	DESCRIPCION ITEM	Resane de Placa, Techo y Muros.
UND:	M2		

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

RESANES

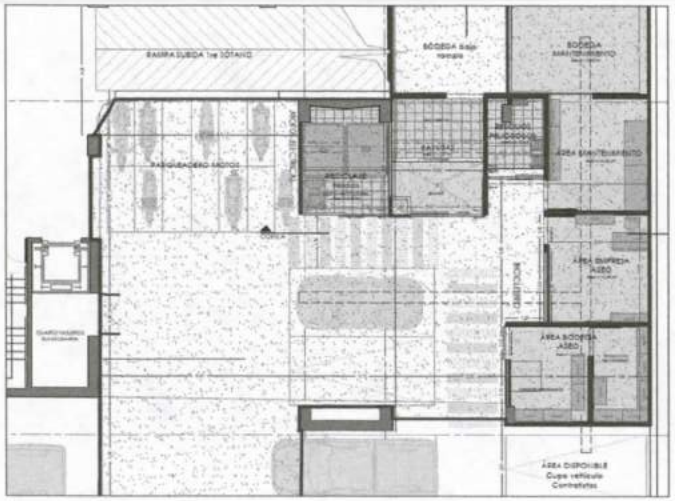

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	2,3	3		6,90
	1,00	3,4	2,2		7,48
	1,00	5,1	10,4		53,04
	1,00	3,1	2,6		8,06
	1,00	3,25	3,6		11,70
	1,00	3,2	1,8		5,76
	1,00	2,1	2,4		5,04
	1,00	1,8	2,7		4,86
	1,00	2,3	1,3		2,99
	1,00	0,4	0,3		0,12
	1,00	0,5	0,7		0,35
	1,00	0,12	0,75		0,09
	1,00	0,5	0,71		0,36
	1,00	0,32	0,6		0,19
	1,00	1,40	1,80		2,52
	1,00	0,30	0,28		0,08
	1,00	0,35	0,56		0,20
	1,00	0,34	0,50		0,17
	1,00	0,18	0,35		0,06
	1,00	0,31	0,12		0,04
				SUBTOTAL	110,01
				VIENEN	-
				TOTAL	110,01

OBSERVACIONES:	REVISOR	Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS	Vo. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS SUPERVISOR Firma:		Marlon Gutierrez Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	**PRELIMINARES**	
ITEM Nº:	**1.4.9**	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable — UND: M2

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PINTURA ACRILICA

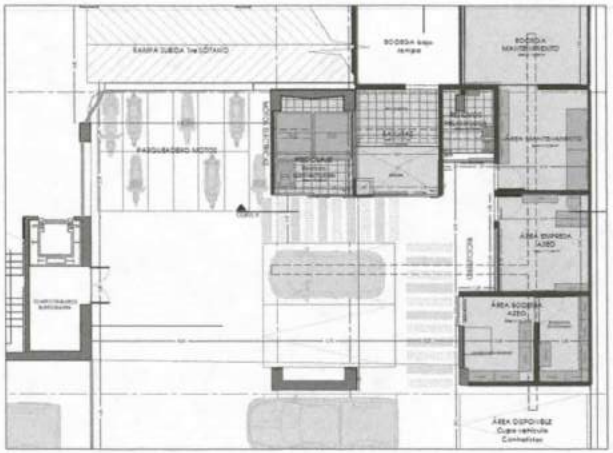

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	2,3	3		6,90
	1,00	3,4	2,2		7,48
	1,00	5,1	10,4		53,04
	1,00	3,1	2,6		8,06
	1,00	3,25	3,6		11,70
	1,00	3,2	1,8		5,76
	1,00	2,1	2,4		5,04
	1,00	1,8	2,7		4,86
	1,00	2,3	1,3		2,99
	1,00	3,7	5		18,50
	1,00	2,4	2,3		5,52
	1,00	5	4,4		22,00
	1,00	2,6	3,6		9,36
	1,00	2,90	1,5		4,35
	1,00	3,00	1,50		4,50
				SUBTOTAL	**170,06**
				VIENEN	-
				TOTAL	**170,06**

OBSERVACIONES:

REVISOR
Firma: ARQ. JUANCARLOS

SUPERVISOR
Firma:

Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS

Vo. Bo. INTEC
Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM N°:	1.6.1	DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5 2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija).	UND:	M2

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

REJA EN MALLA ESLABONADA

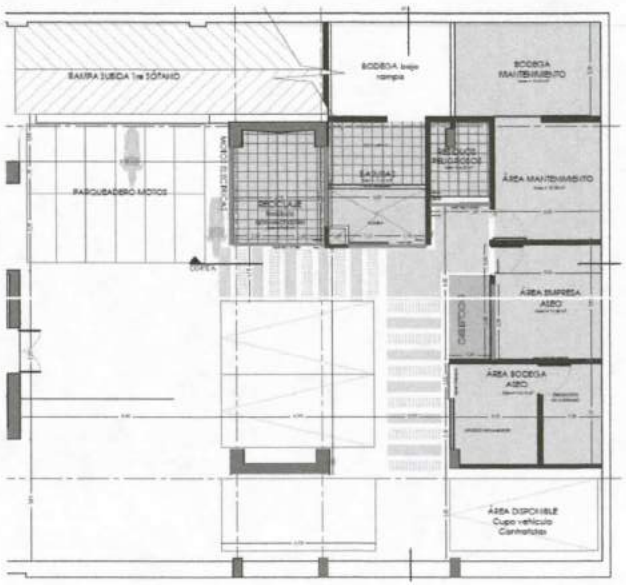

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	3,24	2,17		7,03
	1,00	1,73	2,17		3,75
	1,00	1,98	2,17		4,30
	1,00	2,64	0,39		1,03
	1,00	2,64	0,39		1,03
	1,00	2,64	0,39		1,03
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	18,17
				VIENEN	-
				TOTAL	18,17

OBSERVACIONES:	REVISOR	Vo. Bo. INTERVENTORIA CONSORCIO INTER DEPORTIVOS	Vo. Bo. INTEC
	Firma: ARQ. JUANCARLOS		Marlon Gutierrez
	SUPERVISOR		
	Firma:		Firma: DIRECTOR DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019

CAPITULO	1	**PRELIMINARES**			
ITEM N°:	1.6.3	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad.	UND:	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PUERTAS

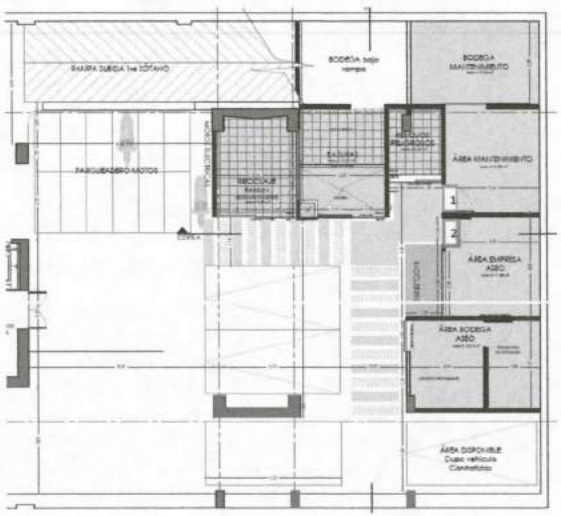

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	1,0	1,0		1,00
	1,00	1,0	1,0		1,00
					-
					-
					-

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.


MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM N°:	1.6.4	DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m.	UND:	UND

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TAPA METALICAS

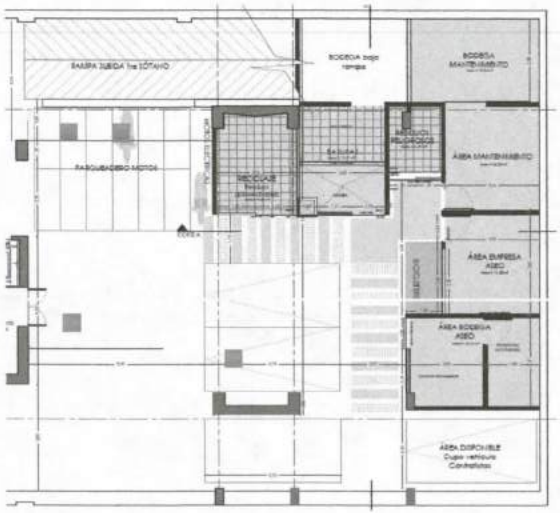

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	1,0	1,0		1,00
	1,00	1,0	1,0		1,00
	1,00	1,0	1,0		1,00
	1,00	1,0	1,0		1,00
					-
					-
					-

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM Nº:	1.9.4	DESCRIPCION ITEM	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND:	m3

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

VIAJE DE ESCOMBRO



DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	2,2	3,2		7,04
	1,00	2,2	3,2		7,04
					-
					-
					-

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Obras civiles para la construcción del cuarto de basuras y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	INTEC	CORTE No. 1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
OBRA	Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96.	FECHA:	13 de diciembre de 2019
CAPITULO	1	PRELIMINARES	
ITEM Nº:	N.P 1.1	DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de placa de contrapiso esmaltada
UND:	M2		

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLACA

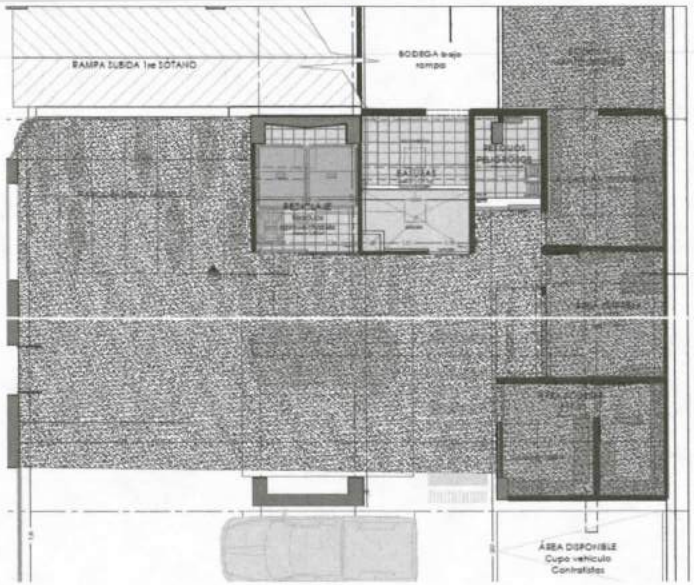

DESCRIPCION	DIMENSIONES CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF.	TOTAL
SEGÚN PLANO ADJUNTO					
	1,00	3	4,3		12,90
	1,00	3,9	3,1		12,09
	1,00	3,35	2		6,70
	1,00	11,3	10,4		117,52
	1,00	13,6	6,4		87,04
	1,00	2	2,9		5,80
					-
					-
					-
