ALCALDÍA DE SALENTO

CONTRATO
N° OBRA001-2023,

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS LA NUBIA, LA PALMERA, PALOGRANDE EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

CONTRATISTA
GRUPO ARQUINOVA S.A.S

INFORME GENERAL

1. INTRODUCCION.

El presente documento corresponde a la compilación de las actividades realizadas durante el mes de agosto y septiembre de 2023, en el contrato de obra pública N° OBRA001-2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS LA NUBIA, LA PALMERA, PALOGRANDE EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.”.

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Localización del proyecto

El municipio de Salento está situado al nororiente del departamento del Quindío, en los 4° 38′ 14″ latitud Norte y los 75° 34′ 15″ longitud oeste. Presentando alturas que van desde los 1300 (m s. n. m.) en la parte baja y 4750 (m s. n. m.) es su zona de nevados, limitando al norte con el Departamento de Risaralda, al sur con los Municipios de Calarcá y Armenia, al este con el Departamento del Tolima y al oeste con los municipios de Circasia y Filandia

La ejecución del contrato de obra se llevó a cabo en las veredas La Nubia y La Palmera, en el municipio de Salento, Quindío, en el sistema de abastecimiento de agua.



Información General.

- El municipio de Salento generó el proceso de selección mediante **MC-021-2023** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS LA NUBIA, LA PALMERA, PALOGRANDE EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

- El GRUPO ARQUINOVA S.A.S firmó en calidad de contratista el Contrato N° OBRA001-2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS LA NUBIA, LA PALMERA, PALOGRANDE EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”.

- El día 11 de septiembre de 2023 se firmó entre ambas partes el MODIFICATORIO Y PRORROGRA DE CONTRATO DE OBRA 001 DE 2023. Para un valor final total de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($32.475.314).

- La fecha de terminación del contrato conforme a la Modificación será el 22 de septiembre del 2023.

3. DATOS GENERALES

3.1 Información General del Contrato de Obra

TIPO DE CONTRATO	OBRA
No. CONTRATO	No. OBRA 001-2023
CONTRATISTA	GRUPO ARQUINOVA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	INES ELVIRA BERRATO OSPINA
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS LA NUBIA, LA PALMERA, PALOGRANDE EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
PLAZO INICIAL	60 DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($25.299.787,5) M/CTE
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
FECHA DE INICIO CONTRATO	16 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MODIFICACION No 1	SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE ($7.175.526,5)
PRORROGA No 1	8 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

3.2 Estado General del Contrato de Obra.

Al día 21 de septiembre del 2023, el contratista ha cumplido con la totalidad de las actividades de obra estipuladas en el contrato; y cuyo estado es finalizado pendiente de liquidación.

El contratista presenta el 30 de agosto una solicitud para la adición de los ítems No Previstos (NP) con el fin de culminar de forma satisfactoria el objeto del contrato.

3.3 Cumplimiento de Programación.

3.3.1 Actividades

Durante el plazo de ejecución, las actividades contractuales se llevaron a cabo conforme a la programación específica de obra. Sin embargo, a continuación, se describe el desarrollo de dichas actividades, concernientes al presente contrato.

- Se ejecutaron obras para la conformación de la línea de aducción en el sector de La Holanda, mediante excavación y conformación de zanjas para el suministro de manguera en polietileno de 3”.

- Para el sector de La Nubia, se excavaron zanjas para la posterior conformación de la línea de aducción.

- Se suministró e instaló tubería de 1 ½”, y se llenaron las zanjas anteriormente excavadas.

- Entre las actividades no previstas se encuentran las siguientes:

    - Suministro e instalación de viaducto en cable guaya de acero galvanizado 5/16". Incluye perros de anclaje y amarras para tubería en cable guaya de acero galvanizado en 3/16" cada 50 cm. Incluye transporte y acarreo horizontal desde punto de acopio a centro de gravedad de obra

    - Suministro y fundición de muertos en concreto pobre 14mpa. Incluye perfilacion y cajeo del terreno para formaleta. No incluye acero de refuerzo

    - Rocería, limpieza y adecuación de plataforma de trabajo a mano

    - Suministro e instalación de estructura en tubería galvanizada 2" x 1.5mm para soporte de viaducto en cable guaya. Dimensiones según diseño

    - Suministro e instalación de acero de fuerzo fy = 420 mpa 60.000 psi. Según diseño. Incluye corte y figurado

3.3.2 Presupuesto

El presupuesto contractual tiene una adición de ítems no previstos que fueron necesarios acordar con la entidad y aprobados, generando un balance presupuestal con mayores y menores cantidades que incluye la adición de estos ítems. Cabe resaltar, que el presupuesto no tiene el mismo costo contractual.

3.3.3 Balance Presupuestal

Se aprueba el balance presupuestal, el cual es ajustado a la intervención de solo los sectores de La Holanda y La Nubia, en este sentido, se deja por fuera el tramo N°2 Ramal a Escuela de Palogrande para aprovechar los recursos financieros.

4. GESTION TECNICA Y DE CALIDAD

4.1 Planes de Trabajo Ejecutados y Programados.

4.1.1 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

A la fecha de cierre del presente informe las actividades planeadas ya se encuentran realizadas.

La Holanda

ITEM	ACTIVIDAD	UN.	CANTIDAD FINAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
SECTOR NO. 1 - LA HOLANDA						
1	LINEA DE ADUCCION					
1.1	SISTEMA DE ADUCCIÓN EN MANGUERA POLIETILENO DE 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400	370	93%	100%
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL COMUN, NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M3	48	122.72	256%	100%
1.3	LLENO Y COMPACTADO ZANJA EN MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	M3	46.18	122.72	266%	100%


Ramal a Escuela La Nubia


ITEM	ACTIVIDAD	UN.	CANTIDAD FINAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
SECTOR NO. 1 - LA HOLANDA						
1	LINEA DE ADUCCION					
1.1	SISTEMA DE ADUCCIÓN EN TUBERÍA DE 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	150	100	67%	100%
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL COMUN, NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M3	18	9	50%	100%
1.3	LLENO Y COMPACTADO ZANJA EN MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	M3	13.8	9	65%	100%
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DISIPADORA DE PRESIÓN DE 1 1/2"	UND	2	0	0%	100%
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PASO DE 1 1/2"	UND	3	0	0%	100%
1.6	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO F´C=21MPA DE 50*50*40, INCLUYE TAPA DE CONCRETO REFORZADO	UND	3	0	0%	100%

4.2 Control del plan de trabajo

4.2.1 Grafica avance físico de actividades de obra

El avance de obra por cada sector se representa de la siguiente manera:

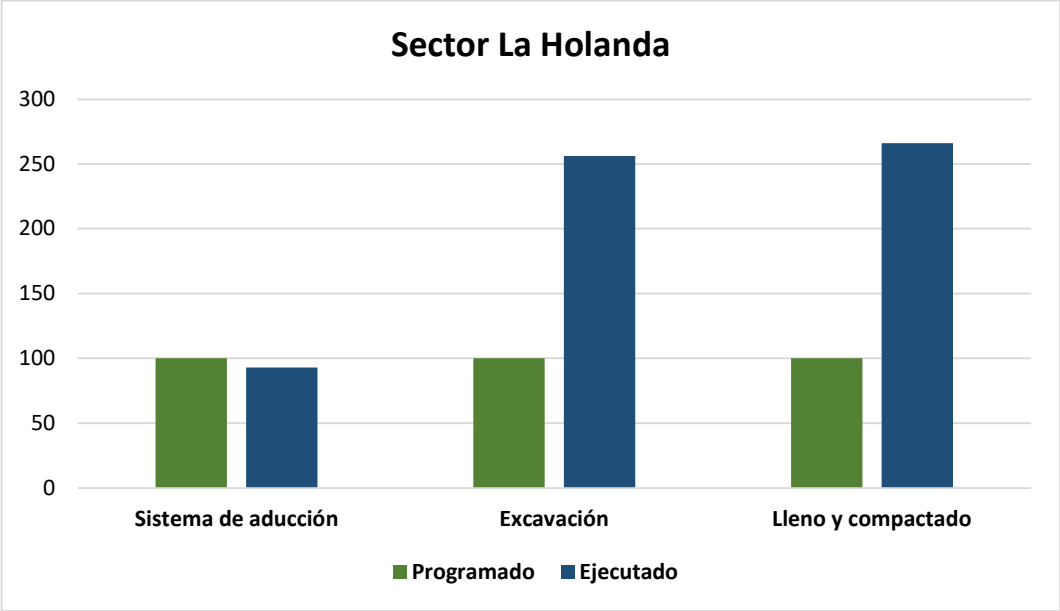

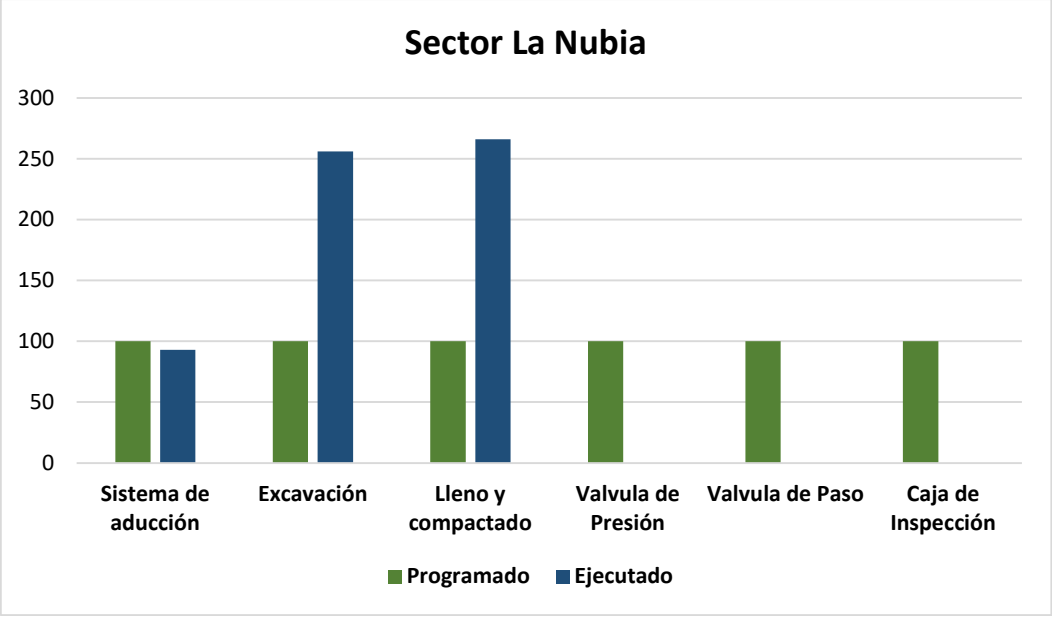

4.2.2 Actividades Ejecutadas

En este apartado, se mencionan las actividades que fueron ejecutadas durante el contrato. Entre los cuales se encuentran las obras para la conformación de la línea de aducción en el sector de La Holanda y La Nubia, mediante excavación y conformación de zanjas para el suministro de manguera en polietileno de 3” y de 1 ½”.

A continuación, se evidencia el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas.





Suministro de manguera
Fuente: Propia





Excavación
Fuente: Propia





Lleno y Compactación
Fuente: Propia

Entre las actividades no previstas se encuentran las siguientes:

- Suministro e instalación de viaducto en cable guaya de acero galvanizado 5/16". Incluye perros de anclaje y amarras para tubería en cable guaya de acero galvanizado en 3/16" cada 50 cm. Incluye transporte y acarreo horizontal desde punto de acopio a centro de gravedad de obra

- Suministro y fundición de muertos en concreto pobre 14mpa. Incluye perfilacion y cajeo del terreno para formaleta. No incluye acero de refuerzo

- Rocería, limpieza y adecuación de plataforma de trabajo a mano

- Suministro e instalación de estructura en tubería galvanizada 2" x 1.5mm para soporte de viaducto en cable guaya. Dimensiones según diseño

- Suministro e instalación de acero de fuerzo fy = 420 mpa 60.000 psi. Según diseño. Incluye corte y figurado

A continuación, se evidencia el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas.





Viaducto
Fuente: Propia



Elementos de anclaje y amarre
Fuente: Propia

4.2.3 Actividades No Ejecutadas dentro de lo programado, Justificación y Acciones de cumplimiento.

Las actividades No ejecutadas se justifican en el surgimiento de las actividades no previstas del presupuesto inicial. Así como, en la variación de cantidades mayores para algunos ítems. Por otro lado, dado que la contratación pública se dio mediante un proceso de selección de mínima cuantía, no se podía exceder el monto establecido al adicionar el contrato; por lo cual, se priorizo la intervención del Sector 1 y Sector 3.

Para el sector 1, correspondiente al frente de la palmera, se tiene que en dicho sector nace el acueducto, por lo que era necesario realizar las adecuaciones para aumentar el caudal captado y así surtir la necesidad creciente. Y por para el sector 3, La escuela ubicada en La Nubia, presenta mayor concentración de estudiantes que la ubicada en el sector de Palogrande.

Entre las actividades NO ejecutadas se encuentran las siguientes:

- Cambio y reposición de tubería presión PVC 2" (suministro e instalación)
- Excavación manual de zanja en material común, no incluye retiro de escombros.
- Lleno y compactado zanja en material proveniente de excavación
- Suministro e instalación válvula disipadora de presión de 2"
- Suministro e instalación válvula de paso de 2"
- Construcción cajas de inspección en concreto f´c=21mpa de 50*50*40, incluye tapa de concreto reforzado
- Construcción tapa en concreto reforzado de 50*50, f´c = 21mpa

4.3 Cuadro financiero del contrato

Se relaciona el cuadro financiero del contrato, con el valor contractual, el valor ejecutado, lasadiciones y actas parciales (SI APLICA).

CONTRATO No. OBRA 001-2023			
DESCRIPCIÓN	**VALOR CONTRACTUAL**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO**
VALOR INICIAL	$25.299.787,5	$0	$25.299.787,5
ADICIÓN	$7.175.526,5	$0	$32.475.314
EJECUCION	$32.475.314	$32.475.314	$0

5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe se tiene un avance del 100% de la obra programada teniendo en cuenta los modificatorios.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901397504	2	GRUPO ARQUINOVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ARQUINOVA	BARRIO LA PATRIA MZ 36 CASA 18	ARMENIA-QUINDIO	7410083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	340086251	9460428591	E	2023/09/04	2023/12/15	BANCOLOMBIA	102	$943,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ARQUINOVA (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
1	CC	18399706 ARIAS JOHN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1004918491 ORTIZ BRIHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1097398902 VILLARRAGA DUBER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(3)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901397504	2	GRUPO ARQUINOVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ARQUINOVA	BARRIO LA PATRIA MZ 36 CASA 18	ARMENIA-QUINDIO	7410083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	340086251	9460428591	E	2023/09/04	2023/12/15	BANCOLOMBIA	102	$943,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$58,400	$0	$615,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$19,500	$0	$205,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$38,900	$0	$410,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$18,300	$2,000	$0	$20,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$18,300	$2,000	$0	$20,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$14,600	$0	$153,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$139,200	$14,600	$0	$153,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$139,200	$14,700	$0	$153,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$9,800	$0	$102,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$4,900	$0	$51,300
TOTAL				**3**	**$853,500**	**$89,700**	**$0**	**$943,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901397504	2	GRUPO ARQUINOVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ARQUINOVA	BARRIO LA PATRIA MZ 36 CASA 18	ARMENIA-QUINDIO	7410083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	340082906	9460428531	E	2023/10/03	2023/12/15	BANCOLOMBIA	73	$916,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ARQUINOVA (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
1	CC	18399706	ARIAS JOHN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1004918491	ORTIZ BRIHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1097398902	VILLARRAGA DUBER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901397504	2	GRUPO ARQUINOVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ARQUINOVA	BARRIO LA PATRIA MZ 36 CASA 18	ARMENIA-QUINDIO	7410083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	340082906	9460428531	E	2023/10/03	2023/12/15	BANCOLOMBIA	73	$916,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$40,800	$0	$597,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$13,600	$0	$199,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$27,200	$0	$398,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$18,300	$1,400	$0	$19,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$18,300	$1,400	$0	$19,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$10,200	$0	$149,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$139,200	$10,200	$0	$149,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$139,200	$10,200	$0	$149,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$6,800	$0	$99,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$3,400	$0	$49,800
TOTAL				3	$853,500	$62,600	$0	$916,100

GRUPO ARQUINOVA SAS
NIT: 901.397.504-2
CL 21 14 17 P6 ED HOTEL BOLIVAR PLAZA
CORREO: grupoarquinova1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE9

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPO DE SALENTO **NIT No. :** 890001127-0 **DIRECCION :** CL 6 6 34 CAM **TELEFONO :** **CIUDAD :** SALENTO **PAIS :** Colombia	**26/12/2023**	**$ 32.475.314,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	26/12/2023	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	413020	CONTRATO DE OBRA CIVIL ACUEDUCTO LA PALMERA Y LA NUBIA	1	$ 24.981.011,00		$ 24.981.011,00
2	413020	ADMINISTRACION 20%	1	$ 4.996.202,00		$ 4.996.202,00
3	413020	IMPREVISTOS 3%	1	$ 749.430,00		$ 749.430,00
4	413021	UTILIDAD 7%	1	$ 1.748.671,00		$ 1.748.671,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/12/2023	$ 32.475.314,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESO

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA CIVIL ACUEDUCTO LA PALMERA Y LA NUBIA SALENTO
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 26/12/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
PXYwFUX51AsfMw4GpITPtMox+rJO69cNCIvOE0j69c/HIZCdi99kyR071g7rK8JmrWI5SooU9HlwP34wqI00W7wnGMID2QSb9VHJte9IButRNRQRhXNzFHFsYeVOr31u5jU/YjgNeZyMLFzseaYJq6TYQh9YXKRnGGDOIDYGc1wnS+tTdp9fkVUleYESrcn3s37RHHB2pED4VijfSEswzOU/VUo6mksCTkrNyXmKEABg3v3lzDw5s+C8Zz2Bkb+LU6zWMRn8eXa+b3Zc78yQtztxUNOJRdPjcQxtdrTzoIbQaL9PKSl0dUbDhZPQJBMZ2pKHmsaPH0cBLLVJU0MYSQ==

CUFE: 37f0c39701eb8d3b38f94a45bd83a4be82570bfd1751c0c9b603ec2ea5e5140980618d5df9d756c679e0353025198711
Fecha emisión: 2023-12-26 20:22:42 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-26 20:22:47-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764056768035. Prefijo: FE. Rango: 3 al 50. Vigencia: 26/09/2023 hasta 26/09/2024.
