| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA** | Código: SIVEYC FTO<br>Versión: 0.0<br>Vig. 23/05/2016 |

# CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GN2688-2023

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VÍA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES - SAN ISIDRO - LA PLANADA, SOBRE EL RIO GUIZA EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

## INFORME DE SUPERVISION No 6

**PERIODO INFORME: 15/11/2023 al 29/12/2023**

**San Juan de Pasto, diciembre de 2023**

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO | Código: SIVEYC FTO<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION: | 29-dic-23 | | | CORTE | 29/12/2023 |

**1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCUROS DE MINIMA CUANTIA: | MC 006-2023 | | | | |
| CONTRATO DE CONSULTORIA Nro: | GN2688-2023 del 12 de mayo de 2023. | | | | |
| CDP No.: | 2023020307 | FECHA: | 15-feb-23 | VALOR | $ 64.519.896,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No: | 2023050406. | FECHA: | 12-may-23 | VALOR | $ 58.067.906,00 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera a la Elaboración de Los Estudios y Diseños del Puente San Antonio Ubicado en la Vía Departamental 10NR02 Chucunes - San Isidro - La Planada, Sobre el Rio Guiza en los Municipios de Mallama y Ricaurte Departamento de Nariño | | | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | JAVIER ENRIQUEZ BRAVO C.C. 98.379.545. | | | | |
| SUPERVISOR | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS | | | | |
| PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION | Ing. FREDY ERNESTO TREJO CORAL | | | | |
| META FISICA | 1. INTERVENTORIA - ESTUDIO REALIZADO | | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 58.067.906,00 | | | | |
| VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: | $ - | | | | |
| VALOR CONTRATO ACTUALIZADO: | $ 58.067.906,00 | | | | |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: | 12-may-23 | | | | |
| PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: | Cinco (5) Meses, contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio. | | | | |
| FECHA DE ACTA INICIO: | 15-jun-23 | | | | |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 15-nov-23 | | | | |
| MODIFICATORIO No 1: | Prorroga por 15 dias adicionales | | | | |
| FECHA TERMINACION MOD No 1: | 29-dic-23 | | | | |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 15-jun-23 | | | | |
| PORCENTAJE ANTICIPO | 20% del valor del Contrato | | | | |
| TOTAL ANTICIPO 20% | $ 11.613.581,20 | | | | |
| VALOR PAGADO ACTAS + ANTICIPO | $ - | | | | |
| GARANTIAS: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | | |
| POLIZA No.: | 41-44-101269264 | | | | |
| % AVANCE FISICO CONTRATO | % PROGRAMADO: | 100% | | % EJECUTADO: | 100,00% |
| % AVANCE FINANCIERO | % PROGRAMADO | 90% | | % EJECUTADO | 0% |
| META FISICA A LA FECHA | 1 ESTUDIO REALIZADO | | | % EJECUTADO | 100,00% |

| | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO** | Código: SIVEYC.FTO.<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |
|---|---|---|

## 2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

**ASPECTOS TECNICOS** La ejecución del contrato comprende realizar las actividades correspondientes a la interventoría en cuanto a los componentes técnicos, administrativos, financieros y ambientales mediante la cual se realizará el seguimiento, control cumplimiento de las obligaciones el respeto de las especificaciones técnicas ofrecidas y la vigilancia de la ejecución de las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en el Objeto del Contrato de Consultoría No. GN2806-2022.

El dia 20 de diciembre de 2023 se llevo a cabo el quinto comité tecnico de manera virtual, donde el Ing. MAURICIO CERON, representante de la Firma Consultora realiza un informe pormenorizado y presentación en Power Poin sobre el avance de la consultoria.




**ASPECTOS FINANCIEROS:** De acuerdo con la cláusula referente a valor y forma de pago, el pago del anticipo correspondiente al 20% del valor del aportado por el Departamento de Nariño (**$ 11,613,581,2,oo**). En trámite en Contabilidad - Sin pago a la fecha.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** El Contrato Nro 2688-2023 contractualmente inició su ejecución, una vez se adelantó su perfeccionamiento y se suscribió el Acta de Inicio el dia 15-06-2023. todos los docuentos se encuentran legalizados y publicados en pagina Secop 2, con el numero de proceso IMC006-20023, La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Interventoria se realizó mendiante sim DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023.


**ASPECTOS LEGALES:** Contrato de Interventoria debidamente suscrito el 12-05-2023**.** Se Publica el Acta de Inicio en Secop II por parte del DAC el **15-06-2023.** con fecha 15/06/2023 se legalizó el modificatorio 01, que modifica el numeral 8.1.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO de los Estudios Previos del Proceso IMC006-2023 y de la cláusula "GARANTÍA UNICA" del Comunicado de aceptación de la oferta GN2688-2023, en cuanto a que, en la garantía de Buen manejo y correcta inversión del anticipo, se estableció que cubriría lo siguiente: "100% del monto entregado como anticipo (30% del valor del contrato)", no obstante, es necesario aclarar que correctamente el anticipo corresponde al 20% de valor total del contrato, tal y como se encuentra señalado en la Forma de Pago, tanto de los Estudios Previos como del Comunicado de aceptación de la oferta, y que por error involuntario en el contenido de la misma se indicó a un porcentaje diferente. El Contrato a la fecha tiene certificado de legalización y el modificacion No 02, que prorroga el contrato hasta el 29/12/2023. se encuntra legalizalizado.

| | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO** | Código: SIVEYC FTO<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |
|---|---|---|

**RECIBO DE PRODUCTOS:** Mediante Correo electronico de fecha 27/12/2023 el Consultor entrega final de los volúmenes del proyecto, habiendo orientado la ejecución integral de la consultoría, a través del desarrollo metodológico del proyecto en 5 etapas, como se muestra en la figura siguiente y se detalla en los párrafos de abajo

ETAPA 1. Recopilación y análisis de información secundaria. Se plantea de manera detallada el diagnóstico de las condiciones actuales basados en la revisión de los estudios existentes. El principal objetivo de esta etapa es rescatar las temáticas relevantes
- ETAPA 2. Planificación operativa del proyecto. Se establecen los mecanismos de coordinación del proyecto, de tal manera que las actividades planeadas correspondan con las necesidades verdaderas del proyecto
- ETAPA 3. Estudios de campo. El principal objetivo es hacer el inventario de las componentes técnicas y de la infraestructura existente, para consolidar el diagnóstico de las condiciones actuales. Siendo fundamental el Estudio de Topografía, Movilidad con énfasis hacia el PMT, Geotecnia, Redes existentes, Inventario arbóreo.
- ETAPA 4. Consultoria de Oficina - estudios y diseños. Basados en los determinantes de Movilidad, Geometría, Estado y funcionalidad, definidos por el grupo consultor de diseño, se procede en esta etapa a la estructuración y desarrollo de los estudios y diseños, que lleven el proyecto a las escalas de construcción en todos y cada uno de los capítulos listados en el numeral de alcances
- ETAPA 5. Documentación de los estudios y diseños, que corresponde al compendio de los estudios y diseños en Informes Finales por cada uno de los volúmenes definidos en los alcances del contrato, y que terminan siendo el conocimiento colectivo, documentos y planos. Así de esta manera, en estos documentos se presenta el alcance, Informe Final, de la Etapa de Estudios y Diseños para los componentes integrales del puente, abordando las especialidades de la ingeniería en cada uno de los Volúmenes, que se describen en el siguiente cuadro:

Los documentos mencionados se entregan en digital ( Se anexa evidencia de entrega de productos del Estudio)

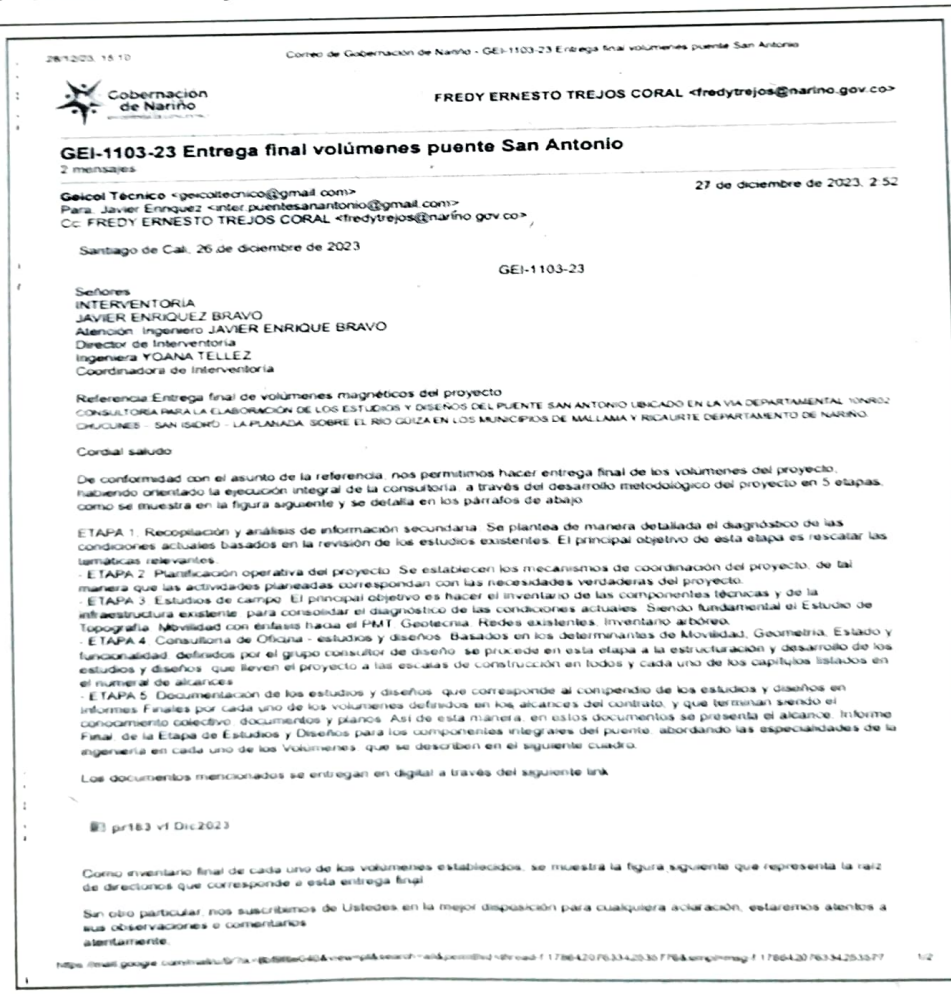

28/12/2023, 15:10 Correo de Gobernación de Nariño - GEI-1103-23 Entrega final volúmenes puente San Antonio

Gobernación de Nariño

FREDY ERNESTO TREJOS CORAL <fredytrejos@narino.gov.co>

**GEI-1103-23 Entrega final volúmenes puente San Antonio**
2 mensajes

**Geicol Técnico** <geicoltecnico@gmail.com> 27 de diciembre de 2023, 2:52
Para: Javier Enriquez <interventoriapuentesanantonio@gmail.com>
Cc: FREDY ERNESTO TREJOS CORAL <fredytrejos@nariño.gov.co>

Santiago de Cali, 26 de diciembre de 2023

GEI-1103-23

Señores
INTERVENTORIA
JAVIER ENRIQUEZ BRAVO
Atención: Ingeniero JAVIER ENRIQUE BRAVO
Director de Interventoria
Ingeniera YOANA TELLEZ
Coordinadora de Interventoria

Referencia: Entrega final de volúmenes magnéticos del proyecto
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VIA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES - SAN ISIDRO - LA PLANADA, SOBRE EL RIO GUIZA EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Cordial saludo

De conformidad con el asunto de la referencia, nos permitimos hacer entrega final de los volumenes del proyecto, habiendo orientado la ejecución integral de la consultoría, a través del desarrollo metodológico del proyecto en 5 etapas, como se muestra en la figura siguiente y se detalla en los párrafos de abajo

ETAPA 1. Recopilación y análisis de información secundaria. Se plantea de manera detallada el diagnóstico de las condiciones actuales basados en la revisión de los estudios existentes. El principal objetivo de esta etapa es rescatar las temáticas relevantes.
- ETAPA 2. Planificación operativa del proyecto. Se establecen los mecanismos de coordinación del proyecto, de tal manera que las actividades planeadas correspondan con las necesidades verdaderas del proyecto.
- ETAPA 3. Estudios de campo. El principal objetivo es hacer el inventario de las componentes técnicas y de la infraestructura existente, para consolidar el diagnóstico de las condiciones actuales. Siendo fundamental el Estudio de Topografía, Movilidad con énfasis hacia el PMT, Geotecnia, Redes existentes, Inventario arbóreo.
- ETAPA 4. Consultoria de Oficina - estudios y diseños. Basados en los determinantes de Movilidad, Geometría, Estado y funcionalidad, definidos por el grupo consultor de diseño, se procede en esta etapa a la estructuración y desarrollo de los estudios y diseños, que lleven el proyecto a las escalas de construcción en todos y cada uno de los capítulos listados en el numeral de alcances
- ETAPA 5. Documentación de los estudios y diseños, que corresponde al compendio de los estudios y diseños en Informes Finales por cada uno de los volúmenes definidos en los alcances del contrato, y que terminan siendo el conocimiento colectivo, documentos y planos. Así de esta manera, en estos documentos se presenta el alcance, Informe Final, de la Etapa de Estudios y Diseños para los componentes integrales del puente, abordando las especialidades de la ingeniería en cada uno de los Volúmenes, que se describen en el siguiente cuadro:

Los documentos mencionados se entregan en digital a través del siguiente link

pr183 v1 Dic2023

Como inventario final de cada uno de los volúmenes establecidos, se muestra la figura siguiente que representa la raiz de directorios que corresponde a esta entrega final

Sin otro particular, nos suscribimos de Ustedes en la mejor disposición para cualquiera aclaración, estaremos atentos a sus observaciones o comentarios
atentamente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=... 1/2

| | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO** | Código.: SIVEYC.FTO.<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |
|---|---|---|

De igual manera mediante acta de recibo de fecha 29/12/2023 EL INTERVENOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA GN2806-2022 CERTIFICA: Que GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. representado Legalmente por Luz Adriana Bastidas Álzate ejecutó el contrato de referencia en los plazos legalmente establecidos; estudios y diseños que se reciben para ser revisados y observados por parte de los profesionales especializados que hacen parte del equipo técnico de la interventoría quienes previa evaluación darán los respectivos informes de aval y recibo a satisfacción según especificaciones y términos establecidos en el contrato GN2806-2022 .cuyo objeto es realizar la "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VIA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES – SAN ISIDRO – LA PLANADA, SOBRE EL RIO GUIZA EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO ( Se anexa Evidencia)

**3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Durante el periodo se ha recibido cinco (5) informes de avance por parte de la Interventoria;: de los periodos 15-06-2023 al 14/07/2023 del 15/07/2023 al 14/08/2023. 15/08/2023 al 14/09/2023; del 15/09/2023 al 14/10/2023 y del 15/10/2023 al 14/11/2023 , faltando por entregar el informe Final 06.

Se espera que los estudios y diseños que se reciben para ser revisados y observados por parte de los profesionales especializados que hacen parte del equipo técnico de la interventoría quienes previa evaluación darán los respectivos informes de aval y recibo a satisfacción según especificaciones y términos establecidos en el contrato GN2806-2022 .


Proyecto: Ing. **FREDY ERNESTO TREJO CORAL**
Profesional Univeristario - Apoyo a la Supervisión - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. **JORGE RENE ARTEAGA PALACIOS**
Subsecretario de Infraestructura y Vias - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. **SONIA ALEJANDRA VELASCO R.**
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - REGISTRO FOTOGRAFICO** | Código.: SIVEYC.FTO.<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO

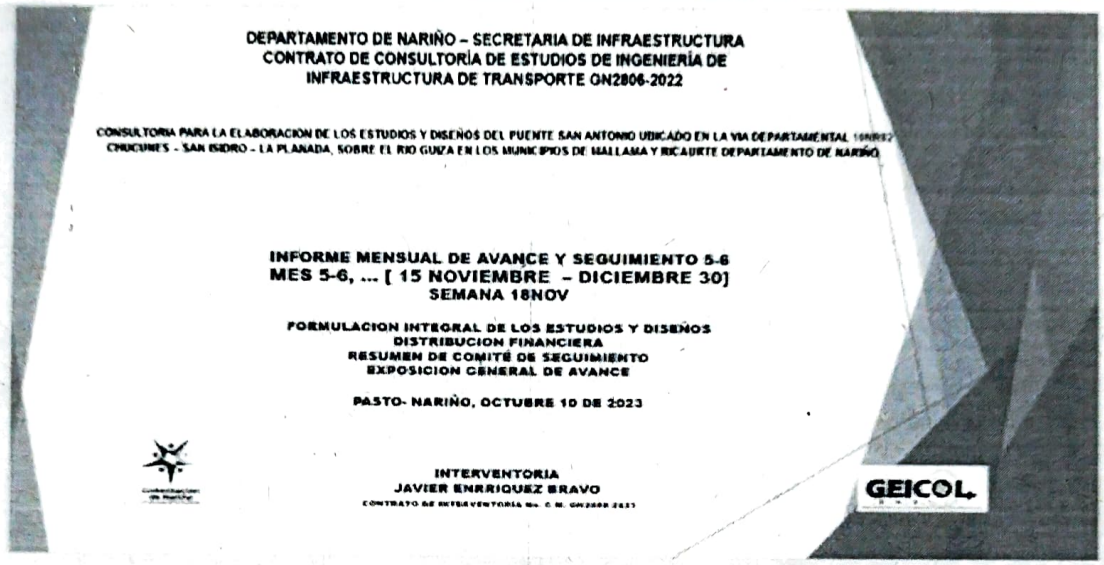


Fotografia No 1- Presentacion comité tecnico de manera virtual, donde el Ing. MAURICIO CERON, representante de la Firma Consultora realiza un informe pormenorizado y presentación en Power Poin sobre el avance de la consultoría.

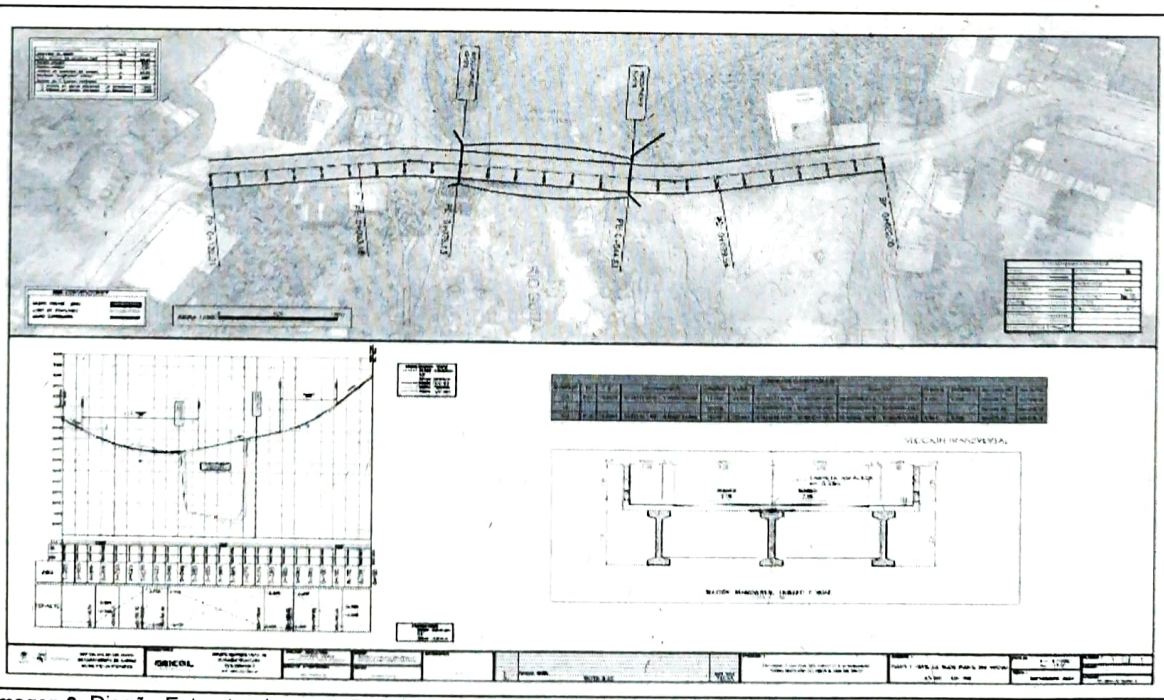


**Imagen 2:** Diseño Estructural puente Definitivo.

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VÍA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES - SAN ISIDRO - LA PLANADA, SOBRE EL RIO GUIZA EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

**PERSONAL PROFESIONAL VINCULADO A LA INTERVENTORIA**

| PROFESIONAL ACEPTADO | NOMBRE | REQUISISTOS GENERALES | TITULO PPOFESIONAL | POST- GRADO | POST- GRADO ADICIONAL | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA | OBERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director **de Interventoria Dedicación del 30 % mensual** | Ing. Javier Enriquez Bravo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Ver Observación | CUMPLE | CUMPLE | La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023. |
| **Ingeniero Postgrado Ambiental Dedicación del 16% mensual.** | Ing. Javier Enriquez Bravo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Ver Observación | CUMPLE | CUMPLE | La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023. |
| **Ingeniero Postgrado Geotecnia Dedicación del 16% mensual.** | Ing. Javier Enriquez Bravo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE | La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023. |
| **Ingeniero Postgrado Vias o Ingenieria de carreteras Dedicación del 16% mensual.** | Ing. Javier Enriquez Bravo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE | La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023. |
| **Ingeniero Postgrado Pavimentos Dedicación del 16% mensual.** | Ing. Javier Enriquez Bravo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE | La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023. |
| **Ingeniero Postgrado Hidrologia/Hidraulica Dedicación del 16% mensual.** | Ing. Leon Harvey Quiroz | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE | La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023. |
| **Ingeniero Postgrado Estructuras Dedicación del 30% mensual.** | Ing. Oscar Lopez Rodriguez | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE | La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023. |
| Profesional Social y **Predial Dedicación del 16% mensual.** | Ing. Jenny Téliez Salas | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE | CUMPLE | La aprobación de las Hojas de vida de los especialistas de la Consultoria se realizó mendiante sim 1DSIM- 1235-2023 de fecha 01 de agosto de 2023. |

Nota: Sin cambios para el periodo

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO** | Código.: SIVEYC.FTO.<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

## 5. INFORME FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **2688-2023** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 58.067.906,00** |

| ACTAS | FECHA | VR. TOTAL | ACUMULADO | AMORT. ANTICIPO | VR. NETO | VR EGRESO | TOTAL DESC | COM EGRESO No | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO 20% | 15/12/2021 | $ 11.613.581,20 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | |

| | |
|---|---|
| **AVANCE FISICO** | **100,00%** |
| **AVANCE FINANCIERO** | **0,00%** |

Nota: A la fecha no se ha efectuado el pago del Anticipo

Nota: Sin cambios para el periódo.

| | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS<br>**FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS** | Código.: SIVEYC.FTO.<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |
|---|---|---|

## 6. CONTROL POLIZAS

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | GN2688-2023 |
| **GARANTIAS:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **POLIZA No:** | 41-44-101269264 |

| AMPARO | VALOR | TIEMPO |
|---|---|---|
| Buen Manejo Anticipo | 100% del valor del anticipo | Tiempo de ejecución del contrato y 6 meses mas |
| Cumplimineto del Contrato | 20% del valor del contrato | Tiempo de ejecución del contrato y 6 meses mas |
| Pago de Salarios y P.S. | 15% del valor del contrato | Tiempo de ejecución del contrato y 3 años mas |
| Calidad del Servicio | 30% del valor del contrato | Tiempo de ejecución del contrato y 6 meses mas |

| ANEXO 0 | | | FECHA APROBACION | 15/05/2023 | FECHA EXPEDICION | 15/05/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **VALOR** | **%** | **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** | **OBSERVACIONES** | **ALERTA** |
| Buen Manejo Anticipo | $ 11.613.581,20 | 100% | 12-may-23 | 12-abr-24 | Poliza Original | 105 |
| Cumplimineto del Contrato | $ 11.613.581,20 | 20% | 12-may-23 | 12-abr-24 | Poliza Original | 105 |
| Pago de Salarios y P.S. | $ 8.710.185,90 | 10% | 12-may-23 | 12-oct-26 | Poliza Original | 1.018 |
| Calidad del Servicio | $ 11.613.581,20 | 30% | 12-may-23 | 12-abr-24 | Poliza Original | 105 |

| ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 1 | | | FECHA APROBACION | 23/06/2023 | FECHA EXPEDICION | 23/06/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **VALOR** | **%** | **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** | **OBSERVACIONES** | **ALERTA** |
| Buen Manejo Anticipo | $ 11.613.581,20 | 100% | 15-jun-23 | 16-may-24 | Acta Inicio | 139 |
| Cumplimineto del Contrato | $ 11.613.581,20 | 20% | 15-jun-23 | 16-may-24 | Acta Inicio | 139 |
| Pago de Salarios y P.S. | $ 8.710.185,90 | 10% | 15-jun-23 | 15-nov-26 | Acta Inicio | 1.052 |
| Calidad del Servicio | $ 11.613.581,20 | 30% | 13-nov-23 | 16-may-24 | Acta Inicio | 139 |

| ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 1 | | | FECHA APROBACION | 20/11/2023 | FECHA EXPEDICION | 20/11/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **VALOR** | **%** | **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** | **OBSERVACIONES** | **ALERTA** |
| Buen Manejo Anticipo | $ 11.613.581,20 | 100% | 15-jun-23 | 29-jun-24 | Prórroga | 183 |
| Cumplimineto del Contrato | $ 11.613.581,20 | 20% | 15-jun-23 | 29-jun-24 | Prórroga | 183 |
| Pago de Salarios y P.S. | $ 8.710.185,90 | 10% | 15-jun-23 | 29-dic-26 | Prórroga | 1.096 |
| Calidad del Servicio | $ 11.613.581,20 | 30% | 13-nov-23 | 29-jun-24 | Prórroga | 183 |

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA GN2806-2022 del 16 de diciembre de 2022.

**CERTIFICA**:

Que GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. NIT. 800256897-0 representado Legalmente por Luz Adriana Bastidas Álzate con C.C. 34.557.778 ejecutó el contrato de referencia en los plazos legalmente establecidos; estudios y diseños que se reciben para ser revisados y observados por parte de los profesionales especializados que hacen parte del equipo técnico de la interventoría quienes previa evaluación darán los respectivos informes de aval y recibo a satisfacción según especificaciones y términos establecidos en el contrato GN2806-2022 del 16 de diciembre de 2022..cuyo objeto es realizar la "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VIA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES – SAN ISIDRO – LA PLANADA, SOBRE EL RIO GUIZA EN LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO." , de acuerdo con el siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | GN2806-2022 del 16 de diciembre de 2022. |
| **RECURSOS:** | Cuenta: 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402021-2021003520255- 53290-16-1.2.2.0.00 – Recursos Propios - Departamento de Nariño |
| **No.CDP:** | 2022080036. |
| **No. REGISTRO DE COMPROMISO:** | 2022120403. |
| **CONTRATISTA:** | GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. NIT. 800256897-0 representado Legalmente por Luz Adriana Bastidas Álzate con C.C. 34.557.778. |
| **PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION**: | Ing. Fredy Ernesto Trejo Coral – Profesional Universitario - SIMD |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Realizar la CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VIA DEPARTAMENTAL 10NR02 CHUCUNES – SAN ISIDRO – LA PLANADA, SOBRE EL RIO GUIZA EN |

LOS MUNICIPIOS DE MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

**VALOR DEL CONTRATO:** Doscientos Once Millones Novecientos Quince Mil Doscientos Pesos. M/Cte ($211.915.200),

**FECHA DE INICIACION:** Quince (15) de junio de 2023.

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** Cinco (05) Meses

**FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:** Quince (15) de noviembre de 2023.

**PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO**: 45 días

**FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO:** Veintinueve (29) de diciembre de 2023.

**FECHA DE LA PPRESENTE ACTA** Veintinueve (29) de diciembre de 2023

**DETALLE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL CONSULTOR.** Se relaciona a continuación los volúmenes entregados por el consultor GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO, los cuales aún se encuentran con observaciones por parte de Interventoría según lista de chequeo del 26 de diciembre de 2023. Por lo anterior, mediante la presente acta se relaciona los volúmenes entregados por el consultor más no aprobados por la interventoría debido a que dicha información todavía requiere ajustes de acuerdo a las observaciones de los profesionales de interventoría.

| No. De Volumen | Nombre del Volumen | Entregado | | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | Si | No | |
| 0 | Introducción | X | | Ok. |
| 1 | Levantamiento Topográfico, Batimétrico E Información General Local. | X | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |
| 2 | Estudio de Geología, Geomorfología Para Ingeniería y Geotécnica | X | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | Estudio de Suelos Para Diseño de Otras Estructuras De Contención, Obras De Arte y Estabilización De Rasante En Accesos | **X** | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |
| **4** | Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes | **X** | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |
| **5** | Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación | **X** | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |
| **6** | Estudio de Alternativas, Consideraciones Técnicas y Económicas Para La Determinación de la más Viable y Análisis e Identificación Predial. | **X** | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |
| **7** | Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico | **X** | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |
| **8** | Diseño Estructural De Puentes y Obras Complementarias (Accesos Y Otros) | **X** | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |
| **9** | Estudio Para Pliegos de Condiciones, Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas, Análisis De Precios Unitarios, Presupuesto y Cronograma. | **X** | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |
| **10** | Componente Ambiental de Obra y Plan Manejo | **X** | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |
| **11** | Documentos Técnicos Para Gestión de Permisos y Licencias para Ejecución. | **X** | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **12** | Informe Final. El Informe Final consta del compendio de todos y cada uno de los volúmenes aprobados, resultado de cada uno de los estudios desarrollados en los apartes debidamente aprobados por Interventoría. | **X** | | Con observaciones de acuerdo a matriz de observaciones del 26 de diciembre de 2023. |

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por interventoría, el contratista Consultor GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO, deberá dar respuesta a las mismas en el menor tiempo posible con el fin de permitir que la Interventoría a través de su equipo de especialistas verifiquen el cumplimiento a las observaciones y en lo posible emitan concepto de viabilidad de los diferentes volúmenes. El término para presentar dichos ajustes no podrá sobrepasar el mes de enero de 2024 con el fin de permitir que desde la Gobernación de Nariño se cuente con el tiempo suficiente para organizar la información y continuar con el proceso de liquidación.

Para constancia se firma en San juan de pasto a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

**NOTA:** LA PRESENTE ACTA NO IMPLICA EL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, Y SOLO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBO DOCUMENTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR TANTO NO ES VÁLIDO PARA TRAMITE DE PAGO.



---

**LUZ ADRIANA BASTIDAS ÁLZATE.**
Representante Legal GEICOL
Contratista Consultoría



---

**ING.JAVIER ENRIQUEZ BRAVO**
Contratista de Interventoría
