JCB CONSULTORIAS SAS
NIT 901.269.311

Bogotá D.C.,15 de Diciembre de 2023 **51-BOGOTA-YOQC**

Ingeniero:
MANUEL TORRES
INTERVENTOR
Cerrito, Valle del Cauca

Referencia: *CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4926239 – " ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINICIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA".*

Asunto: COBRO ACTA FINAL – CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4926239

Cordial saludo.

Adjunto para su revisión, aprobación y trámite para pago del ACTA FINAL, del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR 4926239, que corresponde a un 7,51% por un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 51 CENTAVOS MONEDA CTE. ($ 42.649.430,51), de las actividades contractuales contratadas y para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

No.	DETALLE
2	Factura de Venta JCBC-158
3	DIAN – Representación gráfica Factura electrónica
4	Acta FINAL
5	Memorias Finales Cantidades de Obra
6	Acta de Modificación No. 4
7	Memorias de Cantidades acta de Modificación
8	Balance Final del Contrato
9	Resolución de Facturación
10	RUT . JCB CONSULTORIA SAS
11	C.C. Representante Legal JCB CONSULTORIA SAS
12	Certificación Bancaria
13	Certificación de Pagos de Aportes Parafiscales, C.C, T.P y vigencia del Contador
14	Planillas de Pago de Seguridad Social.
15	FORMATO RCD – (Excel)
16	INFORME MENSUAL No. 4

Atentamente,

ARQ. YUDY QUINTERO
JCB CONSULTORIAS SAS

ADJUNTO: LO ANUNCIADO

Correo: alc.cerrito.jcb@gmail.com – Celular Profesional Encargado 312-3810399
CND-Bogotá Calle 150 # 16-56 Ofc 308-6 Centro Comercial Cedritos Telefax 7-028090 Cel 314-2645967

CERTIFICACIÓN POR INTERVENTORÍA PAGO ACTA FINAL DE OBRA
CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.4926239

Verificando las actividades del objeto contractual y los documentos aportados por la contratista JCB CONSUL TORIA S.A.S NIT: 901269311-1, realizó a satisfacción la ejecución de la obra con las actividades consignadas en el contrato de obra para el acta final de obra, cuya ejecución de actividades comprendió el periodo octubre noviembre de 2023, Contrato obra Número CO1.PCCNTR.4926239, cuyo objeto es **"ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA".** El contratista ejecutó lo relacionado con las actividades del pago final objeto de contrato y aprobación de ítems no previstos. Por tal motivo se autoriza a quién corresponda el pago de **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVO M/CTE ($42.649.430,51)** correspondientes al valor pactado y como lo establece la forma de pago.

Para constancia de lo anterior, se firma el quince (15) del mes diciembre de Dos mil veintitrés (2023).

YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO
R/ JCB CONSUL TORIA S.A.S
NIT: 901269311-1

MANUEL OLIVERIO TORRES BERMÚDEZ
INTERVENTORÍA
Nit. 94373765-8

JCB CONSULTORIA SAS

NIT: 901269311-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 150 16 56 OF 308 6, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 7028090

Email. contabilidad.jcb@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764042964124 válida desde 2023-01-18 hasta 2024-01-18 rango desde JCBC-142 hasta JCBC-200.

Correo Electrónico: contabilidad.jcb@hotmail.com
Celular: 314 2645967

Cliente:	MUNICIPIO DE EL CERRITO
NIT :	800100533-5
Dirección:	CALLE 7 No. 11-62, El Cerrito, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	2570952
Email:	infraestructura@elcerrito-valle.gov.co

Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	29/12/2023
Total de Lineas:	6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**JCBC - 158**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:33:36**
FECHA FIRMADO:	**22/12/2023 11:33:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	12	2023	29	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	86	ACTA FINAL corresponde a un avance del 7.51% CONTRATO DE OBRA No. 4926239 CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	WSD	1,00	$32.806.963,55				0,00	$32.806.963,55
2	AIU 1	ADMINISTRACIÓN 23%	WSD	1,00	$7.545.601,62				0,00	$7.545.601,62
3	AIU 2	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	$328.069,64				0,00	$328.069,64
4	AIU 3	UTILIDAD 4%	WSD	1,00	$1.312.278,54				0,00	$1.312.278,54
5	87	PGIO 7.51%	WSD	1,00	$328.258,58				0,00	$328.258,58
6	88	PAGA 7.51%	WSD	1,00	$328.258,58				0,00	$328.258,58

Notas:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 65000010681

SON: (cuarenta y dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta pesos cincuenta y un centavos)
CUFE: 7a81e0cd194c7ae11f50d6c54904da04f879d1a6b71b1bba8188635e0dc479e733b24994e4705b2b4319313b3d489e88

Subtotal:	$42.649.430,51
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$42.649.430,51

Firma Digital: pjYILB+fAADdHKuhjDkn83kvdRBkHmh3M+gt36EUhblcYlbSyYrMp6+Q85StaOks hVTCTb1mNP7tkFiAkcgSakCevM1xzAhPnyairdQ25e+lwkAudr 4zKEBMG3Vr5YdU qgVlcAlj6fdLJN3ndN6uRQsnaUmyHuDnkZL3SAm7/eamuvB1GqsA+i9tdyUUAdl9 17fkufMf3xAbV6/yA6+8Nr7mpEv4UCu3fo4 nFwtfh3VkXgtUDJkd+Bk2z2uKTbnS 3ejVp6AcAc43mkPCZ2wNh54t+29IvJHvUp0owLn+Sb4GGWwzKMfw/2z4O5Ui5jD0 nO+63Lu9C2KfstPdmJgw mQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7a81e0cd194c7ae11f50d6c54904da04f879d1a6b71b1bba8188635e0dc479e733b24994e4705b2b4319313b3d489e88

Número de Factura: JCBC-158
Fecha de Emisión: 21/12/2023
Fecha de Vencimiento: 29/12/2023
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JCB CONSULTORIA SAS
Nombre Comercial: JCB CONSULTORIA SAS
Nit del Emisor: 901269311
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 150 16 56 OF 308 6
Teléfono / Móvil: 7028090
Correo: contabilidad.jcb@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL CERRITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800100533
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: EL CERRITO
Dirección: CALLE 7 No. 11-62
Teléfono / Móvil: 2570952
Correo: infraestructura@elcerrito-valle.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	86	ACTA FINAL corresponde a un avance del 7.51%	WSD	1,00	$ 32.806.963,55	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.806.963,55
2	AIU 1	ADMINISTRACIÓN 23%	WSD	1,00	$ 7.545.601,62	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.545.601,62
3	AIU 2	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	$ 328.069,64	$ 0,00	$ 0,00					$ 328.069,64
4	AIU 3	UTILIDAD 4%	WSD	1,00	$ 1.312.278,54	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.312.278,54
5	87	PGIO 7.51%	WSD	1,00	$ 328.258,58	$ 0,00	$ 0,00					$ 328.258,58
6	88	PAGA 7.51%	WSD	1,00	$ 328.258,58	$ 0,00	$ 0,00					$ 328.258,58

Datos AIU

Información - Adicional

CONTRATO DE OBRA No. 4926239 CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 65000010681

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-22 11:33:41
Documento generado el: 2023-12-22 16:33:39
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			42.649.430,51
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			42.649.430,51
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			42.649.430,51
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	42.649.430,51

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764042964124 Rango desde: 142 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-01-18

ALCALDÍA
EL CERRITO
Juntos por el progreso

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533-6

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA:	No. 4926239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2023	% EJECUTADO	7,51%
VR. INICIAL	$ 568,272,895.61	FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	% ACUMULADO	100,00%
VR. ADICIONES	$ -	PLAZO	150 DIAS	VR PRESENTE ACTA	$ 42,649,430.51
VR. TOTAL	$ 568,272,895.61			VR. ACUMULADO	$ 568,272,895.61
INTERVENTOR:	ING. MANUEL TORRES			FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los (30) dias del mes de NOVIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY O. QUINTERO CAMARGO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA FINAL de obra de las siguientes actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 y el 30 de NOVIEMBRE DE 2023, según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 4		ACUMULADO ANTERIOR ACTA PARCIAL No. 3		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
1	PRELIMINARES																
1,01	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	940,00	$ 14.328,00	$ 13.468.320,00	994,71	$ 14.252.204,88	994,71	$ 14.252.204,88	-	$ -	994,71	$ 14.252.204,88	100%	-	$ -	
1,02	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	5,00	$ 12.763,00	$ 63.815,00	65,28	$ 833.168,64	65,28	$ 833.168,64	-	$ -	65,28	$ 833.168,64	100%	-	$ -	
1,03	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE TEJAS DE BARRO, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, CABALLETES, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	20,00	$ 12.763,00	$ 255.260,00	9,68	$ 123.545,84	9,68	$ 123.545,84	-	$ -	9,68	$ 123.545,84	100%	-	$ -	
1,04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO, VIGA DE JARDINERA ENTRE OTROS ELEMENTOS, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	24,00	$ 4.948,00	$ 118.752,00	273,22	$ 1.351.892,56	273,22	$ 1.351.892,56	-	$ -	273,22	$ 1.351.892,56	100%	-	$ -	
1,05	EXCAVACIONES MANUAL PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN ENTIBADO, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES.	m3	260,00	$ 23.298,00	$ 6.057.480,00	206,82	$ 4.818.492,36	206,82	$ 4.818.492,36	-	$ -	206,82	$ 4.818.492,36	100%	-	$ -	
1,06	EXCAVACIONES MECANICA PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN ENTIBADO, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	M3	658,00	$ 3.768,00	$ 2.479.344,00	590,37	$ 2.224.514,16	590,37	$ 2.224.514,16	-	$ -	590,37	$ 2.224.514,16	100%	-	$ -	
1,07	EXCAVACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE TUBERIA EXISTENTE EN DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIA SOBRANTE	ML	134,00	$ 17.350,00	$ 2.324.900,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
1,08	TALA, CORTE DE ARBOLES DE ALTURA MAYORES A H>3,0, INCLUYE TRASLADO, EXCAVACIÓN, Y ADECUACIÓN DEL TERRENO,	UND	3,00	$ 273.960,00	$ 821.880,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
1,09	TRANSPLANTE Y PODA DE ARBUSTOS DE ALTURA MAYOR A METRO, INCLUYE TRANSPORTE Y ABONO PARA SU RESIEMBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CONSERVACIÓN	UND	18,00	$ 84.907,00	$ 1.528.326,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
1,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM	M3/KM	10205,00	$ 2.048,00	$ 20.899.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
1,11	EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN VARIOS DIAMETROS, ASI COMO LA ADECUACIÓN DEL TERRENO PARA LA DISPOCISIÓN DE LA TUBERIA A REEMPLAZAR EN VARIOS DIAMETROS, INCLUYE EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SOBRANTE, BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA	ML	134,00	$ 19.221,00	$ 2.575.614,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
1,12	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y TRAZADO DE LOS DISEÑOS, ASI COMO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	m2	940,00	$ 3.803,00	$ 3.574.820,00	1.311,94	$ 4.989.307,82	1.311,94	$ 4.989.307,82	-	$ -	1.311,94	$ 4.989.307,82	100%	-	$ -	
1,13	SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA DE SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T	M3	260,00	$ 89.495,00	$ 23.268.700,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
1,14	SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN	M3	190,00	$ 90.851,00	$ 17.261.690,00	104,65	$ 9.507.557,15	104,65	$ 9.507.557,15	-	$ -	104,65	$ 9.507.557,15	100%	-	$ -	
1,15	SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	120,00	$ 77.348,00	$ 9.281.760,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
	SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES:				$ 103.980.501,00	-	**$ 38.100.683,41**	-	**$ 38.100.683,41**	-	$ -	-	**$ 38.100.683,41**		-	$ -	
2	URBANISMO					-		-		-	$ -	-	$ -				
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ADOQUIN EN CONCRETO DE 10X20X8 CM PARA SENDERO PEATONAL GUITARRA AMARILLO Y GRIS, NO INCLUYE LA ARENA DE CIMENTACIÓN Y SELLO	M2	875,00	$ 80.885,00	$ 70.774.375,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSETA TACTIL OCRE Y GUIA AMARILLA NO INCLUYE EL MORTERO DE PEGA	M2	100,00	$ 69.421,00	$ 6.942.100,00	89,00	$ 6.178.469,00	89,00	$ 6.178.469,00	-	$ -	89,00	$ 6.178.469,00	100%	-	$ -	
2.3	VIGA CONFINAMIENTO ENLACE H=10-20 CM 3100PSI	ML	190,00	$ 31.006,00	$ 5.891.140,00	297,20	$ 9.214.983,20	297,20	$ 9.214.983,20	-	$ -	297,20	$ 9.214.983,20	100%	-	$ -	
2.4	CONTENEDOR DE RAÍCES EN BLOQUE MACIZO #4 DE 10X20X30 CM, ALCORQUE PREFABRICADO SEGÚN INDICACIÓN DEL DISEÑO O DE LA INTERVENTORIA, ARENA NEGRA Y LECHO FILTRANTE.	UND	3,00	$ 192.612,00	$ 577.836,00	4,00	$ 770.448,00	-	$ -	4,00	$ 770.448,00	4,00	$ 770.448,00	100%	-	$ -	
2.5	CONCRETO CLASE D (21 MPA), CANALES E= 0,15, Y CUNETAS A=40CM E=5CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO 420 MPA, INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO,	ML	190,00	$ 41.134,00	$ 7.815.460,00	175,76	$ 7.229.711,84	175,76	$ 7.229.711,84	-	$ -	175,76	$ 7.229.711,84	100%	-	$ -	
	SUBTOTAL CAP. 2 URBANISMO				$ 92.000.911,00	-	**$ 23.393.612,04**	-	**$ 22.623.164,04**	-	**$ 770.448,00**	-	**$ 23.393.612,04**		-	$ -	
3	CONSTRUCCIÓN CASETA					-		-		-	$ -	-	$ -				
3.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LADRILLO SOGA LIMPIO 2C PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO, SEGÚN DISEÑO O LO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, INCLUYE CONCRETO DE PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100,00	$ 69.331,00	$ 6.933.100,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
3.02	ZAPATA EN CONCRETO DE 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA, NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	M3	9,00	$ 621.476,00	$ 5.593.284,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
3.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60), SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORIA	kg	436,28	$ 9.746,00	$ 4.251.936,15	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
3.04	CONCRETO PARA COLUMNA AMARRE AL MURO DE 0,2x0,2	ML	30,00	$ 37.379,00	$ 1.121.370,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
3.05	CONCRETO DE VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	40,00	$ 59.700,00	$ 2.388.000,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
3.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2	M2	100,00	$ 54.444,00	$ 5.444.400,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
3.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	100,00	$ 75.379,00	$ 7.537.900,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533-6

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA:	No. 4926239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2023	% EJECUTADO	7,51%
VR. INICIAL	$ 568.272.895,61	FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	% ACUMULADO	100,00%
VR. ADICIONES	$ -	PLAZO	150 DIAS		
VR. TOTAL	$ 568.272.895,61				
INTERVENTOR:	ING. MANUEL TORRES				

VR PRESENTE ACTA	$ 42.649.430,51
VR. ACUMULADO	$ 568.272.895,61
FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los (30) dias del mes de NOVIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY O. QUINTERO CAMARGO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA FINAL de obra de las siguientes actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 y el 30 de NOVIEMBRE DE 2023, según las condiciones que se detallan a continuación:

	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 4		ACUMULADO ANTERIOR ACTA PARCIAL No. 3		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
3.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESON EN CONCRETO PULIDO Y A LA VISTA VACIADO IN SITU, INCLUYE LA ESTRUCTURA DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	20,00	$ 121.062,00	$ 2.421.240,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
3.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 VAI. CON MARCO INCLUYE LA ESTRUCTURA DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	2,00	$ 465.625,00	$ 931.250,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTAS LM EMTAMB. CAL 20 2.0X1.20 CON MARCO INCLUYE LA ESTRUCTURA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	10,00	$ 851.245,00	$ 8.512.450,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
	SUBTOTAL CAP. 3 CONSTRUCCIÓN CASETA				$ 45.134.930,15	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4	**PERGOLA**					-		-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4.01	Suministro, transporte e instalación de estructura metalica para cubierta pergola zona, acorde a diseño.	kg	4810,00	$ 13.377,00	$ 64.343.370,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4.02	Suministro e instalación de cubierta en teja policarbonato alveolar, incluye polarización, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	222,00	$ 69.360,00	$ 15.397.920,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA LAM HR 0,11- 0.15X0.11-0.15 X 1/8	kg	429,00	$ 10.367,00	$ 4.447.443,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4.04	CONCRETO CLASE F (14 MPA), SOLADOS DE E=0.05 M. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	m2	1,59	$ 27.862,00	$ 44.216,99	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4.05	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 21,0 MPA SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA, NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	m3	6,67	$ 571.993,00	$ 3.812.562,14	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4.06	PEDESTAL EN CONCRETO 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	m3	0,86	$ 885.567,00	$ 758.753,81	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4.07	RELLENO COMPACTADO CON SALTARIN PARA ESTRUCTURAS, EN MATERIAL DE PRESTAMO ROCA MUERTA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	22,81	$ 25.655,00	$ 585.103,32	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4.08	CONCRETO 3000 PSI 21,0 MPA PARA LOSAS DE PISO, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	M2	3,05	$ 59.805,00	$ 182.357,41	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60), SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	kg	872,55	$ 9.746,00	$ 8.503.872,30	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PERNOS ROSCADOS GRADO 7, INCLUYE AMARRE AL ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	und	48,00	$ 34.398,00	$ 1.651.104,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
	SUBTOTAL CAP. 4 PERGOLA				$ 99.726.702,97	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -				
5	**MOBILIARIO Y PINTURA**					-		-		-	$ -	-	$ -				
5.01	RESTAURACION DE BANCA EN MADERA 1.80X0.80 M, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	12,00	$ 411.715,00	$ 4.940.580,00	9,00	$ 3.705.435,00	9,00	$ 3.705.435,00	-	$ -	9,00	$ 3.705.435,00	100%	-	$ -	
5.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO DE HIERRO COLOR NEGRO D-14, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	12,00	$ 373.495,00	$ 4.481.940,00	10,00	$ 3.734.950,00	10,00	$ 3.734.950,00	-	$ -	10,00	$ 3.734.950,00	100%	-	$ -	
5.03	JARDINERA MATERA EN CONCRETO 1.20x.40x0.40 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	12,00	$ 1.059.764,00	$ 12.717.168,00	5,00	$ 5.298.820,00	-		5,00	$ 5.298.820,00	5,00	$ 5.298.820,00	100%	-	$ -	
5.04	RESATURANCION BUSTO PRATIMONIO SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	1,00	$ 364.045,00	$ 364.045,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
5.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA [3M], INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	500,00	$ 10.529,00	$ 5.264.500,00	277,68	$ 2.923.692,72	-		277,68	$ 2.923.692,72	277,68	$ 2.923.692,72	100%	-	$ -	
5.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA VENTANA PUERTAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	50,00	$ 10.222,00	$ 511.100,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
5.07	PINTURA MANO DE OBRA [3M] INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	500,00	$ 6.276,00	$ 3.138.000,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
5.08	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	500,00	$ 1.758,00	$ 879.000,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
5.09	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	500,00	$ 2.876,00	$ 1.438.000,00	277,68	$ 798.607,68	-		277,68	$ 798.607,68	277,68	$ 798.607,68	100%	-	$ -	
	SUBTOTAL CAP. 5 MOBILIARIO Y PINTURA				$ 33.734.333,00	-	$ 16.461.505,40	-	$ 7.440.385,00	-	$ 9.021.120,40	-	$ 16.461.505,40		-	$ -	
6	**AGUAS LLUVIAS**					-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
6.01	CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO], INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA BORDES DE TAPA, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	UND	2,00	$ 345.270,00	$ 690.540,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
6.02	TAPA CAJA MARCO CON BORDE EN ANGULO 71X71 - 80X80 EN CONCRETO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	UND	2,00	$ 161.040,00	$ 322.080,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC NOVALOC 24" PARA TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4 Y RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	ML	90,00	$ 144.189,00	$ 12.977.010,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
6.04	EMPALME TUB 15"-25" CAMARA CONCRETO, INCLUYE DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS ASI COMO EL RESANE Ym EMBOQUILLADO Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	2,00	$ 144.175,00	$ 288.350,00	2,00	$ 288.350,00	2,00	$ 288.350,00	-	$ -	2,00	$ 288.350,00	100%	-	$ -	

ALCALDÍA
EL CERRITO
"Trabajando juntos por el progreso"

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533-6

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA:	No. 4926239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2023	% EJECUTADO	7,51%
VR. INICIAL	$ 568,272,895,61	FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	% ACUMULADO	100,00%
VR. ADICIONES	$ -	PLAZO	150 DIAS		
VR. TOTAL	$ 568,272,895,61				
INTERVENTOR:	ING. MANUEL TORRES				

VR PRESENTE ACTA	$ 42,649,430,51
VR. ACUMULADO	$ 568,272,895,61
FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los (30) días del mes de NOVIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY D. QUINTERO CAMARGO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA FINAL de obra de las siguientes actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 y el 30 de NOVIEMBRE DE 2023, según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 4		ACUMULADO ANTERIOR ACTA PARCIAL No. 3		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3", INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA, EQUIPOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	ML	40,00	$ 26.649,00	$ 1.065.960,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA SANITARIA 4" PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA, EQUIPOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	UND	20,00	$ 17.381,00	$ 347.620,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		-	$ -	
	SUBTOTAL CAP. 6 AGUAS LLUVIAS				$ 15.691.560,00	-	$ 288.350,00	-	$ 288.350,00	-	$ -	-	$ 288.350,00				
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN**					-					$ -		$ -				
7,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 50W ALURBAN S, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	8,00	$ 2.266.131,00	$ 18.129.048,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X16	ML	190,00	$ 4.136,00	$ 785.840,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEBRAZO ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16X1 1/4"	UND	8,00	$ 69.600,00	$ 556.800,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE PERFORACION	UND	16,00	$ 9.882,00	$ 158.112,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDA GRILLETE DIAMETROS 5-6" 6-7" - T 3/8"	UND	16,00	$ 29.812,00	$ 476.992,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE GALVANIZADO 4 MTS 3" ANCLAJE PISO	UND	4,00	$ 1.127.278,00	$ 4.509.112,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF	HC	48,00	$ 102.511,00	$ 4.920.528,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA IP65	UND	8,00	$ 34.201,00	$ 273.608,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA AISLANTE ROLLO	UND	3,00	$ 26.610,00	$ 79.830,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRE COBRE THWN #12	ML	78,00	$ 2.024,00	$ 157.872,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "GRAPA GALV-GRUESA 3/4""	UND	18,00	$ 633,00	$ 11.394,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SWITCHE DOBLE AMBIA	UND	2,00	$ 18.510,00	$ 37.020,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "ADAPTADOR EMT ,3/4""	UND	12,00	$ 1.165,00	$ 13.980,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "UNION 3/4"" EMT"	UND	12,00	$ 3.058,00	$ 36.696,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "CURVA EMT MET ,3/4""	UND	6,00	$ 4.962,00	$ 29.772,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "CAJA RAWELT 3/4""	UND	6,00	$ 7.315,00	$ 43.890,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "TUBO EMT 3/4""X 3 MT"	UND	7,00	$ 37.169,00	$ 260.183,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT	ML	45,00	$ 45.567,00	$ 2.050.515,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DECABLE COBRE DESNUDO #4	ML	9,00	$ 5.905,00	$ 53.145,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETAPA REGISTRO A TIERRA 20	UND	3,00	$ 42.307,00	$ 126.921,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEVARILLA COBRE	UND	3,00	$ 173.901,00	$ 521.703,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEHIERR,DE 37000 PSI 259 MPA	KLS	4,00	$ 3.822,00	$ 15.288,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMEZCLA CONCRETO 3000 PSI (21 MPA)	M3	1,00	$ 328.006,00	$ 328.006,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEALAMBRE COBRE THWN #14	ML	24,00	$ 1.388,00	$ 33.312,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	0,50	$ 9.459,00	$ 4.729,50	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W	UND	4,00	$ 31.392,00	$ 125.568,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "TUBO PVC ,1/2"" X 3 MTS	UND	6,00	$ 6.273,00	$ 37.638,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA 2x 4 PVC	UND	4,00	$ 2.194,00	$ 8.776,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE P-T AMBIA	UND	4,00	$ 19.144,00	$ 76.576,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON 30X30	UND	8,00	$ 81.303,00	$ 650.424,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	400,00	$ 4.443,00	$ 1.777.200,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W IP65 EXTERIOR DECO SYLVANIA	UND	30,00	$ 297.065,00	$ 8.911.950,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 8	ML	250,00	$ 3.526,00	$ 881.500,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
7,34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ,1/2"	ML	130,00	$ 6.001,00	$ 780.130,00	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -		-	$ -	
	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN				$ 46.864.056,50	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -				
	ITEMS ADICIONALES										$ -		$ -				
AD-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	UND		$ 600.000,00		1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	-	$ -	1,00	$ 600.000,00	100%	-	$ -	
AD-03	AJUSTES AL DISEÑO ARQUITECTONICO Y CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTES	M2		$ 7.072,05		1.311,94	$ 9.278.105,28	1.311,94	$ 9.278.105,28	-	$ -	1.311,94	$ 9.278.105,28	100%	-	$ -	
AD-04	AJUSTES A LOS DISEÑOS ELECTRICOS	UND		$ 3.124.533,33		1,00	$ 3.124.533,33	1,00	$ 3.124.533,33	-	$ -	1,00	$ 3.124.533,33	100%	-	$ -	
AD-05	CERRAMIENTO TELA VERDE + POSTE DE GUADUA DE 2m DE ALTURA LIBRE ENTERRADO MINIMO 50 CM, SEPARACIÓN ENTRE POSTES 3M	ML		$ 13.038,81		80,00	$ 1.043.104,80	80,00	$ 1.043.104,80	-	$ -	80,00	$ 1.043.104,80	100%	-	$ -	

ALCALDÍA
EL CERRITO
Tierra de gente con el propósito

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533-6

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA:	No. 4925239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2023	% EJECUTADO	7,51%
VR. INICIAL	$ 568,272,895,61	FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	% ACUMULADO	100,00%
VR. ADICIONES	$ -	PLAZO	150 DIAS		
VR. TOTAL	$ 568,272,895,61				
INTERVENTOR:	ING. MANUEL TORRES				

VR PRESENTE ACTA	$ 42,649,430,51
VR. ACUMULADO	$ 568,272,895,61
FECHA DE ELABORACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los (30) dias del mes de NOVIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY O. QUINTERO CAMARGO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA FINAL de obra de las siguientes actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 y el 30 de NOVIEMBRE DE 2023, según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 4		ACUMULADO ANTERIOR ACTA PARCIAL No. 3		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
AD-06	DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E:7,6 a 12 cms (SECCION DE ANDEN/CONTRAPISO)	M2		$ 5.805,18		994,71	$ 5.774.470,60	994,71	$ 5.774.470,60	-	$ -	994,71	$ 5.774.470,60	100%	-	$ -	
AD-07	DEMOLICION DE ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2		$ 8.162,51		994,71	$ 8.119.330,32	994,71	$ 8.119.330,32	-	$ -	994,71	$ 8.119.330,32	100%	-	$ -	
AD-08	DESMONTE DE VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND		$ 4.145,63		8,00	$ 33.165,04	6,00	$ 24.873,78	2,00	$ 8.291,26	8,00	$ 33.165,04	100%	-	$ -	
AD-09	DESMONTE DE MARCO PUERTA + NAVE SENCILLA	UND		$ 22.110,03		4,00	$ 88.440,12	2,00	$ 44.220,06	2,00	$ 44.220,06	4,00	$ 88.440,12	100%	-	$ -	
AD-10	DESMONTE DE SILLETERIA METALICA- MADERA	UND		$ 5.875,12		9,00	$ 52.876,08	9,00	$ 52.876,08	-	$ -	9,00	$ 52.876,08	100%	-	$ -	
AD-11	DEMOLICION DE BARANDA EN CONCRETO	ML		$ 7.478,03		22,45	$ 167.881,77	22,45	$ 167.881,77	-	$ -	22,45	$ 167.881,77	100%	-	$ -	
AD-12	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 115.777,80		10,25	$ 1.186.722,45	10,25	$ 1.186.722,45	-	$ -	10,25	$ 1.186.722,45	100%	-	$ -	
AD-13	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INLCUYE CARGUE, TRANSPORTE A UNA DISTANCIA DE 25 KM Y DISPOSICION FINAL AL SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE RECORRIDO DE 25 KM CONTADOS RADIALMENTE A PARTIR DEL LIMITE URBANO DEL MUNICIPIO.	M3		$ 58.212,89		759,77	$ 44.228.407,44	759,77	$ 44.228.407,44	-	$ -	759,77	$ 44.228.407,44	100%	-	$ -	
AD-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 20" PVC PARA RED DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA.	ML		$ 458.253,12		99,04	$ 45.385.389,00	99,04	$ 45.385.389,00	-	$ -	99,04	$ 45.385.389,00	100%	-	$ -	
AD-15	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1,50-2,00 MTS	UND		$ 1.935.078,76		3,00	$ 5.805.236,28	3,00	$ 5.805.236,28	-	$ -	3,00	$ 5.805.236,28	100%	-	$ -	
AD-16	RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. ST	M3		$ 111.555,56		718,31	$ 80.131.474,30	718,31	$ 80.131.474,30	-	$ -	718,31	$ 80.131.474,30	100%	-	$ -	
AD-17	INSTALACIÓN DE MURO EN BOARD 6MM, PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PUERTAS Y VENTANAS SEGÚN INDICACIONES DE LA INTERVENTORIA	M2		$ 43.272,91		5,76	$ 249.251,96	5,76	$ 249.251,96	-	$ -	5,76	$ 249.251,96	100%	-	$ -	
AD-18	TALA PALMA REAL,INCLUYE TALA,ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICICÓN EN EL BOTADERO OFICIAL	UND		$ 1.960.000,00		1,00	$ 1.960.000,00	1,00	$ 1.960.000,00	-	$ -	1,00	$ 1.960.000,00	100%	-	$ -	
AD-19	ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 9 ARBOLES. INCLUYE TALA, ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO ESPECIAL	GLB		$ 11.396.510,08		1,00	$ 11.396.510,08	1,00	$ 11.396.510,08	-	$ -	1,00	$ 11.396.510,08	100%	-	$ -	
AD-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES SEGÚN DISEÑO	M2		$ 124.181,45		823,50	$ 102.263.424,08	699,98	$ 86.923.910,46	123,53	$ 15.339.513,61	823,50	$ 102.263.424,08	100%	-	$ -	
AD-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES GRIS	M2		$ 110.595,24		223,00	$ 24.662.737,41	189,55	$ 20.963.327,74	33,45	$ 3.699.410,61	223,00	$ 24.662.737,41	100%	-	$ -	
AD-22	ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI e=8 DILATADO CADA 1,20 m, incluye malla electrosoldada 5mm 15x15	M2		$ 57.908,49		67,76	$ 3.923.959,61	-	$ -	67,76	$ 3.923.959,61	67,76	$ 3.923.959,61	100%	-	$ -	
AD-23	TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI	ML		$ 29.243,24		42,80	$ 1.251.610,67	42,80	$ 1.251.610,67	-	$ -	42,80	$ 1.251.610,67	100%	-	$ -	
AD-24	IMPRIMACION	M2		$ 3.385,11		22,60	$ 76.503,49	22,60	$ 76.503,49	-	$ -	22,60	$ 76.503,49	100%	-	$ -	
AD-25	CARPETA ASFALTICA	M3		$ 1.469.569,56		2,26	$ 3.321.227,21	2,26	$ 3.321.227,21	-	$ -	2,26	$ 3.321.227,21	100%	-	$ -	
AD-26	SUMIDERO SENCILLO	UND		$ 654.688,76		5,00	$ 3.273.443,80	5,00	$ 3.273.443,80	-	$ -	5,00	$ 3.273.443,80	100%	-	$ -	
AD-27	TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML		$ 34.198,18		43,60	$ 1.491.040,65	43,60	$ 1.491.040,65	-	$ -	43,60	$ 1.491.040,65	100%	-	$ -	
	ITEMS ADICIONALES						$ 358.888.845,77		$ 335.673.451,55		$ 23.015.395,15		$ 358.888.845,77				
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 437.132.996,62		$ 437.132.996,62		$ 404.326.034,90		$ 32.806.963,55		$ 437.132.996,62	######			
		ADMINISTRACION		23,0%	$ 100.540.589,22		$ 100.540.589,22		$ 92.994.987,82		$ 7.545.601,62		$ 100.540.589,22				
		IMPREVISTO		1,0%	$ 4.371.329,97		$ 4.371.329,97		$ 4.043.260,34		$ 328.069,64		$ 4.371.329,97				
		UTILIDAD		4,0%	$ 17.485.319,86		$ 17.485.319,86		$ 16.173.041,36		$ 1.312.278,54		$ 17.485.319,86				
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+U)					$ 122.397.239,05		$ 113.211.289,52		$ 9.185.949,79		$ 122.397.239,05				
		PGIO		1,0%	$ 4.371.329,97		$ 4.371.329,97		$ 4.043.070,79	7,51%	$ 328.258,59		$ 4.371.329,38				
		PAGA		1,0%	$ 4.371.329,97		$ 4.371.329,97		$ 4.043.070,79	7,51%	$ 328.258,59		$ 4.371.329,38				
	VALOR TOTAL				$ 568.272.895,61		$ 568.272.895,61		$ 525.623.485,10		$ 42.649.430,51		$ 568.272.894,42				

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR FACTURADO	VALOR FACTURADO ACUMULADO	VR. NETO A PAGAR	PAGADO ACUMULADO		SALDO POR FACTURAR	
1	ACTA PARCIAL No. 1		$ 26.328.396,90	$ 26.328.396,90	$ 26.328.129,80	$ 26.328.396,90	4,63%	$ 541.944.765,82	95,37%
2	ACTA PARCIAL No. 2		$ 259.005.025,00	$ 285.333.421,90	$ 259.005.025,00	$ 285.333.421,90	50,21%	$ 282.939.740,82	49,79%
2	ACTA PARCIAL No. 3		$ 240.290.043,20	$ 525.623.465,10	$ 240.290.043,20	$ 525.623.465,10	92,49%	$ 42.649.319,73	7,51%
	ACTA PARCIAL No. 4		$ 42.649.430,51	$ 568.272.895,61	$ 42.649.430,51	$ 568.272.895,61	100,00%	$ -	
	TOTAL		$ 42.649.430,51	$ 568.272.895,61	$ 42.649.430,51	$ 568.272.895,61	100,00%	$ -	

CONTRATISTA

NOMBRE: ARQ. YUDY O. QUINTERO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL
JCB CONSULTORIAS SAS

INTERVENTOR

NOMBRE: ING. MANUEL TORRES
CARGO: INTERVENTOR

SUPERVISOR

NOMBRE: ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
MUNICIPIO EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA


NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE NIT: 890100633-6	Vigencia a partir de 29/04/2010			JCB

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1

ITEM Nº:	2.40	DESCRIPCION ITEM	CONTENEDOR DE RAÍCES EN BLOQUE MACIZO #4 DE 10X20X30 CM, ALCORQUE PREFABRICADO SEGÚN INDICACIÓN DEL DISEÑO O DE LA INTERVENTORIA, ARENA NEGRA Y LECHO FILTRANTE.	UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

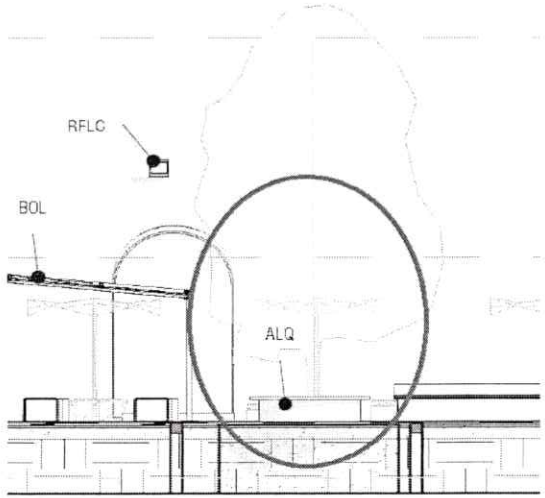


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad de elementos	Subtotal	(ml) MEDIDA TOTAL
	Longitud					
Cr 11 / Calle 5 y 6				4,00	4,00	4,00
(I)TOTAL						4,00

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
EL CERRITO	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja___ 1	de ____ 1
ITEM Nº: 5,03	DESCRIPCION ITEM: JARDINERA MATERA EN CONCRETO 1.20x.40x0.40 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

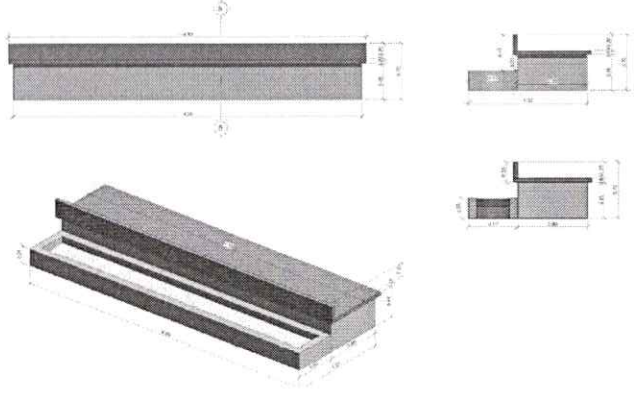

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Area		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
PASAJE PEATONAL				5,00	5,00	5,00
				(I)TOTAL		5,00


Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE NIT. 800100633-3	Vigencia a partir de 29/04/2010			JCB

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: 5,05	DESCRIPCION ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA [3M], INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Ancho		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
PASAJE PEATONAL	19,2		3,45	1,00	66,24	66,24
	30		3,00	1,00	90,00	90,00
	35,2		3,45	1,00	121,44	121,44
					0,00	0,00
					0,00	0,00
(I)TOTAL						277,68


Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
ALCALDÍA EL CERRITO	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: 5,05	DESCRIPCION ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA [3M], INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Ancho		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
PASAJE PEATONAL	19,2		3,45	1,00	66,24	66,24
	30		3,00	1,00	90,00	90,00
	35,2		3,45	1,00	121,44	121,44
					0,00	0,00
					0,00	0,00
(I)TOTAL						277,68

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE NIT. 890106533-5	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-09	DESCRIPCION ITEM: DESMONTE DE MARCO PUERTA + NAVE SENCILLA	UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

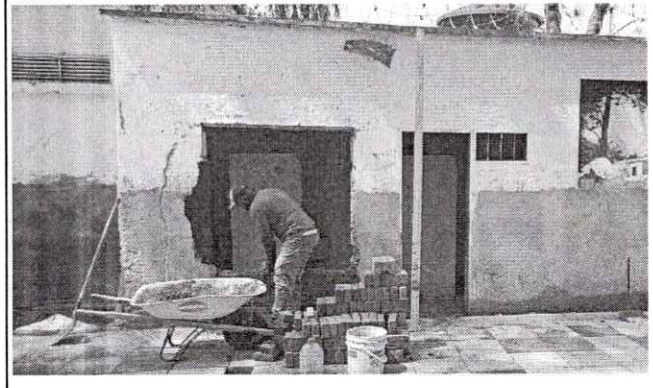


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Area		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
DESMONTE DE MARCO PUERTA + NAVE SENCILLA				2,00	2,00	
						2,00
(I)TOTAL						2,00

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO / ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE NIT. 890100533-5	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-08	DESCRIPCION ITEM: DESMONTE DE VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

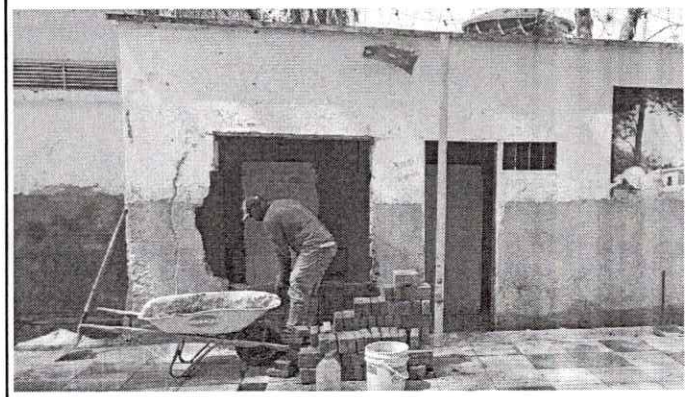


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Area		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
Puerta baños existente+				2,00	2,00	
						2,00
(I)TOTAL						2,00

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-20	DESCRIPCION ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES SEGÚN DISEÑO	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

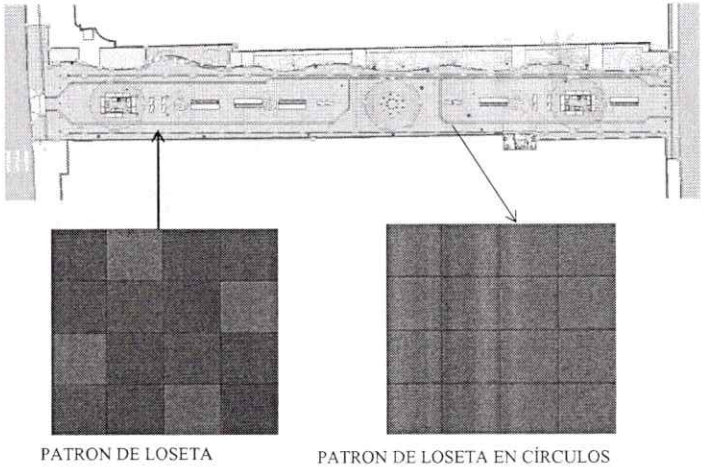

PATRON DE LOSETA

PATRON DE LOSETA EN CÍRCULOS


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES AREA	Cantidad de elementos	Subtotal	CANTIDAD TOTAL
LOCETA OCRE	377,5	1,00	377,50	
LOCETA ROJO	223	1,00	223,00	
LOCETA VERDE	223	1,00	223,00	
				823,50
(I)TOTAL AVANCE (15% RESTANTE)				123,53

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
	Vigencia a partir de **29/04/2010**			

CONTRATO No. :	4926239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.			**CORTE Nº:**	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS			**PERIODO**	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA				
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO			**Hoja** 1	**de** 1
ITEM Nº: AD-021	**DESCRIPCION ITEM**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES GRIS		**UND:**	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

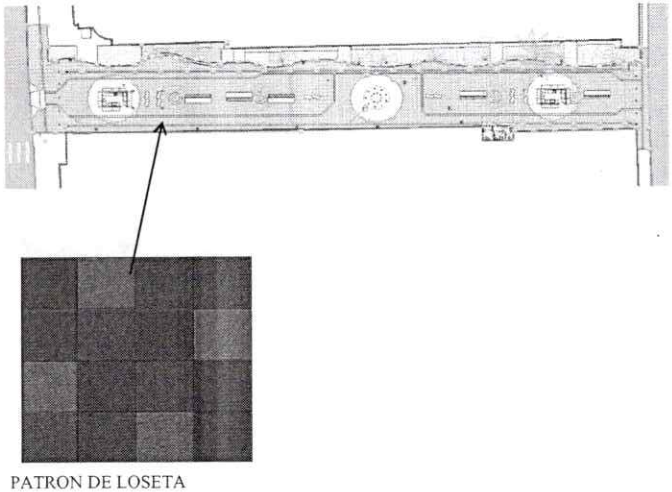

PATRON DE LOSETA


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES AREA	Cantidad de elementos	Subtotal	CANTIDAD TOTAL
LOSETA GRIS	223,0	1,00	223,00	
				223,00
			(I)TOTAL AVANCE (15% RESTANTE)	33,45

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	**DIRECTOR DE OBRA** ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	**SUPERVISOR** ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.			CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS			PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA				
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO			Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-22	DESCRIPCION ITEM	ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI e=8 DILATADO CADA 1,20 m, Incluye malla electrosoldada 5mm 15x15		UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

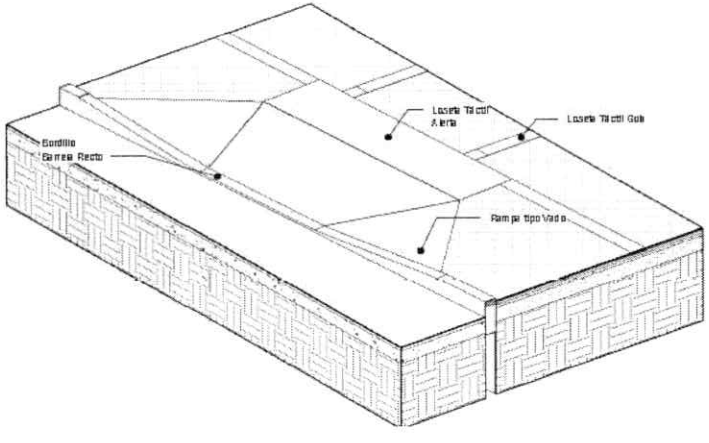

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES CANTIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	Subtotal	CANTIDAD TOTAL
calle 5	1,0	1,85	9,85	0,08	18,22	18,22
acceso a escula de baile	1,0	1,40	2,75	0,08	3,85	3,85
acceso a asocomunal	1,0	1,60	2,30	0,08	3,68	3,68
calle 6	1,0	1,90	15,00	0,08	28,50	28,50
entre accesos	1,0	0,80	16,89	0,08	13,51	13,51
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	
(I)TOTAL						67,76

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

ALCALDÍA
EL CERRITO
Juntos por el progreso

ALCALDIA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533-5

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

ACTA DE MODIFICACION No. 4.

CONTRATO DE OBRA: No. 4926239

OBJETO: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: JCB CONSULTORIAS SAS
VR. INICIAL $ 568.272.895,61
VR. ADICIONES $ -
VR. TOTAL $ 568.272.895,61
INTERVENTOR: ING. MANUEL TORRES

FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE
PLAZO 150 DIAS

FECHA DE ELABORACION: 30 NOVIEMBRE DE 2023

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los treinta(30) días del mes de NOVIIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY QUINTERO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE MODIFICACION No. 4 de los ajustes a las cantidades de obra, así como de la inclusion de ITEMS ADICIONALES según las condiciones que se detallan a continuación:

	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					+/- CANTIDADES ACTA MODIF. No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 3		+/- CANTIDADES PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT.	VALOR	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.
1	**PRELIMINARES**												
1,01	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	940,00	$ 14.328,00	$ 13.468.320,00			994,71	$ 14.252.204,88			994,71	$ 14.252.204,88
1,02	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	5,00	$ 12.763,00	$ 63.815,00			65,28	$ 833.168,64			65,28	$ 833.168,64
1,03	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE TEJAS DE BARRO, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, CABALLETES, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	20,00	$ 12.763,00	$ 255.260,00			9,68	$ 123.545,84			9,68	$ 123.545,84
1,04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO, VIGA DE JARDINERA ENTRE OTROS ELEMENTOS, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	24,00	$ 4.948,00	$ 118.752,00			273,22	$ 1.351.892,56			273,22	$ 1.351.892,56
1,05	EXCAVACIONES MANUAL PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN ENTIBADO, NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	m3	260,00	$ 23.298,00	$ 6.057.480,00	-9,00	-209.682,00	206,82	$ 4.818.492,36			206,82	$ 4.818.492,36
1,06	EXCAVACIONES MECANICA PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO SIN ENTIBADO. NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	M3	658,00	$ 3.768,00	$ 2.479.344,00			590,37	$ 2.224.514,16			590,37	$ 2.224.514,16
1,07	EXCAVACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE TUBERIA EXISTENTE EN DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIA SOBRANTE	ML	134,00	$ 17.350,00	$ 2.324.900,00			-	$ -			-	$ -
1,08	TALA, CORTE DE ARBOLES DE ALTURA MAYORES A H>3.0, INCLUYE TRASLADO, EXCAVACIÓN, Y ADECUACIÓN DEL TERRENO.	UND	3,00	$ 273.960,00	$ 821.880,00			-	$ -			-	$ -
1,09	TRANSPLANTE Y PODA DE ARBUSTOS DE ALTURA MAYOR A METRO, INCLUYE TRANSPORTE Y ABONO PARA SU RESIEMBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CONSERVACIÓN	UND	18,00	$ 84.907,00	$ 1.528.326,00	-5,00	-424.535,00	-	$ -			-	$ -
1,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM	M3/KM	10205,00	$ 2.048,00	$ 20.899.840,00	-1943,65	-3.980.625,68	-	$ -			-	$ -
1,11	EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN VARIOS DIAMETROS, ASI COMO LA ADECUCIÓN DEL TERRENO PARA LA DISPOCISIÓN DE LA TUBERIA A REEMPLAZAR EN VARIOS DIAMETROS, INCLUYE EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SOBRANTE, BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA	ML	134,00	$ 19.221,00	$ 2.575.614,00			-	$ -			-	$ -
1,12	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y TRAZADO DE LOS DISEÑOS, ASI COMO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	m2	940,00	$ 3.803,00	$ 3.574.820,00			1.311,94	$ 4.989.307,82			1.311,94	$ 4.989.307,82
1,13	SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA DE SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T	M3	260,00	$ 89.495,00	$ 23.268.700,00	-262,39	-23.482.593,05	-	$ -			-	$ -
1,14	SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN	M3	190,00	$ 90.851,00	$ 17.261.690,00	-92,14	-8.371.011,14	104,65	$ 9.507.557,15			104,65	$ 9.507.557,15
1,15	SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	120,00	$ 77.348,00	$ 9.281.760,00	-65,60	-5.074.028,80	-	$ -			-	$ -
	SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES:				**$ 103.980.501,00**							-	$ -
2	**URBANISMO**											-	$ -
2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ADOQUIN EN CONCRETO DE 10X20X8 CM PARA SENDERO PEATONAL GUITARRA AMARILLO Y GRIS, NO INCLUYE LA ARENA DE CIMENTACIÓN Y SELLO	M2	875,00	$ 80.885,00	$ 70.774.375,00			-	$ -			-	$ -
2,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSETA TACTIL OCRE Y GUIA AMARILLA NO INCLUYE EL MORTERO DE PEGA	M2	100,00	$ 69.421,00	$ 6.942.100,00	30,88	2.143.910,62	89,00	$ 6.178.469,00			89,00	$ 6.178.469,00
2,3	VIGA CONFINAMIENTO ENLACE H=10-20 CM 3100PSI	ML	190,00	$ 31.006,00	$ 5.891.140,00	-56,68	-1.738.816,48	297,20	$ 9.214.983,20			297,20	$ 9.214.983,20
2,4	CONTENEDOR DE RAICES EN BLOQUE MACIZO #4 DE 10X20X30 CM. ALCORQUE PREFABRICADO SEGÚN INDICACIÓN DEL DISEÑO O DE LA INTERVENTORIA. ARENA NEGRA Y LECHO FILTRANTE.	UND	3,00	$ 192.612,00	$ 577.836,00	1,00	192.612,00	4,00	$ 770.448,00			4,00	$ 770.448,00
2,5	CONCRETO CLASE D (21 MPA), CANALES E= 0.15, Y CUNETAS A=40CM E=5CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO 420 MPA, INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO.	ML	190,00	$ 41.134,00	$ 7.815.460,00	175,76	7.229.711,84	175,76	$ 7.229.711,84			175,76	$ 7.229.711,84
	SUBTOTAL CAP. 2 URBANISMO				**$ 92.000.911,00**							-	$ -
3	**CONSTRUCCIÓN CASETA**											-	$ -
3,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LADRILLO SOGA LIMPIO 2C PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO, SEGÚN DISEÑO O LO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, INCLUYE CONCRETO DE PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	100,00	$ 69.331,00	$ 6.933.100,00			-	$ -			-	$ -
3,02	ZAPATA EN CONCRETO DE 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORIA, NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	M3	9,00	$ 621.476,00	$ 5.593.284,00			-	$ -			-	$ -
3,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60). SEGUN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	kg	436,28	$ 9.746,00	$ 4.251.936,15			-	$ -			-	$ -
3,04	CONCRETO PARA COLUMNA AMARRE AL MURO DE 0.2x0.2	ML	30,00	$ 37.379,00	$ 1.121.370,00			-	$ -			-	$ -
3,05	CONCRETO DE VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	40,00	$ 59.700,00	$ 2.388.000,00			-	$ -			-	$ -
3,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTRAMADO METAL CF,PER,CHR 4X2-TUB,1.1/2	M2	100,00	$ 54.444,00	$ 5.444.400,00			-	$ -			-	$ -
3,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	100,00	$ 75.379,00	$ 7.537.900,00			-	$ -			-	$ -
3,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESON EN CONCRETO PULIDO Y A LA VISTA VACIADO IN SITU, INCLUYE LA ESTRUCTURA DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	20,00	$ 121.062,00	$ 2.421.240,00			-	$ -			-	$ -
3,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 VAI. CON MARCO INCLUYE LA ESTRUCTURA DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	2,00	$ 465.625,00	$ 931.250,00			-	$ -			-	$ -
3,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTAS LM EMTAMB. CAL 20 2.0X1.20 CON MARCO INCLUYE LA ESTRUCTURA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	10,00	$ 851.245,00	$ 8.512.450,00			-	$ -			-	$ -
	SUBTOTAL CAP. 3 CONSTRUCCIÓN CASETA				**$ 45.134.930,15**							-	$ -
4	**PERGOLA**											-	$ -

LAB

ALCALDÍA
EL CERRITO
Juntos por el progreso

ALCALDIA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533-5

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

ACTA DE MODIFICACION No. 4.

CONTRATO DE OBRA: No. 4926239

OBJETO: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: JCB CONSULTORIAS SAS

VR. INICIAL $ 568.272.895,61

VR. ADICIONES $ -

VR. TOTAL $ 568.272.895,61

INTERVENTOR: ING. MANUEL TORRES

FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE

PLAZO 150 DIAS

FECHA DE ELABORACION: 30 NOVIEMBRE DE 2023

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los treinta(30) dias del mes de NOVIIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY QUINTERO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE MODIFICACION No. 4 de los ajustes a las cantidades de obra, asi como de la inclusion de ITEMS ADICIONALES según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						+ / - CANTIDADES ACTA MODIF. No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 3		+ / - CANTIDADES PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT.	VALOR	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.
4.01	Suministro, transporte e instalación de estructura metalica para cubierta pergola zona, acorde a diseño.	kg	4810,00	$ 13.377,00	$ 64.343.370,00			0,00	$ -			-	$ -
4.02	Suministro e instalación de cubierta en teja policabornato alveolar, incluye polarización, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	222,00	$ 69.360,00	$ 15.397.920,00			-	$ -			-	$ -
4.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA LAM HR 0.11- 0.15X0.11-0.15 X 1/8	kg	429,00	$ 10.367,00	$ 4.447.443,00			-	$ -			-	$ -
4.04	CONCRETO CLASE F (14 MPA), SOLADOS DE E=0,05 M. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	m2	1,59	$ 27.862,00	$ 44.216,99			-	$ -			-	$ -
4.05	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 21,0 MPA, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	m3	6,67	$ 571.993,00	$ 3.812.562,14			-	$ -			-	$ -
4.06	PEDESTAL EN CONCRETO 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	m3	0,86	$ 885.567,00	$ 758.753,81			-	$ -			-	$ -
4.07	RELLENO COMPACTADO CON SALTARIN PARA ESTRUCTURAS, EN MATERIAL DE PRESTAMO ROCA MUERTA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	22,81	$ 25.655,00	$ 585.103,32			-	$ -			-	$ -
4.08	CONCRETO 3000 PSI 21,0 MPA PARA LOSAS DE PISO, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	M2	3,05	$ 59.805,00	$ 182.357,41			-	$ -			-	$ -
4.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60), SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	kg	872,55	$ 9.746,00	$ 8.503.872,30			-	$ -			-	$ -
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PERNOS ROSCADOS GRADO 7. INCLUYE AMARRE AL ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	und	48,00	$ 34.398,00	$ 1.651.104,00			-	$ -			-	$ -
	SUBTOTAL CAP. 4 PERGOLA				**$ 99.726.702,97**							-	$ -
5	**MOBILIARIO Y PINTURA**											-	$ -
5.01	RESTAURACION DE BANCA EN MADERA 1.80X0.80 M, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	12,00	$ 411.715,00	$ 4.940.580,00	9,00	3.705.435,00	9,00	$ 3.705.435,00			9,00	$ 3.705.435,00
5.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO DE HIERRO COLOR NEGRO D-14, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	12,00	$ 373.495,00	$ 4.481.940,00	10,00	3.734.950,00	10,00	$ 3.734.950,00			10,00	$ 3.734.950,00
5.03	JARDINERA MATERA EN CONCRETO 1.20x.40x0.40 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	12,00	$ 1.059.764,00	$ 12.717.168,00	5,00	5.298.820,00	5,00	$ 5.298.820,00			5,00	$ 5.298.820,00
5.04	RESATURANCION BUSTO PRATIMONIO SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	1,00	$ 364.045,00	$ 364.045,00			-	$ -			-	$ -
5.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA [3M], INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	500,00	$ 10.529,00	$ 5.264.500,00	274,81	2.893.474,49	274,81	$ 2.893.474,49	2,87	30.218,23	277,68	$ 2.923.692,72
5.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA VENTANA PUERTAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	50,00	$ 10.222,00	$ 511.100,00			-	$ -			-	$ -
5.07	PINTURA MANO DE OBRA [3M] INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	500,00	$ 6.276,00	$ 3.138.000,00			-	$ -			-	$ -
5.08	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	500,00	$ 1.758,00	$ 879.000,00	274,81	483.115,98	274,81	$ 483.115,98	-274,81	-483.115,98	-	$ -
5.09	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	500,00	$ 2.876,00	$ 1.438.000,00			-	$ -	277,68	796.607,68	277,68	$ 796.607,68
	SUBTOTAL CAP. 5 MOBILIARIO Y PINTURA				**$ 33.734.333,00**			-	$ -			-	$ -
6	**AGUAS LLUVIAS**							-	$ -			-	$ -
6.01	CAJA INSPECCION 80x80 CM (CONCRETO), INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA BORDES DE TAPA, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	UND	2,00	$ 345.270,00	$ 690.540,00			2,00	$ 690.540,00	-2,00	-690.540,00	-	$ -
6.02	TAPA CAJA MARCO CON BORDE EN ANGULO 71X71 - 80X80 EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	UND	2,00	$ 161.040,00	$ 322.080,00			2,00	$ 322.080,00	-2,00	-322.080,00	-	$ -
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC NOVALOC 24" PARA TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4 Y RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA, SEGUN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	ML	90,00	$ 144.189,00	$ 12.977.010,00			-	$ -			-	$ -
6.04	EMPALME TUB 15"-25" CAMARA CONCRETO, INCLUYE DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS ASI COMO EL RESANE Y m EMBOQUILLADO Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	2,00	$ 144.175,00	$ 288.350,00			2,00	$ 288.350,00			2,00	$ 288.350,00
6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA, EQUIPOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	ML	40,00	$ 26.649,00	$ 1.065.960,00	-40,00	-1.065.960,00	-	$ -			-	$ -
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA SANITARIA 4" PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA, EQUIPOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	UND	20,00	$ 17.381,00	$ 347.620,00	-20,00	-347.620,00	-	$ -			-	$ -
	SUBTOTAL CAP. 6 AGUAS LLUVIAS				**$ 15.691.560,00**							-	$ -
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN**											-	$ -
7.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 50W ALURBAN S. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	8,00	$ 2.266.131,00	$ 18.129.048,00			-	$ -			-	$ -
7.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X16	ML	190,00	$ 4.136,00	$ 785.840,00			-	$ -			-	$ -
7.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEBRAZO ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16X1 1/4"	UND	8,00	$ 69.600,00	$ 556.800,00			-	$ -			-	$ -
7.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE PERFORACION	UND	16,00	$ 9.882,00	$ 158.112,00			-	$ -			-	$ -
7.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDA GRILLETE DIAMETROS 5-6" 6-7" - T 3/8"	UND	16,00	$ 29.812,00	$ 476.992,00			-	$ -			-	$ -
7.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE GALVANIZADO 4 MTS 3" ANCLAJE PISO	UND	4,00	$ 1.127.278,00	$ 4.509.112,00			-	$ -			-	$ -

EL CERRITO
Puntos por el progreso

ALCALDIA MUNICIPAL
EL CERRITO VALLE
NIT. 800100533-5

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

ACTA DE MODIFICACION No. 4.

CONTRATO DE OBRA: No. 4926239

OBJETO: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: JCB CONSULTORIAS SAS
VR. INICIAL $ 568.272.895,61
VR. ADICIONES $ -
VR. TOTAL $ 568.272.895,61
INTERVENTOR: ING. MANUEL TORRES

FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE
PLAZO 150 DIAS

FECHA DE ELABORACION: 30 NOVIEMBRE DE 2023

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los treinta(30) dias del mes de NOVIIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY QUINTERO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE MODIFICACION No. 4 de los ajustes a las cantidades de obra, asi como de la inclusion de ITEMS ADICIONALES según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						+/- CANTIDADES ACTA MODIF. No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 3		+/- CANTIDADES PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT.	VALOR	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.
7,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF	HC	48,00	$ 102.511,00	$ 4.920.528,00			-	$ -			-	$ -
7,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA IP65	UND	8,00	$ 34.201,00	$ 273.608,00			-	$ -			-	$ -
7,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA AISLANTE ROLLO	UND	3,00	$ 26.610,00	$ 79.830,00			-	$ -			-	$ -
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRE COBRE THWN #12	ML	78,00	$ 2.024,00	$ 157.872,00			-	$ -			-	$ -
7,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "GRAPA GALV-GRUESA 3/4"""	UND	18,00	$ 633,00	$ 11.394,00			-	$ -			-	$ -
7,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SWITCHE DOBLE AMBIA	UND	2,00	$ 18.510,00	$ 37.020,00			-	$ -			-	$ -
7,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "ADAPTADOR EMT ,3/4"""	UND	12,00	$ 1.165,00	$ 13.980,00			-	$ -			-	$ -
7,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "UNION 3/4"" EMT"	UND	12,00	$ 3.058,00	$ 36.696,00			-	$ -			-	$ -
7,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "CURVA EMT MET ,3/4"""	UND	6,00	$ 4.962,00	$ 29.772,00			-	$ -			-	$ -
7,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "CAJA RAWELT 3/4"""	UND	6,00	$ 7.315,00	$ 43.890,00			-	$ -			-	$ -
7,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "TUBO EMT 3/4""X 3 MT"	UND	7,00	$ 37.169,00	$ 260.183,00			-	$ -			-	$ -
7,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT	ML	45,00	$ 45.567,00	$ 2.050.515,00			-	$ -			-	$ -
7,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DECABLE COBRE DESNUDO #4	ML	9,00	$ 5.905,00	$ 53.145,00			-	$ -			-	$ -
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETAPA REGISTRO A TIERRA 20	UND	3,00	$ 42.307,00	$ 126.921,00			-	$ -			-	$ -
7,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEVARILLA COBRE	UND	3,00	$ 173.901,00	$ 521.703,00			-	$ -			-	$ -
7,22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEHIERR.DE 37000 PSI 259 MPA	KLS	4,00	$ 3.822,00	$ 15.288,00			-	$ -			-	$ -
7,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMEZCLA CONCRETO 3000 PSI (21 MPA)	M3	1,00	$ 328.006,00	$ 328.006,00			-	$ -			-	$ -
7,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEALAMBRE COBRE THWN #14	ML	24,00	$ 1.388,00	$ 33.312,00			-	$ -			-	$ -
7,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	0,50	$ 9.459,00	$ 4.729,50			-	$ -			-	$ -
7,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W	UND	4,00	$ 31.392,00	$ 125.568,00			-	$ -			-	$ -
7,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "TUBO PVC ,1/2"" X 3 MTS	UND	6,00	$ 6.273,00	$ 37.638,00			-	$ -			-	$ -
7,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA 2x 4 PVC	UND	4,00	$ 2.194,00	$ 8.776,00			-	$ -			-	$ -
7,29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE P-T AMBIA	UND	4,00	$ 19.144,00	$ 76.576,00			-	$ -			-	$ -
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON.30X30	UND	8,00	$ 81.303,00	$ 650.424,00			-	$ -			-	$ -
7,31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	400,00	$ 4.443,00	$ 1.777.200,00			-	$ -			-	$ -
7,32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W IP65 EXTERIOR DECO SYLVANIA	UND	30,00	$ 297.065,00	$ 8.911.950,00			-	$ -			-	$ -
7,33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 8	ML	250,00	$ 3.526,00	$ 881.500,00			-	$ -			-	$ -
7,34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ,1/2"	ML	130,00	$ 6.001,00	$ 780.130,00			-	$ -			-	$ -
	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN				**$ 46.864.058,50**							$ -	$ -
	ITEMS ADICIONALES												
AD-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	UND		$ 600.000,00				1,00	$ 600.000,00	-	$ -	1,00	$ 600.000,00
AD-03	AJUSTES AL DISEÑO ARQUITECTONICO Y CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTES	M2		$ 7.072,05				1.311,94	$ 9.278.105,28	-	$ -	1.311,94	$ 9.278.105,28
AD-04	AJUSTES A LOS DISEÑOS ELECTRICOS	UND		$ 3.124.533,33				1,00	$ 3.124.533,33	-	$ -	1,00	$ 3.124.533,33
AD-05	CERRAMIENTO TELA VERDE + POSTE DE GUADUA DE 2m DE ALTURA LIBRE ENTERRADO MINIMO 50 CM, SEPARACIÓN ENTRE POSTES 3M	ML		$ 13.038,81				80,00	$ 1.043.104,80	-	$ -	80,00	$ 1.043.104,80
AD-06	DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E 7,6 a 12 cms (SECCION DE ANDEN/CONTRAPISO)	M2		$ 5.805,18				994,71	$ 5.774.470,60	-	$ -	994,71	$ 5.774.470,60
AD-07	DEMOLICION DE ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2		$ 8.162,51				994,71	$ 8.119.330,32	-	$ -	994,71	$ 8.119.330,32
AD-08	DESMONTE DE VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND		$ 4.145,63				6,00	$ 24.873,78	2,00	$ 8.291,26	8,00	$ 33.165,04
AD-09	DESMONTE DE MARCO PUERTA + NAVE SENCILLA	UND		$ 22.110,03				2,00	$ 44.220,06	2,00	$ 44.220,06	4,00	$ 88.440,12
AD-10	DESMONTE DE SILLETERIA METALICA- MADERA	UND		$ 5.875,12				9,00	$ 52.876,08	-	$ -	9,00	$ 52.876,08
AD-11	DEMOLICION DE BARANDA EN CONCRETO	ML		$ 7.478,03				22,45	$ 167.881,77	-	$ -	22,45	$ 167.881,77
AD-12	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 115.777,80				10,25	$ 1.186.722,45	-	$ -	10,25	$ 1.186.722,45
AD-13	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INLCUYE CARGUE, TRANSPORTE A UNA DISTANCIA DE 25 KM Y DISPOSICION FINAL AL SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE RECORRIDO DE 25 KM CONTADOS RADIALMENTE A PARTIR DEL LIMITE URBANO DEL MUNICIPIO.	M3		$ 58.212,89		-177,80	-10.350.472,16	759,77	$ 44.228.407,44	-	$ -	759,77	$ 44.228.407,44
AD-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 20" PVC PARA RED DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA.	ML		$ 458.253,12				99,04	$ 45.385.389,00	-	$ -	99,04	$ 45.385.389,00
AD-15	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1,50-2.00 MTS	UND		$ 1.935.078,76				3,00	$ 5.805.236,28	-	$ -	3,00	$ 5.805.236,28
AD-16	RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. ST	M3		$ 111.555,56		241,22	26.909.432,18	718,31	$ 80.131.474,30	-	$ -	718,31	$ 80.131.474,30
AD-17	INSTALACIÓN DE MURO EN BOARD 6MM, PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PUERTAS Y VENTANAS SEGUN INDICACIONES DE LA INTERVENTORIA	M2		$ 43.272,91				5,76	$ 249.251,96	-	$ -	5,76	$ 249.251,96
AD-18	TALA PALMA REAL INCLUYE TALA,ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO OFICIAL	UND		$ 1.960.000,00				1,00	$ 1.960.000,00	-	$ -	1,00	$ 1.960.000,00
AD-19	ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 9 ARBOLES, INCLUYE TALA, ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO ESPECIAL	GLB		$ 11.396.510,08				1,00	$ 11.396.510,08	-	$ -	1,00	$ 11.396.510,08
AD-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES SEGÚN DISEÑO	M2		$ 124.181,45		-261,50	-34.932.241,89	823,50	$ 102.263.424,08	-	$ -	823,50	$ 102.263.424,08
AD-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES GRIS	M2		$ 110.595,24		223,00		223,00	$ 24.662.737,41	-	$ -	223,00	$ 24.662.737,41
AD-22	ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI e=8 DILATADO CADA 1,20 m, Incluye malla electrosoldada 5mm 15x15	M2		$ 57.908,49		57,15		57,15	$ 3.309.560,86	10,61	$ 614.398,75	67,76	$ 3.923.959,61
AD-23	TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI	ML		$ 29.243,24		42,80		42,80	$ 1.251.610,67	-	$ -	42,80	$ 1.251.610,67
AD-24	IMPRIMACION	M2		$ 3.385,11		22,60		22,60	$ 76.503,49	-	$ -	22,60	$ 76.503,49
AD-25	CARPETA ASFALTICA	M3		$ 1.469.569,56		2,26		2,26	$ 3.321.227,21	-	$ -	2,26	$ 3.321.227,21
AD-26	SUMIDERO SENCILLO	UND		$ 654.688,76		5,00		5,00	$ 3.273.443,80	-	$ -	5,00	$ 3.273.443,80

ALCALDIA
EL CERRITO
Nuestro gran compromiso

ALCALDIA MUNICIPAL
EL CERRITO - VALLE
NIT. 800100533-5

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

ACTA DE MODIFICACION No. 4.

CONTRATO DE OBRA: No. 4926239

OBJETO: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2023
VR. INICIAL	$ 568.272.895,61	FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE
VR. ADICIONES	$ -	PLAZO	150 DIAS
VR. TOTAL	$ 568.272.895,61		
INTERVENTOR:	ING. MANUEL TORRES	FECHA DE ELABORACION:	30 NOVIEMBRE DE 2023

En el municipio de Cerrito - Valle del Cauca, a los treinta(30) días del mes de NOVIIEMBRE del año 2023, se reunieron ARQ. YUDY QUINTERO Representante Legal de JCB CONSULTORIAS SAS y ING. MANUEL TORRES en representación de la INTERVENTORIA, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE MODIFICACION No. 4 de los ajustes a las cantidades de obra, asi como de la inclusion de ITEMS ADICIONALES según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						+/- CANTIDADES ACTA MODIF. No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 3		+/- CANTIDADES PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT.	VALOR	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.	CANT.	VLR. UNIT.
AD-27	TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML		$ 34.198,18		43,60		43,60	$ 1.491.040,65	-	$ -	43,60	$ 1.491.040,65
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 437.132.996,62		-$ 37.386.124,11		$ 437.132.996,62		$ -		$ 437.132.996,62
		ADMINISTRACION		23,0%	$ 100.540.589,22		-$ 8.598.808,55		$ 100.540.589,22				$ 100.540.589,22
		IMPREVISTO		1,0%	$ 4.371.329,97		$ -		$ 4.371.329,97				$ 4.371.329,97
		UTILIDAD		4,0%	$ 17.485.319,86		-$ 1.495.444,96		$ 17.485.319,86				$ 17.485.319,86
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+U)			$ 122.397.239,05		$ -		$ 122.397.239,05				$ 122.397.239,05
		PGIO		1,0%	$ 4.371.329,97		$ -		$ 4.371.329,97				$ 4.371.329,97
		PAGA		1,0%	$ 4.371.329,97		$ -		$ 4.371.329,97				$ 4.371.329,97
TOTAL PRESUPUESTO					$ 568.272.895,61		$ -		$ 568.272.895,61				$ 568.272.895,61

NOMBRE: ARQ. YUDY O. QUINTERO CAMARGO
CARGO: R/L JCB CONSULTORIAS SAS

NOMBRE ING. MANUEL TORRES
CARGO INTERVENTOR


NOMBRE ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
CARGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
MUNICIPIO EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

NOTA: LA INFORMACION, LA CUANTIFICACION Y CALCULOS CONTENIDOS EN LAS ACTAS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRATISTA; LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	JCB
ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO- VALLE NIT. 800100633 6	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.			CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS			PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA				
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO			Hoja 1	de 1
ITEM Nº: 1,05	DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIONES MANUAL PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN ENTIBADO. NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.		UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

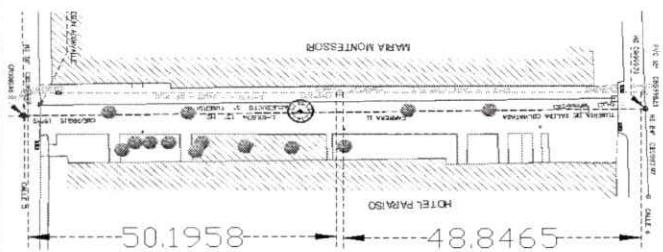


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad de elementos	Subtotal	(m3) MEDIDA TOTAL
	Alto	Ancho	Largo			
Camara 1 - 2	2	0,8	48,85	1,00	78,15	78,15
Camara 2 - 3	2	0,8	50,19	1,00	80,30	80,30
					0,00	0,00
Excavación de camaras	2	1,6	1,60	3,00	15,36	15,36
					0,00	0,00
Excavaciones varias para hidrosanitarias	1	0,4	42,80	1,00	17,12	16,50
Excavaciones varias para red sanitaria	1,2	0,4	43,60	1,00	20,93	16,50
				(I)TOTAL		206,82

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	**DIRECTOR DE OBRA** ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	**SUPERVISOR** ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE NIT.: 890100639 6	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.			CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS			PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA				
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO			Hoja 1	de 1
ITEM Nº: 1,14	DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN		UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad de elementos	Subtotal	(m3) MEDIDA TOTAL
	Area		Altura			
Cr 11 / Calle 5 y 6	1046,5		0,10		104,65	104,65
				(I)TOTAL		104,65


Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
Sergio Sandoval	Andrés López	Manuel Q. Torres B.	
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	**DIRECTOR DE OBRA** ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	**SUPERVISOR** ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código
	Vigencia a partir de 29/04/2010		

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	4
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1

ITEM Nº:	1,00	DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSETA TACTIL OCRE Y GUIA AMARILLA NO INCLUYE EL MORTERO DE PEGA	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

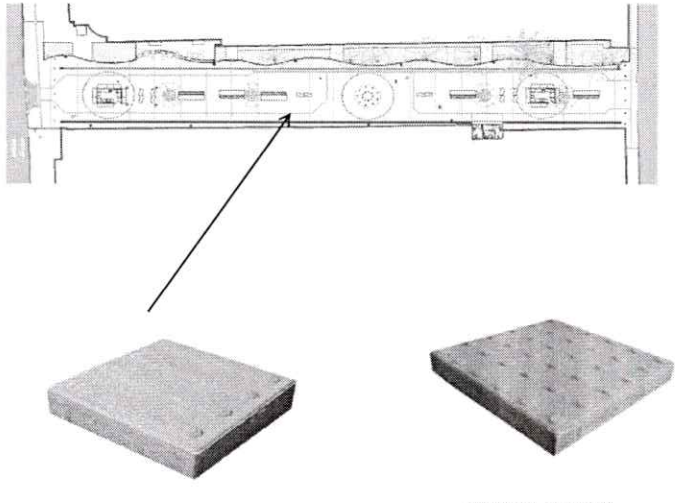

LOSETA GUÍA

LOSETA ALERTA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES AREA	Cantidad de elementos	Subtotal	CANTIDAD TOTAL
LOSETA TÁCTIL GUÍA	80,0	1,00	80,00	
LOSETA TÁCTIL ALERTA	9,0	1,00	9,00	
				89,00
		(I)TOTAL		89,00


Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	**DIRECTOR DE OBRA** ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	**SUPERVISOR** ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1

ITEM Nº:	1,00	DESCRIPCION ITEM	VIGA CONFINAMIENTO ENLACE H=10-20 CM 3100PSI	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

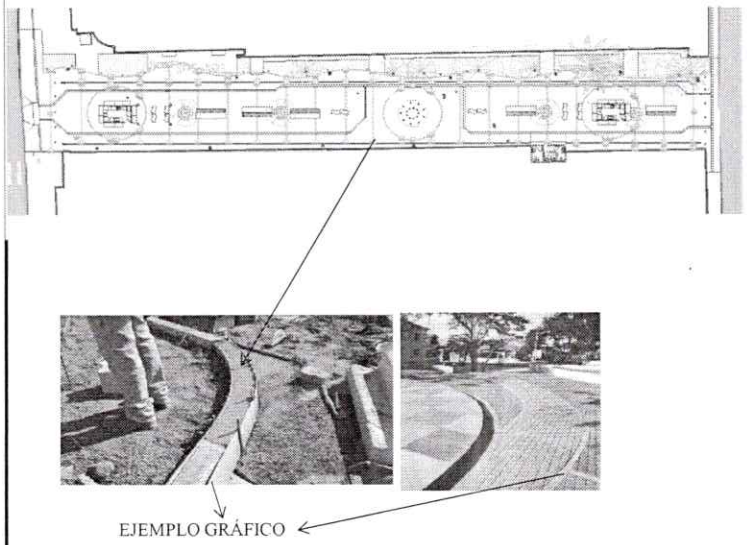


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES ML	Cantidad de elementos	Subtotal	CANTIDAD TOTAL
VIGA CONFINAMIENTO	297,2	1,00	297,20	
		1,00	0,00	
				297,20
(I)TOTAL				297,20

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	JCB
ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE NIT. 890100633 6	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.			CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS			PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA				
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO			Hoja 1	de 1
ITEM Nº: 2,50	DESCRIPCION ITEM	CONCRETO CLASE D (21 MPA). CANALES E= 0.15. Y CUNETAS A=40CM E=5CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO 420 MPA, INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO.		UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

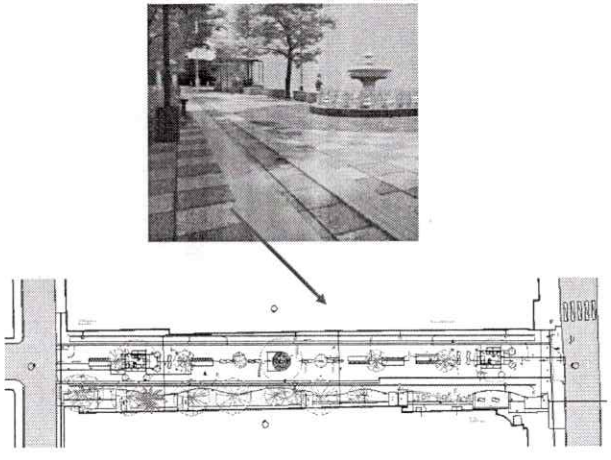

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad de elementos	Subtotal	(ml) MEDIDA TOTAL
	Longitud					
Cr 11 / Calle 5 y 6	87,88			2,00	175,76	175,76
			(l)TOTAL			175,76


Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código	

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja___ 1	de ____ 1

ITEM Nº:	5.02	DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO DE HIERRO COLOR NEGRO D-14, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,	UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

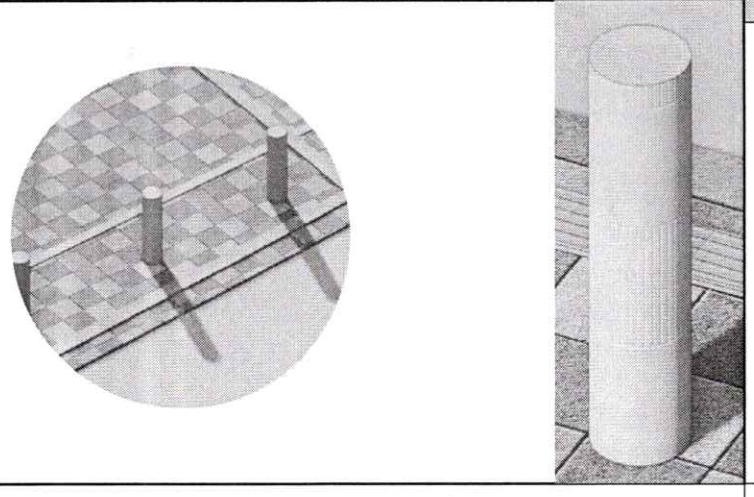

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Area		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
PASAJE PEATONAL				10,00	10,00	10,00
				(I)TOTAL		10,00

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código	
CONTRATO No. :	4926239			
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.		CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS		PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA			
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO		Hoja 1	de 1
ITEM Nº: 5.03	DESCRIPCION ITEM: JARDINERA MATERA EN CONCRETO 1.20x.40x0.40 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Area		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
PASAJE PEATONAL				5,00	5,00	5,00
				(I)TOTAL		5,00

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código	

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: 5,05	DESCRIPCION ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA [3M], INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Area		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
PASAJE PEATONAL	274,81			1,00	274,81	274,81
(I)TOTAL						274,81

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código	

CONTRATO No. :		4926239			
OBJETO:		ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.		CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:		JCB CONSULTORIAS SAS		PERIODO	
INTERVENTOR:		MTB INGENIERIA			
SUPERVISOR:		ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO		Hoja 1	de 1
ITEM Nº:	5,08	DESCRIPCION ITEM	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Area		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
PASAJE PEATONAL	274,81			1,00	274,81	274,81
(I)TOTAL						274,81

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	JCB
ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO VALLE NIT. 800156533-0	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1 de 1	

ITEM Nº:	AD-13	DESCRIPCION ITEM	Retiro de material producto de la excavacion. incluye cargue, transporte distancia 25km y disposicion final al sitio autorizado por la entidad competente a una distancia promedio de recorrido 25km contados radialmente a partir del limite urbano de la ciudad)	UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad de elementos	Subtotal	(m3) MEDIDA TOTAL
	Espesor	Ancho	Area			
DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	0,09		994,71	1,00	89,52	89,52
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	0,06		994,71	1,00	59,68	59,68
DEMOL. DE BARANDA EN CONCRETO	0,2		22,45	1,00	4,49	4,49
						0,00
Excavación tuberia sanitaria					158,46	158,46
excavación general para terreno	0,45		994,71		447,62	447,62
						0,00
						0,00
						0,00
				(I)TOTAL		759,77

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

ALCALDÍA EL CERRITO / ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO VALLE NIT. 800100533-5	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código	JCB

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-17	DESCRIPCION ITEM: INSTALACIÓN DE MURO EN BOARD 6MM, PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PUERTAS Y VENTANAS SEGÚN INDICACIONES DE LA INTERVENTORIA	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad de elementos	Subtotal	(m2) MEDIDA TOTAL
		Area	Longitud	Altura			
	PUERTA		1,3	2,50	1,00	3,25	3,25
	VENTANAS		1,2	1,05	2,00	2,51	2,51
						(I)TOTAL	5,76


Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
ALCALDIA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE NIT. 800100533-5	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1

ITEM Nº:	AD-16	DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ROCA MUERTA	UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad de elementos	Subtotal	(m3) MEDIDA TOTAL
	Area	Longitud	Altura			
Cr 11 / Calle 5 y 6	1046,5		0,60		627,90	627,90
relleno de tuberia sanitaria de 20 pulgadas	0,8	99,04	1,14		90,41	90,41
AUSTE						
				(I)TOTAL		718,31

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 29/04/2010			

CONTRATO No. :	4926239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.			CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS			PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA				
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO			Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-021	DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES GRIS		UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

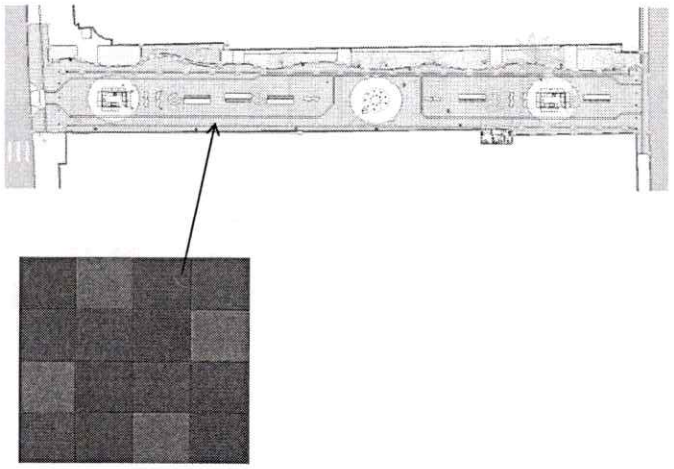

PATRON DE LOSETA GRAL


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES AREA	Cantidad de elementos	Subtotal	CANTIDAD TOTAL
LOSETA GRIS	223,0	1,00	223,00	
				223,00
			(I)TOTAL	223,00

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	**DIRECTOR DE OBRA** ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	**SUPERVISOR** ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	Código
	Vigencia a partir de 29/04/2010		

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-20	DESCRIPCION ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES SEGÚN DISEÑO	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

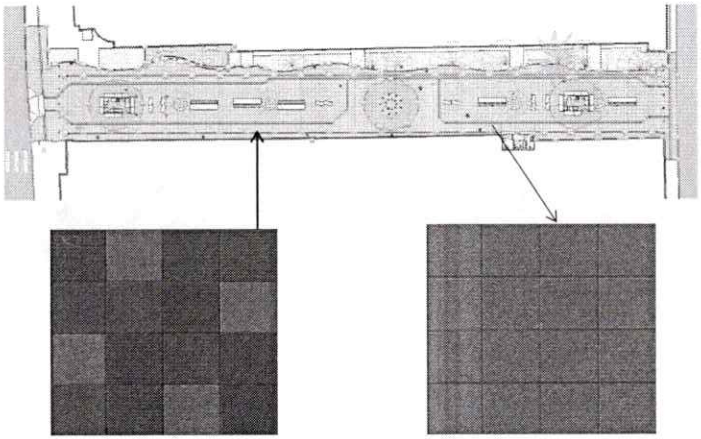

PATRON DE LOSETA GRAL

PATRON DE LOSETA EN CÍRCULOS

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES AREA	Cantidad de elementos	Subtotal	CANTIDAD TOTAL
LOCETA OCRE	377,5	1,00	377,50	
LOCETA ROJO	223	1,00	223,00	
LOCETA VERDE	223	1,00	223,00	
				823,50
		(I)TOTAL		823,50

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO


EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código	

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1

ITEM Nº:	AD-022	DESCRIPCION ITEM	ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI e=8 DILATADO CADA 1,20 m, Incluye malla electrosoldada 5mm 15x15	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

RAMPA DE DESCAPACITADOS

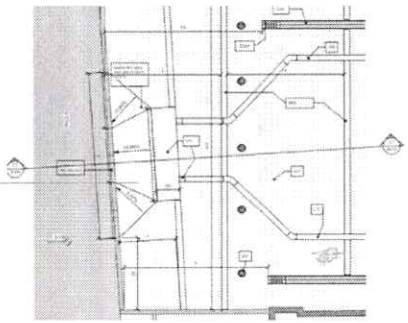

D1 1.1 Detalle Acceso Rampa


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Area		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
RAMPAS	116,92			1,00	116,92	
						116,92
				(I)TOTAL		116,92

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código	

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-023	DESCRIPCION ITEM: TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI	UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

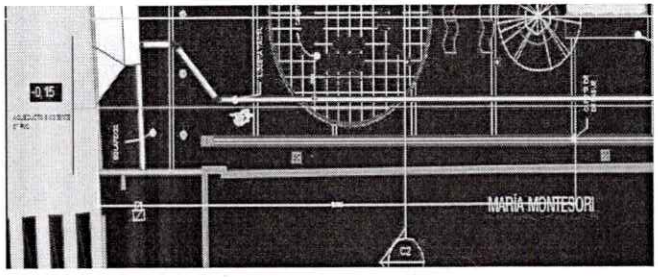


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Longitud		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
SENDERO	42,8			1,00	42,80	
						42,80
				(I)TOTAL		42,80

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código	

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-024	DESCRIPCION ITEM: IMPRIMACION	UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

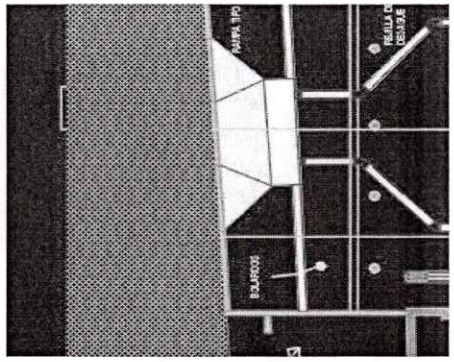


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Area		Altura	Cantidad de elementos	Subtotal	(und) MEDIDA TOTAL
VIAS INTERVENIDAS		22,6		1,00	22,60	
						22,60
(I)TOTAL						22,60

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código	JCB

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-25	DESCRIPCION ITEM: CARPETA ASFALTICA	UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

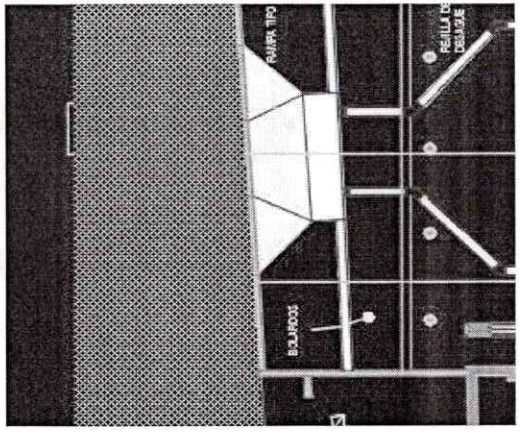


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES AREA	ESPESOR	Subtotal	CANTIDAD TOTAL
VIAS INTERVENIDAS	22,6	0,10	2,26	
				2,26
		(I)TOTAL		2,26

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código

CONTRATO No. :	4926239		
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.	CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS	PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA		
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO	Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-026	DESCRIPCION ITEM: SUMIDERO SENCILLO	UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

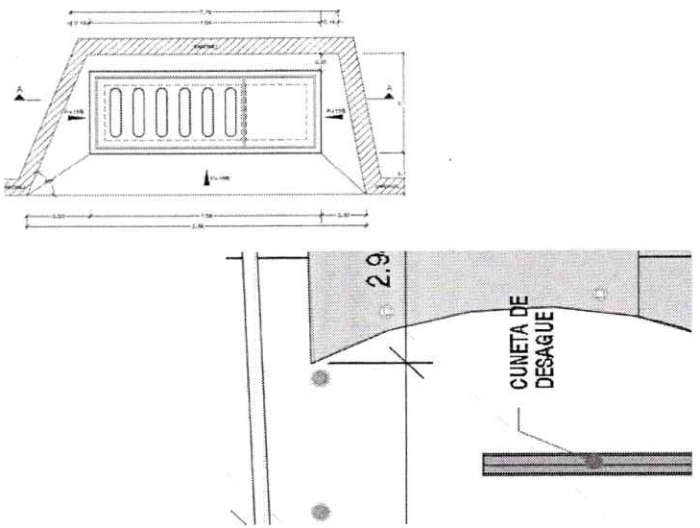

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES AREA	Cantidad de elementos	Subtotal	CANTIDAD TOTAL
SUMIDERO SENCILLO		5,00	5,00	
				5,00
		(I)TOTAL		5,00


Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

UB

EL CERRITO	MEMORIAS CORTE DE OBRA Vigencia a partir de 29/04/2010	Versión	Código	JCB

CONTRATO No. :	4926239				
OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.			CORTE Nº:	3
CONTRATISTA:	JCB CONSULTORIAS SAS			PERIODO	
INTERVENTOR:	MTB INGENIERIA				
SUPERVISOR:	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO			Hoja 1	de 1
ITEM Nº: AD-027	DESCRIPCION ITEM	TUBERIA SANITARIA PVC 4"		UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

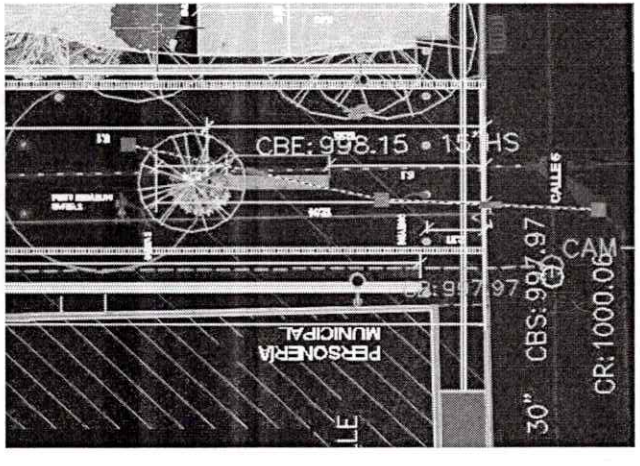

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES longitud	Cantidad de elementos	Subtotal	CANTIDAD TOTAL
CANALIZACIÓN LLUVIA	21,8	2,00	43,60	
				43,60
(I)TOTAL				43,60

Elaboró:	Autorizó	REVISO y APROBO	Vo. Bo.
RESIDENTE DE OBRA SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE OBRA ING. ANDRES LOPEZ JCB CONSULTORIA SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. MANUEL TORRES INTERVENTORIA	SUPERVISOR ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ALCALDIA MUNICIPIO CERRITO

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

BALANCE FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 4926239

OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	
CONTRATISTA:	**JCB CONSULTORIAS SAS**	
VALOR INICIAL	$	568.272.895,61
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL	$	568.272.895,61
FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
PLAZO	150 DIAS	
INTERVENTOR:	**ING. MANUEL TORRES**	
SUPERVISOR:	**ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	$ 14.328,00	994,71	$ 14.252.204,88
1,02	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO CON UN ESPESOR DE HASTA 20 CM, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	$ 12.763,00	65,28	$ 833.168,64
1,03	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE TEJAS DE BARRO, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, CABALLETES, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	$ 12.763,00	9,68	$ 123.545,84
1,04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO, VIGA DE JARDINERA ENTRE OTROS ELEMENTOS, EL CUAL INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	$ 4.948,00	273,22	$ 1.351.892,56
1,05	EXCAVACIONES MANUAL PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN ENTIBADO. NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	m3	$ 23.298,00	206,82	$ 4.818.492,36
1,06	EXCAVACIONES MECANICA PARA ESTRUCTURAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO SIN ENTIBADO. NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.	M3	$ 3.768,00	590,37	$ 2.224.514,16
1,07	EXCAVACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE TUBERIA EXISTENTE EN DIFERENTES DIAMETROS, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIA SOBRANTE	ML	$ 17.350,00	-	$ -
1,08	TALA, CORTE DE ARBOLES DE ALTURA MAYORES A H>3.0, INCLUYE TRASLADO. EXCAVACIÓN, Y ADECUACIÓN DEL TERRENO.	UND	$ 273.960,00	-	$ -
1,09	TRANSPLANTE Y PODA DE ARBUSTOS DE ALTURA MAYOR A METRO, INCLUYE TRANSPORTE Y ABONO PARA SU RESIEMBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CONSERVACIÓN	UND	$ 84.907,00	-	$ -
1,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM	M3/KM	$ 2.048,00	-	$ -
1,11	EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN VARIOS DIAMETROS, ASI COMO LA ADECUCIÓN DEL TERRENO PARA LA DISPOCISIÓN DE LA TUBERIA A REEMPLAZAR EN VARIOS DIAMETROS, INCLUYE EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SOBRANTE, BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA	ML	$ 19.221,00	-	$ -
1,12	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y TRAZADO DE LOS DISEÑOS, ASI COMO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	m2	$ 3.803,00	1.311,94	$ 4.989.307,82
1,13	SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA DE SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T	M3	$ 89.495,00	-	$ -
1,14	SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN	M3	$ 90.851,00	104,65	$ 9.507.557,15
1,15	SUMINISTRO, LLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL Y MECANICA COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	$ 77.348,00	-	$ -
	SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES:			-	**$ 38.100.683,41**
2	**URBANISMO**			-	$ -
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ADOQUIN EN CONCRETO DE 10X20X8 CM PARA SENDERO PEATONAL GUITARRA AMARILLO Y GRIS, NO INCLUYE LA ARENA DE CIMENTACIÓN Y SELLO	M2	$ 80.885,00	-	$ -
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSETA TACTIL OCRE Y GUIA AMARILLA NO INCLUYE EL MORTERO DE PEGA	M2	$ 69.421,00	89,00	$ 6.178.469,00
2.3	VIGA CONFINAMIENTO ENLACE H=10-20 CM 3100PSI	ML	$ 31.006,00	297,20	$ 9.214.983,20
2.4	CONTENEDOR DE RAÍCES EN BLOQUE MACIZO #4 DE 10X20X30 CM, ALCORQUE PREFABRICADO SEGÚN INDICACIÓN DEL DISEÑO O DE LA INTERVENTORIA, ARENA NEGRA Y LECHO FILTRANTE.	UND	$ 192.612,00	4,00	$ 770.448,00
2.5	CONCRETO CLASE D (21 MPA). CANALES E= 0.15. Y CUNETAS A=40CM E=5CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO 420 MPA, INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO.	ML	$ 41.134,00	175,76	$ 7.229.711,84
	SUBTOTAL CAP. 2 URBANISMO			-	**$ 23.393.612,04**
3	**CONSTRUCCIÓN CASETA**			-	$ -
3.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LADRILLO SOGA LIMPIO 2C PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO, SEGÚN DISEÑO O LO INDICADO POR LA INTERVENTORIA, INCLUYE CONCRETO DE PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	$ 69.331,00	-	$ -
3.02	ZAPATA EN CONCRETO DE 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 621.476,00	-	$ -
3.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60). SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	kg	$ 9.746,00	-	$ -
3.04	CONCRETO PARA COLUMNA AMARRE AL MURO DE 0.2x0.2	ML	$ 37.379,00	-	$ -
3.05	CONCRETO DE VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	$ 59.700,00	-	$ -
3.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2	M2	$ 54.444,00	-	$ -
3.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	$ 75.379,00	-	$ -
3.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESON EN CONCRETO PULIDO Y A LA VISTA VACIADO IN SITU, INCLUYE LA ESTRUCTURA DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	$ 121.062,00	-	$ -

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

BALANCE FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 4926239

OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	
CONTRATISTA:	**JCB CONSULTORIAS SAS**	
VALOR INICIAL	$	568.272.895,61
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL	$	568.272.895,61
FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
PLAZO	150 DIAS	
INTERVENTOR:	**ING. MANUEL TORRES**	
SUPERVISOR:	**ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO**	

ITEM		DESCRIPCION	UND	VALOR. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
3,09		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 VAI. CON MARCO INCLUYE LA ESTRUCTURA DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	$ 465.625,00	-	$ -
3.10		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTAS LM EMTAMB. CAL 20 2.0X1.20 CON MARCO INCLUYE LA ESTRUCTURA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	$ 851.245,00	-	$ -
	SUBTOTAL CAP. 3 CONSTRUCCIÓN CASETA				-	**$** -
4		**PERGOLA**			-	**$** -
4.01		Suministro, transporte e instalación de estructura metalica para cubierta pergola zona, acorde a diseño.	kg	$ 13.377,00	-	$ -
4.02		Suministro e instalación de cubierta en teja policabornato alveolar, incluye polarización, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	$ 69.360,00	-	$ -
4.03		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA LAM HR 0.11- 0.15X0.11-0.15 X 1/8	kg	$ 10.367,00	-	$ -
4.04		CONCRETO CLASE F (14 MPA). SOLADOS DE E=0.05 M. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	m2	$ 27.862,00	-	$ -
4.05		ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 21.0 MPA. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	m3	$ 571.993,00	-	$ -
4.06		PEDESTAL EN CONCRETO 4000 PSI. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	m3	$ 885.567,00	-	$ -
4.07		RELLENO COMPACTADO CON SALTARIN PARA ESTRUCTURAS, EN MATERIAL DE PRESTAMO ROCA MUERTA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	$ 25.655,00	-	$ -
4.08		CONCRETO 3000 PSI 21.0 MPA PARA LOSAS DE PISO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE NI ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 59.805,00	-	$ -
4.09		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60). SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	kg	$ 9.746,00	-	$ -
4.10		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PERNOS ROSCADOS GRADO 7. INCLUYE AMARRE AL ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	und	$ 34.398,00	-	$ -
	SUBTOTAL CAP. 4 PERGOLA				-	**$** -
5		**MOBILIARIO Y PINTURA**			-	**$** -
5.01		RESTAURACION DE BANCA EN MADERA 1.80X0.80 M, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	$ 411.715,00	9,00	$ 3.705.435,00
5.02		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO DE HIERRO COLOR NEGRO D-14, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,	UND	$ 373.495,00	10,00	$ 3.734.950,00
5.03		JARDINERA MATERA EN CONCRETO 1.20x.40x0.40 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE APOYO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA AASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	$ 1.059.764,00	5,00	$ 5.298.820,00
5.04		RESATURANCION BUSTO PRATIMONIO SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	$ 364.045,00	-	$ -
5.05		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA [3M], INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	$ 10.529,00	277,68	$ 2.923.692,72
5.06		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA VENTANA PUERTAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	$ 10.222,00	-	$ -
5.07		PINTURA MANO DE OBRA [3M] INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	$ 6.276,00	-	$ -
5.08		RASQUETEADA-LIJADA-RESANE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	$ 1.758,00	-	$ -
5.09		RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	$ 2.876,00	277,68	$ 798.607,68
	SUBTOTAL CAP. 5 MOBILIARIO Y PINTURA				-	**$ 16.461.505,40**
6		**AGUAS LLUVIAS**			-	**$** -
6.01		CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO]. INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA BORDES DE TAPA. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	UND	$ 345.270,00	-	$ -
6.02		TAPA CAJA MARCO CON BORDE EN ANGULO 71X71 - 80X80 EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	UND	$ 161.040,00	-	$ -
6.03		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC NOVALOC 24" PARA TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4 Y RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	ML	$ 144.189,00	-	$ -
6.04		EMPALME TUB 15"-25" CAMARA CONCRETO, INCLUYE DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS ASI COMO EL RESANE Ym EMBOQUILLADO Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	$ 144.175,00	2,00	$ 288.350,00
6.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA, EQUIPOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	ML	$ 26.649,00	-	$ -

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

BALANCE FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 4926239

OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	
CONTRATISTA:	**JCB CONSULTORIAS SAS**	
VALOR INICIAL	$	568.272.895,61
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL	$	568.272.895,61
FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
PLAZO	150 DIAS	
INTERVENTOR:	**ING. MANUEL TORRES**	
SUPERVISOR:	**ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA SANITARIA 4" PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, ANDAMIOS, LINEAS DE VIDA, EQUIPOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA	UND	$ 17.381,00	-	$ -
	SUBTOTAL CAP. 6 AGUAS LLUVIAS			-	**$ 288.350,00**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN**			-	**$ -**
7,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 50W ALURBAN S, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	$ 2.266.131,00	-	$ -
7,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X16	ML	$ 4.136,00	-	$ -
7,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEBRAZO ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16X1 1/4"	UND	$ 69.600,00	-	$ -
7,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE PERFORACION	UND	$ 9.882,00	-	$ -
7,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDA GRILLETE DIAMETROS 5-6" 6-7" - T 3/8"	UND	$ 29.812,00	-	$ -
7,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE GALVANIZADO 4 MTS 3" ANCLAJE PISO	UND	$ 1.127.278,00	-	$ -
7,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF	HC	$ 102.511,00	-	$ -
7,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA IP65	UND	$ 34.201,00	-	$ -
7,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTA AISLANTE ROLLO	UND	$ 26.610,00	-	$ -
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRE COBRE THWN #12	ML	$ 2.024,00	-	$ -
7,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "GRAPA GALV-GRUESA 3/4"""	UND	$ 633,00	-	$ -
7,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SWITCHE DOBLE AMBIA	UND	$ 18.510,00	-	$ -
7,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "ADAPTADOR EMT .3/4"""	UND	$ 1.165,00	-	$ -
7,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "UNION 3/4"" EMT"	UND	$ 3.058,00	-	$ -
7,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "CURVA EMT MET ,3/4"""	UND	$ 4.962,00	-	$ -
7,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "CAJA RAWELT 3/4"""	UND	$ 7.315,00	-	$ -
7,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "TUBO EMT 3/4""X 3 MT"	UND	$ 37.169,00	-	$ -
7,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT	ML	$ 45.567,00	-	$ -
7,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DECABLE COBRE DESNUDO #4	ML	$ 5.905,00	-	$ -
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETAPA REGISTRO A TIERRA 20	UND	$ 42.307,00	-	$ -
7,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEVARILLA COBRE	UND	$ 173.901,00	-	$ -
7,22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEHIERR.DE 37000 PSI 259 MPA	KLS	$ 3.822,00	-	$ -
7,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMEZCLA CONCRETO 3000 PSI (21 MPA)	M3	$ 328.006,00	-	$ -
7,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEALAMBRE COBRE THWN #14	ML	$ 1.388,00	-	$ -
7,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEALAMBRE GALVANIZADO # 18	KG	$ 9.459,00	-	$ -
7,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W	UND	$ 31.392,00	-	$ -
7,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "TUBO PVC ,1/2"" X 3 MTS	UND	$ 6.273,00	-	$ -
7,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA 2x 4 PVC	UND	$ 2.194,00	-	$ -
7,29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE P-T AMBIA	UND	$ 19.144,00	-	$ -
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON.30X30	UND	$ 81.303,00	-	$ -
7,31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	$ 4.443,00	-	$ -
7,32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 18W IP65 EXTERIOR DECO SYLVANIA	UND	$ 297.065,00	-	$ -
7,33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE HF-ZH# 8	ML	$ 3.526,00	-	$ -
7,34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ,1/2"	ML	$ 6.001,00	-	$ -
	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN			-	**$ -**
	ITEMS ADICIONALES			-	**$ -**
AD-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	UND	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00
AD-03	AJUSTES AL DISEÑO ARQUITECTONICO Y CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTES	M2	$ 7.072,05	1.311,94	$ 9.278.105,28
AD-04	AJUSTES A LOS DISEÑOS ELECTRICOS	UND	$ 3.124.533,33	1,00	$ 3.124.533,33
AD-05	CERRAMIENTO TELA VERDE + POSTE DE GUADUA DE 2m DE ALTURA LIBRE ENTERRADO MINIMO 50 CM, SEPARACIÓN ENTRE POSTES 3M	ML	$ 13.038,81	80,00	$ 1.043.104,80
AD-06	DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E:7,6 a 12 cms (SECCION DE ANDEN/CONTRAPISO)	M2	$ 5.805,18	994,71	$ 5.774.470,60
AD-07	DEMOLICION DE ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	$ 8.162,51	994,71	$ 8.119.330,32
AD-08	DESMONTE DE VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND	$ 4.145,63	8,00	$ 33.165,04
AD-09	DESMONTE DE MARCO PUERTA + NAVE SENCILLA	UND	$ 22.110,03	4,00	$ 88.440,12
AD-10	DESMONTE DE SILLETERIA METALICA- MADERA	UND	$ 5.875,12	9,00	$ 52.876,08
AD-11	DEMOLICION DE BARANDA EN CONCRETO	ML	$ 7.478,03	22,45	$ 167.881,77

ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

BALANCE FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 4926239

OBJETO:	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EL SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL CON EL FIN DE TENER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN PROMOCIONAR Y PROMOVER LA CULTURA Y MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	
CONTRATISTA:	**JCB CONSULTORIAS SAS**	
VALOR INICIAL	$	568.272.895,61
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL	$	568.272.895,61
FECHA DE INICIO:	04 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
PLAZO	150 DIAS	
INTERVENTOR:	**ING. MANUEL TORRES**	
SUPERVISOR:	**ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO**	

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
AD-12	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3	$ 115.777,80	10,25	$ 1.186.722,45
AD-13	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INLCUYE CARGUE, TRANSPORTE A UNA DISTANCIA DE 25 KM Y DISPOSICION FINAL AL SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE RECORRIDO DE 25 KM CONTADOS RADIALMENTE A PARTIR DEL LIMITE URBANO DEL MUNICIPIO.	M3	$ 58.212,89	759,77	$ 44.228.407,44
AD-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 20" PVC PARA RED DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS ESTRUCTURA DE SOPORTE EN GRAVA 3/4. SEGÚN DISEÑO O INDICACIÓN DE INTERVENTORÍA.	ML	$ 458.253,12	99,04	$ 45.385.389,00
AD-15	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	$ 1.935.078,76	3,00	$ 5.805.236,28
AD-16	RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. ST	M3	$ 111.555,56	718,31	$ 80.131.474,30
AD-17	INSTALACIÓN DE MURO EN BOARD 6MM, PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE PUERTAS Y VENTANAS SEGÚN INDICACIONES DE LA INTERVENTORIA	M2	$ 43.272,91	5,76	$ 249.251,96
AD-18	TALA PALMA REAL,INCLUYE TALA,ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICICÓN EN EL BOTADERO OFICIAL	UND	$ 1.960.000,00	1,00	$ 1.960.000,00
AD-19	ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 9 ARBOLES. INCLUYE TALA, ERRADICACIÓN, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO ESPECIAL	GLB	$ 11.396.510,08	1,00	$ 11.396.510,08
AD-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES SEGÚN DISEÑO	M2	$ 124.181,45	823,50	$ 102.263.424,08
AD-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSETA 40x40x6, COLORES GRIS	M2	$ 110.595,24	223,00	$ 24.662.737,41
AD-22	ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI e=8 DILATADO CADA 1,20 m, Incluye malla electrosoldada 5mm 15x15	M2	$ 57.908,49	67,76	$ 3.923.959,61
AD-23	TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI	ML	$ 29.243,24	42,80	$ 1.251.610,67
AD-24	IMPRIMACION	M2	$ 3.385,11	22,60	$ 76.503,49
AD-25	CARPETA ASFALTICA	M3	$ 1.469.569,56	2,26	$ 3.321.227,21
AD-26	SUMIDERO SENCILLO	UND	$ 654.688,76	5,00	$ 3.273.443,80
AD-27	TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	$ 34.198,18	43,60	$ 1.491.040,65
					$ 358.888.845,77
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 437.132.996,62
	ADMINISTRACION		23,0%		$ 100.540.589,22
	IMPREVISTO		1,0%		$ 4.371.329,97
	UTILIDAD		4,0%		$ 17.485.319,86
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+U)				$ 122.397.239,05
	PGIO		1,0%		$ 4.371.329,97
	PAGA		1,0%		$ 4.371.329,97
	VALOR TOTAL				**$ 568.272.895,61**

RELACION DE PAGOS

N°	FECHA DE FACTURACION	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR FACTURADO
1	16-ago-23	ACTA PARCIAL No. 1	JCB C 146	$ 26.328.396,90
2	15-sep-23	ACTA PARCIAL No. 2	JCB C 151	$ 259.005.025,00
3	28-nov-23	ACTA PARCIAL No. 3	JCB C 153	$ 240.290.043,20
4	21-dic-23	ACTA PARCIAL No. 4	JCB C 158	$ 42.649.430,51
		TOTAL		**$ 568.272.895,61**

CONTRATISTA

ARQ. YUDY C. QUINTERO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL
JCB CONSULTORIAS SAS

INTERVENTOR

ING. MANUEL TORRES
INTERVENTOR

SUPERVISOR

ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
MUNICIPIO EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042964124

(415)7707212489984(8020) 001876404296412 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 6 9 3 1 1	1				

11. Razón social
JCB CONSULTORIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CL 150 16 56 OF 308 6

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-01-18 / 07:58:26 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MONSALVE MORENO ANA MILENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 63484572 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización JCB CONSULTORIA SAS

997. Fecha formalización 2 0 2 3-0 1-1 8/0 7:5 8:2

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042964124

(415)7707212489984(8020) 001876404296412 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 6 9 3 1 1	1				

11. Razón social
JCB CONSULTORIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	JCB CONSULTORIA SAS CL 150 16 56 OF 308 6	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	JCBC	142	200	12	HABILITACIÓN	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año: 2023 — 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028071301798

(415)7707212489984(8020) 001302807130179 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9012693111	1				

11. Razón social: JCB CONSULTORIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilita:

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód
1	JCB CONSULTORIA SAS CL 150 16 56 OF 308 6	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	JCBC	142	200	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Firma de quien suscribe el documento

DIAN
2023-01-18 / 07:57:13 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres: MONSALVE MORENO ANA MILENA
1002. Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 63484572 — 1004. DV: 7
1005. Cód. Represent.: Representante Legal Principal
1006. Organización: JCB CONSULTORIA SAS

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres:
985. Cargo:
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCION
993. Establecimiento:
992. Área:
990. Lugar Admitivo.:
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALI

997. Fecha recepción: 2023-01-18/07:57:1

DEFINITIVO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14887140931

(415)7707212489984(8020) 000001488714093 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 9 3 1 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JCB CONSULTORIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	JCB CONSULTORIA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0

41. Dirección principal
CL 150 16 56 OF 308 6

42. Correo electrónico gerenciageneral.jcb@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 2 8 0 9 0	3 1 4 2 6 4 5 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 2 2	4 2 1 0	2 0 1 9 0 3 2 2		4 1 1 2	4 9 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 10 / 11 : 41: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONSALVE MORENO ANA MILENA
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887140931

(415)7707212489984(8020) **000001488714093 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 9 3 1 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 2 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 9 1 1 3 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 2 2 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0
87. Extranjero privado	0 . 0

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 3 2 8		-
2	8 0	2 0 1 9 0 2 2 6		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. D

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO FOLIO SIN COSTO

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887140931

(415)7707212489984(8020) **000001488714093 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 9 3 1 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 3 4 8 4 5 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONSALVE	MORENO	ANA	MILENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 1 4 9 0 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTERO	CAMARGO	YUDY	OLINDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 7 8 0 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RANGEL	HERRERA	MIGUEL	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 2 8 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CUEVAS	MONTOYA	YEFER	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 2 4 0 8 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALARCON	SEVERICHE	GREGORIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887140931

(415)7707212489984(8020) **000001488714093 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 9 3 1 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 0 3 4 0 4 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUIROGA	SEPULVEDA	MYRIAM	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887140931

(415)7707212489984(8020) **000001488714093 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 9 3 1 1	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 7 1 8 2 6 5		1 3 6 8 2 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PADILLA	PADILLA	JORGE	HUMBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 0 7 4 5 6 1 7		2 5 4 5 3 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERNANDEZ	CHACON	CRISTHIAN	FERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.484.572

MONSALVE MORENO
APELLIDOS

ANA MILENA
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1973
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

30-AGO-1991 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500101-42135037-F-0063484572-20050919 02345 05262B 02 180157040

Certificado
Bancario

Martes, 05 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JCB CONSULTORIA SAS identificado(a) con NIT 901269311, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	65000010681	2019/09/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

JCB CONSULTORÍA S.A.S.
Nit. No. 901.269.311-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 9 y 5 DE LA LEY 828 DE 2003


Yo **ANA MILENA MONSALVE MORENO,** identificada con Cedula de Ciudadanía **No. 63.484.572**, en calidad de representante legal de la empresa **JCB CONSULTORÍA S.A.S**. con **Nit 901.269.311-1 y JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA** identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 79.718.265** y Tarjeta Profesional **No. 136824-T** en calidad de revisor fiscal de la misma empresa **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, manifiesta que ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** a la fecha, con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Firma
Nombre: ANA MILENA MONSALVE MORENO
Identificación No. 63.484.572
Nit. No. 63.484.572-7


Firma
Nombre: JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA
Identificación No. 79.718.265
Tarjeta Profesional 136824-T

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., **15 de DICIEMBRE de 2023**

Bogotá Calle 150#16-56 Oficina 308-6 Centro Comercial Cedritos Telefax: 7028090-CL: 314-2645967
Correo Electrónico: contabilidad.jcb@hotmail.com

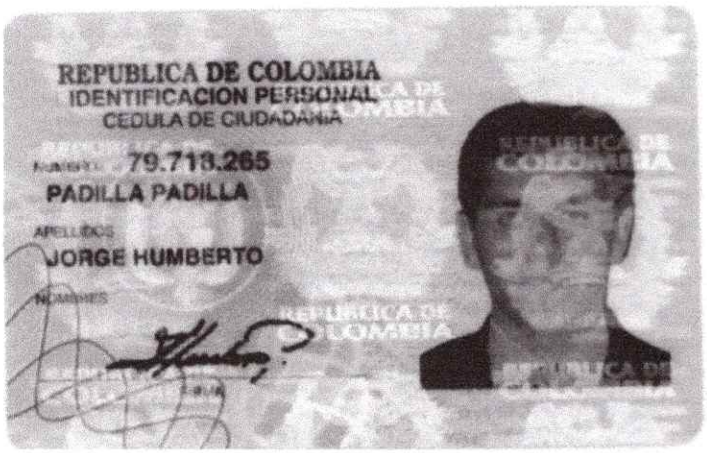
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.713.265
PADILLA PADILLA
APELLIDOS
JORGE HUMBERTO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A-
G.S. RH
M
SEXO
05-MAY-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500100-00004241-M-0079718265-20080331
0000109621A 1
1690008719

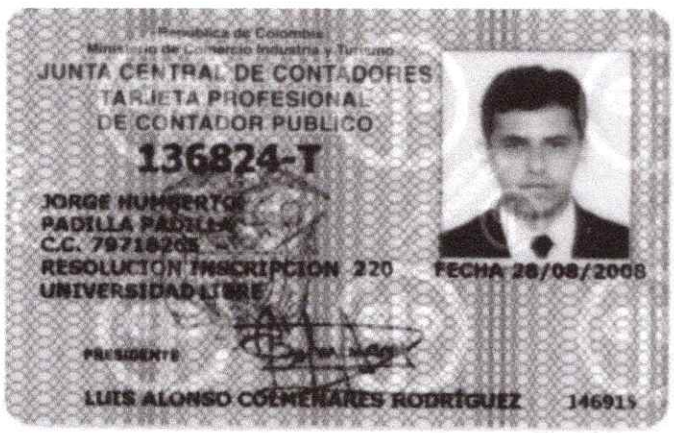
República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
136824-T
JORGE HUMBERTO
PADILLA PADILLA
C.C. 79718265
RESOLUCION INSCRIPCION 220
FECHA 28/08/2008
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COMENARES RODRIGUEZ
146915


59826
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5ED15F98C24D0D0D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79718265 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

nea

Resumen General de Pago

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1	ROA ZAPATA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 47 BN 5BN 62	CALI-VALLE	4058492	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	1563475589	9453345738	E	2023/11/20	2023/11/20	BANCOLOMBIA		$527,000

DETALLADA DE APORTES

LEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ción	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	LOPEZ ANDRES	230301	6	$580,000	$92,800	EPS002	6	$580,000	$23,200	CCF57	6	$580,000	$23,200	14-11	6	$580,000	$40,400	6	$0	$0
	OIME MELBA	25-14	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF57	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
49	ROA JEFRINN	230301	25	$966,667	$154,700	EPS018	25	$966,667	$38,700	CCF57	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
liados(3)				$1,701,334	$272,300			$1,701,334	$68,100			$1,701,334	$68,100			$1,701,334	$118,500		$0	$0

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DORAS: 2)				3	$272,300	$0	$272,300
S	25-14	900,336,004	7	1	$24,800	$0	$24,800
	230301	800,224,808	8	2	$247,500	$0	$247,500
DORAS: 1)				3	$118,500	$0	$118,500
	14-11	890,903,790	5	3	$118,500	$0	$118,500
DORAS: 1)				3	$68,100	$0	$68,100
	CCF57	890,303,208	5	3	$68,100	$0	$68,100
DORAS: 3)				3	$68,100	$0	$68,100
	EPS037	900,156,264	2	1	$6,200	$0	$6,200
IO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	$38,700	$0	$38,700
	EPS002	800,130,907	4	1	$23,200	$0	$23,200
				3	$527,000	$0	$527,000

nea

Resumen General de Pago

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1	ROA YROMERO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA CERRITO	CALLE 36 NORTE # 2BN-109	CALI-VALLE	3127524248	Si

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	1963475589	9353445768	E	2023/11/15	2023/11/15	BANCOLOMBIA	0	$1,295,300

DETALLADA DE APORTES

LEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ión	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
	ARELLANO LUZ	230301	15	$595,000	$95,200	EPS005	15	$595,000	$23,800	CCF57	15	$595,000	$23,800	14-11	15	$595,000	$41,500	15	$0	$0
	GIRALDO JORGE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS012	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
	GONZALEZ RAMON	230301	15	$580,000	$92,800	ESSC18	15	$580,000	$23,200	CCF57	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
13	LOZANO JOSE	230301	7	$270,667	$43,400	ESSC18	7	$270,667	$10,900	CCF57	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
	MARIN OMAR	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF57	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
71	MEDINA LUIS	25-14	15	$580,000	$150,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF57	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
	SALAZAR CESAR	230301	15	$1,350,000	$216,000	EPS010	15	$1,350,000	$54,000	CCF57	15	$1,350,000	$54,000	14-11	15	$1,350,000	$94,000	15	$0	$0
liados(7)				**$3,994,334**	**$697,200**			**$3,994,334**	**$159,900**			**$3,994,334**	**$159,900**			**$3,994,334**	**$278,300**		**$0**	**$0**

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DORAS: 2)				7	$697,200	$0	$0	$697,200
	25-14	900,336,004	7	1	$150,800	$0	$0	$150,800
	230301	800,224,808	8	6	$546,400	$0	$0	$546,400
DORAS: 1)				7	$278,300	$0	$0	$278,300
	14-11	890,903,790	5	7	$278,300	$0	$0	$278,300
DORAS: 1)				7	$159,900	$0	$0	$159,900
	CCF57	890,303,208	5	7	$159,900	$0	$0	$159,900
DORAS: 6)				7	$159,900	$0	$0	$159,900
VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$1,600	$0	$0	$1,600
	ESSC18	901,021,565	8	2	$34,100	$0	$0	$34,100
TES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$54,000	$0	$0	$54,000
	EPS037	900,156,264	2	1	$23,200	$0	$0	$23,200
	EPS002	800,130,907	4	1	$23,200	$0	$0	$23,200
	EPS005	800,251,440	6	1	$23,800	$0	$0	$23,800
				7	$1,295,300	$0	$0	$1,295,300

Resumen General de Pago

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1	ROA Y ROMERO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 13 # 7-18	CALI-VALLE	3786025	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	1363574579	9459574781	E	2023/11/15	2023/11/15	BANCOLOMBIA		$182,000

DETALLADA DE APORTES

LEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ión	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
	MATURANA JAMES	230201	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF57	15	$580,000	$23,200	14-1	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
liados(1)				**$580,000**	**$92,800**			**$580,000**	**$23,200**			**$580,000**	**$23,200**			**$580,000**	**$40,400**		**$0**	**$0**

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DORAS: 1)				1	$92,800	$0	$94,000
	230201	800,229,739	0	1	$92,800	$0	$94,000
DORAS: 1)				1	$40,400	$0	$41,000
	14-11	890,903,790	5	1	$40,400	$0	$41,000
DORAS: 1)				1	$23,200	$0	$23,500
	CCF57	890,303,208	5	1	$23,200	$0	$23,500
DORAS: 1)				1	$23,200	$0	$23,500
	EPS002	800,130,907	4	1	$23,200	$0	$23,500
				1	$179,600	$0	$182,000

MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800 100 833 2	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EL CERRITO	FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
		OBRA /CONTRATO: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO SENDERO PEATONAL DEL PARQUE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL CERRIRO VALLE DEL CAUCA — VERSIÓN: 1
		FECHA DE APLICACIÓN: Periodo: [illegible] (DD)

ANEXO. 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA

ETAPA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: TIPOLOGIA DEL RESIDUO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: COMPONENTE	OBSERVACIONES	1 Volumen total de materiales de construcción a usar en Obra (m3) (1)	2 Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (m3)	3 Aprovechamiento o tratamiento (2): Disposición final	3 Aprovechamiento o tratamiento (2): Reutilización	3 Aprovechamiento o tratamiento (2): Reciclaje	3 Aprovechamiento o tratamiento (2): Otros	4 Lugar de disposición final (2,1)	5 Acumulado: Volumen total de materiales usados en obra (m3) (3)	5 Acumulado: Cantidad Real Generada (m3)	5 Acumulado: Justificación (3,1)	6 Mes de reporte: Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3) (4)	6 Mes de reporte: Cantidad real generada (m3)	6 Mes de reporte: Justificación (4,1)
DEMOLICION	RCD PETREOS	Concretos, Cerámicos,ladrillos,arenas, gravas,cantos,bloques o fragmentos de roca,baldosines,morteros, asfalto y materiales inertes														
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC														
		Metales														
		Maderas														
		Cartón, Papel														
		Vidrios														
		Otros														
EXCAVACION Y CIMENTACION	Residuos de Cespedón	Coberturas Vegetales														
	Residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos	Tierras,arcillas (caolín),limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometría, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometría	Producto de excavacion estructura general			774.4 m3				.- Predio matricula inmobiliaria 378-19930 - Correginiento Palmaseca - SE ANEXA LICENCIA autorizada por la CVC - Solo tierra		774.4 m3			774.4 m3	
CONSTRUCCION	RCD Pétreos	Concretos, Cerámicos,ladrillos,arenas,gravas,cantos,bloques o fragmentos de roca,baldosines,morteros,asfalto y materiales inertes														
	RCD NO Pétreos	Plásticos, PVC														
		Maderas														
		Cartón, Papel														
		Vidrios														
		Otros														
	Residuos de carácter metálico	Acero, Hierro,Cobre, Aluminio,Estaño y Zinc														
	Residuos especiales	Poliestireno, Cartón, Yeso (Drywall), llantas usadas														
	Residuos Peligrosos	Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán,pinturas, disolventes orgánicos, aceites,asfaltos,resinas,plastificantes,tintas,baldones,tamices,telas de asbesto,escoria,plomo,cenizas volantes,luminarias convencionales y fluorescentes y deschos explosivos o cualquier elemento que este incluido en los anexos del Dec 4741 de 2005														
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores														
	TOTAL			-	-	**774.4 m3**		-				**774.4 m3**			**774.4 m3**	

Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Art 4 de la Resolución 01115 de 2012, se debe definir el volumen de materiales a usar proyectado en el PGRCD´s para con este dato calcular la cantidad de D´s que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo con el porcentaje de aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en que se desarrolle.
Aprovechamiento o Tratamiento: Marque con una (X) al que corresponda
1) Lugar de disposición: Sitio de disposición final aprobado por la autoridad ambiental competente y/o Zona de aprovechamiento que va a utilizar para los residuos generados en la obra.
Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Art 4 de la Resolución 01115 de 2012, se debe definir el volumen de materiales a usar acumulado de acuerdo a la echa de reporte para con este dato
icular la cantidad de RCD´s que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo con el porcentaje de aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en que se desarrolle.
1) Justificación: Breve explicación cuando las cantidades proyectadas no coincidan con las reales.
Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Art 4 de la Resolución 01115 de 2012, se debe describir el volumen de materiales utilizados en el mes actual del reporte para con este dato calcular la
ntidad de RCD´s que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo con el porcentaje de aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en que se desarrolle.
1) Justificación: Breve explicación cuando las cantidades proyectadas no coincidan con las reales.
