	Versión: 02
	Código: GIL-F-072

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO	Octubre	**Informe Número:**	**1**
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL TOLIMA		**Supervisor Regional**	EDGAR AUGUSTO PRADA
Fecha de elaboración del informe	31/10/2023		

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	Jhon Fredy Niño Aragon	Interventor	Jhair Rodolfo Gonzalez Velasquez
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5402648	Contrato No.	CO1.PCCNTR.5448117
Fecha de Iniciación	17 de octubre de 2023	Fecha de Iniciación	17 de octubre de 2023
Fecha Suspensión No. 1	N/A	Fecha Suspensión No. 1	N/A
Fecha Reinicio No. 1	N/A	Fecha Reinicio No. 1	N/A
Fecha Suspensión No. 2	N/A	Fecha Suspensión No. 2	N/A
Fecha Reinicio No. 2	N/A	Fecha Reinicio No. 2	N/A
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2023	Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2023
Valor Inicial	$948,406,754,69	Valor Inicial	$94,800,000
Valor adición No. 1	N/A	Valor adición No. 1	N/A
Valor adición No. 2	N/A	Valor adición No. 2	N/A
Valor Actualizado	$948,406,754,69	Valor Actualizado	$94,800,000
Plazo Inicial	Tres Meses (Sin exceder el 31 de diciembre)	Plazo Inicial	Setenta y siete (77) dias
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	Tres Meses (Sin exceder el 31 de diciembre)	Plazo Actualizado	Setenta y siete (77) dias

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA :

diseño y construcción de cubierta para las edificaciones del centro de comercio y servicios y el despacho de dirección regional

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

contratar la interventoría integral (Técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) del contrato de obra cuyo objeto es diseño y construcción de cubierta para las edificaciones del centro de comercio y servicios y el despacho de dirección regional

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA


CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	Jhon Fredy Niño Aragon
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	Cristian Rivera
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA	N/A
RESIDENTE SISO DE OBRA	Yenny Astrid Rodriguez Basto
INSPECTOR DE OBRA	N/A
COORDINADOR DE OBRA	N/A
ESPECIALISTAS	N/A

PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	Jhair Rodolfo Gonzalez Velasquez
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	Julian Andres Mosquera Jaramillo
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA	N/A
RESIDENTE SISO DE OBRA	Ana Maria Morales
INSPECTOR DE OBRA	N/A
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N/A
ESPECIALISTAS	N/A
	N/A

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION (Porcentaje)

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION




%AVANCE SEMANAL	PROGRAMADO	PV	EJECUTADO	EV	ATRASO
SEM 1	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%
SEM 2	5,00%	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%
ALERTAS					0,00%

Nota:

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

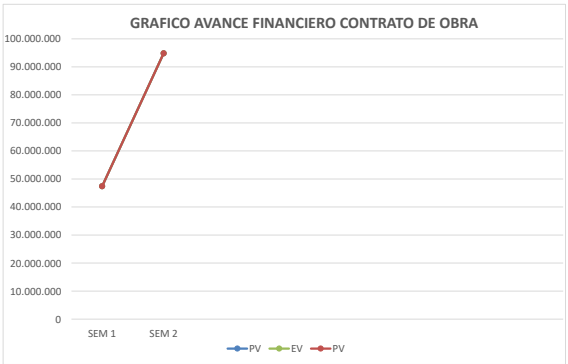

%AVANCE SEMANAL	PROGRAMADO	PV	EJECUTADO	EV	ATRASO
SEM 1	$ 47.420.337,73	$ 47.420.337,73	$ 47.420.337,73	$ 47.420.337,73	$ -
SEM 2	$ 47.420.337,73	$ 94.840.675,47	$ 47.420.337,73	$ 94.840.675,47	$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
ALERTAS					$ -

Nota:

NOTA: Los avances plasmados en este informe se basan en los informes quincenales de interventoría. A la fecha no se tiene informe mensual de interventoría consolidado.

CONTROL DE HITOS DE CONSTRUCCION								
No.	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**No DE DIAS PROGRAMADOS**	**No DE DIAS TRANSCURRIDOS**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**RETRASO/ADELANTO**
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**17/10/2023**	**31/12/2023**					
1	PRELIMINARES	17/10/2023	30/10/2023	13	0	**0,00%**		**0,00%**
2	OBRA CIVIL - ARQUITECTURA	17/10/2023	31/12/2023	75	0	**0,00%**		**0,00%**
3	OBRA ESTRUCTURAL - ESTRUCTURA METALICA	30/10/2023	15/12/2023	46	0	**0,00%**		**0,00%**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	31/12/2023						
	Plazo FALTANTE el Proyecto en Días	**75**						

ALERTA	

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	**Cumple**
El contratista de obra cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	**SI**
Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía y a las demás normas aplicables.	**SI**
Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	**SI**
Presencia de personal de interventoría en las sedes	**SI**
La interventoría realiza el seguimiento a actividades ejecutadas por el contratista de obra	**SI**
La interventoría realiza el seguimiento a ejecución contractual en bitácora de obra	**SI**
La interventoría realiza comités periódicos de obra	**SI**
El interventor exigió el uso de los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad	**SI**
El personal de interventoría utilizo de forma correcta los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad	**SI**
Se presenta concepto sanitario FAVORABLE expedido por la secretaria de salud municipal, para realizar actividades de limpieza y desinfección de tanques.	**SI**
El contratista de obra dio cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición	**SI**
El contratista de obra y el interventor atendieron las solicitudes formuladas por la Dirección Regional y sus centros adscritos	**SI**

Observaciones

TEMAS JURIDICOS CONTRACTUALES

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	**Cumple**
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo.	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
Se implementan protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la resolución N°666 de 2020 y demás normativa emitida por el Gobierno Nacional.	**SI**

Observaciones (DETALLE LOS TEMAS RELEVANTES PARA EL PARA EL COMPONENTE DURANTE LA SEMANA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	
SEMANA No. 1	Inicio de ejecucion de actividades de retiro de drywall existente en los ambientes de hoteleria, cocina. Asi como el retiro de la estructura de soporte del drywall existente
SEMANA No. 2	continua la ejecucion de actividades de retiro de drywall existente en los ambientes de hoteleria, cocina. Asi como el retiro de la estructura de soporte del drywall existente, se culmina esta actividad en la zona de hoteleria y continua en la zona de cocina y logistica

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA	
SEMANA No. 1	Se realiza el seguimiento a la actividad y se hacen las peticiones y correciones pertinentes respecto del uso de los implementos de seguridad para el personal y la ejecucion tecnica de cada una de las actividades.
SEMANA No. 2	Se realiza el seguimiento a la actividad y se hacen las peticiones y correciones pertinentes respecto del uso de los implementos de seguridad para el personal y la ejecucion tecnica de cada una de las actividades.

PERSONAL QUE LABORÓ EN EL MES

PERSONAL CONTRATISTA DE OBA	CANT.	PERSONAL MANO DE OBRA	CANT.	SUBCONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	SUBCONTRATISTA OBRA HIDRAULICOS	CANT.	
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS (AUXILIAR, A		INGENIEROS		INGENIEROS		
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO, INSPECTOR)	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	2	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		
AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	17	AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA		
OFICIALES DE OBRA								
OPERADOR DE MAQUINARIA								
TOTAL	3	TOTAL	22	TOTAL	0	TOTAL	0	

REGISTRO INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA
(Registre los datos de los últimos informes)

PERIODO			ESTADO Y CONTENIDO		
N° INFORME	DESDE	HASTA	Fecha de Entrega	Radicado SENA	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1	17/10/2023	31/10/2023	31/10/2023		Informe de avance de actividades y verificacion de obligaciones del contrato
					<

ANEXOS DE INFORMES DE INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe, de conformidad con las funciones desempeñadas, en Ibagué a los:

Treinta y uno	31	días del mes de	Octubre	de	2023
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año en que se firma el acta)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NOMBRES Y APELLIDOS	Edgar Augusto Prada Canizalez	FIRMA	Firmado digitalmente por Edgar Augusto Prada Canizalez

EQUIPO DE APOYO DE LA REGIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS	Paola Morales	FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Georreferenciación	Descripción
	Capacitacion del personal de obra





Georreferenciación	Descripción
	Desmonta de luminarias existentes en los diferentes ambientes



Georreferenciación	Descripción
	Retiro de cielorraso existente y retiro de estructura





Georreferenciación	Descripción
	Retiro de cielorraso y estructura del mismo
