INFORME DE INTERVENTORIA No.01
Del 17 de Octubre al 31 de Octubre

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL."

CONTRATISTA:
Ing. JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ V.



SENA REGIONAL TOLIMA.
Ibagué Tolima

INTRODUCCIÒN 3

2. CONTRATO DE OBRA 4

2.1. Información del contrato de obra: 4
2.2. Control de pólizas: 5
2.3. Relación de equipo de obra 5
2.4. Estado del tiempo 5
2.5. Balance Financiero contrato de obra: 6

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6

3.1. Información general del contrato. 6
3.2. Control de pólizas: 7
3.3. Balance financiero del contrato de interventoría: 7
3.4. Control y vigilancia de actividades de campo. 7

4. RELACION CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA 8

5. RELACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 8

6. EJECUCION DE OBRA. 9

6.1 Suministro e instalación de campamento provisional de obra 9
6.2 Desmonte de Luminarias Existentes 10
6.3 Desmonte de cielorraso existente 11
6.4 Mantenimiento de estructura metálica existente ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.5 Retiro de escombros ..... **¡Error! Marcador no definido.**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12

INTRODUCCIÒN

El servicio Nacional de Aprendizaje SENA regional Tolima, celebró el contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de fecha 27 de septiembre de 2023, con el Ingeniero JHON FREDY NIÑO ARAGON, el cual tiene como objeto: EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL, de conformidad con lo estipulado en los estudios previos y la propuesta presentada por JHON FREDY NIÑO ARAGON identificado con cedula de ciudadanía No.93.206.420, y los documentos que hacen parte integral del contrato.

De otro lado, mediante contrato de mínima cuantía se adjudicó el contrato de Interventoría Nº. MC-RT-931010-595-2023 al ingeniero JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ. El cual recibió el visto bueno por parte del SENA regional Tolima.

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer el avance de las actividades realizadas por el Contratista de obra entre las fechas 17 de octubre de 2023 hasta el 31 de Octubre de 2023. Durante la presente ejecución del contrato, la Interventoría realizó funciones de control seguimiento y vigilancia de las actividades y obligaciones del constructor, con el fin de verificar el cumplimiento oportuno y eficaz de las mismas en sus aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, en consecuencia, ha impartido instrucciones y recomendaciones al contratista para la ejecución de actividades programadas para el presente período, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 cuyo objeto es: "EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL", suscrito con el servicio Nacional de Aprendizaje SENA regional Tolima y de todas aquellas normas, especificaciones, documentos de orden técnico y legal contenidos en estos.

Durante este período, la Interventoría ejerció sus funciones a través de comunicaciones, comité de obra y bitácora de obra, realizando a su vez control y seguimiento del personal, equipo, estado del tiempo y actividades de obra.

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. Información del contrato de obra:

La Construcción del proyecto consiste en la ejecución de las obras de acuerdo con la estructuración del contrato, características y diseños que proporcionaron los estudios previos efectuados y por la entidad.

Las características principales del contrato son las siguientes:

Contrato No:	CO1.PCCNTR.5402648
Contratista:	JHON FREDY NIÑO ARAGON
Objeto De Contrato:	EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL.
Valor Del Contrato:	Novecientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con sesenta y nueve centavos ($ 948.406.754,69) M/te
Plazo:	Tres (03) Meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. (sin exceder el 31 de diciembre del año 2023)

2.2. Control de pólizas:

El contrato de Obra de la referencia, se encuentra amparada con la garantía única de cumplimiento Nº 4008784 y responsabilidad Civil Extracontractual Nº 4001839 Expedidas por la compañía aseguradora "HDI SEGUROS" el día 12/10/2023 que ampara el contrato de obra Nº CO1.PCCNTR.5402648 suscrito con JHON FREDY NIÑO ARAGON, en los siguientes términos.

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Cumplimiento del contrato	4008784	27/09/2023	30/04/2024	$189.681.351,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	4008784	27/09/2023	30/12/2026	$47.420.337,75
Estabilidad y calidad de la obra	4008784	27/09/2023	27/09/2028	$379.362.702,00

El contrato de Obra de la referencia, se encuentra amparado con la póliza de Responsabilidad civil extracontractual RCE expedida por la compañía " HDI SEGUROS." Nº 4001839; las cuales fueron revisadas y aprobadas el funcionario competente con el siguiente detalle:

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Predios labores y operaciones	4001839	27/09/2023	30/12/2023	$232.000.000,00

2.3. Relación de equipo de obra

- Herramienta Menor
- Andamios certificados

2.4. Estado del tiempo

Durante el desarrollo de la obra hasta la fecha se presentó un 15% de tiempo de lluvia, que durante la ejecución de las actividades realizadas a la fecha no interfiere en el avance de obra

2.5. Balance Financiero contrato de obra:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$948.406.755,00	
SALDO EN EJECUCION		$948,406,755.00
SUMAS IGUALES	**$948.406.755,00**	**$948.406.755,00**

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. Información general del contrato.

Los aspectos generales del contrato son:

Contrato Nº: CO1.PCCNTR.5448117

Contratista: JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
NIT: 93.296.714-9

Contratista: SENA REGIONAL TOLIMA

Objeto/Contrato: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL

Valor/Contrato: Noventa y cuatro millones ochocientos mil pesos ($ 94.800.000,00) M/te

Plazo: Setenta y siete (77) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de ejecución. (Sin exceder el 31 de diciembre de 2023)

3.2. Control de pólizas:

El contrato de Interventoría de la referencia, se encuentra amparado por la póliza Nº 41-44-101275981 (Anexo 0) expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** la que ampara el contrato Nº CO1.PCCNTR.5448117, suscrito con JHAIR RODOLFO GONZALES cual fue revisada por el funcionario competente y aprobado con el siguiente detalle:

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Cumplimiento del contrato	41-44-101275981	11-10-2023	30-04-2024	$18.960.000,00
Calidad del servicio	41-44-101275981	31-12-2023	31-12-2026	$4.740.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	41-44-101275981	11-10-2023	31-12-2028	$18.960.000,00

3.3. Balance financiero del contrato de interventoría:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$94.800.000,00	
SALDO EN EJECUCION		$94,800,000.00
SUMAS IGUALES	**$94.800.000,00**	**$94.800.000,00**

3.4. Control y vigilancia de actividades de campo.

- Verificación y control de materiales.
- Evaluación de terminados acordes a lo contratado en cada uno de sus procedimientos técnicos.
- Vigilancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en la ejecución de la obra.

4. RELACION CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	Tres (03) Meses contados a partir del acta de inicio
ACTA DE INICIO	17-oct-23
FECHA DE TERMINACION	31-dic-23

5. RELACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	77 Días contados a partir del acta de inicio
ACTA DE INICIO	17-oct-23
FECHA DE TERMINACION	31-Dic-23

6. EJECUCION DE OBRA.

6.1 Suministro e instalación de campamento provisional de obra

Esta actividad implica la entrega de infraestructuras temporales funcionales, diseñadas para satisfacer las necesidades de cubierta y resguardo a los equipos del contratista. Este proceso se ejecuta garantizando la eficiencia y la operatividad del campamento. La entidad dispuso de un lugar junto al parqueadero de Motos para su construcción y adecuación. A continuación, se adjunta registro fotográfico de esta actividad.



Ilustración 1 Campamento, Cerramiento y Paso Provisional

6.2 Desmonte de Luminarias Existentes

Luego de la entrega de las áreas de trabajo por parte del SENA, se realizo la actividad de retiro de luminarias, este retiro fue necesario para optimizar la funcionalidad del espacio y facilitar el retiro del cielorraso en drywall cumpliendo con los requisitos del proyecto.

Para el retiro, se elaboró un plan detallado, teniendo en cuenta la ubicación, tipo de fijación y conexiones eléctricas. Se establecieron protocolos de seguridad para minimizar riesgos durante el proceso, Antes de iniciar el retiro de las luminarias, se llevaron a cabo las medidas necesarias para la desconexión eléctrica de cada unidad. Las luminarias fueron retiradas con el cuidado necesario, asegurando la integridad de las conexiones eléctricas y minimizando cualquier daño potencial a las estructuras circundantes. Se implementaron técnicas de manipulación cuidadosa y, en casos necesarios, se contó con el apoyo de equipos especializados.



Ilustración 2 Desmonte de luminarias

6.3 Desmonte de cielorraso existente

Durante la ejecución del proyecto, se llevó a cabo el desmonte del cielorraso existente y su estructura de soporte como parte integral de las modificaciones planificadas. Este proceso fue ejecutado con precisión técnica para garantizar la seguridad, eficiencia y la preparación adecuada para la instalación de la nueva infraestructura. A continuación, se detallan los aspectos técnicos clave de esta actividad. Se realizó una evaluación minuciosa del cielorraso existente y su estructura de soporte para determinar el método más apropiado de desmonte, A continuación, se adjunta registro fotográfico de la ejecución de esta actividad.



Ilustración 3 Desmonte de Cielorraso

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la ejecución del proyecto de modificación del cielorraso y el mantenimiento estructural, se llevaron a cabo una serie de actividades técnicas que han dejado resultados significativos. A continuación, se presentan las principales conclusiones derivadas de estas intervenciones:

- El proceso de desmonte del cielorraso existente en drywall se llevó a cabo de manera sistemática y cuidadosa, respetando los estándares de seguridad y minimizando cualquier impacto negativo en las estructuras circundantes.

- La coordinación efectiva entre los equipos de desmonte y construcción garantizó una transición sin problemas hacia las fases posteriores del proyecto.

- El proceso de retiro de luminarias fue ejecutado de forma segura, desconectando cuidadosamente las conexiones eléctricas y garantizando la preservación de las instalaciones circundantes.

- El mantenimiento de la estructura metálica tipo cercha se llevó a cabo con un enfoque proactivo, identificando y abordando áreas afectadas por corrosión o daño**.**

- La aplicación de recubrimientos anticorrosivos y pintura protectora no solo mejoró la estética de la estructura, sino que también prolongó su vida útil y resistencia ante condiciones ambientales adversas.

- La fase de retiro de escombros se ejecutó de manera eficiente, gestionando adecuadamente los residuos derivados del desmonte del cielorraso y la estructura de soporte.

- En todas las fases del proyecto, se implementaron medidas de seguridad rigurosas, incluyendo el uso adecuado de equipos de protección personal, señalización efectiva y zonas seguras.

- Los estándares de calidad han sido exigidos en cada etapa, asegurando la entrega de cada una de las actividades con el cumplimiento de las mismas.

- Se establecieron zonas seguras y se colocaron señales para informar a los trabajadores y visitantes sobre las áreas de trabajo activas y las rutas seguras.

- Se coordinó el acceso controlado a la zona de ejecución de actividades para minimizar riesgos potenciales.

- La implementación de protocolos de seguridad y la capacitación adecuada contribuyeron a la prevención de incidentes y al cumplimiento de estándares de seguridad rigurosos.

- A la fecha se tiene proyectada una ejecución aproximada del 10%, se le ha consultado al contratista sobre el suministro de cubierta y los tiempos de entrega estimados y manifiesta que se encuentra en fabricación la totalidad de la misma.

En resumen, el desmonte del cielorraso y luminarias se encuentra en ejecución y se lleva a cabo con éxito, destacando la eficiencia operativa, el compromiso con la seguridad y la atención a los detalles técnicos.

Al presente informe se anexan los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo del personal adscrito a la ejecución de obra.

Ing. **JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**.
Interventor Externo.

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL."

CONTRATISTA:
Ing. JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ V.



SENA REGIONAL TOLIMA.
Ibagué Tolima

1.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 3

1.2. PERSONAL DE LA OBRA 3

1.3. REGISTO DE DOCUMENTOS DE TRABAJADORES 4

1.3.1. SOPORTES DE APTITUD PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (CERTIFICADOS DE ENTRENAMIENTO TSA Y/O REENTRENAMIENTO T.S.A) 4

1.4. INDICADORES DE GESTION Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDAES GENERALES Y LABORALES. 10

1.4.1 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 10

1.4.2 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 10

1.4.3 INDICADORES DE AUSENTISMO 11

1.4.5. HISTORICO DE CASOS REPORTADOS 11

1.5. PLAN DE EMERGENCIAS 11

1.6. REGISTROS DE INSPECCION 11

1.6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DEL BUEN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 11

1.6.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS 12

1.7. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACION 13

1.7.1. LISTADO DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDAD MES DESDE EL 17 OCTUBRE /23 AL 31 DE OCTUBRE /23 13

1.8. REGISTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 14

1.8.1. ORDEN Y ASEO 14

1.9 ANEXOS 17

1.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

El objeto del contrato a ejecutar es: contratar la interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) del contrato de obra cuyo objeto es diseño y construcción de cubierta para las edificaciones del centro de comercio y servicios y el despacho de dirección regional."

1.2. PERSONAL DE LA OBRA

Se relaciona el personal que durante el periodo comprendido del 17 de octubre al 31 de Octubre de 2023 labora en la obra:

APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	CARGO	ACTIVO
BAYONA	CHRISTIAN	1.005.752.234	AYUDANTE	NO
BAYONA	MARLON	1.005.712.547	AYUDANTE	SI
MORALES	LUCAS	93.202.048	AYUDANTE	NO
RIVERA	CRISTIAN	1.110.569.061	INGENIERO RESIDENTE	SI
ROCHA	WILSON	1.110.468.420	OFICIAL	SI
RODRIGUEZ	YENNY	28.567.327	SGSST	SI
MORA	JERSSON	1.106.397.294	OFICIAL	SI

1.3. REGISTO DE DOCUMENTOS DE TRABAJADORES

Se realizó la verificación y seguimiento de las afiliaciones al sistema de seguridad social del personal de obra por parte de la interventoría, cumpliendo con los requerimientos contractuales. A continuación, se adjunta imagen de la planilla la cual se adjunta como anexo al presente documento.

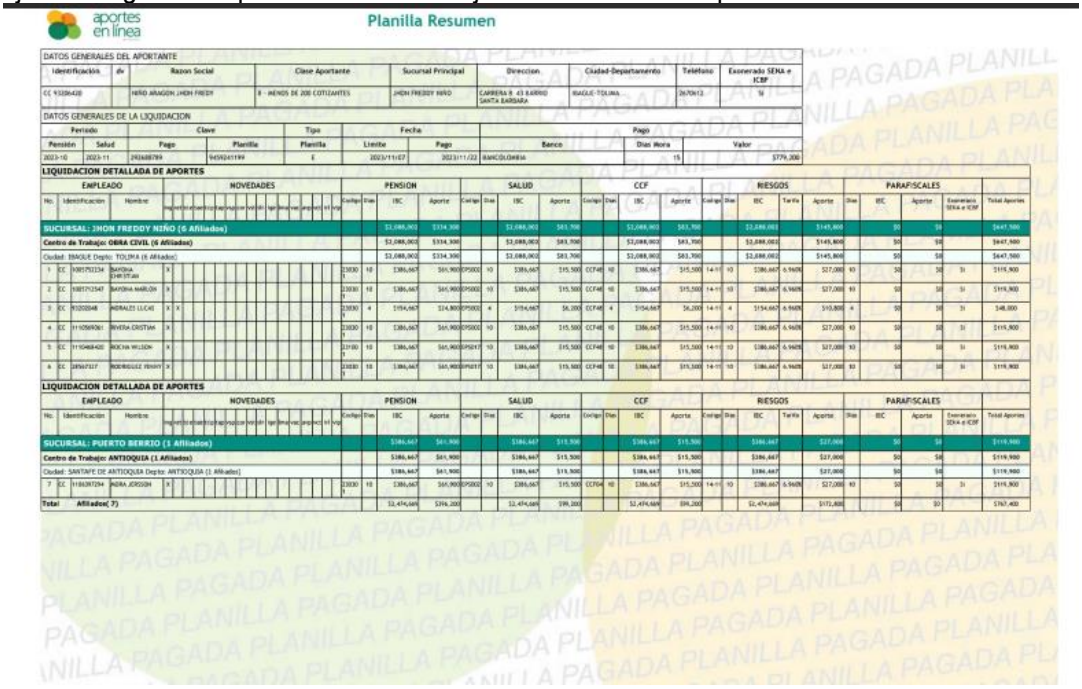


Ilustración 1 Seguridad social

1.3.1. SOPORTES DE APTITUD PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (CERTIFICADOS DE ENTRENAMIENTO TSA Y/O REENTRENAMIENTO T.S.A)

Se realizó la verificación de los certificados de trabajo seguro en alturas del personal de obra por parte de la interventoría, cumpliendo con los requerimientos del Ministerio de trabajo para su veracidad como constancia de formación vocacional a continuación, se adjunta imágenes con certificado de alturas del personal.



Libertad y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

NTC 6072:2014

I.M.A
Israel Muñoz Ardila
Trabajo Seguro en Alturas

Autorizado y Aprobado por el Ministerio de Trabajo Nº 08SE2018220000000013795 Bajo Resolución 4272 del 2021 y Certificado por Bureau Veritas con Nº CO21.01617 Acreditado ONAC 09-CPR-008

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Cristian Samuel Rivera Carvajal

Con numero de cedula 1.110.569.061

Asistió y aprobó la capacitación y entrenamiento trabajo seguro en alturas

NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Con una duración de 32 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente [illegible] a los Veinticinco (25) Días del mes de Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023)

ISRAEL MUÑOZ ARDILA
Líder de operaciones
Ingeniero Industrial-Especialista en seguridad industrial y salud ocupacional
LIC.S.O. Resolución 13024 SSB 08/10/2021
Para verificación de autenticidad: imardila221@gmail.com
I.M.A Calle 37 N 7-104 B/Gaitan
CEL:3138482733-3166904803

FABIO GALLO PULIDO
LIC S.O N 4712 de abril 2019
Entrenador Certificado Trabajo Seguro en Alturas

EMPRESA: *JHON FREDY NIÑO ARAGON*
NIT: *93206420-4*
ARL: *SURA*
REPRESENTANTE LEGAL: *JHON FREDY NIÑO ARAGON*

Código: 012310-00005235

Powered by CamScanner

Ilustración 2 curso de alturas (Cristian Samuel rivera Carvajal)



Libertad y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

NTC 6072:2014

I.M.A
Israel Muñoz Ardila
Trabajo Seguro en Alturas

Autorizado y Aprobado por el Ministerio de Trabajo N° 08SE2018220000000013795 Bajo Resolución 4272 del 2021 y Certificado por Bureau Veritas con N° CO21.01617 Acreditado ONAC 09-CPR-008

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Yenny Astrid Rodriguez Basto

Con numero de cedula 28.567.237

Asistió y aprobó la capacitación y entrenamiento trabajo seguro en alturas

NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Con una duración de 32 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Ibagué, a los Veinticinco (25) Días del mes de Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023)

ISRAEL MUÑOZ ARDILA
Líder de operaciones
Ingeniero Industrial-Especialista en seguridad industrial y salud ocupacional
LIC.S.O. Resolución 13024 SSB 08/10/2021
Para verificación de autenticidad: imardila221@gmail.com
I.M.A Calle 37 N 7-104 B/Gaitan
CEL:3138482733-3166904803

FABIO GALLO PULIDO
LIC S.O N 4712 de abril 2019
Entrenador Certificado Trabajo Seguro en Alturas

EMPRESA: JHON FREDY NIÑO ARAGON
NIT.: 93206420-4
ARL: SURA
REPRESENTANTE LEGAL: JHON FREDY NIÑO ARAGON

Código: 012310-00005235

Ilustración 3 curso de alturas (Yenny Astrid Rodriguez Basto)



Ilustración 4 curso de alturas (Lucas Alirio morales Hernández)



Libertad y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

NTC 6072:2014

I.M.A
Israel Muñoz Ardila
Trabajo Seguro en Alturas

Autorizado y Aprobado por el Ministerio de Trabajo N° 08SE2018220000000013795 Bajo Resolución 4272 del 2021 y Certificado por Bureau Veritas con N° CO21.01617 Acreditado ONAC 09-CPR-008

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Jersson Julian Mora Otavo
Con numero de cedula 1.106.397.294
Asistió y aprobó la capacitación y entrenamiento trabajo seguro en alturas

NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Con una duración de 32 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Ibagué, a los Veinticinco (25) Días del mes de Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023)

ISRAEL MUÑOZ ARDILA
Líder de operaciones
Ingeniero Industrial-Especialista en seguridad industrial y salud ocupacional
LIC.S.O. Resolución 13024 SSB 08/10/2021
Para verificación de autenticidad: imardila221@gmail.com
I.M.A Calle 37 N 7-104 B/Gaitan
CEL: 3138482733-3166904803

FABIO GALLO PULIDO
LIC S.O N 4712 de abril 2019
Entrenador Certificado Trabajo Seguro en Alturas

EMPRESA: *JHON FREDY NIÑO ARAGON*
NIT: *93206420-4*
ARL: *SURA*
REPRESENTANTE LEGAL: *JHON FREDY NIÑO ARAGON*

Código: 012310-00005235

Ilustración 5 curso de alturas (Jersson julian mora otavo)



Libertad y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

NTC 6072:2014

I.M.A
Israel Muñoz Ardila
Trabajo Seguro en Alturas

Autorizado y Aprobado por el Ministerio de Trabajo N° 08SE2018220000000013795 Bajo Resolución 4272 del 2021 y Certificado por Bureau Veritas con N° CO21.01617 Acreditado ONAC 09-CPR-008

CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Wilson Alexander Rocha Palacio
Con numero de cedula 1.110.468.420
Asistió y aprobó la capacitación y entrenamiento trabajo seguro en alturas

NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Con una duración de 32 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Ibagué, a los Veinticinco (25) Días del mes de Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023)

ISRAEL MUÑOZ ARDILA
Líder de operaciones
Ingeniero Industrial-Especialista en seguridad industrial y salud ocupacional
LIC.S.O. Resolución 13024 SSB 08/10/2021
Para verificación de autenticidad: imardila221@gmail.com
I.M.A Calle 37 N 7-104 B/Gaitan
CEL: 3138482733-3166904803

FABIO GALLO PULIDO
LIC S.O N 4712 de abril 2019
Entrenador Certificado Trabajo Seguro en Alturas

EMPRESA: *JHON FREDY NIÑO ARAGON*
NIT: *93206420-4*
ARL: *SURA*
REPRESENTANTE LEGAL: *JHON FREDY NIÑO ARAGON*

Código: 012310-00005236

Ilustración 6 curso de alturas (Wilson Alexander rocha palacio)

1.4. INDICADORES DE GESTION Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDAES GENERALES Y LABORALES.

1.4.1 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Se realizó seguimiento a los indicadores de accidentalidad durante el periodo del 17 de octubre al 31 de octubre, no se han presentado accidentes / Incidentes

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD									
MES	N° de AT	HHT	N° Días Perdidos por AT	No. AT Graves	No. Trabajadores Mes	I.F AT	I.S. AT	ILI 2023	Tasa AT
OCTUBRE	0	392	0	0	6	0	0	0	0
TOTAL	**0**	1728	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0%**

I.F: INDICE DE FRECUENCIA ACCIDENTES DE TRABAJO

I.S: INDICE DE SEVERIDAD ACCIDENTES DE TRABAJO

I.L.I: INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES

1.4.2 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Durante el Periodo del 17 octubre al 31 de octubre no se presentaron Accidentes, ni Incidentes de trabajo

1.4.3 INDICADORES DE AUSENTISMO

Durante el periodo del 17 al 31 de octubre, no se presentaron ausentismos, Este indicador nos refleja que en la organización no se han presentado accidentes de trabajo en el mes, lo cual demuestra el compromiso frente a las actividades de prevención en los temas de SST.

INDICADORES DE AUSENTISMO								
MES	No. De trabajadores	No. de casos existentes de EG	No. Casos existentes de EL	No. Casos Nuevos EL	N° Días Perdidos por EG	Incidencia EL	Prevalencia general de la EL	Prevalencia global de la EG 2023
OCTUBRE	7	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTUALES	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4.5. HISTORICO DE CASOS REPORTADOS

N/A

1.5. PLAN DE EMERGENCIAS

En aras de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores cuenta con un plan de emergencias y con los equipos requeridos para atender cualquier eventualidad, ajustado para el contrato.

GRUPO (LUGAR)	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANTIDAD
AREA DE HOTELERIA	BOTIQUIN	0
	EXTINTOR	0
	CAMILLA	1

1.6. REGISTROS DE INSPECCION

1.6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DEL BUEN USO DE ELEMENTOS DE

PROTECCIÓN PERSONAL

En cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Se realiza inspección de uso de los elementos de protección personal, inspeccionando cada uno de los trabajadores donde se observa en qué estado se encuentran, limpieza, cuidados y su uso.

INSPECCION	APELLIDOS	NOMBRES	OBSERVACIONES
DIARIA	BAYONA	CHRISTIAN	Bueno
DIARIA	BAYONA	MARLON	Bueno
DIARIA	ROCHA	WILSON	Bueno
DIARIA	MORA	JERSSON	Bueno

NOTA: En estado General de Inspección se debe especificar si es Bueno (B), Regular (R), Malo (M)

1.6.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

INSPECCION	APELLIDOS	NOMBRES	OBSERVACIONES
DIARIA	BAYONA	CHRISTIAN	NA
DIARIA	BAYONA	MARLON	NA
DIARIA	ROCHA	WILSON	NA
DIARIA	MORA	JERSSON	NA

Nota: Durante las actividades no ha requerido de equipo protección contra caídas. Se realizará la verificación de los mismo en próximas actividades que se requieran por parte de la interventoría

1.6.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD SISTEMAS DE ACCESO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Se realiza inspección del andamio por parte de la interventoría, con el fin de garantizar que todas las piezas del andamio están en perfectas condiciones de seguridad para realizar las actividades de trabajo seguro en alturas

INSPECCION	SISTEMA DE ACCESO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	OBSERVACIONES
DIARIA	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 2 MTS	Bueno

1.7. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACION

Como parte de la mejora continua y el compromiso con el SGSST la interventoría realiza seguimiento de las charlas diarias, para el personal por parte de la interventoría.

1.7.1. LISTADO DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDAD MES DESDE EL 17 OCTUBRE /23 AL 23 DE NOVIEMBRE /23

FECHA	TEMA	TIPO
23-10-2023	Políticas, no consumo de sustancias, tabaco y alcohol	charla
24-10-2023	Que es un accidente de trabajo	charla
25-10-2023	Riesgo físico	charla
26-10-2023	Sustancias peligrosas	charla
27-10-2023	Riesgo ambiental	charla
30-10-2023	Síndrome del arnés	charla
31-10-2023	Hábitos de vida saludable	charla

1.8. REGISTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

1.8.1. ORDEN Y ASEO

Dentro de las actividades de gestión ambiental, se realiza seguimiento de orden y aseo de las áreas intervenidas, Es oportuno señalar que la Seguridad y Salud en el Trabajo busca generar condiciones de trabajo y calidad de vida laboral óptimas las cuales representan bienestar a los funcionarios, mayor productividad, mejoramiento en el clima laboral, lo cual conlleva al logro de objetivos



Ilustración 7 orden y aseo de áreas intervenidas

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

	
Observaciones: Verificación de pausas actividad dentro de la jornada laboral	Observaciones: Entrega de EPP
	
Observaciones: Verificación de permisos	Observaciones: Verificación de ATS

	
Observaciones: Entrega de EPP	Observaciones: se verifica rotulación de sustancias

	
Observaciones: Entrega de dotación	Observaciones: Entrega y reposición de EPP

	
Observaciones: Charla de seguridad	Observaciones: Capacitación sst
	
Observaciones: Pausas activas durante la jornada laboral	Observaciones: Orden y aseo de áreas intervenidas

1.9 ANEXOS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93206420		NIÑO ARAGON JHON FREDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 8 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	292688789	9459241199	E	2023/11/07	2023/11/22	BANCOLOMBIA	15	$779,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tcp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JHON FREDDY NIÑO (6 Afiliados)																						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (6 Afiliados)																						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
1	CC	1005752234	BAYONA CHRISTIAN	X																23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
2	CC	1005712547	BAYONA MARLON	X																23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
3	CC	93202048	MORALES LUCAS	X	X															23030	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF48	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
4	CC	1110569061	RIVERA CRISTIAN	X																23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
5	CC	1110468420	ROCHA WILSON	X																23100	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
6	CC	28567327	RODRIGUEZ YENNY	X																23030	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tcp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO BERRIO (1 Afiliados)																						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
7	CC	1106397294	MORA JERSSON	X																23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF04	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
Total	**Afiliados(7)**																					$2,474,669	$396,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669		$172,800		$0	$0		$767,400

Página 1 de 2

2023/11/22 03:49 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93206420		NIÑO ARAGON JHON FREDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 8 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	29268789	9459241199	E	2023/11/07	2023/11/22	BANCOLOMBIA	15	$779,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exoneracio SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JHON FREDDY NIÑO (6 Afiliados)																						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (6 Afiliados)																						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
1	CC	1005752234	BAYONA CHRISTIAN	X																23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
2	CC	1005712547	BAYONA MARLON	X																23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
3	CC	93202048	MORALES LUCAS	X	X															23030	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF48	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	Si	$48,000
4	CC	1110569061	RIVERA CRISTIAN	X																23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
5	CC	1110468420	ROCHA WILSON	X																23100	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
6	CC	28567327	RODRIGUEZ YEHNY	X																23030	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exoneracio SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO BERRIO (1 Afiliados)																						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
7	CC	1106397294	MORA JERSSON	X																23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF04	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
Total	**Afiliados(7)**																					$2,474,669	$396,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669		$172,800		$0	$0		$767,400

Página 1 de 2

2023/11/22 03:49 PM

Powered by CamScanner
