INFORME DE INTERVENTORIA No.02
De 01 de noviembre a 15 de noviembre de 2023

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL."

CONTRATISTA:
Ing. JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ V.



SENA REGIONAL TOLIMA.
Ibagué Tolima

INTRODUCCIÒN 3

2. CONTRATO DE OBRA 4

2.1. Información del contrato de obra: 4
2.2. Control de pólizas: 5
2.3. Relación de equipo de obra 5
2.4. Estado del tiempo 5
2.5. Balance Financiero contrato de obra: 6

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6

3.1. Información general del contrato. 6
3.2. Control de pólizas: 7
3.3. Balance financiero del contrato de interventoría: 7
3.4. Control y vigilancia de actividades de campo. 7

4. RELACION CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA 8

5. RELACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 8

6.1 Desmonte de cielorraso existente 9
6.2 Mantenimiento de estructura metálica existente 10
6.3 Retiro de escombros 11

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12

INTRODUCCIÒN

El servicio Nacional de Aprendizaje SENA regional Tolima, celebró el contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de fecha 27 de septiembre de 2023, con el Ingeniero JHON FREDY NIÑO ARAGON, el cual tiene como objeto: EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL, de conformidad con lo estipulado en los estudios previos y la propuesta presentada por JHON FREDY NIÑO ARAGON identificado con cedula de ciudadanía No.93.206.420, y los documentos que hacen parte integral del contrato.

De otro lado, mediante contrato de mínima cuantía se adjudicó el contrato de Interventoría Nº. MC-RT-931010-595-2023 al ingeniero JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ. El cual recibió el visto bueno por parte del SENA regional Tolima.

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer el avance de las actividades realizadas por el Contratista de obra entre las fechas 31 de octubre de 2023 hasta el 15 de Noviembre de 2023. Durante la presente ejecución del contrato, la Interventoría realizó funciones de control seguimiento y vigilancia de las actividades y obligaciones del constructor, con el fin de verificar el cumplimiento oportuno y eficaz de las mismas en sus aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, en consecuencia, ha impartido instrucciones y recomendaciones al contratista para la ejecución de actividades programadas para el presente período, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 cuyo objeto es: "EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL", suscrito con el servicio Nacional de Aprendizaje SENA regional Tolima y de todas aquellas normas, especificaciones, documentos de orden técnico y legal contenidos en estos.

Durante este período, la Interventoría ejerció sus funciones a través de comunicaciones, comité de obra y bitácora de obra, realizando a su vez control y seguimiento del personal, equipo, estado del tiempo y actividades de obra.

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. Información del contrato de obra:

La Construcción del proyecto consiste en la ejecución de las obras de acuerdo con la estructuración del contrato, características y diseños que proporcionaron los estudios previos efectuados y por la entidad.

Las características principales del contrato son las siguientes:

Contrato No:	CO1.PCCNTR.5402648
Contratista:	JHON FREDY NIÑO ARAGON
Objeto De Contrato:	EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL.
Valor Del Contrato:	Novecientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con sesenta y nueve centavos ($ 948.406.754,69) M/te
Plazo:	Tres (03) Meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. (sin exceder el 31 de diciembre de 2023)

2.2. Control de pólizas:

El contrato de Obra de la referencia, se encuentra amparada con la garantía única de cumplimiento Nº 4008784 y responsabilidad Civil Extracontractual Nº 4001839 Expedidas por la compañía aseguradora "HDI SEGUROS" el día 12/10/2023 que ampara el contrato de obra Nº CO1.PCCNTR.5402648 suscrito con JHON FREDY NIÑO ARAGON, en los siguientes términos.

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Cumplimiento del contrato	4008784	27/09/2023	30/04/2024	$189.681.351,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	4008784	27/09/2023	30/12/2026	$47.420.337,75
Estabilidad y calidad de la obra	4008784	27/09/2023	27/09/2028	$379.362.702,00

El contrato de Obra de la referencia, se encuentra amparado con la póliza de Responsabilidad civil extracontractual RCE expedida por la compañía " HDI SEGUROS." Nº 4001839; las cuales fueron revisadas y aprobadas el funcionario competente con el siguiente detalle:

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Predios labores y operaciones	4001839	27/09/2023	30/12/2023	$232.000.000,00

2.3. Relación de equipo de obra

- Herramienta Menor
- Andamios certificados

2.4. Estado del tiempo

Durante el desarrollo de la obra hasta la fecha se presentó un 10% de tiempo de lluvia, que durante la ejecución de las actividades realizadas a la fecha no interfiere en el avance de obra

2.5. Balance Financiero contrato de obra:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$948.406.755,00	
ACTA PARCIAL No. 01		$244,642,322.86
SALDO EN EJECUCION		$703,764,431.83
SUMAS IGUALES	**$948.406.755,00**	**$948.406.755,00**

NOTA: El contratista se encuentra en proceso de cobro del acta parcial No. 01

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. Información general del contrato.

Los aspectos generales del contrato son:

Contrato Nº: CO1.PCCNTR.5448117

Contratista: JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
NIT: 93.296.714-9

Contratista: SENA REGIONAL TOLIMA

Objeto/Contrato: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL

Valor/Contrato: Noventa y cuatro millones ochocientos mil pesos ($ 94.800.000,00) M/te

Plazo: Setenta y siete (77) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de ejecución. (Sin exceder el 31 de diciembre de 2023)

3.2. Control de pólizas:

El contrato de Interventoría de la referencia, se encuentra amparado por la póliza Nº 41-44-101275981 (Anexo 0) expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** la que ampara el contrato Nº CO1.PCCNTR.5448117, suscrito con JHAIR RODOLFO GONZALES cual fue revisada por el funcionario competente y aprobado con el siguiente detalle:

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Cumplimiento del contrato	41-44-101275981	11-10-2023	30-04-2024	$18.960.000,00
Calidad del servicio	41-44-101275981	31-12-2023	31-12-2026	$4.740.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	41-44-101275981	11-10-2023	31-12-2028	$18.960.000,00

3.3. Balance financiero del contrato de interventoría:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$94.800.000,00	
SALDO EN EJECUCION		$94,800,000.00
SUMAS IGUALES	**$94.800.000,00**	**$94.800.000,00**

3.4. Control y vigilancia de actividades de campo.

- Verificación y control de materiales.
- Evaluación de terminados acordes a lo contratado en cada uno de sus procedimientos técnicos.
- Vigilancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en la ejecución de la obra.

4. RELACION CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	Tres (03) Meses contados a partir del acta de inicio
ACTA DE INICIO	17-oct-23
FECHA DE TERMINACION	31-dic-23

5. RELACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	77 Días contados a partir del acta de inicio
ACTA DE INICIO	17-oct-23
FECHA DE TERMINACION	31-Dic-23

6. EJECUCION DE OBRA.

6.1 Desmonte de cielorraso existente

Durante la ejecución del proyecto, se llevó a cabo el desmonte del cielorraso existente y su estructura de soporte como parte integral de las modificaciones planificadas. Este proceso fue ejecutado con precisión técnica para garantizar la seguridad, eficiencia y la preparación adecuada para la instalación de la nueva infraestructura. A continuación, se detallan los aspectos técnicos clave de esta actividad. Se realizó una evaluación minuciosa del cielorraso existente y su estructura de soporte para determinar el método más apropiado de desmonte, A continuación, se adjunta registro fotográfico de la ejecución de esta actividad.



Ilustración 1 Desmonte de Cielorraso

6.2 Mantenimiento de estructura metálica existente

Durante la fase de ejecución del proyecto, se llevó a cabo un riguroso mantenimiento y pintura de la estructura metálica de soporte de la cubierta, específicamente una estructura tipo cercha. Este proceso, desarrollado con precisión técnica, abordó de manera integral la conservación y mejora de la integridad estructural, Se realizó una inspección exhaustiva de la estructura tipo cercha para identificar áreas afectadas por corrosión, impurezas u otros signos de deterioro. Se estableció un plan detallado de mantenimiento basado en la evaluación inicial, definiendo las áreas prioritarias y los métodos de intervención. Se llevaron a cabo procedimientos de limpieza exhaustiva para eliminar impurezas, suciedad y cualquier capa de óxido presente en la estructura. Adicionalmente Se utilizaron métodos específicos, como cepillado, para garantizar la eliminación completa de corrosión superficial. Luego de esto se procedió con la preparación y aplicación de anticorrosivo a fin de proteger de cualquier agente erosivo la estructura. A continuación, se adjunta registro fotográfico.



Ilustración 2 Mantenimiento de estructura metálica existente

6.3 Retiro de escombros

Durante la ejecución del proyecto, se completó la fase de retiro de escombros, que incluyó tanto los residuos derivados del cielorraso en drywall como la estructura de soporte previamente desmontada. Este proceso se llevó a cabo con el objetivo de asegurar la limpieza del área de trabajo y facilitar la transición hacia las etapas posteriores del proyecto. El retiro de escombros se realizó de manera controlada y metódica, evitando cualquier impacto negativo en las áreas circundantes. A continuación, se adjunta registro fotográfico de la ejecución de esta actividad.

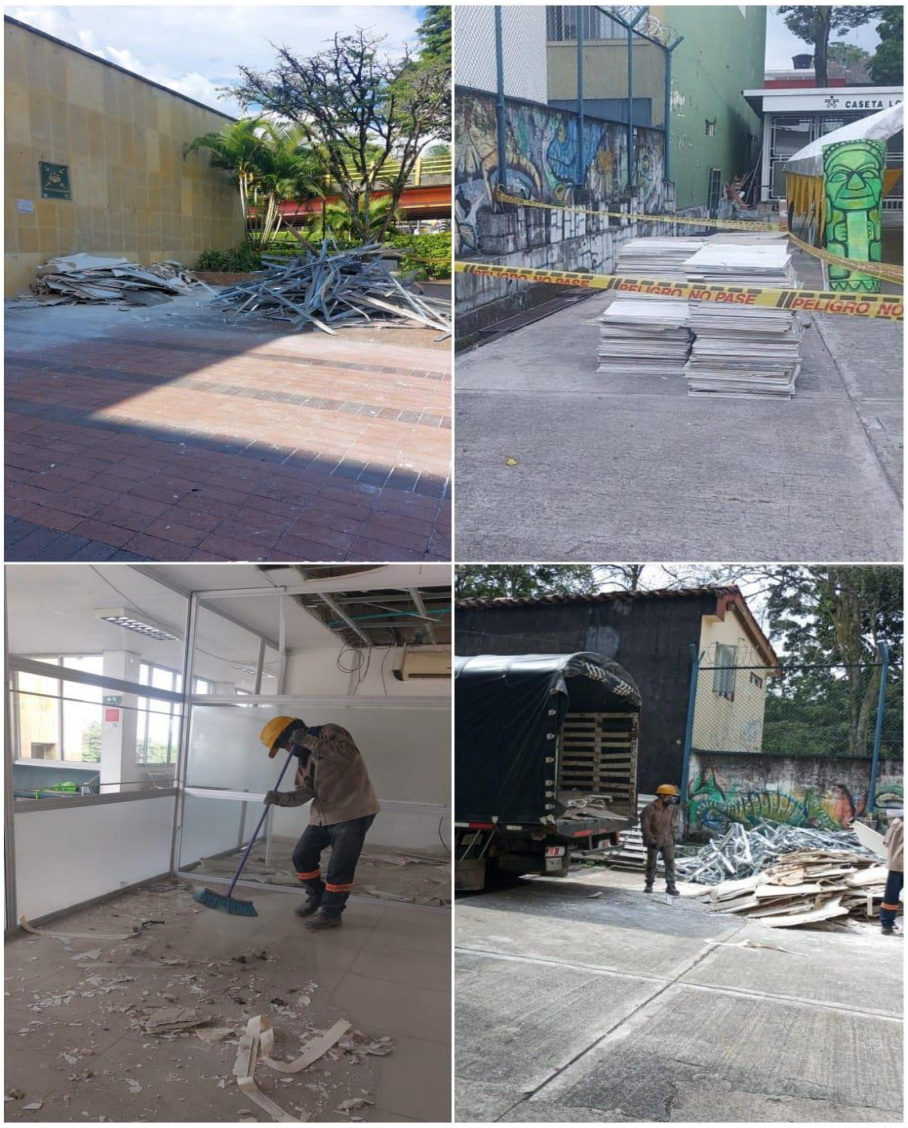


Ilustración 3 Retiro de escombros

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la ejecución del proyecto de mantenimiento de cubierta de estructura metálica y retiro de escombros

Evaluación Integral de la Estructura Metálica:

La inspección detallada de la estructura metálica existente reveló la presencia de corrosión en diversas áreas. La intervención oportuna resulta esencial para prevenir daños adicionales y garantizar la estabilidad estructural a largo plazo.

Mantenimiento Ante Corrosión:

Se llevaron a cabo acciones efectivas para el tratamiento de la corrosión, incluyendo limpieza, aplicación de inhibidores y recubrimientos protectores. Estas medidas se traducirán en una prolongación significativa de la vida útil de la estructura.

Reforzamiento con Nuevas Cerchas:

La instalación de nuevas cerchas ha fortalecido significativamente la capacidad de carga y resistencia estructural. Este refuerzo se diseñó con base en estándares normativos y específicamente adaptado a las necesidades de la estructura existente.

Adecuación para Instalación de Cubierta Nueva:

Las adecuaciones realizadas cumplen con los requisitos necesarios para soportar la instalación de la nueva cubierta, asegurando una integración armoniosa entre la estructura metálica y los componentes de la cubierta.

Planificación y Secuencia de Trabajo:

La planificación cuidadosa de las actividades de mantenimiento y la secuencia de trabajo han contribuido a minimizar los tiempos de inactividad y optimizar la eficiencia del proceso, garantizando un progreso constante en la obra.

Supervisión de Calidad en la Ejecución:

La supervisión rigurosa de la ejecución de las tareas de mantenimiento ha asegurado que se cumplan los estándares de calidad establecidos, desde la preparación de la superficie hasta la aplicación de recubrimientos protectores.

Coordinación Efectiva con Contratistas:

La colaboración eficiente con los contratistas involucrados en la instalación de las cerchas y la cubierta ha facilitado la sincronización de actividades y la resolución oportuna de cualquier desafío encontrado durante el proceso.

Capacitación del Personal:

Se proporcionó capacitación adecuada al personal involucrado, enfocándose en las mejores prácticas de seguridad, manejo de materiales y técnicas de instalación, contribuyendo a un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

Monitoreo Continuo y Pruebas de Calidad:

Se implementará un plan de monitoreo continuo para evaluar la efectividad de las acciones de mantenimiento y la durabilidad de las nuevas instalaciones, con pruebas de calidad programadas para verificar el rendimiento a lo largo del tiempo.

A la fecha el contratista de Obra manifiesta retrasos en el suministro de la cubierta por parte del proveedor, y se encuentra ejecutando actividades para la preparación y retiro de cubierta existente e instalación de la nueva.

Al presente informe se anexan los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo del personal adscrito a la ejecución de obra.

Ing. **JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**.
Interventor Externo.

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL."

CONTRATISTA:
Ing. JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ V.



SENA REGIONAL TOLIMA.
Ibagué Tolima

1.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 3

1.2. PERSONAL DE LA OBRA 3

1.3. REGISTO DE DOCUMENTOS DE TRABAJADORES 4

1.3.1. SOPORTES DE APTITUD PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (CERTIFICADOS DE ENTRENAMIENTO TSA Y/O REENTRENAMIENTO T.S.A) 4

1.4. INDICADORES DE GESTION Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDAES GENERALES Y LABORALES. 6

1.4.1 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 6

1.4.2 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 6

1.4.3 INDICADORES DE AUSENTISMO 7

1.4.5. HISTORICO DE CASOS REPORTADOS 7

1.5. PLAN DE EMERGENCIAS 7

1.6. REGISTROS DE INSPECCION 7

1.6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DEL BUEN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 7

1.6.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS 8

1.7. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACION 9

1.7.1. LISTADO DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDAD DEL 1 DE NOVIEMBRE/23 AL 15 DE NOVIEMBRE /23 9

1.8. REGISTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 10

1.8.1. ORDEN Y ASEO 10

1.8.2. PUNTO ECOLOGICO 11

1.8.3. DISPOSICION FINAL DE MATERIALES 11

1.9 ANEXOS 13

1.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

El objeto del contrato a ejecutar es: contratar la interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) del contrato de obra cuyo objeto es diseño y construcción de cubierta para las edificaciones del centro de comercio y servicios y el despacho de dirección regional."


1.2. PERSONAL DE LA OBRA

Se relaciona el personal que durante el periodo comprendido del 01 de noviembre al 15 de noviembre de 2023 labora en la obra:

APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	CARGO	ACTIVO
BAYONA	MARLON	1.005.712.547	AYUDANTE	SI
RIVERA	CRISTIAN	1.110.569.061	INGENIERO RESIDENTE	SI
ROCHA	WILSON	1.110.468.420	OFICIAL	SI
RODRIGUEZ	YENNY	28.567.327	SGSST	SI
MORA	JERSSON	1.106.397.294	OFICIAL	SI

1.3. REGISTO DE DOCUMENTOS DE TRABAJADORES

Se realizo la verificación y seguimiento de las afiliaciones al sistema de seguridad social del personal de obra por parte de la interventoría, cumpliendo con los requerimientos contractuales. A continuación, se adjunta imagen de la planilla la cual se adjunta como anexo al presente documento.

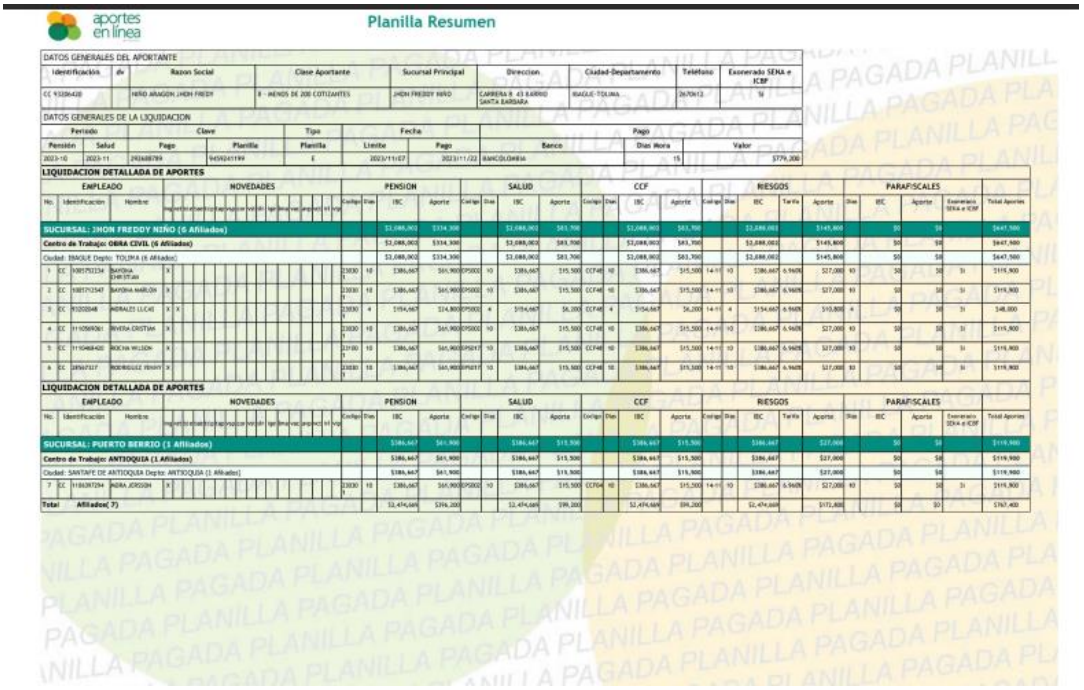

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93394428		NIÑO ARAGON JHON FREDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 8 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	241668789	94592411199	E	2023/11/07	2023/11/22	BANCOLOMBIA	15	$779,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JHON FREDDY NIÑO (6 Afiliados)						$2,088,900	$334,300			$2,088,900	$83,700			$2,088,900	$83,700			$2,088,900		$145,800	$0	$0			$647,500
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (6 Afiliados)						$2,088,900	$334,300			$2,088,900	$83,700			$2,088,900	$83,700			$2,088,900		$145,800	$0	$0			$647,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)						$2,088,900	$334,300			$2,088,900	$83,700			$2,088,900	$83,700			$2,088,900		$145,800	$0	$0			$647,500
1	CC	1001751234	BAYONA SANTIAGO	X		23030 1	10	$386,667	$61,900	DPS02	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-III	10	$386,667	6.9658	$27,000	30	$0	$0	31	$119,900
2	CC	1001712547	BAYONA MARLON	X		23030 1	10	$386,667	$61,900	DPS02	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-III	10	$386,667	6.9658	$27,000	30	$0	$0	31	$119,900
3	CC	93202048	MORALES LUCAS	X	X	23030 1	4	$154,667	$24,800	DPS02	4	$154,667	$6,200	CCF48	4	$154,667	$6,200	14-III	4	$154,667	6.9658	$10,800	4	$0	$0	31	$48,000
4	CC	1110569261	RIVERA CRISTIAN	X		23030 1	10	$386,667	$61,900	DPS02	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-III	10	$386,667	6.9658	$27,000	30	$0	$0	31	$119,900
5	CC	1110468420	ROCHA WILSON	X		23030 1	10	$386,667	$61,900	DPS02	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-III	10	$386,667	6.9658	$27,000	30	$0	$0	31	$119,900
6	CC	28567177	RODRIGUEZ YENNY	X		23030 1	10	$386,667	$61,900	DPS02	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-III	10	$386,667	6.9658	$27,000	30	$0	$0	31	$119,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO BERRIO (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000	$0	$0			$119,900
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000	$0	$0			$119,900
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000	$0	$0			$119,900
7	CC	1118367294	MORA JORDAN	X		23030 1	10	$386,667	$61,900	DPS02	10	$386,667	$15,500	CCF64	10	$386,667	$15,500	14-III	10	$386,667	6.9658	$27,000	30	$0	$0	31	$119,900
Total		Afiliados(7)				$2,474,669	$396,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669		$172,800	$0	$0			$767,400

Ilustración 1 Seguridad social

1.3.1. SOPORTES DE APTITUD PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (CERTIFICADOS DE ENTRENAMIENTO TSA Y/O REENTRENAMIENTO T.S.A)

Por parte de la interventoría se hace seguimiento continuo al personal que ingresa verificando que cuenten con los certificados de trabajo seguro en alturas, pro del cumplimiento de los estándares del Ministerio de trabajo, se realiza verificación del curso y en la página del ministerio.

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que WILSON ALEXANDER ROCHA PALACIO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1110468420, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ISRAEL ARDILA MUNOZ ARDILA
ENTRENADOR: FABIO GALLO PULIDO
SEDE DONDE SE FORMÓ: ISRAEL MUÑOZ ARDILA (I.M.A)
EMPLEADOR: JHON FREDY NI?O ARAGON
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 22/10/2023 a 25/10/2023
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Ilustración 2 Verificación curso de alturas

1.4. INDICADORES DE GESTION Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDAES GENERALES Y LABORALES.

1.4.1 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Se realizó seguimiento a los indicadores de accidentalidad durante el periodo de 01 de noviembre hasta el 15 de noviembre, no se han presentado accidentes / Incidentes

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD									
MES	N° de AT	HHT	N° Días Perdidos por AT	No. AT Graves	No. Trabajadores Mes	I.F AT	I.S. AT	ILI 2023	Tasa AT
NOVIEMBRE	0	728	0	0	5	0	0	0	0
TOTAL	**0**	728	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0%**

I.F: INDICE DE FRECUENCIA ACCIDENTES DE TRABAJO

I.S: INDICE DE SEVERIDAD ACCIDENTES DE TRABAJO

I.L.I: INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES

1.4.2 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Durante el Periodo del 01 noviembre al 15 de noviembre no se presentaron Accidentes, ni Incidentes de trabajo

1.4.3 INDICADORES DE AUSENTISMO

Durante el periodo del 01 de noviembre al 15 de noviembre de 2023, no se presentaron ausentismos.

INDICADORES DE AUSENTISMO								
MES	No. De trabajadores	No. de casos existentes de EG	No. Casos existentes de EL	No. Casos Nuevos EL	N° Días Perdidos por EG	Incidencia EL	Prevalencia general de la EL	Prevalencia global de la EG 2023
NOVIEMBRE	7	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTUALES	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4.5. HISTORICO DE CASOS REPORTADOS

N/A

1.5. PLAN DE EMERGENCIAS

En aras de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores cuenta con un plan de emergencias y con los equipos requeridos para atender cualquier eventualidad, ajustado para el contrato.

GRUPO (LUGAR)	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANTIDAD
AREA DE HOTELERIA	BOTIQUIN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1

1.6. REGISTROS DE INSPECCION

1.6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DEL BUEN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Dentro de la matriz de EPP y dando cumplimiento al sistema de gestión se realiza entrega de EPP de acuerdo a la actividad y/o reposición de los mismos, se hace inspecciones continuas del buen uso, cuidado y limpieza de los mismos.

INSPECCION	APELLIDOS	NOMBRES	OBSERVACIONES
DIARIA	BAYONA	CHRISTIAN	Bueno
DIARIA	BAYONA	MARLON	Bueno
DIARIA	ROCHA	WILSON	Bueno
DIARIA	MORA	JERSSON	Bueno

NOTA: En estado General de Inspección se debe especificar si es Bueno (B), Regular (R), Malo (M)

1.6.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

INSPECCION	APELLIDOS	NOMBRES	OBSERVACIONES
DIARIA	BAYONA	CHRISTIAN	NA
DIARIA	BAYONA	MARLON	NA
DIARIA	ROCHA	WILSON	NA
DIARIA	MORA	JERSSON	NA

Nota: En este periodo no sea ha dado uso a los equipos de protección contra caídas.

1.6.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD SISTEMAS DE ACCESO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Dando cumplimiento con el Programa de prevención y protección contra caídas en alturas, se realiza inspección y verificación de armado de andamios por parte de la interventoría, buscando garanticas las condiciones de seguridad al momento de realizar dichas actividades.

INSPECCION	SISTEMA DE ACCESO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	OBSERVACIONES
DIARIA	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 2 MTS	Bueno
DIARIA	ANDAMIO TUBULAR PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	Bueno

1.7. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACION

Dando cumplimiento con el cronograma de charas y capacitaciones del SGSST, la interventoría verifica que se realicen

1.7.1. LISTADO DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDAD MES DESDE EL 01 NOVIEMBRE /23 AL 15 DE NOVIEMBRE /23

FECHA	TEMA	TIPO
01-11-2023	Riesgo biomecánico	charla
02-11-2023	Peligro y riesgo	charla
03-11-2023	Cuidado de manos	charla
04-11-2023	Riesgo mecánico	charla
05-11-2023	Pausas activas	charla
08-11-2023	Cuidado de EPP	charla
09-11-2023	Condiciones subestandar	charla
10-11-2023	Accidente de trabajo	charla
11-11-2023	Condiciones de seguridad	charla
14-11-2023	Rotulación química	charla
15-11-2023	Utilización de los 3 R	charla

1.8. REGISTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

1.8.1. ORDEN Y ASEO

Mediante el programa de orden y aseo, se realiza seguimiento de las áreas intervenidas por parte de la interventoría, buscando prevenir accidentes laborales, cuidando la integridad del personal y calidad laboral para obtener una mejor productividad.

	
Observaciones: orden y aseo de área intervenida	Observaciones: acopio de material retirado para disposición final
	
Observaciones: Protección de equipos	Observaciones: Orden y aseo de área intervenida

1.8.2. PUNTO ECOLOGICO

Se realiza instalación y seguimiento desde el área de interventoría con el fin de observar si la disposición de los residuos en el punto ecológico se está realizando adecuadamente, lo cual permite recuperar la mayor cantidad de residuos aprovechables.



Ilustración 3 instalación de punto ecológico

1.8.3. DISPOSICION FINAL DE MATERIALES


Seguimiento de la disposición de los residuos sólidos por parte de la interventoría, se anexa certificado N° 2023146

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

	
Observaciones: Instalación de protección cocina europea	Observaciones: Charlas de seguridad 5 minutos
	
Observaciones: Verificación de armado de andamio	Observaciones: Protección de áreas intervenidas

	
Observaciones: Entrega y reposición de EPP	Observaciones: Entrega y reposición de EPP

1.9 ANEXOS

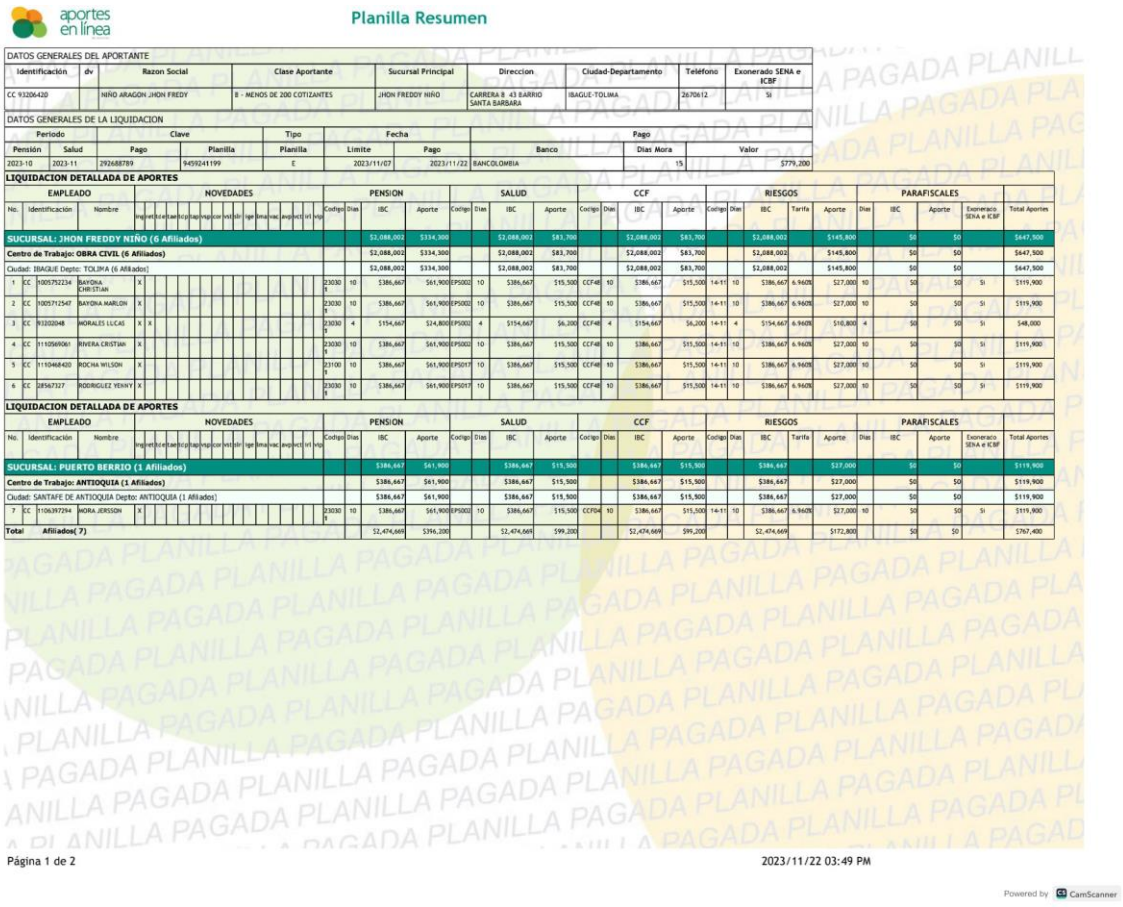

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93206420		NIÑO ARAGON JHON FREDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 8 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	292688789	9459241199	E	2023/11/07	2023/11/22	BANCOLOMBIA	15	$779,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exoneraco SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JHON FREDDY NIÑO (6 Afiliados)						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (6 Afiliados)						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
1	CC 1005752234	BAYONA CHRISTIAN	X	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
2	CC 1005712547	BAYONA MARLON	X	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
3	CC 93202048	MORALES LUCAS	X X	23030	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF48	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
4	CC 1110569061	RIVERA CRISTIAN	X	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
5	CC 1110468420	ROCHA WILSON	X	23100	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
6	CC 28567327	RODRIGUEZ YENNY	X	23030	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exoneraco SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO BERRIO (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
7	CC 1106397294	MORA JERSSON	X	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF04	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
Total Afiliados(7)						$2,474,669	$396,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669		$172,800		$0	$0		$767,400

Página 1 de 2

2023/11/22 03:49 PM

Powered by CamScanner

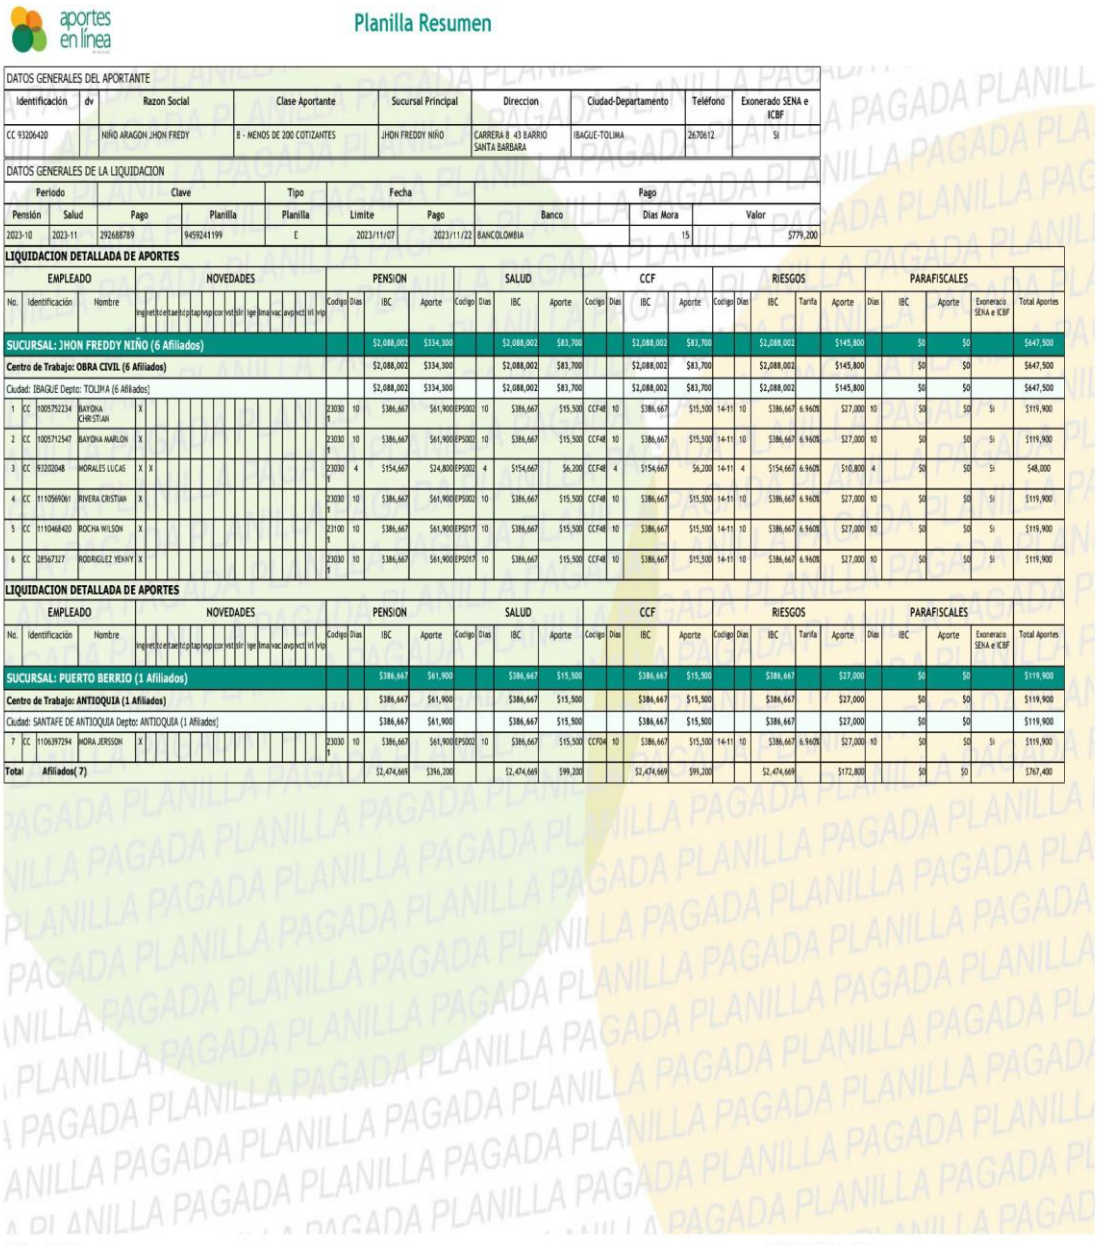

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93206420		NIÑO ARAGON JHON FREDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 8 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	29268789	9459241199	E	2023/11/07	2023/11/22	BANCOLOMBIA	15	$779,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exoneracio SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JHON FREDDY NIÑO (6 Afiliados)						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (6 Afiliados)						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
1	CC	1005752234	BAYONA CHRISTIAN X	23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
2	CC	1005712547	BAYONA MARLON X	23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
3	CC	93202048	MORALES LUCAS X X	23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF48	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	Si	$48,000
4	CC	1110569061	RIVERA CRISTIAN X	23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
5	CC	1110468420	ROCHA WILSON X	23100 1	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
6	CC	28567327	RODRIGUEZ YEHNY X	23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exoneracio SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO BERRIO (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
7	CC	1106397294	MORA JERSSON X	23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF04	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
Total	**Afiliados(7)**					$2,474,669	$396,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669		$172,800		$0	$0		$767,400

Página 1 de 2

2023/11/22 03:49 PM

Powered by CamScanner



ESCOMBRERA "LA PONDEROSA"



Aprobada por Resolución No. 1331 del 6 Abril de 2017 por CORTOLIMA

No. 2023146

Ibagué, 20 Noviembre de 2023

JAIRO ANTONIO LOZANO MARQUEZ
NIT: 93.378.362-2

HACE CONSTAR

Que yo, **JAIRO ANTONIO LOZANO MARQUEZ**, identificado como aparece al pie de mi firma y quien actuó como administrador de la escombrera ubicada en la Vereda la Helena, Predio "LA PONDEROSA" jurisdicción del municipio de Ibagué, departamento del Tolima y cuyo permiso fue otorgado mediante la **RESOLUCION No. 1331 del 06 de ABRIL de 2017**. Lo cual se otorgó "**PERMISO DE ALMACENAMIENTO, DISPOSICION DE ESCOMBROS, APROVECHAMIENTO FORESTAL**" a favor de la SOCIEDAD REYCHA S.A.S identificada con Nit. 900.461102-7.

De acuerdo a la anterior se recibió de **JHON FREDY NIÑO ARAGON** con C.C No.93.206.420 se le ha prestado el servicio de disposición final de Material **DRYWALL** de la **OBRA CL 43 a #2ª – 2ª-36 SENA CIUDAD DE IBAGUE**, FECHA: **NOVIEMBRE 08** del 2023, **TIPO DE RESIDUO:** Obra Civil, **VEHICULO:** SYM345 **CANTIDAD: TOTAL: 14M³APROX VALE: No. 5223**

Dada a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del 2023.

En constancia firma,

Jairo Antonio Lozano Marquez
NIT: 93.378362-2
3115314350 – 3216543190.
C. COPIA A CORTOLIMA

Vereda La Helena: 2 Km Vía El Puente del País – San Bernardo
Correo: frarut@hotmail.com
Celular: 3115314350 - 3216543190
Ibagué - Tolima

Powered by CamScanner
