INFORME DE INTERVENTORIA No.03
Del 16 a 30 de noviembre de 2023.

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL."

CONTRATISTA:
Ing. JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ V.



SENA REGIONAL TOLIMA.
Ibagué Tolima

INTRODUCCIÒN 3

2. CONTRATO DE OBRA 4

2.1. Información del contrato de obra: 4
2.2. Control de pólizas: 5
2.3. Relación de equipo de obra 5
2.4. Estado del tiempo 6
2.5. Balance Financiero contrato de obra: 6

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6

3.1. Información general del contrato. 6
3.2. Control de pólizas: 7
3.3. Balance financiero del contrato de interventoría: 7
3.4. Control y vigilancia de actividades de campo. 7

4. RELACION CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA 8

5. RELACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 8

6.1 Mantenimiento de estructura metálica existente 9
6.2 Retiro de Aires Acondicionados 10
6.3 Instalación de drywall 11

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12

INTRODUCCIÒN

El servicio Nacional de Aprendizaje SENA regional Tolima, celebró el contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de fecha 27 de septiembre de 2023, con el Ingeniero JHON FREDY NIÑO ARAGON, el cual tiene como objeto: EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL, de conformidad con lo estipulado en los estudios previos y la propuesta presentada por JHON FREDY NIÑO ARAGON identificado con cedula de ciudadanía No.93.206.420, y los documentos que hacen parte integral del contrato.

De otro lado, mediante contrato de mínima cuantía se adjudicó el contrato de Interventoría Nº. MC-RT-931010-595-2023 al ingeniero JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ. El cual recibió el visto bueno por parte del SENA regional Tolima.

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer el avance de las actividades realizadas por el Contratista de obra entre las fechas 15 de Noviembre de 2023 hasta el 30 de Noviembre de 2023. Durante la presente ejecución del contrato, la Interventoría realizó funciones de control seguimiento y vigilancia de las actividades y obligaciones del constructor, con el fin de verificar el cumplimiento oportuno y eficaz de las mismas en sus aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, en consecuencia, ha impartido instrucciones y recomendaciones al contratista para la ejecución de actividades programadas para el presente período, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 cuyo objeto es: "EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL", suscrito con el servicio Nacional de Aprendizaje SENA regional Tolima y de todas aquellas normas, especificaciones, documentos de orden técnico y legal contenidos en estos.

Durante este período, la Interventoría ejerció sus funciones a través de comunicaciones, comité de obra y bitácora de obra, realizando a su vez control y seguimiento del personal, equipo, estado del tiempo y actividades de obra.

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. Información del contrato de obra:

La Construcción del proyecto consiste en la ejecución de las obras de acuerdo con la estructuración del contrato, características y diseños que proporcionaron los estudios previos efectuados y por la entidad.

Las características principales del contrato son las siguientes:

Contrato No:	CO1.PCCNTR.5402648
Contratista:	JHON FREDY NIÑO ARAGON
Objeto De Contrato:	EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL.
Valor Del Contrato:	Novecientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con sesenta y nueve centavos ($ 948.406.754,69) M/te
Plazo:	Tres (03) Meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. (Sin exceder el 31 de diciembre de 2023)

2.2. Control de pólizas:

El contrato de Obra de la referencia, se encuentra amparada con la garantía única de cumplimiento Nº 4008784 y responsabilidad Civil Extracontractual Nº 4001839 Expedidas por la compañía aseguradora "HDI SEGUROS" el día 12/10/2023 que ampara el contrato de obra Nº CO1.PCCNTR.5402648 suscrito con JHON FREDY NIÑO ARAGON, en los siguientes términos.

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Cumplimiento del contrato	4008784	27/09/2023	30/04/2024	$189.681.351,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	4008784	27/09/2023	30/12/2026	$47.420.337,75
Estabilidad y calidad de la obra	4008784	27/09/2023	27/09/2028	$379.362.702,00

El contrato de Obra de la referencia, se encuentra amparado con la póliza de Responsabilidad civil extracontractual RCE expedida por la compañía " HDI SEGUROS." Nº 4001839; las cuales fueron revisadas y aprobadas el funcionario competente con el siguiente detalle:

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Predios labores y operaciones	4001839	27/09/2023	30/12/2023	$232.000.000,00

2.3. Relación de equipo de obra

- Herramienta Menor
- Andamios certificados

2.4. Estado del tiempo

Durante el desarrollo de la obra hasta la fecha se presentó un 10% de tiempo de lluvia, que durante la ejecución de las actividades realizadas a la fecha no interfiere en el avance de obra

2.5. Balance Financiero contrato de obra:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$948.406.755,00	
ACTA PARCIAL No. 01		$244,642,322.86
SALDO EN EJECUCION		$703,764,431.83
SUMAS IGUALES	**$948.406.755,00**	**$948.406.755,00**

NOTA: El contratista se encuentra en proceso de cobro del acta parcial No. 01

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. Información general del contrato.

Los aspectos generales del contrato son:

Contrato Nº: CO1.PCCNTR.5448117

Contratista: JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
NIT: 93.296.714-9

Contratista: SENA REGIONAL TOLIMA

Objeto/Contrato: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL

Valor/Contrato: Noventa y cuatro millones ochocientos mil pesos ($ 94.800.000,00) M/te

Plazo: Setenta y siete (77) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de ejecución sin exceder el 31 de diciembre de 2023

3.2. Control de pólizas:

El contrato de Interventoría de la referencia, se encuentra amparado por la póliza Nº 41-44-101275981 (Anexo 0) expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** la que ampara el contrato Nº CO1.PCCNTR.5448117, suscrito con JHAIR RODOLFO GONZALES cual fue revisada por el funcionario competente y aprobado con el siguiente detalle:

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Cumplimiento del contrato	41-44-101275981	11-10-2023	30-04-2024	$18.960.000,00
Calidad del servicio	41-44-101275981	31-12-2023	31-12-2026	$4.740.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	41-44-101275981	11-10-2023	31-12-2028	$18.960.000,00

3.3. Balance financiero del contrato de interventoría:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$94.800.000,00	
SALDO EN EJECUCION		$94,800,000.00
SUMAS IGUALES	**$94.800.000,00**	**$94.800.000,00**

3.4. Control y vigilancia de actividades de campo.

- Verificación y control de materiales.
- Evaluación de terminados acordes a lo contratado en cada uno de sus procedimientos técnicos.
- Vigilancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en la ejecución de la obra.

4. RELACION CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	Tres (03) Meses contados a partir del acta de inicio
ACTA DE INICIO	17-oct-23
FECHA DE TERMINACION	31-dic-23

5. RELACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	77 Días contados a partir del acta de inicio
ACTA DE INICIO	17-oct-23
FECHA DE TERMINACION	31-Dic-23

6. EJECUCION DE OBRA.

6.1 Mantenimiento de estructura metálica existente

Durante el presente periodo continuo el mantenimiento de la estructura metálica existente y la adaptación para la instalación de la nueva cubierta, para lo cual se debieron instalar cerchas de refuerzo, a fin de garantizar la correcta sujeción de las tejas a instalar.

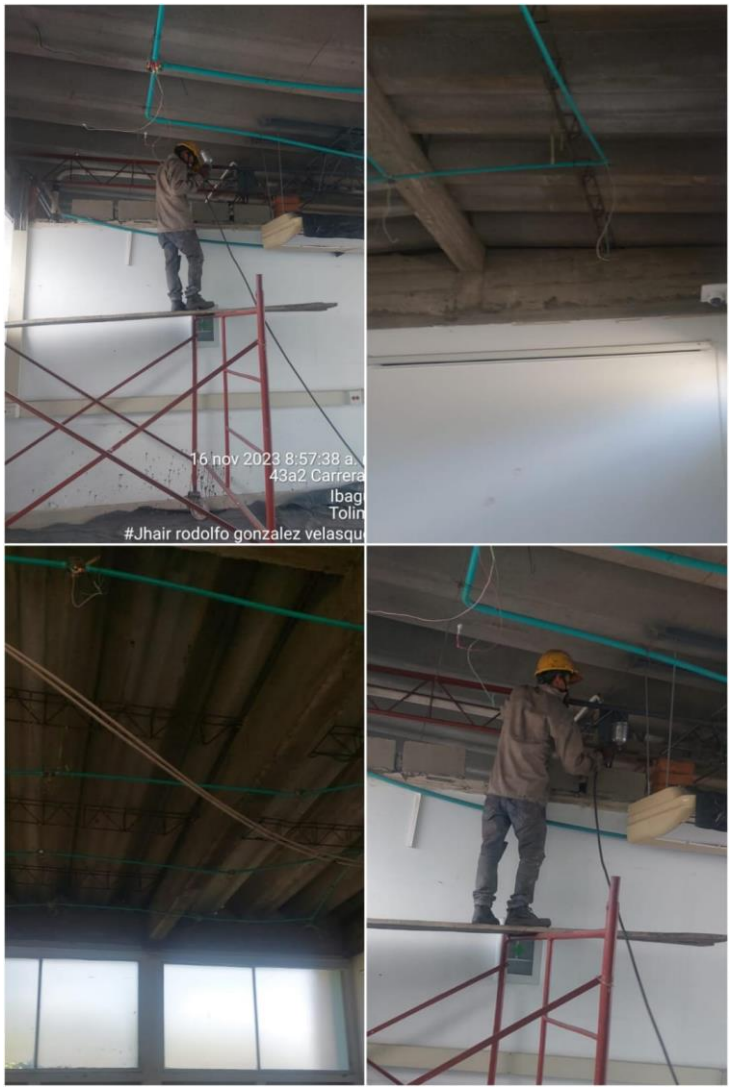


Ilustración 1 Mantenimiento de estructura metálica existente

6.2 Retiro de Aires Acondicionados

Durante la ejecución del proyecto, se realizo el desmonte de aires acondicionados, tarea que se encontraba dentro de las actividades contractuales.

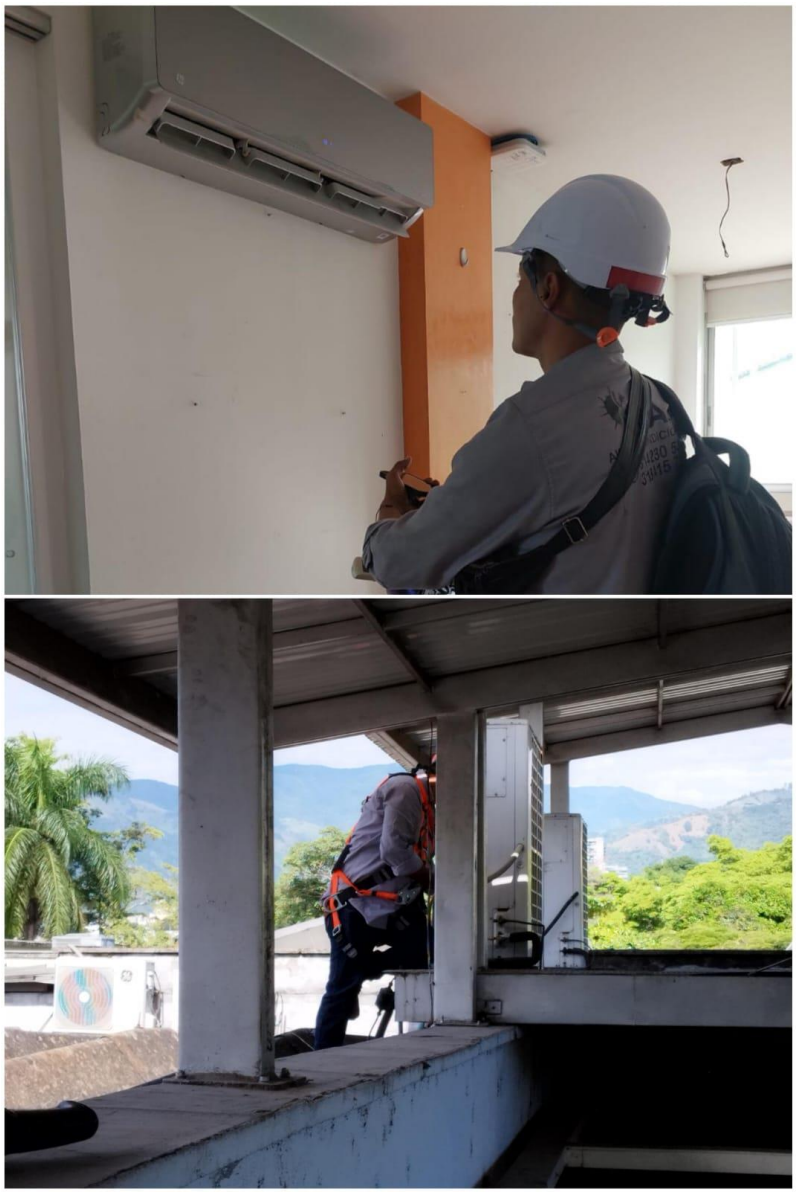


Ilustración 2 Desmonte de aires acondicionados

6.3 Instalación de drywall

En esta fase inicial, estamos ejecutando la instalación de la estructura para el Drywall. Se está realizando un seguimiento meticuloso, verificando la nivelación y asegurando una instalación precisa para cumplir con los estándares técnicos requeridos. Estamos comprometidos con la correcta ejecución de esta actividad. A la fecha solo se inició su instalación en las oficinas de dirección regional, ya que en este espacio se cuenta con una cubierta en placa y la teja a instalar se encuentra sobrepuesta en la misma.



Ilustración 3 Inicio de actividad de instalación de drywall

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La inspección detallada de la estructura metálica existente reveló la presencia de corrosión en diversas áreas. La intervención oportuna resulta esencial para prevenir daños adicionales y garantizar la estabilidad estructural a largo plazo.

- Se realiza el mantenimiento a la estructura metálica existente y se realizó la instalación de los refuerzos en cercha para la correcta sujeción de la estructura.

- La instalación de nuevas cerchas ha fortalecido significativamente la capacidad de carga y resistencia estructural. Este refuerzo se diseñó con base en estándares normativos y específicamente adaptado a las necesidades de la estructura existente.

- La actividad de mantenimiento de estructura metálica se encuentra en un porcentaje de avance cercano al 65%.

- A la fecha se le ha solicitado reiteradamente al contratista mediante oficios la fecha de inicio de actividades de suministro e instalación de cubierta, a lo cual ha manifestado que la misma llega el día 8 de diciembre, de la misma manera se le han solicitado planes de choque para mitigar los retrasos en la ejecución de la misma.

- Se ha llevado a cabo un seguimiento técnico exhaustivo durante todas las etapas de la instalación del Drywall, garantizando la adherencia a los estándares y especificaciones técnicas establecidos.

- La meticulosa verificación de la nivelación ha sido prioritaria, asegurando que cada elemento de Drywall se ajuste con precisión, cumpliendo con los requisitos técnicos para un resultado homogéneo.

- Se han implementado ajustes y correcciones inmediatas en el proceso, en respuesta a las observaciones del seguimiento técnico, asegurando una instalación libre de desviaciones y acorde con las normativas.

- Cada fase de la instalación se ha desarrollado cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas para el Drywall, garantizando una ejecución que refleje precisión y calidad.

- La colaboración estrecha con el equipo técnico ha sido fundamental para abordar cualquier desafío identificado durante la instalación, permitiendo la implementación de soluciones técnicas eficientes.

- Se ha mantenido una documentación detallada de cada etapa del proceso, incluyendo registros fotográficos y mediciones, proporcionando una base sólida para la evaluación del progreso técnico.

Al presente informe se anexan los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo del personal adscrito a la ejecución de obra.



Ing. **JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**.
Interventor Externo.

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL."

CONTRATISTA:
Ing. JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ V.



SENA REGIONAL TOLIMA.
Ibagué Tolima

1.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 3

1.2. PERSONAL DE LA OBRA 3

1.3. REGISTO DE DOCUMENTOS DE TRABAJADORES 4

1.3.1. SOPORTES DE APTITUD PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (CERTIFICADOS DE ENTRENAMIENTO TSA Y/O REENTRENAMIENTO T.S.A) 4

1.4. INDICADORES DE GESTION Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDAES GENERALES Y LABORALES. 6

1.4.1 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 6

1.4.2 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 6

1.4.3 INDICADORES DE AUSENTISMO 7

1.4.5. HISTORICO DE CASOS REPORTADOS 7

1.5. PLAN DE EMERGENCIAS 7

1.6. REGISTROS DE INSPECCION 7

1.6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DEL BUEN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 8

1.6.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS 8

1.7. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACION 9

1.7.1. LISTADO DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDAD DEL 16 DE NOVIEMBRE/23 AL 30 DE NOVIEMBRE /23 9

1.8. REGISTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 10

1.8.1. ORDEN Y ASEO 10

1.9 ANEXOS 14

1.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

El objeto del contrato a ejecutar es: contratar la interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) del contrato de obra cuyo objeto es diseño y construcción de cubierta para las edificaciones del centro de comercio y servicios y el despacho de dirección regional."

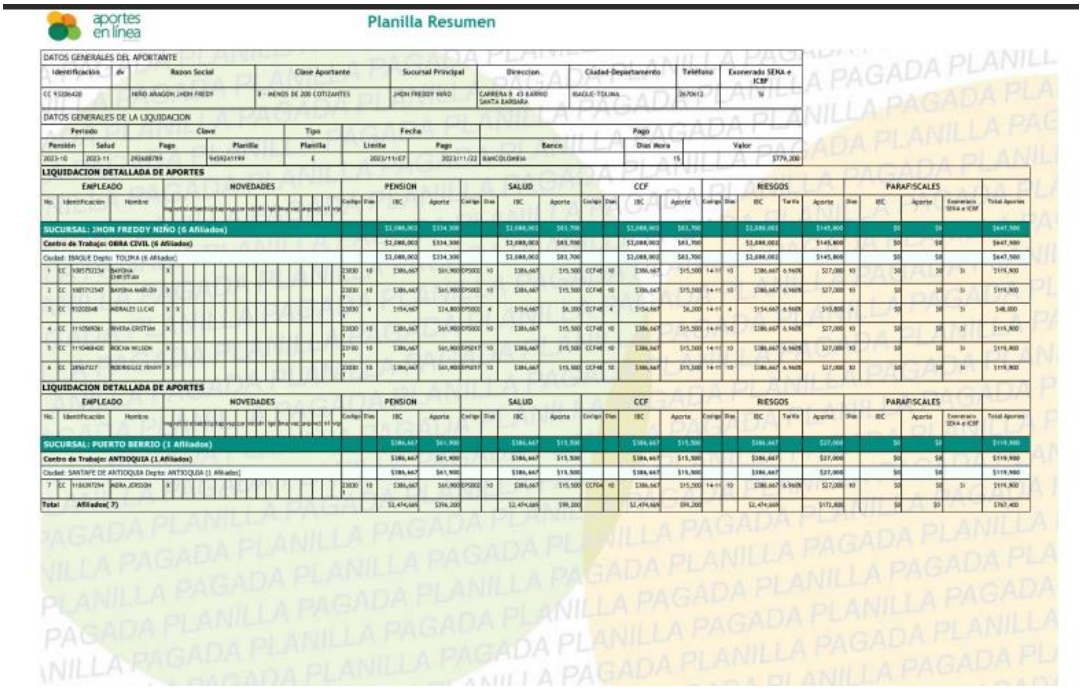
1.2. PERSONAL DE LA OBRA

Relación del personal que durante el periodo comprendido del 16 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 labora en la obra:

APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	CARGO	ACTIVO
BAYONA	MARLON	1.005.712.547	AYUDANTE	SI
RIVERA	CRISTIAN	1.110.569.061	INGENIERO RESIDENTE	SI
ROCHA	WILSON	1.110.468.420	OFICIAL	SI
RODRIGUEZ	YENNY	28.567.327	SGSST	SI
MORA	JERSSON	1.106.397.294	OFICIAL	SI

1.3. REGISTO DE DOCUMENTOS DE TRABAJADORES

Desde del área de SST por parte de la interventoría se verifica que se cumpla con las afiliaciones del personal al sistema de seguridad social, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato. A continuación, se adjunta imagen de la planilla la cual se adjunta como anexo al presente documento.


aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91356420		NIÑO ARAGON JHON FREDY	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 9 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-10	2023-11	2926688799	94592431799	E	2023/11/07	2023/11/22	BANCOLOMBIA	15	$779,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JHON FREDDY NIÑO (6 Afiliados)						$3,088,902	$334,300			$3,088,902	$83,700			$3,088,902	$83,700			$2,886,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (6 Afiliados)						$3,088,902	$334,300			$3,088,902	$83,700			$3,088,902	$83,700			$2,886,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)						$3,088,902	$334,300			$3,088,902	$83,700			$3,088,902	$83,700			$2,886,002		$145,800		$0	$0		$647,500
1	CC	1085753234	BAYONA CHRISTIAN	X		23030 1	10	$386,667	$65,900	DP5002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-II	10	$386,667	6.9428	$27,000	10	$0	$0	31	$119,900
2	CC	1085712547	BAYONA MARLON	X		23030 1	10	$386,667	$65,900	DP5002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-II	10	$386,667	6.9428	$27,000	10	$0	$0	31	$119,900
3	CC	93202848	MORALES LUCAS	X	X	23030 1	4	$154,667	$24,800	DP5002	4	$154,667	$6,200	CCF48	4	$154,667	$6,200	14-II	4	$154,667	6.9428	$10,800	4	$0	$0	31	$48,000
4	CC	1110569261	RIVERA CRISTIAN	X		23030 1	10	$386,667	$65,900	DP5002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-II	10	$386,667	6.9428	$27,000	10	$0	$0	31	$119,900
5	CC	1110468420	ROCHA WILSON	X		23100 1	10	$386,667	$65,900	DP5217	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-II	10	$386,667	6.9428	$27,000	10	$0	$0	31	$119,900
6	CC	38567117	RODRIGUEZ PENNY	X		23030 1	10	$386,667	$65,900	DP5217	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-II	10	$386,667	6.9428	$27,000	10	$0	$0	31	$119,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO BERRIO (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
7	CC	1106367294	MORA JORDAN	X		23030 1	10	$386,667	$65,900	DP5002	10	$386,667	$15,500	CCF64	10	$386,667	$15,500	14-II	10	$386,667	6.9428	$27,000	10	$0	$0	31	$119,900
Total Afiliados(7)						$2,474,669	$396,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669		$172,800		$0	$0		$767,400

Ilustración 1 Seguridad social

1.3.1. SOPORTES DE APTITUD PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (CERTIFICADOS DE ENTRENAMIENTO TSA Y/O REENTRENAMIENTO T.S.A)

Se verifica por parte de la interventoría que el personal esté capacitado en cuanto a trabajo seguro en alturas, que cuenten con los certificados y estén en la página del ministerio reportados como realizados. De adjunta imagen aleatoria de un colaborador.

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que CRISTIAN SAMUEL RIVERA CARVAJAL, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1110569061, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ISRAEL ARDILA MUNOZ ARDILA
ENTRENADOR: FABIO GALLO PULIDO
SEDE DONDE SE FORMÓ: ISRAEL MUÑOZ ARDILA (I.M.A)
EMPLEADOR: JHON FREDY NI?O ARAGON
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 22/10/2023 a 25/10/2023
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Ilustración 2 Verificación curso de alturas

1.4. INDICADORES DE GESTION Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDAES GENERALES Y LABORALES.

1.4.1 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Se realizó seguimiento a los indicadores de accidentalidad durante el periodo de 16 de noviembre hasta el 30 de noviembre, no se han presentado accidentes / Incidentes

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD									
MES	N° de AT	HHT	N° Días Perdidos por AT	No. AT Graves	No. Trabajadores Mes	I.F AT	I.S. AT	ILI 2023	Tasa AT
NOVIEMBRE	0	728	0	0	5	0	0	0	0
TOTAL	**0**	728	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0%**

I.F: INDICE DE FRECUENCIA ACCIDENTES DE TRABAJO

I.S: INDICE DE SEVERIDAD ACCIDENTES DE TRABAJO

I.L.I: INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES

1.4.2 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Durante el Periodo del 16 noviembre al 30 de noviembre no se presentaron Accidentes, ni Incidentes de trabajo

1.4.3 INDICADORES DE AUSENTISMO

Durante el periodo del 16 de noviembre al 30 de noviembre de 2023, no se presentaron ausentismos.

INDICADORES DE AUSENTISMO								
MES	No. De trabajadores	No. de casos existentes de EG	No. Casos existentes de EL	No. Casos Nuevos EL	N° Días Perdidos por EG	Incidencia EL	Prevalencia general de la EL	Prevalencia global de la EG 2023
NOVIEMBRE	7	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTUALES	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4.5. HISTORICO DE CASOS REPORTADOS

N/A

1.5. PLAN DE EMERGENCIAS

En aras de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores cuenta con un plan de emergencias y con los equipos requeridos para atender cualquier eventualidad, ajustado para el contrato.

GRUPO (LUGAR)	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANTIDAD
AREA DE HOTELERIA	BOTIQUIN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1

1.6. REGISTROS DE INSPECCION

1.6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DEL BUEN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se realizan inspecciones continuas de los EPP, buscando estos elementos sean los requeridos para la actividad a ejecutar por parte del colaborador, dando cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

INSPECCION	APELLIDOS	NOMBRES	OBSERVACIONES
DIARIA	BAYONA	CHRISTIAN	Bueno
DIARIA	BAYONA	MARLON	Bueno
DIARIA	ROCHA	WILSON	Bueno
DIARIA	MORA	JERSSON	Bueno

NOTA: En estado General de Inspección se debe especificar si es Bueno (B), Regular (R), Malo (M)

1.6.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

INSPECCION	APELLIDOS	NOMBRES	OBSERVACIONES
DIARIA	BAYONA	CHRISTIAN	NA
DIARIA	BAYONA	MARLON	NA
DIARIA	ROCHA	WILSON	NA
DIARIA	MORA	JERSSON	NA

Nota: En este periodo no sea ha dado uso a los equipos de protección contra caídas.

1.6.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD SISTEMAS DE ACCESO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Durante la inspección de equipos para trabajo en alturas, se revisa cada uno de estos individualmente con el objetivo de validar su estado frente a los requerimientos específicos del fabricante por parte de la interventoría para garantizar estado que proteja al colaborador

INSPECCION	SISTEMA DE ACCESO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	OBSERVACIONES
DIARIA	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 2 MTS	Bueno
DIARIA	ANDAMIO TUBULAR PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	Bueno

1.7. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACION

Dando cumplimiento con el cronograma de charas y capacitaciones del SGSST, la interventoría verifica que se realicen

1.7.1. LISTADO DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDAD MES DESDE EL 16 NOVIEMBRE /23 AL 30 DE NOVIEMBRE /23

FECHA	TEMA	TIPO
16-11-2023	Riesgo eléctrico	charla
17-11-2023	Trabajos en Andamios	charla
18-11-2023	Cuidado de ojos	charla
20-11-2023	Herramientas eléctricas	charla
21-11-2023	Derrame de sustancias peligrosas	charla
22-11-2023	Almacenamiento	charla
23-11-2023	Riesgo locativo	charla
24-11-2023	Conocer los riesgos físicos, químicos, bilógicos, mecánicos	charla
25-11-2023	Cuidado de manos	charla
27-11-2023	Protección auditiva	charla
28-11-2023	Riesgo biomecánico	charla
29-11-2023	Riesgo mecánico	charla
30-11-2023	Heridas abiertas	charla

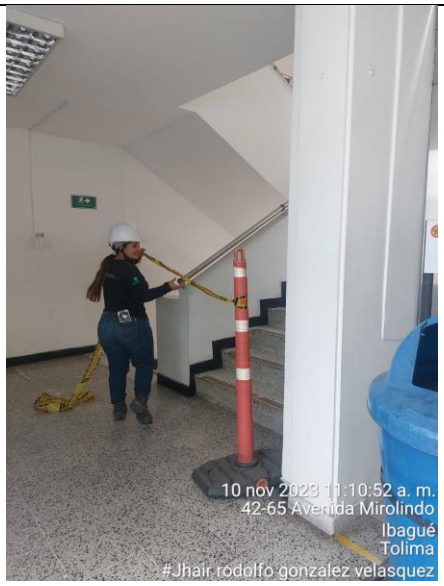
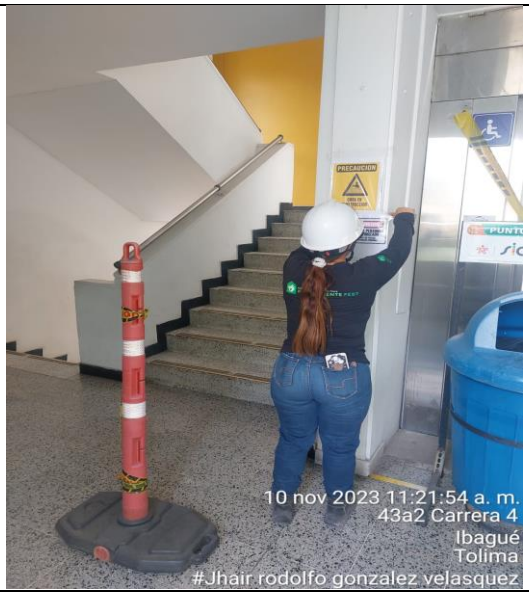
1.8. REGISTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

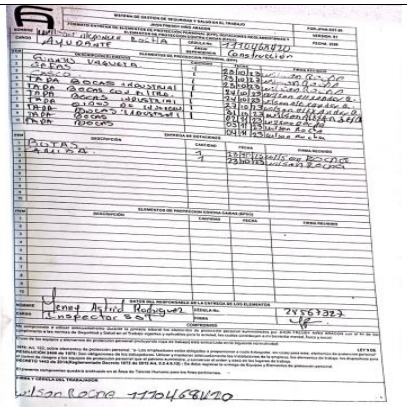
1.8.1. ORDEN Y ASEO

El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo. Como tal requieren de unos estándares claros de desempeño, un trabajo en equipo y de la participación responsable de todos, interventoría verifica que esto se cumpla.

	
Observaciones: orden y aseo de área intervenida	Observaciones: orden y aseo de área intervenida
	
Observaciones: Protección de equipos	Observaciones: Protección de material

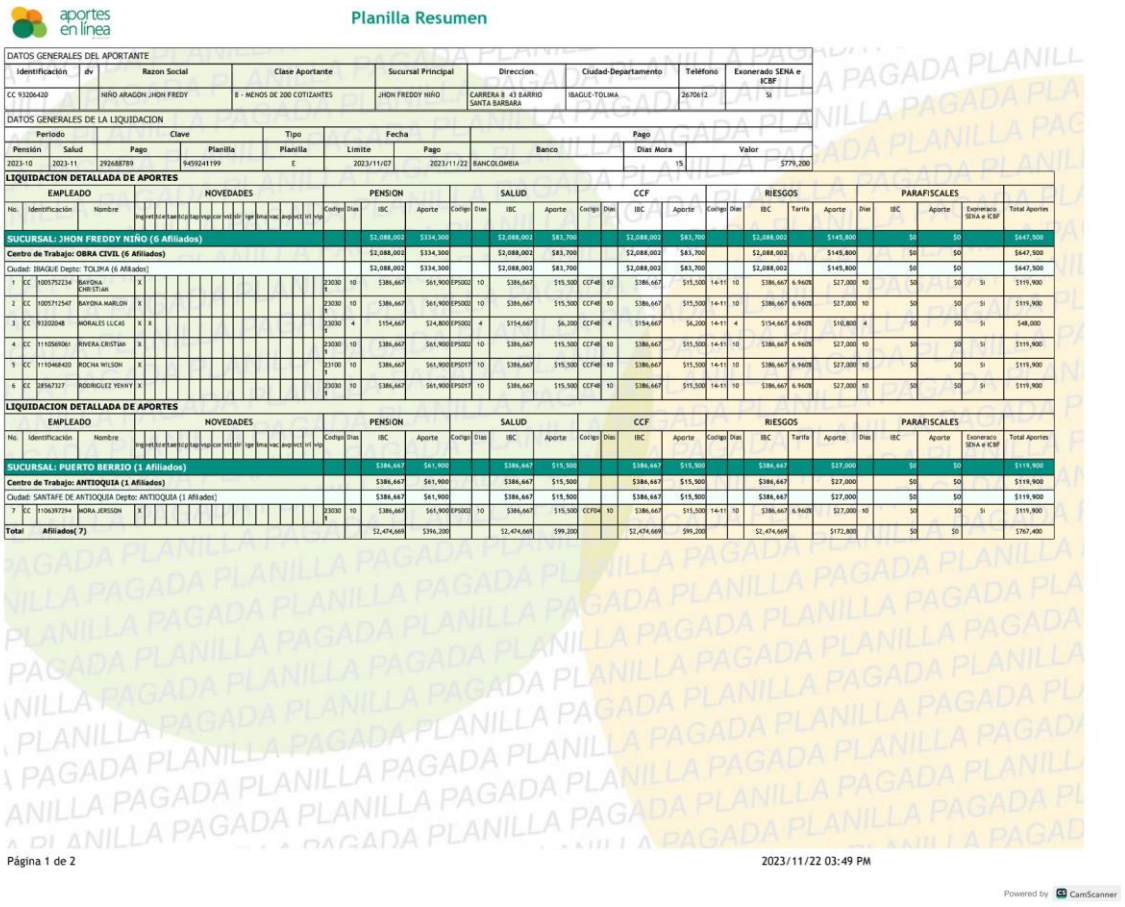
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

	
Observaciones: Recomendación al personal por parte de interventoría	Observaciones: Protección de áreas intervenidas
	
Observaciones: Demarcación	Observaciones: señalización

	
Observaciones: Capacitación	Observaciones: Orden y aseo
	
Observaciones: Registro de entrega de EPP	Observaciones: Entrega de EPP

	
Observaciones: Entrega de Dotación	Observaciones: Inducción

1.9 ANEXOS



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93206420		NIÑO ARAGON JHON FREDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 8 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	292688789	9459241199	E	2023/11/07	2023/11/22	BANCOLOMBIA	15	$779,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JHON FREDDY NIÑO (6 Afiliados)						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (6 Afiliados)						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)						$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
1	CC 1005752234	BAYONA CHRISTIAN	X	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
2	CC 1005712547	BAYONA MARLON	X	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
3	CC 93202048	MORALES LUCAS	X X	23030	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF48	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
4	CC 1110569061	RIVERA CRISTIAN	X	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
5	CC 1110468420	ROCHA WILSON	X	23100	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
6	CC 28567327	RODRIGUEZ YENNY	X	23030	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO BERRIO (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
7	CC 1106397294	MORA JERSSON	X	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCFD4	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
Total Afiliados(7)						$2,474,669	$396,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669		$172,800		$0	$0		$767,400

Página 1 de 2 2023/11/22 03:49 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93206420		NIÑO ARAGON JHON FREDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 8 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	29268789	9459241199	E	2023/11/07	2023/11/22	BANCOLOMBIA	15	$779,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Sce	Sal	Cen	Tco	Ptap	Vsp	Cor	Vst	Slr	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exoneracio SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JHON FREDDY NIÑO (6 Afiliados)																							$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (6 Afiliados)																							$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																							$2,088,002	$334,300			$2,088,002	$83,700			$2,088,002	$83,700			$2,088,002		$145,800		$0	$0		$647,500
1	CC	1005752234	BAYONA CHRISTIAN	X																	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
2	CC	1005712547	BAYONA MARLON	X																	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
3	CC	93202048	MORALES LUCAS	X	X																23030	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF48	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	Si	$48,000
4	CC	1110569061	RIVERA CRISTIAN	X																	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
5	CC	1110468420	ROCHA WILSON	X																	23100	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
6	CC	28567327	RODRIGUEZ YEHNY	X																	23030	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Sce	Sal	Cen	Tco	Ptap	Vsp	Cor	Vst	Slr	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exoneracio SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO BERRIO (1 Afiliados)																							$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$386,667	$61,900			$386,667	$15,500			$386,667	$15,500			$386,667		$27,000		$0	$0		$119,900
7	CC	1106397294	MORA JERSSON	X																	23030	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF04	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
Total	**Afiliados(7)**																						$2,474,669	$396,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669	$99,200			$2,474,669		$172,800		$0	$0		$767,400

Página 1 de 2

2023/11/22 03:49 PM

Powered by CamScanner
