INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE INTERVENTORIA

ALCALDIA DE VILLA DE LEYVA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 230-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

INFORME DE INTERVENTORÍA

FECHA
07/12/2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo mostrar las actividades adelantadas por la interventoría SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ por medio del contrato de interventoría No. 230-2023, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ ¨ en el periodo del 11 de octubre de 2023 hasta el 07 de diciembre del 2023 de acuerdo con las obligaciones adquiridas con la ALCALDIA DE VILLA DE LEYVA En el mismo se detallan las actividades realizadas por el contratista de obra en dicho período, así como el estado financiero del contrato, los recursos humanos y técnicos utilizados para el desarrollo del proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El municipio de Villa de Leyva adjudico el contrato 234 de 2023 cuyo objeto es “Contratación bajo en la modalidad de llave en mano para el mantenimiento, adecuación y mejoras locativas de la institución educativa técnica industrial Antonio Ricaurte sede campestre en apoyo al plan de contingencia de la sede principal (ITINAR) municipio de Villa de Leyva – Boyacá” al contratista EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL.


La interventoría fue asignada al ingeniero SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ y la supervisión en cabeza de la secretaria de infraestructura y obras físicas del municipio de Villa de Leyva.

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del municipio.

Este informe representa las actividades de obra contractuales desarrolladas durante el periodo del 11 de octubre al 07 de diciembre de 2023.

2.2. LOCALIZACIÓN

El contrato 234 de 2023 cuyo objeto es “Contratación bajo en la modalidad de llave en mano para el mantenimiento, adecuación y mejoras locativas de la institución educativa técnica industrial Antonio Ricaurte sede campestre en apoyo al plan de contingencia de la sede principal (ITINAR) municipio de Villa de Leyva – Boyacá” se desarrolla en la zona urbana del municipio de Villa de Leyva, que hace parte de la provincia de alto Ricaurte del departamento de Boyacá.

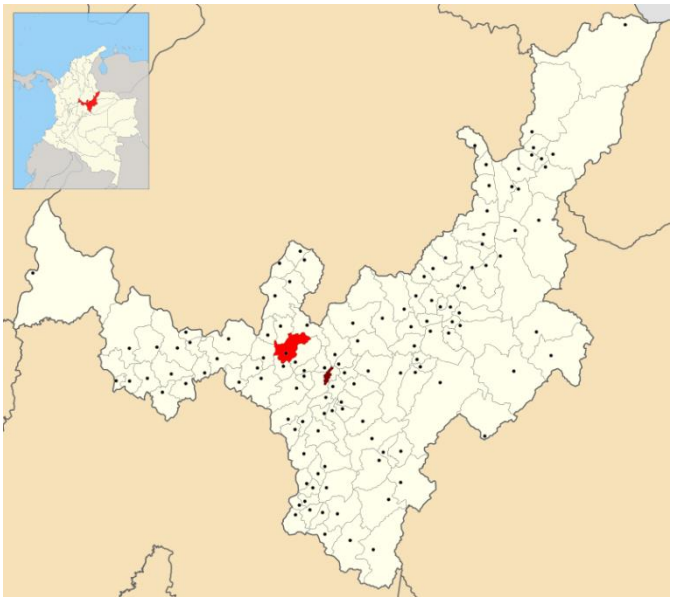

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para este proyecto no aplican normas específicas, únicamente las mencionadas a continuación

- NSR-10 (TITULO A,C,H) para estructuras en concreto de elementos de contención.. Concretos de andenes y rampas de los cuales se anexan planos estructurales.

MÉTODO CONSTRUCTIVO

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
- La estabilidad de la obra contratada.
- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismo resistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	METAFÍSICA PROGRAMADA
BOYACA	VILLA DE LEYVA	• ACTIVIDADES PRELIMINARES • ALISTAMIENTO DE PISO • ESTRUCTURAS EN CONCRETO • MOBILIARIO • INSTALACIONES ELECTRICAS

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se relaciona a continuación información general del contrato de obra:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT.	891.801.268-7
REPRESENTANTE LEGAL	JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES
IDENTIFICACIÓN	C.C. N°. 7.127.339 DE VILLA DE LEYVA
SUPERVISOR	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CEDULA DE CIUDADANÍA	7.127.372 DE VILLA DE LEYVA
CONTRATISTA	EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL
IDENTIFICACIÓN	C.C. N° 5.747.999 DE SAN JOSÉ DE MIRANDA SANTANDER
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE OBRA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
INTERVENTOR	SAID LEONARDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
IDENTIFICACIÓN	CC No. 80.724.407 de Bogotá
OBJETO	CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ
N° CDP	2023080012 DE 04/08/2023 2023110046 del 28/11/2023
N° REGISTRO	2023090040 DE 15/09/2023 202311056 del 30/11/2023
VALOR INICIAL	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS M/CTE ($142.785.030).
VALOR ADICIONAL	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($12.364.333,52)
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($155.149.363,52)

PLAZO Y VIGENCIA	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIACIÓN, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FECHA ACTA INICIO	11 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ACTA FINAL	7 DE DICIEMBRE DE 2023

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA EN EL PERIODO

El contrato de OBRA **No 234 DE 2023** que tiene por objeto el **"**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ" y cuyo valor contratado es de ($142.785.030). y un adicional cuyo valor es de ($12.364.333,52), para un total del contrato de ($155.149.363,52), siendo este el **100%.**

se desglosa las actividades ejecutadas durante el periodo dando validación a lo anteriormente relacionado.

Actividad	Un	Cantidad avance	Valor total	Avance Real
Accesos y rampas				**100%**
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	2,08	108.041,44	100%
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	2,08	208.632,32	100%
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	30,05	3.908.122,70	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	M	12,00	719.677,80	100%
Baño niñas				**100%**
DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO	ML	10,60	64.405,60	100%
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	8,00	109.032,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	14,20	2.590.524,32	100%
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	10,00	4.110.295,60	100%

ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	50,00	738.650,00	100%
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	62,40	1.041.107,18	100%
ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	M	221,20	1.323.786,88	100%
ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	20,00	400.092,20	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	50,75	864.983,00	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	110,00	868.560,00	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	65,10	1.144.197,60	100%
ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	3,24	292.977,00	100%
DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	1,30	43.387,12	100%
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	M2	1,30	234.535,52	100%
Baño niños				**100%**
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	36,40	607.312,52	100%
ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	M	158,30	947.357,43	100%
PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	19,95	502.480,65	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	41,51	707.496,44	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	126,00	994.896,00	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	106,40	1.870.086,40	100%
DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM	M2	1,05	81.275,25	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80	328.376,32	100%
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	10,00	1.139.740,00	100%
PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	4,00	249.346,32	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	UND	3,00	1.060.845,00	100%
Bodega y/o almacen				**100%**
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm.	M2	1,44	80.301,60	100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	1,15	59.734,45	100%
CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,36	308.577,00	100%
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,48	575.077,11	100%
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,14	149.825,54	100%
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kg	165,24	1.157.010,48	100%
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	17,66	915.401,16	100%

PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	70,96	1.787.269,52	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	128.653,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,00	425.364,00	100%
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	1,80	429.831,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80	228.166,40	100%
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	5,00	73.865,00	100%
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	4,00	66.737,64	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	17,66	310.392,16	100%
SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR 0.73 X 3.66 M	M2	10,00	373.575,50	100%
CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	4,00	544.524,60	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	75,24	594.084,97	100%
Baño Discapacitados				**100%**
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	M	5,00	241.896,70	100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	4,39	228.029,77	100%
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm.	M2	6,00	334.590,00	100%
CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,36	308.577,00	100%
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0,66	547.523,67	100%
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,29	347.442,42	100%
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,28	299.651,07	100%
PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	15,69	1.292.829,33	100%
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	69,36	512.501,04	100%
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kg	176,81	1.238.023,62	100%
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	23,00	1.192.198,56	100%
PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	43,50	1.095.634,50	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	M	6,00	635.189,10	100%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	10,80	628.897,72	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT.	M2	10,80	949.677,37	100%
PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	2,00	124.673,16	100%
PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	1,00	112.957,53	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	M	14,50	796.557,07	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	M	6,00	77.100,60	100%
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	2,00	227.948,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AQUAPRO LAVAMANOS SEMIPEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES O SIMILAR	UND	1,00	641.639,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS)	UND	2,00	1.222.357,06	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILA	M2	33,36	2.546.902,56	100%
SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	UND	2,00	51.500,90	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	10,80	184.075,20	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	9,20	72.643,20	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	17,85	313.731,60	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	128.653,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,00	425.364,00	100%
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	0,40	95.518,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	0,40	50.703,64	100%
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	5,00	73.865,00	100%
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	4,00	66.737,64	100%
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	1,00	308.617,31	100%
Oficina				**100%**
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UND	3,00	637.851,00	100%
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN FUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	0,50	348.294,61	100%

DESMONTE VIDRIO	M2	0,70	2.131,50	100%
VIDRIO 4 MM	M2	0,70	45.222,10	100%
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	M	230,80	2.273.841,60	100%
SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	7,00	1.208.517,59	100%
SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO PVC Ø 1/2, INCLUYE REGATAS	UND	3,00	616.005,90	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	128.653,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,00	425.364,00	100%
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	6,38	1.522.318,13	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	6,38	808.089,33	100%
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	5,00	73.865,00	100%
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	4,00	66.737,64	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	23,30	397.125,20	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	23,70	187.135,20	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	54,82	963.516,32	100%
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	M	64,00	470.976,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER DE 12 W	UND	14,00	454.090,00	100%
Nuevo salon				**100%**
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	M	8,00	387.034,72	100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	10,54	547.479,22	100%
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M2	6,39	221.407,75	100%
CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,86	737.156,16	100%
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	2,61	2.165.207,25	100%
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	1,40	1.677.308,25	100%
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,81	866.847,74	100%
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	2,10	2.928.766,72	100%

MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	7,56	758.298,24	100%
PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	37,80	3.114.655,74	100%
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	59,85	442.231,65	100%
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kg	1127,64	7.895.735,28	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES 30*30 CM	M2	36,12	2.537.377,26	100%
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	61,60	3.193.018,75	100%
PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	88,59	2.231.265,96	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	M	41,50	4.393.391,28	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	43,20	2.413.234,94	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	37,80	644.263,20	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	59,52	469.969,92	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	34,73	610.414,48	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	128.653,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,00	425.364,00	100%
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	2,88	687.729,60	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	2,88	365.066,24	100%
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	5,00	73.865,00	100%
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	4,00	66.737,64	100%
SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	1,00	172.645,37	100%
SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2, INCLUYE REGATAS	UND	4,00	1.007.948,72	100%
SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO PVC Ø 1/2, INCLUYE REGATAS	UND	4,00	821.341,20	100%
MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts	M2	1,80	285.681,60	100%
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	16,80	517.104,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"	M	7,00	561.895,67	100%
Adicionales				**100%**

PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	35,25	2.713.473,44	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES 30*30 CM	M2	26,25	1.844.024,18	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	22,00	173.712,00	100%
DESMONTE CANALES - BAJANTES.	M	12,00	69.711,60	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	M	3,00	317.594,55	100%
DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	M2	0,45	7.053,01	100%
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	0,45	23.325,62	100%
PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	0,90	22.668,30	100%
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	0,43	43.130,72	100%
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	1,25	162.567,50	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	0,72	91.266,56	100%
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	0,72	171.932,40	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT.	M2	43,20	3.798.709,49	100%
VALOR DE AVANCE AL PERIODO DE CORTE CON AIU			**151.139.064**	
ESTUDIOS Y DISEÑOS CON IVA			**4.010.300**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**155.149.363,52**	
PORCENTAJE AVANCE			**100,00%**	

De igual forma se anexa registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el contrato para la verificación y claridad de la supervisión, así mismo se ha venido realizando la verificación y aprobación de cantidades

ACCESOS Y RAMPAS

Construcción.

Se desarrollaron las excavaciones necesarias y el mejoramiento del terreno en las áreas y zonas donde era requerida la construcción de rampas de acceso para el personal educativo y de acuerdo a las ubicaciones establecidas por la entidad municipal.







BAÑO NIÑAS

Resanes y trabajos de pintura

Se efectuaron las actividades de pintura de techos, muros internos como externos de acuerdo a las especificaciones y posterior a todos los trabajos de resane y reparación en las diferentes paredes. No obstante, estas labores también se desarrollaron en la estructura de madera de cubiertas, puertas metálicas y de madera








Instalación de aparatos eléctricos

Se instalaron paneles tipo led en los baños para la iluminación y se rehabilitaron y se acondicionaron nuevas tomas eléctricos e interruptores eléctricos.








Ornamentación

Se desarrollo la fabricación e instalación de la estructura de las divisiones para las unidades sanitarias incluidas las puertas de ambas secciones de baños

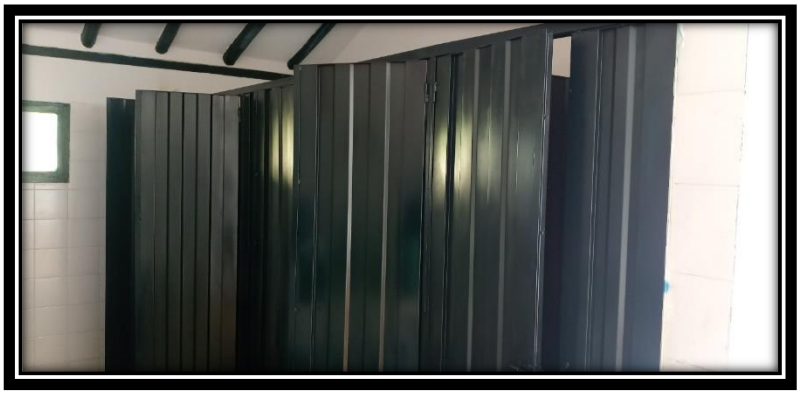



Acabados

Se realizo la instalación de enchape cerámico en el mesón de lavado de manos y arreglo de demás zonas afectadas o dañadas. Adicionalmente se hizo la reparación e instalación de diferentes puntos de suministro de agua y se colocaron nuevos espejos de pared







BAÑO NIÑOS

Resanes y trabajos de pintura

Se efectuaron las actividades de pintura de techos, muros internos como externos de acuerdo a las especificaciones y posterior a todos los trabajos de resane y reparación en las diferentes paredes. No obstante, estas labores también se desarrollaron en la estructura de madera de cubiertas, puertas metálicas y de madera











INSTALACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS


Se instalaron paneles tipo led en los baños para la iluminación y se rehabilitaron y se acondicionaron nuevas tomas eléctricos e interruptores eléctricos.





Ornamentación

Se hizo la fabricación e instalación de las divisiones metálicas para los nuevos orinales y se restauró y pinto las divisiones de los sanitarios

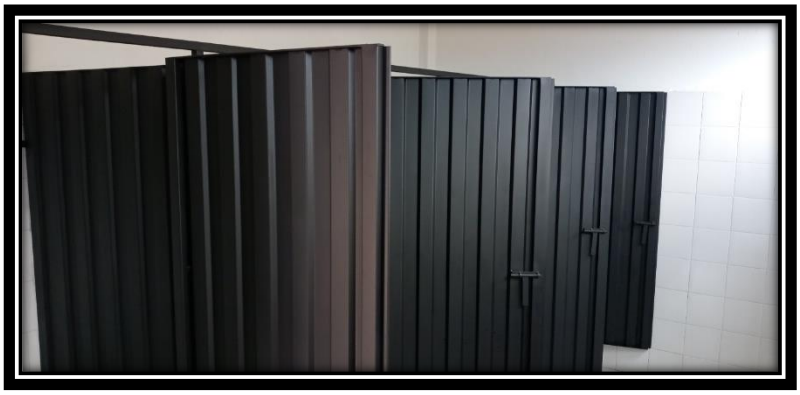



Aparatos sanitarios

Se hicieron las obras correspondientes para la instalación y puesta en funcionamiento de tres nuevos orinales para los niños



BODEGA Y/O ALMACÉN

Construcción.

Durante este periodo se alcanzó la construcción y/o cerramiento de la nueva bodega de la institución actividades que iniciaron con las demoliciones de piso, excavaciones para cimentación, levantamiento de muros en bloque y completamiento de pórticos mediante columnas y vigas de concreto reforzado.





Acabados

Se hicieron los revoques y filos pertinentes en los pañetes para posteriormente desarrollar las actividades de pintura sobre los muros





ORNAMENTACIÓN

Se fabrico, instalo y pinto la ornamentación para completar la bodega, esto incluyo puerta y ventanas con rejas. Adicionalmente en este grupo de actividades se efectúo la fabricación y montaje de la cubierta sobre las canales.





BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Construcción.

Durante este periodo se alcanzó la construcción del nuevo baño para discapacitados de la institución educativa, grupo de actividades que iniciaron con las excavaciones para cimentación, levantamiento de muros en bloque y completamiento de pórticos mediante columnas y vigas de concreto reforzado. Posterior a esto se hizo la instalación de la teja de fibrocemento y la de barro sobre la misma








ACABADOS


Se hicieron los revoques y filos pertinentes en los pañetes para posteriormente desarrollar las actividades de pintura sobre los muros y la instalación de los enchapes






Ornamentación

Se fabrico, instalo y pinto la ornamentación para completar el baño, esto incluyo puerta y ventanas con rejas.

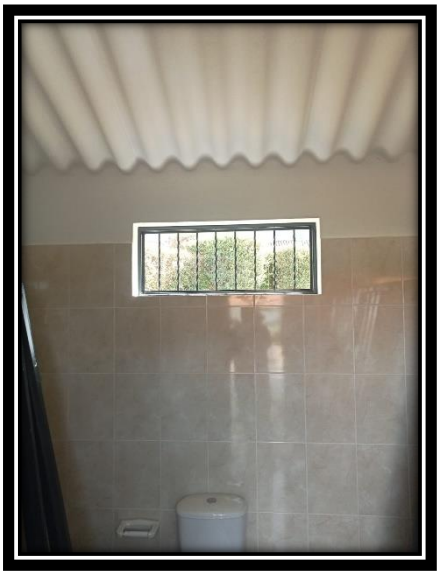



Aparatos sanitarios

Se instalaron los aparatos sanitarios especificados para este baño, La construcción de este baño conllevo a la instalación de una nueva red de suministro y desagüe de agua



Ornamentación

Se fabricaron e instalaron las dos barras de seguridad para personas con discapacidad en el sanitario del baño



OFICINA

Resanes y trabajos de pintura

Se efectuaron las actividades de pintura de techos, muros internos como externos de acuerdo a las especificaciones y posterior a todos los trabajos de resane y reparación en las diferentes paredes. No obstante, estas labores también se desarrollaron en la estructura de madera de cubiertas, puertas metálicas y de madera











Instalación de aparatos eléctricos

Se instalaron paneles tipo led para la iluminación y se rehabilitaron y se acondicionaron nuevas tomas eléctricos e interruptores eléctricos.





Ornamentación

Se fabrico, instalo y pinto la ornamentación requerida para esta área, esto incluyo puerta y ventanas con rejas.





NUEVO SALÓN

Construcción

En este periodo se logró un importante avance en la construcción del salón que incluyo actividades de excavación, rellenos y mejoramientos de terreno, construcción de cimentación, construcción de placa de contrapiso, conformación de pórticos mediante columnas y vigas de concreto reforzado y levantamiento de muros con bloques de arcilla










Cubierta

Se desarrolla la fabricación y montaje de la estructura metálica para la posterior instalación de la teja de fibrocemento en toda el área del salón




Acabados

En este periodo se culminó exitosamente aplicación de pintura sobre muros para el área interior y exterior adicionalmente se instaló toda la tableta de piso tanto en el salón como en el corredor del mismo



Aparatos eléctricos

Se desarrollo la instalación de la red de iluminación en tubería EMT y también los aparatos como tomas y encenderos de pared





Ornamentación

Se desarrollo la fabricación e instalación de las puertas y ventanas correspondientes para esta área





Adicionales

Se efectuaron los ítems o trabajos adicionales autorizados para las zonas de la bodega y el nuevo salón.





4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se anexan los formatos suscritos por los responsables:

4.1. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

El personal profesional mínimo requerido del contratista de obra cumple a cabalidad con la idoneidad exigida en los pliegos de condiciones, además de la vinculación del personal mano de obra no calificada, que también cumplen con los requisitos mínimos de seguridad social y dotaciones para el desarrollo de las actividades contractuales del proyecto.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5747999	EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL		Carrera 0a este 74-51	7473229	edwin0321hurtado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TUNJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	06/12/2023	73047297	$1.306.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	562.500	0		0		0	0	0	0	562.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	720.000	0	0	0	0	0	0		720.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	23.500				23.500	0	0	23.500			235	23.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	562.500	562.500
Pensión	1	720.000	720.000
Riesgos Laborales	1	23.500	23.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.306.000	1.306.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5747999	EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL	Carrera 0a este 74-51	7473229	edwin0321hurtado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TUNJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	06/12/2023	73047297	$1.306.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cot.pens	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Dpto.mpio	IRL	IGE	ISE	IVL	IDP	TAP	VSP	SAN	ESS	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de ARP	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	5747999	HURTADO VILLAMIL EDWIN ORLANDO	57	0			N																25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS010	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	1	23.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055710025		SIERRA GONZALEZ JULIO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 48#8-21	TUNJA-BOYACA	3177635916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	340808345	9459275226	I	2023/12/07	2023/12/18	BANCO DAVIVIENDA	11	$340,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	sp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																								$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1055710025	SIERRA JULIO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total		**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055710025		SIERRA GONZALEZ JULIO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 48#8-21	TUNJA-BOYACA	3177635916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	340808345	9459275226	I	2023/12/07	2023/12/18	BANCO DAVIVIENDA	11	$340,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,000	$0	$187,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$2,000	$0	$187,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
TOTAL				1	$336,700	$3,700	$0	$340,400

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que MANUEL JOSE con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1057590165, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MANUEL JOSE DIAZ BARRERA con documento CC 1057590165, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4530030117	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/12/18	Número de Autorización	9997080985

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS008 - COMPENSAR
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 5747999	0	HURTADO VILLAMIL EDWIN ORLANDO	B	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	KR 0A ESTE 74 51		7473229			EDWIN0321HURTADO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28506583	E	2023-12-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.796.000	0	BANCO AGRARIO
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	28506583	2023-12-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 6762388	REYES LOPEZ JOSE SIGIFREDO	1.160.000	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411201
2	CC 7127513	SALAMANCA SALAS RAMIRO	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411201
3	CC 80431297	GALVIZ QUINCHE JOSE MIGUEL	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411201
4	PT 895766	MARIN RODRIGUEZ ALEXANDER RAMON	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411201
5	PT 4187255	REYES REYES CELIO JOSE	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFABOY-CCF10	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 5747999	0	HURTADO VILLAMIL EDWIN ORLANDO	B	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	KR 0A ESTE 74 51		7473229			EDWIN0321HURTADO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28506583	E	2023-12-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.796.000	0	BANCO AGRARIO
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	28506583		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	928.000	0	0	0	928.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	556.800	0	0	0	556.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	0	0	185.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 3)				5	232.000	0	0	0	232.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	92.800	0	0	0	92.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	92.800	0	0	0	92.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
ARP(Administradoras: 1)				5	404.000	0	0	0	404.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	404.000	0	0	0	404.000
CCF(Administradoras: 1)				5	232.000	0	0	0	232.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	5	232.000	0	0	0	232.000
Gran Total					1.796.000	0	0	0	1.796.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5747999	EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL	Carrera 0a este 74-51	7473229	edwin0321hurtado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I -- Independiente			BOYACÁ	TUNJA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	22/11/2023	72380506	$1.306.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	562.500	0		0		0	0	0	0	562.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	720.000	0	0	0	0	0	0		720.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	23.500				23.500	0	0	23.500			235	23.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	562.500	562.500
Pensión	1	720.000	720.000
Riesgos Laborales	1	23.500	23.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.306.000	1.306.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5747999	EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL	Carrera 0a este 74-51	7473229	edwin0321hurtado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TUNJA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	22/11/2023	72380506	$1.306.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cód.ciudad	Extranjero	Colombiano en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	5747999	HURTADO VILLAMIL EDWIN ORLANDO	57	0		N																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS010	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	1	23.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055710025		SIERRA GONZALEZ JULIO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 48#8-21	TUNJA-BOYACA	3177635916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	262721905	9457913432	I	2023/11/08	2023/11/07	BANCO ITAU	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																									$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1055710025	SIERRA JULIO																				230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total		**Afiliados(1)**																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055710025		SIERRA GONZALEZ JULIO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 48#8-21	TUNJA-BOYACA	3177635916	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	262721905	9457913432	I	2023/11/08	2023/11/07	BANCO ITAU	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que MANUEL JOSE con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1057590165, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MANUEL JOSE DIAZ BARRERA con documento CC 1057590165, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4527219251	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	OCTUBRE/2023	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2023
Fecha Pago	2023/11/23	Número de Autorización	9996707178

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS008 - COMPENSAR
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 5747999	0	HURTADO VILLAMIL EDWIN ORLANDO	B	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
15-1	KR 0A ESTE 74 51		7473229			EDWIN0321HURTADO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28185579	E	2023-11-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	660.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
5	28185579	2023-11-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 6762388	REYES LOPEZ JOSE SIGIFREDO	1.160.000	FIJO														0			11	11	11	11	COLFONDOS-231001	425.334	68.100	0	0	NUEVA E.P.S. O.S.A. MOV-EPS041	425.334	17.100	COMFABOY-CCF10	425.334	17.100	425.334	29.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.000	S	5411201
2	CC 7127513	SALAMANCA SALAS RAMIRO	1.160.000	FIJO														0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	425.334	68.100	0	0	NUEVA E.P.S. O.S.A. MOV-EPS041	425.334	17.100	COMFABOY-CCF10	425.334	17.100	425.334	29.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.000	S	5411201
3	CC 80431297	GALVIZ QUINCHE JOSE MIGUEL	1.160.000	FIJO														0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	425.334	68.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	425.334	17.100	COMFABOY-CCF10	425.334	17.100	425.334	29.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.000	S	5411201
4	PT 895766	MARIN RODRIGUEZ ALEXANDER RAMON	1.160.000	FIJO														0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	425.334	68.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	425.334	17.100	COMFABOY-CCF10	425.334	17.100	425.334	29.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.000	S	5411201
5	PT 4587255	REYES REYES CELIO JOSE	1.160.000	FIJO														0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	425.334	68.100	0	0	NUEVA E.P.S. O.S.A.-EPS037	425.334	17.100	COMFABOY-CCF10	425.334	17.100	425.334	29.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.000	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 5747999	0	HURTADO VILLAMIL EDWIN ORLANDO	B	06	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
15-1	KR 0A ESTE 74 51		7473229			EDWIN0321HURTADO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28185579	E	2023-11-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	660.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
5	28185579		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.126.670	2.126.670	2.126.670	2.126.670	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	340.500	0	0	0	340.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	68.100	0	0	0	68.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	68.100	0	0	0	68.100
PORVENIR	230301	800224808	8	3	204.300	0	0	0	204.300
EPS(Administradoras: 3)				5	85.500	0	0	0	85.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	17.100	0	0	0	17.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	34.200	0	0	0	34.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	34.200	0	0	0	34.200
ARP(Administradoras: 1)				5	148.500	0	0	0	148.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	148.500	0	0	0	148.500
CCF(Administradoras: 1)				5	85.500	0	0	0	85.500
COMFABOY	CCF10	891800213	8	5	85.500	0	0	0	85.500
Gran Total					660.000	0	0	0	660.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

4.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contrato de OBRA **No 234 DE 2023** que tiene por objeto el **"CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ"** y cuyo valor contratado es de **($142.785.030).** y un adicional cuyo valor es de **($12.364.333,52),** para un total del contrato de **($155.149.363,52),** siendo este el **100%,** presenta un acta final por un valor de ($155.149.363,52) **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.**

Actividad	Un	Cantidad avance	Valor total	Avance Real
Accesos y rampas				**100%**
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	2,08	108.041,44	100%
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	2,08	208.632,32	100%
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	30,05	3.908.122,70	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	M	12,00	719.677,80	100%
Baño niñas				**100%**
DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO	ML	10,60	64.405,60	100%
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	8,00	109.032,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	14,20	2.590.524,32	100%
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	10,00	4.110.295,60	100%
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	50,00	738.650,00	100%
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	62,40	1.041.107,18	100%
ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	M	221,20	1.323.786,88	100%
ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	20,00	400.092,20	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	50,75	864.983,00	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	110,00	868.560,00	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	65,10	1.144.197,60	100%
ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	3,24	292.977,00	100%

DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	1,30	43.387,12	100%
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	M2	1,30	234.535,52	100%
Baño niños				**100%**
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	36,40	607.312,52	100%
ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	M	158,30	947.357,43	100%
PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	19,95	502.480,65	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	41,51	707.496,44	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	126,00	994.896,00	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	106,40	1.870.086,40	100%
DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM	M2	1,05	81.275,25	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80	328.376,32	100%
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	10,00	1.139.740,00	100%
PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	4,00	249.346,32	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	UND	3,00	1.060.845,00	100%
Bodega y/o almacen				**100%**
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm.	M2	1,44	80.301,60	100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	1,15	59.734,45	100%
CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,36	308.577,00	100%
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,48	575.077,11	100%
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,14	149.825,54	100%
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kg	165,24	1.157.010,48	100%
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	17,66	915.401,16	100%
PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	70,96	1.787.269,52	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	128.653,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,00	425.364,00	100%
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	1,80	429.831,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80	228.166,40	100%

ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	5,00	73.865,00	100%
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	4,00	66.737,64	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	17,66	310.392,16	100%
SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR 0.73 X 3.66 M	M2	10,00	373.575,50	100%
CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	4,00	544.524,60	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	75,24	594.084,97	100%
Baño Discapacitados				**100%**
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	M	5,00	241.896,70	100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	4,39	228.029,77	100%
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm.	M2	6,00	334.590,00	100%
CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,36	308.577,00	100%
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0,66	547.523,67	100%
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	0,29	347.442,42	100%
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,28	299.651,07	100%
PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	15,69	1.292.829,33	100%
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	69,36	512.501,04	100%
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kg	176,81	1.238.023,62	100%
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	23,00	1.192.198,56	100%
PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	43,50	1.095.634,50	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	M	6,00	635.189,10	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	10,80	628.897,72	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT.	M2	10,80	949.677,37	100%
PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	2,00	124.673,16	100%
PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	1,00	112.957,53	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	M	14,50	796.557,07	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	M	6,00	77.100,60	100%

PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	2,00	227.948,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AQUAPRO LAVAMANOS SEMIPEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES O SIMILAR	UND	1,00	641.639,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS)	UND	2,00	1.222.357,06	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILA	M2	33,36	2.546.902,56	100%
SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	UND	2,00	51.500,90	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	10,80	184.075,20	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	9,20	72.643,20	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	17,85	313.731,60	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	128.653,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,00	425.364,00	100%
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	0,40	95.518,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	0,40	50.703,64	100%
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	5,00	73.865,00	100%
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	4,00	66.737,64	100%
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	1,00	308.617,31	100%
Oficina				**100%**
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UND	3,00	637.851,00	100%
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN FUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	0,50	348.294,61	100%
DESMONTE VIDRIO	M2	0,70	2.131,50	100%
VIDRIO 4 MM	M2	0,70	45.222,10	100%
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	M	230,80	2.273.841,60	100%
SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	7,00	1.208.517,59	100%
SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO PVC Ø 1/2, INCLUYE REGATAS	UND	3,00	616.005,90	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	128.653,00	100%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,00	425.364,00	100%
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	6,38	1.522.318,13	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	6,38	808.089,33	100%
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	5,00	73.865,00	100%
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	4,00	66.737,64	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	23,30	397.125,20	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	23,70	187.135,20	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	54,82	963.516,32	100%
ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	M	64,00	470.976,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER DE 12 W	UND	14,00	454.090,00	100%
Nuevo salon				**100%**
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	M	8,00	387.034,72	100%
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	10,54	547.479,22	100%
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M2	6,39	221.407,75	100%
CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,86	737.156,16	100%
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	2,61	2.165.207,25	100%
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	1,40	1.677.308,25	100%
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,81	866.847,74	100%
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	2,10	2.928.766,72	100%
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	7,56	758.298,24	100%
PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	37,80	3.114.655,74	100%
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	59,85	442.231,65	100%
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	Kg	1127,64	7.895.735,28	100%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES 30*30 CM	M2	36,12	2.537.377,26	100%
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	61,60	3.193.018,75	100%
PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	88,59	2.231.265,96	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	M	41,50	4.393.391,28	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	43,20	2.413.234,94	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	37,80	644.263,20	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	59,52	469.969,92	100%
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	34,73	610.414,48	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	128.653,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,00	425.364,00	100%
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	2,88	687.729,60	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	2,88	365.066,24	100%
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M	5,00	73.865,00	100%
ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	4,00	66.737,64	100%
SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	1,00	172.645,37	100%
SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2, INCLUYE REGATAS	UND	4,00	1.007.948,72	100%
SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO PVC Ø 1/2, INCLUYE REGATAS	UND	4,00	821.341,20	100%
MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts	M2	1,80	285.681,60	100%
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	16,80	517.104,00	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"	M	7,00	561.895,67	100%
Adicionales				**100%**
PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	35,25	2.713.473,44	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES 30*30 CM	M2	26,25	1.844.024,18	100%
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	22,00	173.712,00	100%
DESMONTE CANALES - BAJANTES.	M	12,00	69.711,60	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	M	3,00	317.594,55	100%

DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	M2	0,45	7.053,01	100%
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	0,45	23.325,62	100%
PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	0,90	22.668,30	100%
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	0,43	43.130,72	100%
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	1,25	162.567,50	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	0,72	91.266,56	100%
SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	0,72	171.932,40	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT.	M2	43,20	3.798.709,49	100%
VALOR DE AVANCE AL PERIODO DE CORTE CON AIU			**151.139.064**	
ESTUDIOS Y DISEÑOS CON IVA			**4.010.300**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**155.149.363,52**	
PORCENTAJE AVANCE			**100,00%**	

4.3. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El estado del clima es determinante a la hora de demostrarse los avances o atrasos en la ejecución del contrato de obra, por lo anterior se presentan los estados generales del clima para los meses correspondientes al periodo de ejecución.

MES DE OCTUBRE

FORMATO CONDICIONES CLIMATICAS

Contrato: Contrato de obra 234 de 2023 Mes: Octubre

Objeto: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

Soleado 1	Lluvia moderada 2	Lluvia intensa 3	Nubosidad 4

Horas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
7:00-8:00											1	1	1	2			1	1	1	4	4		4	1	1	1	1	1		1	1
8:00-9:00											1	1	1	2			1	1	1	4	4		4	1	1	1	1	1		1	1
9:00-10:00											1	1	1	2			2	1	1	4	2		4	1	1	1	1	1		1	1
10:00-11:00											1	1	1	2			2	1	1	4	2		4	1	1	1	4	1		1	1
11:00-12:00											1	1	1	1			2	1	1	2	2		4	1	4	3	4	1		1	1
12:00-13:00											1	1	1	1			4	1	1	2	3		3	1	3	3	4	1		1	1
13:00-14:00											1	1	1	1			4	1	1	3	3		3	1	3	3	3	1		1	1
14:00-15:00											1	1	1	1			4	1	1	3	3		3	1	3	3	3	1		1	1
15:00-16:00											1	1	1	1			4	1	1	3	2		3	1	3	2	3	1		1	1
16:00-17:00											1	1	1	1			4	1	1	3	2		3	1	3	2	3	1		1	1

Diligencio:

MES DE NOVIEMBRE

FORMATO CONDICIONES CLIMATICAS

Contrato: Contrato de obra 234 de 2023 Mes: Noviembre

Objeto: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

Soleado 1 | Lluvia moderada 2 | Lluvia intensa 3 | Nubosidad 4

Horas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00-8:00																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
8:00-9:00																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
9:00-10:00																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
10:00-11:00																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
11:00-12:00																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
12:00-13:00																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
13:00-14:00																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
14:00-15:00																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
15:00-16:00																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
16:00-17:00																				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1

Diligencio:

MES DE NOVIEMBRE

FORMATO CONDICIONES CLIMATICAS

Contrato: Contrato de obra 234 de 2023 Mes: Diciembre

Objeto: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

Soleado 1 | Lluvia moderada 2 | Lluvia intensa 3 | Nubosidad 4

Horas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00-8:00	1	1		1	1	1	1																								
8:00-9:00	1	1		1	1	1	1																								
9:00-10:00	1	1		1	1	1	1																								
10:00-11:00	1	1		1	1	1	1																								
11:00-12:00	1	1		1	1	1	1																								
12:00-13:00	1	1		1	1	1	1																								
13:00-14:00	1	1		1	1	1	1																								
14:00-15:00	1	1		1	1	1	1																								
15:00-16:00	1	1		1	1	1	1																								
16:00-17:00	1	1		1	1	1	1																								

Diligencio:

4.4. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE MATERIAL

Durante los procesos de adquisición, fabricación e instalación en la ejecución del contrato de obra, la interventoría realizo el respectivo acompañamiento para garantizar los debidos procesos enfocados en la calidad de los insumos adquiridos por el contratista evitando reprocesos en el avance del proyecto.

Como soporte de lo anterior se solicitaron los documentos al contratista de obra correspondientes a los certificados de calidad y fichas técnicas de cada proveedor.

REPORTE DE CALIDAD DE PRODUCTO

Fecha: 25/06/18	Versión: 6	Código: FR.CC.34	Página 1 de 4

CEMENTOS TEQUENDAMA

MES: Septiembre 2023

CEMENTO: ■ **TIPO UG** ☐ **TIPO ART**

REQUISITOS FÍSICOS-MÉCANICOS	MÉTODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN*	INCERTIDUMBRE	CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S
Finura Blaine, m^2/kg	NTC 33	No especifica	1,95	393
Densidad (g/cm^3)	NTC 221	No especifica	0,03	2,98
Finura Tamiz 45µm (No. 325). %	NTC 294	No especifica	0,15	90,8
Cambio de longitud por autoclave, %	NTC 107	Máximo 0,80	0,0025	0,038
Tiempo de fraguado inicial, no menos de, minutos	NTC 118	No menos de 45	2,33	202
Tiempo de fraguado inicial, no más de, minutos	NTC 118	No más de 420		
Tiempo de fraguado final, minutos	NTC 118	No especifica	4,43	282
Expansión de barra de mortero 14 días. %	NTC 4927	Máximo 0,02	0,002	0,005
Contenido de aire en volumen de mortero. %	NTC 224	Máximo 12,0	0,55	4,70
Resistencia a la compresión, a 1 día, MPa	NTC 220	No especifica	---	7,1
Resistencia a la compresión, a 3 días, MPa		Mínimo 8,0	0,39	16,9
Resistencia a la compresión, a 7 días, MPa		Mínimo 15,0	0,52	21,2
Resistencia a la compresión, a 28 días, MPa		Mínimo 24,0	0,63	26,9

NTC: Norma Técnica Colombiana

Nota:

*Los requisitos físicos definidos en la norma NTC-121 , para cemento Tipo UG.

***Los datos reportados corresponden al promedio mes de Agosto**

*El muestreo se realizó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspección y Ensayo "PL.CC.01"

Fin del Informe



JEFE CONTROL DE CALIDAD

Nombre: Renán Jaimes

Email: rjaimes@cetesa.com.co

Tel. 6017420090 Ext. 2006

Vereda Chitiva, Abajo Finca La María

Suesca, Cundinamarca

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CENTRO LOGISTICO BOGOTA** Fecha Impresión **23/08/24**
Dirección: **Cr 68D 36ª Sur 32 Lo de Kennedy BOGOTA** No. Remisión: **82646446**
Teléfono: **3162802773** Página: **1 de 9**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr *	% Ni *	% Cu
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748003	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.94	0.17	0.025	0.014	0.002	0.46	0.194	0.194	0.163
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748005	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.94	0.17	0.025	0.014	0.002	0.46	0.194	0.194	0.163
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748006	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.94	0.17	0.025	0.014	0.002	0.46	0.194	0.194	0.163
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754704	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	1.05	0.18	0.028	0.013	0.002	0.46	0.152	0.065	0.158
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754714	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	1.05	0.18	0.028	0.013	0.002	0.46	0.152	0.065	0.158
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754718	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	1.05	0.18	0.028	0.013	0.002	0.46	0.152	0.065	0.158
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755403	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.98	0.18	0.027	0.015	0.001	0.46	0.153	0.091	0.160
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755510	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.99	0.18	0.026	0.012	0.001	0.46	0.132	0.070	0.166
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755610	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.99	0.19	0.033	0.014	0.001	0.46	0.112	0.063	0.165
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755618	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.99	0.19	0.033	0.014	0.001	0.46	0.112	0.063	0.165
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A010696516	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.07	0.19	0.026	0.015	0.001	0.49	0.182	0.067	0.182
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517304	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	1.05	0.19	0.034	0.014	0.002	0.47	0.157	0.070	0.191
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517311	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	1.05	0.19	0.034	0.014	0.002	0.47	0.157	0.070	0.191
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607807	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	1.05	0.20	0.026	0.010	0.002	0.46	0.120	0.090	0.173
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607911	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.02	0.22	0.022	0.015	0.002	0.48	0.151	0.100	0.162
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010652710	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	1.04	0.18	0.028	0.017	0.001	0.46	0.149	0.065	0.163
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010658413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	1.01	0.17	0.030	0.017	0.001	0.46	0.227	0.058	0.154

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CENTRO LOGISTICO BOGOTA** Fecha Impresión **23/08/24**
Dirección: **Cr 68D 36ª Sur 32 Lo de Kennedy BOGOTA** No. Remisión: **82646446**
Teléfono: **3162802773** Página: **2 de 9**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr *	% Ni *	% Cu
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010713506	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.05	0.20	0.023	0.019	0.001	0.48	0.192	0.074	0.175

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748003	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.039
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748005	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.039
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748006	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.039
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754704	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021	0.030
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754714	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021	0.030
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754718	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021	0.030
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755403	NTC 2289 GR60	Ternium	0.004	0.027
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755510	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.022
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755610	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.017
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755618	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.017
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A010696516	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.046
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517304	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021	0.027
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517311	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021	0.027

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CENTRO LOGISTICO BOGOTA**
Dirección: **Cr 68D 36ª Sur 32 Lo de Kennedy BOGOTA**
Teléfono: **3162802773**
Fecha Impresión **23/08/24**
No. Remisión: **82646446**
Página: **3 de 9**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607807	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.023
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607911	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.029
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010652710	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021	0.021
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010658413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.027
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010713506	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.020

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción psi	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal mm2
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748003	NTC 2289 GR60	Ternium	68040		87699		16	Sin Grieta	1.29	129
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748005	NTC 2289 GR60	Ternium	68040		87699		16	Sin Grieta	1.29	129
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748006	NTC 2289 GR60	Ternium	68040		87699		16	Sin Grieta	1.29	129
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754704	NTC 2289 GR60	Ternium	67129		90370		19	Sin Grieta	1.35	129
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754714	NTC 2289 GR60	Ternium	67129		90370		19	Sin Grieta	1.35	129
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754718	NTC 2289 GR60	Ternium	67129		90370		19	Sin Grieta	1.35	129
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755403	NTC 2289 GR60	Ternium	70117		89972		15	Cumple den	1.28	129

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CENTRO LOGISTICO BOGOTA** Fecha Impresión **23/08/24**
Dirección: **Cr 68D 36ª Sur 32 Lo de Kennedy BOGOTA** No. Remisión: **82646446**
Teléfono: **3162802773** Página: **4 de 9**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción psi	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal mm2
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755510	NTC 2289 GR60	Ternium	70475		91852		17	Cumple den	1.30	129
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755610	NTC 2289 GR60	Ternium	70093		91787		15	Sin Grieta	1.31	129
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755618	NTC 2289 GR60	Ternium	70093		91787		15	Sin Grieta	1.31	129
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A010696516	NTC 2289 GR60	Ternium	69801		96987		17	Sin Grieta	1.39	199
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517304	NTC 2289 GR60	Ternium		472		642	17	Sin Grieta	1.36	113.10
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517311	NTC 2289 GR60	Ternium		472		642	17	Sin Grieta	1.36	113.10
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607807	NTC 2289 GR60	Ternium		444		598	20	Sin Grieta	1.35	113.10
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607911	NTC 2289 GR60	Ternium		475		648	19	Sin Grieta	1.36	113.10
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010652710	NTC 2289 GR60	Ternium		523		700	17	Sin Grieta	1.34	113.10
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010658413	NTC 2289 GR60	Ternium		490		651	18	Sin Grieta	1.33	113.10
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010713506	NTC 2289 GR60	Ternium		507		682	18	Sin Grieta	1.35	113.10

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS		
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Carga Fluencia N	Carga Tracción N	Fecha Ensayo

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CENTRO LOGISTICO BOGOTA** Fecha Impresión **23/08/24**
Dirección: **Cr 68D 36ª Sur 32 Lo de Kennedy BOGOTA** No. Remisión: **82646446**
Teléfono: **3162802773** Página: **5 de 9**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS		
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Carga Fluencia N	Carga Tracción N	Fecha Ensayo
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748003	NTC 2289 GR60	Ternium	60516	78001	20230801
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748005	NTC 2289 GR60	Ternium	60516	78001	20230801
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748006	NTC 2289 GR60	Ternium	60516	78001	20230801
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754704	NTC 2289 GR60	Ternium	59706	80378	20230801
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754714	NTC 2289 GR60	Ternium	59706	80378	20230801
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754718	NTC 2289 GR60	Ternium	59706	80378	20230801
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755403	NTC 2289 GR60	Ternium	62364	80023	20230804
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755510	NTC 2289 GR60	Ternium	62682	81695	20230804

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CENTRO LOGISTICO BOGOTA** Fecha Impresión **23/08/24**
Dirección: **Cr 68D 36ª Sur 32 Lo de Kennedy BOGOTA** No. Remisión: **82646446**
Teléfono: **3162802773** Página: **6 de 9**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS		
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Carga Fluencia N	Carga Tracción N	Fecha Ensayo
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755610	NTC 2289 GR60	Ternium	62343	81638	20230804
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755618	NTC 2289 GR60	Ternium	62343	81638	20230804
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A010696516	NTC 2289 GR60	Ternium	95771	133071	20230702
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517304	NTC 2289 GR60	Ternium	53398	72650	20230314
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517311	NTC 2289 GR60	Ternium	53398	72650	20230314
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607807	NTC 2289 GR60	Ternium	50183	67610	20230505
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607911	NTC 2289 GR60	Ternium	53692	73296	20230506
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010652710	NTC 2289 GR60	Ternium	59151	79123	20230607

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CENTRO LOGISTICO BOGOTA** Fecha Impresión **23/08/24**
Dirección: **Cr 68D 36ª Sur 32 Lo de Kennedy BOGOTA** No. Remisión: **82646446**
Teléfono: **3162802773** Página: **7 de 9**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS		
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Carga Fluencia N	Carga Tracción N	Fecha Ensayo
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010658413	NTC 2289 GR60	Ternium	55379	73653	20230609
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010713506	NTC 2289 GR60	Ternium	57337	77095	20230720

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Angulo de Resalte °
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748003	NTC 2289 GR60	Ternium	3.3	8.6	0.967	51
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748005	NTC 2289 GR60	Ternium	3.3	8.6	0.967	51
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748006	NTC 2289 GR60	Ternium	3.3	8.6	0.967	51
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754704	NTC 2289 GR60	Ternium	3.8	8.5	0.968	51
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754714	NTC 2289 GR60	Ternium	3.8	8.5	0.968	51
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754718	NTC 2289 GR60	Ternium	3.8	8.5	0.968	51
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755403	NTC 2289 GR60	Ternium	4.5	8.5	0.966	50
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755510	NTC 2289 GR60	Ternium	4.5	8.5	0.973	51

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CENTRO LOGISTICO BOGOTA** Fecha Impresión **23/08/24**
Dirección: **Cr 68D 36ª Sur 32 Lo de Kennedy BOGOTA** No. Remisión: **82646446**
Teléfono: **3162802773** Página: **8 de 9**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Angulo de Resalte
					mm	mm	Kg/m	°
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755610	NTC 2289 GR60	Ternium	4.6	8.5	0.971	51
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755618	NTC 2289 GR60	Ternium	4.6	8.5	0.971	51
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A010696516	NTC 2289 GR60	Ternium	3.7	10.4	1.527	50
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517304	NTC 2289 GR60	Ternium	2.93	8.1	0.866	51
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517311	NTC 2289 GR60	Ternium	2.93	8.1	0.866	51
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607807	NTC 2289 GR60	Ternium	3.01	8.0	0.864	51
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607911	NTC 2289 GR60	Ternium	2.11	8.0	0.890	51
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010652710	NTC 2289 GR60	Ternium	3.52	8.1	0.984	51
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010658413	NTC 2289 GR60	Ternium	3.08	8.1	0.878	50
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010713506	NTC 2289 GR60	Ternium	3.12	8.1	0.870	51

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte
					mm
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748003	NTC 2289 GR60	Ternium	0.91
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748005	NTC 2289 GR60	Ternium	0.91
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010748006	NTC 2289 GR60	Ternium	0.91

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CENTRO LOGISTICO BOGOTA** Fecha Impresión **23/08/24**
Dirección: **Cr 68D 36ª Sur 32 Lo de Kennedy BOGOTA** No. Remisión: **82646446**
Teléfono: **3162802773** Página: **9 de 9**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754704	NTC 2289 GR60	Ternium	0.84
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754714	NTC 2289 GR60	Ternium	0.84
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010754718	NTC 2289 GR60	Ternium	0.84
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755403	NTC 2289 GR60	Ternium	0.71
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755510	NTC 2289 GR60	Ternium	0.77
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755610	NTC 2289 GR60	Ternium	0.81
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	A010755618	NTC 2289 GR60	Ternium	0.81
8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A010696516	NTC 2289 GR60	Ternium	0.92
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517304	NTC 2289 GR60	Ternium	0.90
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010517311	NTC 2289 GR60	Ternium	0.90
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607807	NTC 2289 GR60	Ternium	0.98
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010607911	NTC 2289 GR60	Ternium	0.86
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010652710	NTC 2289 GR60	Ternium	0.88
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010658413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.84
8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	A010713506	NTC 2289 GR60	Ternium	0.65

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO

RESISTENCIA (210 Kg/cm2) 3000 p.s.i.

PROYECTO

MANTENIMIENTO ITINAR CAMPESTRE MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

DIRIGIDO A

ING. EDWIN ORLANDO HURTADO

CHIQUINQUIRÁ

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

1 DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO HIDRAULICO

1.1 DATOS DE DISEÑO

Resistencia a la Compresión Requerida	3000 psi (100 Kg/cm^2)
Asentamiento recomendado	7.5 cm
Agregado fino	Cantera El Moral – Tunja
Agregado grueso	Cantera La Roca – Moniquirá
Cemento	TIPO I

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

AGREGADO GRUESO

Descripción	Material granular tipo grava, forma angular de color gris. TM 1" y TMN 1/2"
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2487
Porcentaje de absorción (%)	1,97
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1313,50

AGREGADO FINO

Descripción	Arena lavada de peña de forma sub–angular de color amarillo
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2478
Porcentaje de absorción (%)	3,45
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1439,29
Módulo de finura (MF)	2.67

CEMENTO

Descripción	Cemento marca HOLCIM
Densidad (Kg/m3)	3100,00
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m3)	1230,00

1.3 CÁLCULO DE LAS PROPORCIONES DE DISEÑO.

Escogida la especificación granulométrica según el tamaño máximo, se optimiza la granulometría mediante un proceso de estabilización para determinar la mejor mezcla de arena y grava para lograr un concreto de buenas propiedades de manejabilidad y resistencia para el contenido de cemento calculado.

La estabilización nos arroja la siguiente granulometría:

TAMIZ		PORCENTAJE PASA				
Diámetro (mm)	Alterno	FRANJA RECOMENDADA TM 3/4"		GRAVA	ARENA	MEZCLA MATERIALES
37,50	1 ½"	100	100	100,00	100,00	100,00
25,00	1"	100	100	100,00	100,00	100,00
19,00	3/4"	90	85	95,67	100,00	97,62
12,70	1/2"	78	68	47,88	100,00	71,34
9,50	3/8"	71	58	29,98	99,40	61,22
4,75	No.4	56	40	3,51	96,23	45,23
2,36	No.8	44	27	2,54	89,08	41,48
1,180	No.16	34	18	2,36	73,18	34,23
0,600	No.30	27	13	2,25	48,76	23,18
0,300	No.50	21	9	2,16	18,56	9,54
0,150	No.100	17	6	2,12	8,16	4,84
0,075	No.200	0	0	2,05	2,76	2,37

AGREGADO	PROPORCIÓN	HUMEDAD
Grava	55%	3,60%
Arena	45%	4.32%

Resistencia a la Compresión requerida	3000 p.s.i 210 Kg/cm^2
Asentamiento recomendado	7.5 cm
Tamaño máximo de diseño	1" (25,00 cm)
Densidad Bulk promedio de los agregados	2482.62 (Kg/m^3)
Relación agua / cemento	0.57

1.3.1 Proporciones para 1 m^3 de concreto corregidas por humedad de los agregados

Saco cemento (Kg)	50,00

Saco	7.3

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO	PROPORCIONES EN PESO (Kg) POR (M3) DE CONCRETO	DENSIDAD BULK	PROPORCIONES EN VOLUMEN ABSOLUTO (m3) POR (M3) DE CONCRETO	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR (M3) DE CONCRETO	AJUSTES POR HUMEDAD Kg/M3
Agua	0,57	207	1000	0,207	0,21	185
Aire		20	0,015	0,000	0,02	20
Cemento	1,0	363	3100	0,117	0,29	363
Arena	2,0	755	2478	0,305	0,52	788
Grava	2,5	923	2487	0,371	0,70	956
TOTAL		*2267,9*		*1,00*	*1,74*	*2312*

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO HÚMEDO (Kg) POR (M3) DE CONCRETO	PROPORCIONES EN PESO (Kg) POR SACO DE CEMENTO	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR SACO DE CEMENTO
Agua	185	25,57	0,026
Aire	0	0,00	0,025
Cemento	363	50,00	0,041
Arena	788	108,67	0,083
Grava	956	131,90	0,092
TOTAL	*2292*	*316,14*	*0,265*

1.3.2 Proporciones de diseño para concreto de 3000 p.s.i. Clase D (210 Kg/m^3)

MATERIAL	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN ABSOLUTO	DOSIFICACIÓN EN PESO	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN SUELTO
Agua	1,8	0,57	0,63
Aire	0,0	0,0	0,6
Cemento	1,0	1,0	1,0
Arena	2,6	2,0	2,0
Grava	3,2	2,5	2,3

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

1.3.3 Dosificación en baldes para un saco de cemento (Volumen suelto de agregados)

Balde (Litros)	10,0
Balde (m3)	0,010

MATERIAL	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR SACO DE CEMENTO	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN SUELTO	DOSIFICACIÓN EN BALDES DE 10 LITROS
Agua	0,026	0,6	2,6
Aire	0,025	0,6	
Cemento	0,041	1,0	4,1
Arena	0,083	2,0	8,3
Grava	0,092	2,3	9,2

1.3.4 Mezcla de Prueba

Número de cilindros de prueba a diseñar: 4

Volumen para un cilindro (m^3)	0,00530
V Total cuatro cilindros (m^3)	0,0212

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO	PESOS TOTALES (4) CILINDROS DE PRUEBA (Kg)	PESO (1) CILINDRO DE PRUEBA (Kg)
Agua	0,57	4,44	1,111
Aire		0,00	0,000
Cemento	1,0	8,69	2,172
Arena	2,0	18,88	4,720
Grava	2,5	22,92	5,729
TOTAL		*54,93*	*13,731*

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

OBSERVACIONES

- Las características evaluadas de los agregados permiten obtener la resistencia deseada mezclándolos en las proporciones recomendadas. La granulometría de la grava se ajusta de mejor manera dentro de la franja recomendada AG – 38 respectivamente. para concreto estructural tabla 630.4 especificaciones INVIAS.

- Para el agregado grueso se obtuvo un TM = 1" pulg. Y TMN = 1/2" pulg. Se debe tener en cuenta que el TMN no debe ser mayor que 1/5 de la dimensión menor de la estructura, no debe ser mayor que 1/3 del espesor de la losa ni mayor que 3/4 del espaciamiento máximo entre las barras de refuerzo.

- Los ensayos fueron realizados a una muestra suministrada por el cliente, Se recomienda realizar ensayos adicionales para verificar las propiedades mecánicas de los agregados y garantizar su óptimo comportamiento en la mezcla y durabilidad del concreto.

- Debido a que no se realizaron ensayos adicionales para verificar las propiedades de los materiales se diseñó para una resistencia mayor de acuerdo a un nivel de confiabilidad escogido por lo cual es importante realizar control sobre la mezcla en obra para lograr ajustar adecuadamente las proporciones de los materiales.

- Se debe tener en cuenta la medida de dosificación de los materiales adoptada en obra, ya sea por peso o por volumen.


- Se recomienda tener en obra el cono de Abrahán para controlar el asentamiento, el cual para este diseño es de 3"

- Se resalta la importancia del contenido de agua, en la mezcla tanto por la manejabilidad y consistencia (asentamiento), como para la resistencia (relación agua cemento) que esta controla. Por este motivo y debido a las

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

diferencia de humedades que se pueden dar al momento del ensayo y al momento de efectuar las mezcla en obra, se debe controlar la cantidad de agua para generar la consistencia y resistencia deseadas.

GCI Para controlar la proporción de agua, en la mezcla preparada en obra se recomienda realizar pruebas de asentamiento (cono slump) y para verificar la resistencia tomar mínimo tres (3) cilindros.



ING. JIMMY VERGARA SILVA
DIRECTOR DE LABORATORIO
GLOBAL CIVIL INGENIERÍA SAS

Laboratorio de Suelos
GlobalCivil
Interventorías y Construcción

Página 1 de 6	ENSAYO
NORMA INV E – 123 –13	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO AGREGADO GRUESO (GRAVILLA)

PROYECTO:	**DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO DE 3000 PSI. PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA**
DIRIGIDO A :	**ING. EDWIN ORLANDO HURTADO / CONSORCIO BW VILLA**
PROCEDENCIA:	**CANTERA LA ROCA - MONIQUIRA**
FECHA ENSAYO:	**25/01/2022**
DESCRIPCION MATERIAL:	Material granular tipo grava, angular de color gris


ANTES DE LAVADO

No. PLATON	12
PESO PLATÓN (g)	209,8
PESO PLATÓN + MUESTRA (g)	2635
PESO MUESTRA (g)	2425,2

DESPUÉS DE LAVADO

PESO PLATÓN (g)	209,8
PESO PLATÓN + MUESTRA (g)	2585
PESO MUESTRA SECA (g)	2375
PASA TAMIZ Nº 200 (%)	2,05

TAMIZ N°	DIÁMETRO (mm)	PESO RETENIDO (g)	PESO CORR (g)	% RETENIDO	%RETENIDO ACUMULADO	% QUE PASA
2"	50,8	0	0,00	0,00	0,00	100,00
11/2"	38,1	0	0,00	0,00	0,00	100,00
1"	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3/4"	19,00	104,98	104,98	4,33	4,33	95,67
1/2"	12,50	1158,94	1158,94	47,79	52,12	47,88
3/8"	9,51	434,12	434,12	17,90	70,02	29,98
4	4,75	642,15	642,15	26,48	96,49	3,51
8	2,36	23,39	23,39	0,96	97,46	2,54
16	1,180	4,3	4,32	0,18	97,64	2,36
30	0,600	2,7	2,68	0,11	97,75	2,25
50	0,300	2,2	2,20	0,09	97,84	2,16
100	0,150	1,1	1,11	0,05	97,88	2,12
200	0,074	1,6	1,60	0,07	97,95	2,05
FONDO		49,72	49,72	2,05	100,00	0,00
Σ		2425,20	2425	100		

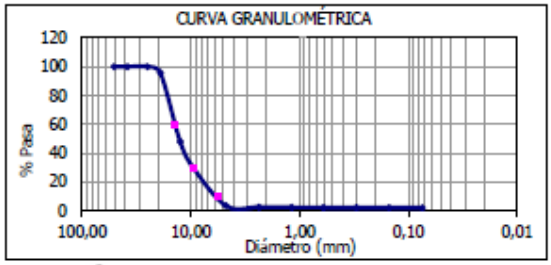

D60	13,90
D30	9,51
D10	5,63

Cc	1,2
Cu	2,5


ING. JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e–mail: globalcivilsas@gmail.com

Laboratorio de Suelos
GlobalCivil
Interventorías y Construcción

Página 2 de 6	ENSAYO
NORMA INV– ART 630 –13	CONCRETO ESTRUCTURAL – FRANJA GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO GRUESO

AGREGADO TIPO AG - 38				
TAMIZ No	DIÁMETRO (mm)	FRANJA ESPECIFICACIÓN % QUE PASA		GRAVILLA % QUE PASA
1 1/2"	37,50	100	100	100,00
1"	25,00	95	100	100,00
1/2"	12,50	25	60	47,88
N°4	4,75	0	10	3,51
N°8	2,36	0	5	2,54

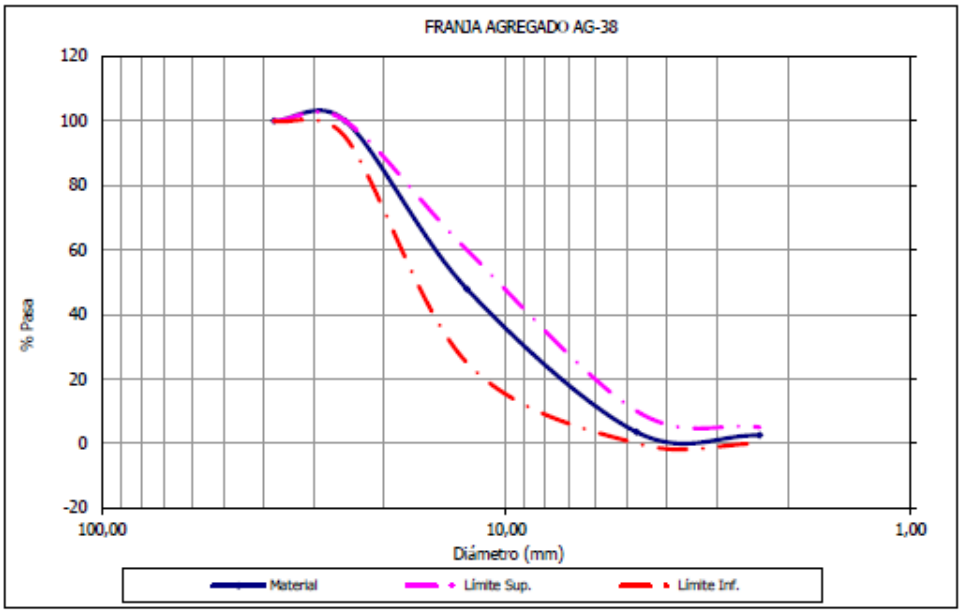

ING. JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e–mail: globalcivilsas@gmail.com

Laboratorio de Suelos
GlobalCivil
Interventorías y Construcción

Página 3 de 6	ENSAYO
NORMA INV E – 123 –13	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO AGREGADO FINO (ARENA)

PROYECTO:	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO DE 3000 PSI. PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
DIRIGIDO A :	ING. EDWIN ORLANDO HURTADO / CONSORCIO BW VILLA
PROCEDENCIA:	CANTERA EL MORAL - TUNJA
FECHA ENSAYO:	25/01/2022
DESCRIPCION MATERIAL:	Arena lavada de peña de forma sub-angular de color amarillo


ANTES DE LAVADO

No. PLATÓN	10
PESO PLATÓN (g)	162,1
PESO PLATÓN + MUESTRA (g)	1125,4
PESO MUESTRA (g)	963,3

DESPUÉS DE LAVADO

PESO PLATÓN (g)	162,1
PESO PLATÓN + MUESTRA (g)	1098,8
PESO MUESTRA SECA (g)	936,7
PASA TAMIZ Nº 200 (%)	2,76

TAMIZ N°	DIÁMETRO (mm)	PESO RETENIDO (g)	PESO CORR (g)	% RETENIDO	%RETENIDO ACUMULADO	% QUE PASA
3/4"	19,10	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
1/2"	12,70	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
3/8"	9,51	5,8	5,80	0,60	0,60	99,40
4	4,76	30,5	30,50	3,17	3,77	96,23
8	2,36	68,9	68,90	7,15	10,92	89,08
16	1,180	153,2	153,20	15,90	26,82	73,18
30	0,600	235,2	235,20	24,42	51,24	48,76
50	0,300	290,89	290,89	30,20	81,44	18,56
100	0,150	100,2	100,20	10,40	91,84	8,16
200	0,075	52,02	52,02	5,40	97,24	2,76
FONDO		26,59	26,59	2,76	100,00	0,00
Σ		963,30	963	100		

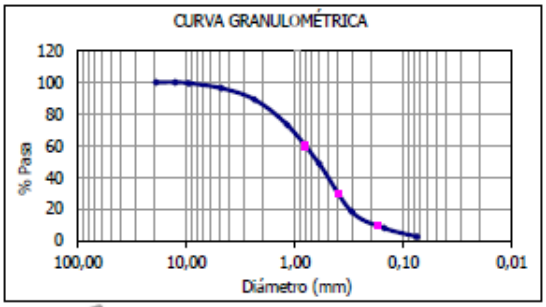

D60	0,82
D30	0,39
D10	0,17

Cc	1,1
Cu	4,8

Módulo de Finura:	**2,67**


ING. JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e-mail: globalcivilsas@gmail.com

Laboratorio de Suelos
GlobalCivil
Interventorías y Construcción

Página 4 de 180	ENSAYO
NORMA INV– ART 630 –13	CONCRETO ESTRUCTURAL – FRANJA GRANULOMÉTRICA DE AGREGADO FINO

AGREGADO TIPO AG - 19				
TAMIZ No	**DIÁMETRO (mm)**	**FRANJA ESPECIFICACIÓN % QUE PASA**		**ARENA % QUE PASA**
3/8"	9,50	100	100	99,40
4	4,75	95	100	96,23
8	2,36	80	100	89,08
16	1,18	50	85	73,18
30	0,60	25	60	48,76
50	0,30	10	30	18,56
100	0,150	2	10	8,16

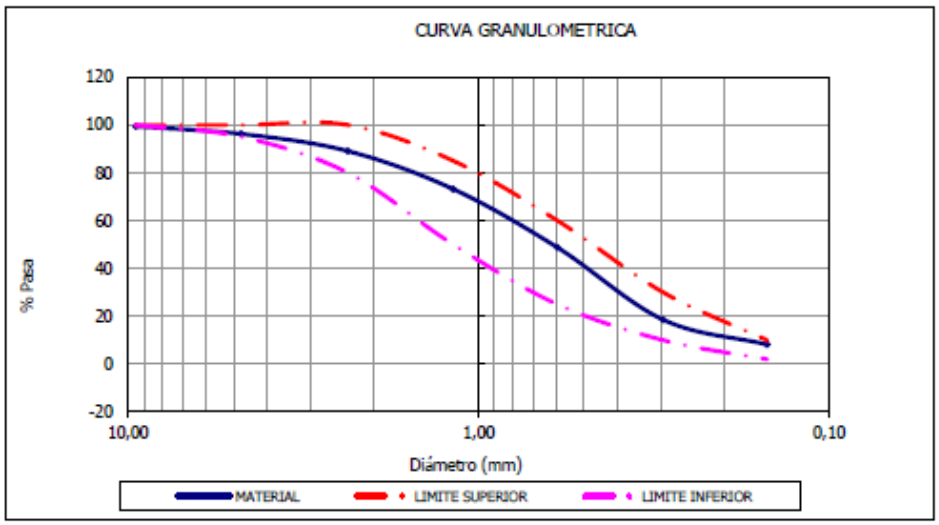

ING. JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e–mail: globalcivilsas@gmail.com

Laboratorio de Suelos
GlobalCivil
Interventorías y Construcción

Página 6 de 6	ENSAYO – DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO Y FINO
NORMA INV E – 222 –13 INV E – 223 –13	

PROYECTO:	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO DE 3000 PSI. PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA		
DIRIGIDO A :	ING. ORLANDO HURTADO / CONSORCIO BW VILLA	FECHA ENSAYO:	25/01/2022
PROCEDENCIA:	GRAVA CANTERA LA ROCA Y ARENA CANTERA EL MORAL		

AGREGADO GRUESO

No. PLATON	8c
PESO DEL PLATÓN (g)	192
PESO DEL PLATÓN +MUESTRA SSS (g)	2000
PESO DEL LASTRE + CANASTILLA (g)	1609
PESO LASTRE + CANASTILLA+ MUESTRA (g)	2704
PESO DEL PLATÓN + MUESTRA SECA (g)	1965

Peso Específico aparente (g/cm^3)	*2,487*
Peso Específico SSS (g/cm^3)	*2,54*
Peso Específico Nominal (g/cm^3)	*2,62*
% de Absorción	*1,97*

AGREGADO FINO

No. PLATON	10B
PESO DEL PLATÓN (g)	74,8
PESO DEL PLATÓN +MUESTRA SSS (g)	569,4
PESO MATRAZ + AGUA (25 ºC) (g)	680,4
PESO MATRAZ + AGUA + MUESTRA (25 ºC) (g)	982,0
PESO DEL PLATÓN + MUESTRA SECA (g)	552,9

Peso Específico aparente (g/cm^3)	*2,478*
Peso Específico nominal (g/cm^3)	*2,71*
% de Absorción	*3,45*

NORMA	ENSAYO – DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO
INV E – 217 –13	

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL GRUESO: Material granular tipo grava, angular de color gris

Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	*1313,50*

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL FINO: Arena lavada de peña de forma sub-angular de color amarillo

Masa Unitaria Suelta (Kg/m^3)	*1439,29*

ING. JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e–mail: globalcivilsas@gmail.com


Laboratorio de Suelos
GlobalCivil
Interventorías y Construcción

Página 6 de 6	ENSAYO
NORMA	ESTABILIZACIÓN DE MATERIAL

PROYECTO:	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO DE 3000 PSI. PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA		
DIRIGIDO A:	ING. ORLANDO HURTADO / CONSORCIO BW VILLA	FECHA ENSAYO:	25/01/2022
PROCEDENCIA:	GRAVA CANTERA LA ROCA Y ARENA CANTERA EL MORAL		

DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES, MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO

TAMIZ		PORCENTAJE PASA				
Diámetro (mm)	Alterno	FRANJA RECOMENDADA TM 1"		GRAVA	ARENA	MEZCLA MATERIALES
37,50	1 ½"	100	100	100,00	100,00	100,00
25,00	1"	100	100	100,00	100,00	100,00
19,00	3/4"	90	85	95,67	100,00	97,62
12,70	1/2"	78	68	47,88	100,00	71,34
9,50	3/8"	71	58	29,98	99,40	61,22
4,75	No.4	56	40	3,51	96,23	45,23
2,36	No.8	44	27	2,54	89,08	41,48
1,180	No.16	34	18	2,36	73,18	34,23
0,600	No.30	27	13	2,25	48,76	23,18
0,300	No.50	21	9	2,16	18,56	9,54
0,150	No.100	17	6	2,12	8,16	4,84
0,075	No.200	0	0	2,05	2,76	2,37

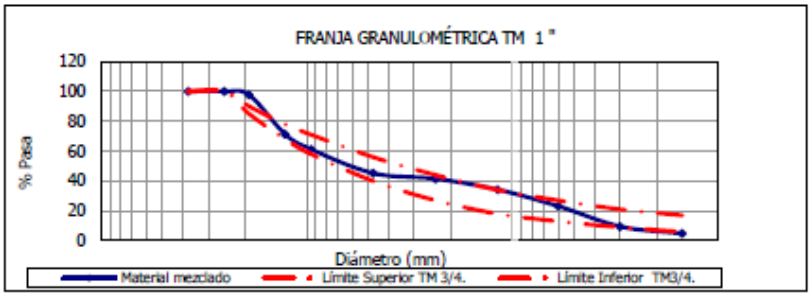

MATERIAL	%
GRAVA	55,0%
ARENA	45,0%
	100%

ING. JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e-mail: globalcivilsas@gmail.com

4.5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Una vez se suscribe el acta de inició para la ejecución del contrato se realizó la renovación de pólizas de acuerdo con la fecha del acta de inicio, los soportes de las pólizas y su aprobación se relacionan a continuación.

Aseguradora	Descripción de los amparos	No Póliza	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
LA PREVISORA S.A.	CUMPLIMIENTO	3002378	11-10-2023	10-12-2024	$ 31.029.873
LA PREVISORA S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3002378	11-10-2023	10-12-2026	$ 15.514.936
LA PREVISORA S.A.	ESTABILIDAD DE OBRA	3002378	11-12-2023	9-02-2026	$ 46.544.809
LA PREVISORA S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	1008309	11-10-2023	15-12-2023	$ 533.600.000
LA PREVISORA S.A.	CUMPLIMIENTO	3002378	30-11-2023	10-12-2024	$ 31.029.873
LA PREVISORA S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3002378	30-11-2023	10-12-2026	$ 15.514.936
LA PREVISORA S.A.	ESTABILIDAD DE OBRA	3002378	11-12-2023	09-02-2026	$ 46.544.809
LA PREVISORA S.A.	CUMPLIMIENTO	3002378	30-11-2023	10-12-2024	$ 31.029.873
LA PREVISORA S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3002378	30-11-2023	10-12-2026	$ 15.514.936
LA PREVISORA S.A.	ESTABILIDAD DE OBRA	3002378	11-12-2023	09-02-2026	$ 46.544.809

PÓLIZA Nº
3002378

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
13	12	2023	MODIFICACIÓN	3			NO

TOMADOR	20025314-EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL	**CC**	5747999
DIRECCIÓN	KR 0 A ESTE 74 51, TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO**	3114521639
ASEGURADO	783130-MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	**NIT**	891.801.268-7
DIRECCIÓN	KR 9 CL 13 - 11 VILLA DE LEIVA, VILLA DE LEIVA, BOYACA	**TELÉFONO**	7320382

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
TUNJA	2304	23	13	12	2023	30	11	2023	00:00	10	12	2026	00:00	1106

MONEDA Pesos
TIPO CAMBIO 1,00

CARGAR A: EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL

FORMA DE PAGO: 1. CONTADO

VALOR ASEGURADO TOTAL: $93.089.620,00

BENEFICIARIOS:
MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA NIT: 891.801.268-7

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31.029.873,00	SI	30/11/2023	10/12/2024	0,00
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	15.514.937,00	SI	30/11/2023	10/12/2026	0,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	46.544.810,00	SI	11/12/2023	09/02/2026	0,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 234-2023, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ".

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.
MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE PROCEDE CON EL AJUSTE DE LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL ASEGURADO Y DE ACUERDO CON EL ADICIONAL No. 1 EN VALOR No. 234-2023. DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2023. EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 234-2023, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN CONTINUAN VIGENTES

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$**********0,00
GASTOS	$**********0,00
IVA	$**********0,00
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$**********0,00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

13/12/2023 09:58:52

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
6665	3	LOYALTY GROUP LTDA A		

PÓLIZA Nº
3002378

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
13	12	2023	MODIFICACIÓN	4			NO

TOMADOR	20025314-EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL	**CC**	5747999
DIRECCIÓN	KR 0 A ESTE 74 51, TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO**	3114521639
ASEGURADO	783130-MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	**NIT**	891.801.268-7
DIRECCIÓN	KR 9 CL 13 - 11 VILLA DE LEIVA, VILLA DE LEIVA, BOYACA	**TELÉFONO**	7320382

EMITIDO EN	MONEDA	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
TUNJA	Pesos	2304	23	13	12	2023	30	11	2023	00:00	4	2	2026	00:00	797

TIPO CAMBIO	CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
1,00	EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL	1. CONTADO	$93.089.620,00

BENEFICIARIOS:
MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA NIT: 891.801.268-7

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31.029.873,00	SI	30/11/2023	10/12/2024	0,00
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	15.514.937,00	SI	30/11/2023	10/12/2026	0,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	46.544.810,00	SI	07/12/2023	04/02/2026	0,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 234-2023, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ".

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SEGUN ACTA FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE FECHA 07/12/2023 AL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA N° 234 DE 2023.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$**********0,00
GASTOS	$**********0,00
IVA	$**********0,00
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$**********0,00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

13/12/2023 10:27:55

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
6665	3	LOYALTY GROUP LTDA A		

PÓLIZA N°
3002378

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
19	10	2023	MODIFICACIÓN	1			NO

TOMADOR	20025314-EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL	CC	5747999
DIRECCIÓN	KR 0 A ESTE 74 51, TUNJA, BOYACA	TELÉFONO	3114521639
ASEGURADO	783130-MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	NIT	891.801.268-7
DIRECCIÓN	KR 9 CL 13 - 11 VILLA DE LEIVA, VILLA DE LEIVA, BOYACA	TELÉFONO	7320382

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
TUNJA	2304	23	19	10	2023	11	10	2023	00:00	10	12	2026	00:00	1156

MONEDA	TIPO CAMBIO	CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1,00	EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL	1. CONTADO	$85.671.018,00

BENEFICIARIOS:
MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA NIT: 891.801.268-7

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28.557.006,00	SI	11/10/2023	10/12/2024	0,00
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	14.278.503,00	SI	11/10/2023	10/12/2026	0,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	42.835.509,00	SI	11/10/2023	10/12/2025	0,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 234-2023, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "CONTRATACIÒN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÒN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÈCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ".

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE PROCEDE CON LA ACTUALIZACION DE LAS FECHAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CONTRATO SELECCIÒN ABREVIADA MENOR CUANTÌA N° 234 DE 2023 (14-09-2023)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$**********0,00
GASTOS	$**********0,00
IVA	$**********0,00
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$**********0,00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://facturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

19/10/2023 11:32:53

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
6665	3	LOYALTY GROUP LTDA A		

PÓLIZA Nº
1008309

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
20	9	2023	EXPEDICION	0			NO

TOMADOR	20025314-EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL	CC	5.747.999
DIRECCIÓN	CRA 0 A ESTE # 74 51, TUNJA, BOYACA	TELÉFONO	3114521639
ASEGURADO	783130-MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	NIT	891.801.268-7
DIRECCIÓN	KR 9 CL 13 - 11 VILLA DE LEIVA, VILLA DE LEIVA, BOYACA	TELÉFONO	7320382

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
TUNJA	2304	23	20	9	2023	15	9	2023	00:00	19	11	2023	00:00	65

MONEDA	TIPO CAMBIO	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1.00	1. CONTADO	$ 533,600,000.00

CARGAR A: HURTADO VILLAMIL EDWIN ORLANDO

Riesgo: 1 -
KR 0 A ESTE NO. 74-51, TUNJA, BOYACA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE	232,000,000.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	232,000,000.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	232,000,000.00	SI	52,000.00
5	COBERTURA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
6	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	116,000,000.00		
7	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	116,000,000.00		
8	COBERTURA RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROP		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	116,000,000.00		
11	GASTOS MEDICOS	69,600,000.00	SI	0.00
12	GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSA	232,000,000.00	SI	0.00

BENEFICIARIOS

Nombre/Razón Social	Documento	Porcentaje	Tipo Benef
Texto continúa en Hojas de Anexos...			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$********52,000.00
GASTOS	$**********0.00
IVA	$*******9,880.00
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$******61,880.00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://facturaseguros.transfiriendo.com/FacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

20/09/2023 15:50:36

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
6665	3	LOYALTY GROUP LTDA ASE		

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1008309 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

PREVISORA SEGUROS

CERTIFICADO DE: EXPEDICION	**0**

TERCEROS AFECTADOS NIT 000 100.000 % NO APLICA

RCP-027-6 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

SE PROCEDE CON LA EXPEDICION DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON DOCUMENTOS APORTADOS POR EL ASEGURADO A TRAVES DE SU ASESOR DE SEGUROS. SLIP DE COTIZACION PRESENTADO Y ACEPTADO.

TOMADOR 20025314 - HURTADO VILLAMIL EDWIN ORLANDO
C.C 5747999
CARRERA 0 A ESTE NO. 74-51 - TUNJA

ASEGURADO 783130 - MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA
NIT 8918012687
KR 9 CL 13 - 11 VILLA DE LEIVA

BENEFICIARIOS Terceros Afectados

VIGENCIA DEL SEGURO

Dos meses, desde la fecha en que la presente propuesta sea aceptada por el asegurado.

OBJETO
Amparar los perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia de un hecho de carácter accidental, súbito e imprevisto imputable al asegurado, de acuerdo con la ley colombiana, que causen la muerte, lesión o menoscabo en la salud de las personas (daños personales) y/o el deterioro o destrucción de bienes (daños materiales) y perjuicios económicos, incluyendo lucro cesante, como consecuencia directa de tales daños personales y/o daños materiales, causados durante el giro normal de sus actividades.

INTERÉS ASEGURABLE

"CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ"

CONDICIONES GENERALES
Textos según clausulado La Previsora S.A forma RCP027VERSION06-D00I que se adjunta.

MODALIDAD DE COBERTURA
La póliza opera bajo la modalidad de delimitación temporal de cobertura denominado "ocurrencia" con arreglo a lo consignado en el articulo 1131 del código de comercio.

LÍMITE TERRITORIAL República de Colombia

LEY Y JURISDICCIÓN República de Colombia

LIMITE ASEGURADO $232.000.000 por evento y por vigencia combinado para todos los amparos (por riesgo).
* Los sublimites y coberturas ofrecidas hacen parte del limite asegurado y no en adición a esta.
* En aquellos amparos donde no se establezca sublimite, se entienden otorgados al 100% del limite asegurado

AMPAROS

Las labores u operaciones que lleva a cabo el asegurado en el ejercicio de las actividades descritas en la carátula de la póliza. De tal manera queda amparada la responsabilidad civil extracontractual derivada de:

1. Perjuicios patrimoniales, incluye daños emergentes y lucro cesante, siempre que se deriven de un daño material, lesión corporal, cubierto por la póliza.
Texto Continua en Hojas de Anexos...

HOJA ANEXA No. 2 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1008309 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

PREVISORA SEGUROS

CERTIFICADO DE: EXPEDICION	0

2. Perjuicios extrapatrimoniales, incluye perjuicio moral, fisiológico y daños a la vida de relación siempre que se deriven de un daño material y/o lesión corporal cubierto por la presente póliza.

OTROS AMPAROS

1. Costos y gastos de defensa, en adición a lo indicado en el numeral 1.2.1. del condicionado general, este amparo se sublimita a 50 % por evento y 100 % por vigencia, aplicando las tarifas de colegios de abogados de la respectiva ciudad.
2. Costos de cauciones, según alcance establecido en las condiciones generales, Sublimitado a 30 % por evento y por vigencia.
3. Gastos Médicos, en adición a lo indicado en el numeral 1.2.3. del condicionado general, este amparo se entiende como aquellos gastos médicos de emergencia en que se incurran hasta cinco (5) dias calendarios siguientes al hecho externo imputable al asegurado; Sublimitado a a 15 % por evento y a 30 % por vigencia. Para esta cobertura se excluyen reclamaciones de empleados y contratistas del asegurado.
4. Vehiculos propios, en adición a lo indicado en el numeral 1.3.1. del condicionado general, este amparo se extiende a los vehiculos no propios y opera en exceso de $100.000.000 para daños a bienes de terceros, $100.000.000 por lesiones o muerte a una persona, $200.000.000 por lesiones o muerte a varias personas; todos estos respecto del seguro de automóviles, SOAT y de cualquier otro seguro que el vehiculo posea. En caso de no contar con póliza opera en exceso de pérdidas, daños o perjuicios superiores a $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. Sublimitado a 50% por evento y 100% por vigencia.
5. Responsabilidad patronal, según alcance establecido en las condiciones generales. Sublimitado a 50% por evento y 100% por vigencia
6. Contratistas y subcontratistas, queda cubierta la responsabilidad civil extracontractual que recae sobre el asegurado en forma directa por daños causados por los contratistas y subcontratistas a su servicio, siempre y cuando dichos daños tengan relación directa o indirecta con la actividad del asegurado. Opera en exceso de las pólizas básicas de responsabilidad de cada contratista y/o subcontratista. En caso de no contar con póliza opera en exceso de pérdidas, daños o perjuicios superiores a 200 SMMLV. Sublimitado a 50% por evento y 100% por vigencia

EXCLUSIONES

Además de las exclusiones contenidas en el clausulado general salvo estipulación expresa en contrario, la presente póliza no se extiende a amparar la responsabilidad civil del asegurado en los siguientes casos:

1. Responsabilidad civil contractual
2. Responsabilidad civil fallas en el suministro
3. Reclamaciones propias de otra clase de seguros
4. Renovación automática
5. Restablecimiento automático
6. Pérdidas o daños derivados del incumplimiento de normas, reglamentos o en general disposiciones legales, incluido el pago de multas y sanciones
7. Recolección y/o retirada de productos
8. Responsabilidad civil por AMIT
9. Responsabilidad civil por actos de terrorismo
10. Enfermedades profesionales
11. Responsabilidad civil profesional
12. Transporte de pasajeros
13. Responsabilidad civil de Directores y Administradores (D&O)
14. Exportaciones a Estados Unidos de Norte América (USA), Canadá, Puerto Rico y México
15. Reclamaciones que no sean consecuencia directa de daños materiales o lesiones personales, daños patrimoniales puros.
16. Conducciones subterráneas y aéreas
17. Propiedades adyacentes
18. Fabricación, elaboración, transporte, almacenamiento y uso entre otros, de explosivos y materias relacionadas con juegos artificiales, y quema de los mismos.
19. Transporte de carta extradimensionada y extrapesada
20. La extracción y fabricación y transporte de productos de carácter inflamable, tóxico, corrosivo, contaminante y/o explosivo incluidos los relacionados en el Dec 1609/2002.
21. Personas al servicio del asegurado cuando no estén en el ejercicio de sus funciones.
22. Daños originados por una contaminación paulatina del medio ambiente u otras variaciones perjudiciales del agua, aire, suelo, subsuelo o bien por ruido, asi como daños originados por la acción paulatina del agua, que no sean consecuencia de un acontecimiento accidental, repentino e imprevisto.

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 3 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1008309 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

PREVISORA SEGUROS

CERTIFICADO DE: EXPEDICION	**0**

23. Toda clase de eventos ocurridos fuera del territorio de la república de Colombia.
24. Eventos que ocurran fuera de la vigencia de esta póliza.
25. Cobertura de honorarios y gastos de defensa si la responsabilidad proviene de dolo o está expresamente excluida del contrato de seguro, si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa del asegurador y si la condena por los perjuicios ocasionados a la victima excede la suma que delimita la responsabilidad del asegurador, este solamente responderá por los gastos del proceso en proporción a la cuota que le corresponda en la indemnización.
26. Reclamaciones entre las personas naturales o jurídicas que aparecen conjuntamente mencionadas como el "asegurado" en la carátula de la póliza o en sus anexos.
27. Reclamaciones originadas por terremoto, erupción volcánica (actos de la naturaleza) y en general todos los eventos que escapen del control del asegurado.
28. Incumplimiento de cualquier norma legal y de operación que regulan la materia

DEDUCIBLES APLICABLES

1. Gastos médicos: Sin deducible
2. Gastos de defensa: 10% de los gastos incurridos
3. Demás amparos: 10% del valor de la pérdida, máximo 2.000 SMMLV

COSTO DEL SEGURO $52.000 + IVA
FORMA DE PAGO: 30 dias a partir del inicio de vigencia.

CONDICIONES PARTICULARES
1. El asegurado será responsable por declarar el verdadero estado del riesgo y mantener informada a la aseguradora de los cambios en este, sobre todo en lo relacionado con los reclamos presentados, tal como lo establecen los Articulos 1058 y 1060 del Código de Comercio.
2. Ampliación del plazo para aviso de siniestro a 10 dias.
3. CLÁUSULA DE DESIGNACIÓN DE AJUSTADOR POR MUTUO ACUERDO: Queda entendido y convenido que, en caso de siniestros amparados por la presente póliza, en los cuales PREVISORA requiera la designación de un perito ajustador, este será nombrado de común acuerdo con el tomador.
4. CLÁUSULA DE REVOCACIÓN UNILATERAL DE LA PÓLIZA POR PARTE DE LA ASEGURADORA - AMPLIACIÓN DEL PLAZO A 30 DÍAS HÁBILES: Modifica parcialmente la Cláusula Décima Sexta de las Condiciones Generales de la Póliza en cuanto al plazo allí previsto. En consecuencia, este seguro podrá ser revocado unilateralmente por PREVISORA, mediante noticia escrita al asegurado enviada a su última dirección conocida con no menos de 30 dias hábiles de antelación contados a partir de la fecha del envio.
5. CLÁUSULA DE NO RESTABLECIMIENTO DE SUMA ASEGURADA: Queda entendido que la suma asegurada se reduce desde el momento del siniestro en el importe de la indemnización pagada por la compañia, y la misma no se entiende restablecida en ningún momento.
6. CLÁUSULA DE NO AMPARO AUTOMÁTICO DE NUEVOS PREDIOS Y OPERACIONES: Queda entendido que para la inclusión de nuevos predios y/u operaciones, el asegurado deberá solicitarla por escrito a la Previsora, quien una vez efectúe el respectivo análisis determinará si da lugar o no a la aceptación del nuevo riesgo u operación y al cobro de prima adicional.

PÓLIZA Nº
1008309

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
19	10	2023	MODIFICACION SIN MOVIMIENTO DE PRIMA	1			NO

TOMADOR	20025314-EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL	CC	5.747.999
DIRECCIÓN	CRA 0 A ESTE # 74 51, TUNJA, BOYACA	TELÉFONO	3114521639
ASEGURADO	783130-MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	NIT	891.801.268-7
DIRECCIÓN	KR 9 CL 13 - 11 VILLA DE LEIVA, VILLA DE LEIVA, BOYACA	TELÉFONO	7320382

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
TUNJA	2304	23	19	10	2023	19	11	2023	00:00	15	12	2023	00:00	26

MONEDA	TIPO CAMBIO	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1.00	1. CONTADO	$ 0.00

CARGAR A: HURTADO VILLAMIL EDWIN ORLANDO

Riesgo: 1 -
KR 0 A ESTE NO. 74-51, TUNJA, BOYACA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE	232,000,000.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	232,000,000.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	232,000,000.00	SI	0.00
5	COBERTURA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
6	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	116,000,000.00		
7	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	116,000,000.00		
8	COBERTURA RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROP		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	116,000,000.00		
11	GASTOS MEDICOS	69,600,000.00	SI	0.00
12	GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSA	232,000,000.00	SI	0.00

BENEFICIARIOS

Nombre/Razón Social	Documento	Porcentaje	Tipo Benef
Texto continúa en Hojas de Anexos...			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$**********0.00
GASTOS	$**********0.00
IVA	$**********0.00
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$**********0.00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://facturaseguros.transfiriendo.com/FacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

19/10/2023 11:35:44

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
6665	3	LOYALTY GROUP LTDA ASE		

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1008309 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

PREVISORA SEGUROS

CERTIFICADO DE: MODIFICACION SIN MOVIMIENTO DE PRIMA	**1**

TERCEROS AFECTADOS NIT 000 100.000 % NO APLICA

RCP-027-6 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE PROCEDE CON LA ACTUALIZACION DE LAS FECHAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA N° 234 DE 2023 (14-09-2023

ANEXO CERTIFICADOS SENA Y COMFABOY

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7452773

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 101266526		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
14	12	2023
FECHA VENCIMIENTO		
19	12	2023

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador EDWIN ORLANDO — **NIT o C.C.** 5747999

Dirección Cr. 12 13 A 23 — **Teléfono** +57,311

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Boyaca		
TRESCIENTOS OCHENTA NOVECIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 387,900.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 387,900.00

Redeban

DIC 15 2023 15:18:34 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGAS MERLY
CR 10 10A 05
C.UNICO: 3007041775 TER: ABCWZ282
RECIBO: 008475 RRN: 013228
APRO: 561723
RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7452773
VALOR $ 387.900
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo si
La impresión de este cupón debe realiza
Si va a cancelar con Cheque, solo se re
Al cancelar su pago se debe hacer solo
Se deben presentar todas las copias de
Si se presenta algún incidente con el cu
Términos y condiciones podrá encontrar

ue de gerencia).
reo certiaportes@sena.edu.co

SENA

(415)7707012100010(8020)7452773(3900)000000387900(96)20231219

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 — **REFERENCIA No.** 101266526

Ciudad | D | M | A | NIT 5747999 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: EDWIN ORLANDO

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

comfaboy
unidos para crecer

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aqui se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que deberia cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa HURTADO VILLAMIL EDWIN ORLANDO con nit 5747999 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplcsap
14/02/2023	8625616581	5	193,400	202301	193,400	$4,833,334	$4,833,334
14/02/2023	8625615876	10	309,600	202301	309,600	$7,733,336	$7,733,336
14/03/2023	8625802301	4	120,800	202302	120,800	$3,016,001	$3,016,001
14/03/2023	8625888649	6	278,400	202302	278,400	$6,960,000	$6,960,000
11/04/2023	8626140583	6	278,400	202303	278,400	$6,960,000	$6,960,000
11/04/2023	8626140987	1	46,400	202303	46,400	$1,160,000	$1,160,000
15/05/2023	8626478191	6	93,000	202304	93,000	$2,320,002	$2,320,002
15/05/2023	8626477986	1	46,400	202304	46,400	$1,160,000	$1,160,000
05/06/2023	8626646251	1	46,400	202305	46,400	$1,160,000	$1,160,000
10/07/2023	8627021958	6	45,200	202306	45,200	$1,121,337	$1,121,337
10/07/2023	8627021756	1	46,400	202306	46,400	$1,160,000	$1,160,000
02/08/2023	8627236058	9	324,900	202307	324,900	$8,120,002	$8,120,002
03/08/2023	8627250003	1	46,400	202307	46,400	$1,160,000	$1,160,000
11/08/2023	8627342107	4	99,200	202307	99,200	$2,474,668	$2,474,668
04/09/2023	8627522393	4	185,600	202308	185,600	$4,640,000	$4,640,000
04/09/2023	8627522347	14	357,500	202308	357,500	$8,932,003	$8,932,003
04/09/2023	8627522377	4	127,000	202308	127,000	$3,170,668	$3,170,668
04/10/2023	8627833219	4	185,600	202309	185,600	$4,640,000	$4,640,000
04/10/2023	8627833313	4	92,900	202309	92,900	$2,320,001	$2,320,001
04/10/2023	8627809366	13	467,300	202309	467,300	$11,677,336	$11,677,336
09/11/2023	8628185632	1	3,100	202310	3,100	$77,334	$77,334
09/11/2023	8628185618	4	99,000	202310	99,000	$2,474,668	$2,474,668
09/11/2023	8628185579	5	85,500	202310	85,500	$2,126,670	$2,126,670
09/11/2023	8628185599	16	340,800	202310	340,800	$8,506,672	$8,506,672
TOTALES:			$3,919,200		$3,919,200	$97,904,032	$97,904,032

FECHA DE EXPEDICION: 11/12/2023

Cordialmente;



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se relaciona a continuación información general del contrato de la interventoría.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT.	891.801.268-7
REPRESENTANTE LEGAL	JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES
IDENTIFICACIÓN	C.C. N°. 7.127.339 DE VILLA DE LEYVA
SUPERVISOR	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CEDULA DE CIUDADANÍA	7.127.372 DE VILLA DE LEYVA
CONTRATISTA	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. N° CC No. 80.724.407 de Bogotá
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE OBRA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MENOR CUATIA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES NOVESCIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 7.999.900).
VALOR ADICION N.1	OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 865.503.35). IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL CON ADICION	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 8.865.403,35) IVA INCLUIDO.
CDP	CDP No. 2023080013 del 04 de septiembre Y CDP No. 2023110045 con fecha de 28 de noviembre del 2023
RP	2023090029 DE 12/9/2023 – 2023110057 DEL 30/11/23
PLAZO Y VIGENCIA	**INICIAL:** CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIACIÓN, PREVIO EL

PLAZO TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **PLAZO ADICIONAL:** QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIACIÓN, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FECHA ACTA INICIO	11 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA ACTA FINAL	7 DE DICIEMBRE DE 2023

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2023 al 07 de diciembre de 2023, se adelantaron las siguientes actividades:

- Se realizó reunión inicial entre supervisión, contratista de obra e interventoría, para verificar el alcance del contrato.
- Se verificaron pólizas de cumplimiento del contrato de obra.
- Se realizo verificación de materiales y equipos utilizados, se toman cilindros de prueba de concreto para verificar la capacidad de PSI del mismo.
- Se suscribió acta de inicio del contrato de obra e interventoría.
- Se realizaron comunicaciones al contratista de obra y supervisión y comités de reunión para seguimiento del contrato.
- Se verifico que el contratista cumpla con sus obligaciones verificando que las actividades se realicen de acuerdo con el anexo técnico del contrato.
- Se realizo verificación de materiales solicitando certificados de materiales
- Se realizan todas las actas necesarias para la buena ejecución del contrato.
- Se realizan todas las acciones necesarias para el seguimiento. cumplimiento y buen desarrollo del contrato.

- Se realizan comités técnicos y se mantiene informada a la supervisión del desarrollo y ejecución del contrato de obra.

- Se solicitó al contratista afiliaciones del personal y pago de la planilla de seguridad social.

- Se realizo la verificación la documentación del corte de obra, para posteriormente radicarlos ante la supervisión del contrato.

6 . REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexan los siguientes formatos diligenciados con la información correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2023 hasta el 07 de diciembre de 2023.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El personal profesional mínimo requerido que contrato la interventoría cumple a cabalidad con la idoneidad exigida en los pliegos de condiciones, además que también cumplen con los requisitos mínimos de seguridad social y dotaciones para el desarrollo de las actividades contractuales del proyecto.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900786077	4	AEM INGENIERIA SAS - AEM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNZA	CALLE 12 # 25-90 CASA 36	FUNZA-CUNDINAMARCA	5605422	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	58404447	94584044447	E	2023/11/21	2023/11/10	BANCO AV VILLAS	0	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: FUNZA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: FUNZA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
1	CC 79998951	QUINTERO MARLON	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS009	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900786077	4	AEM INGENIERIA SAS - AEM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNZA	CALLE 12 # 25-90 CASA 36	FUNZA-CUNDINAMARCA	5605422	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	58404447	9458404447	E	2023/11/21	2023/11/10	BANCO AV VILLAS	0	$359,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$359,200	$0	$0	$359,200

enlace operativo

SuAporte | CERTIFICADO DE PAGO ANUAL

Fecha Creación miércoles, 08 de noviembre de 2023 09:25:49 AM

Empresa SAID LEONARDOJIMENEZ JIMENEZ **Nit** 80724407

Período de consulta: 2023

SAID LEONARDOJIMENEZ JIMENEZ, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago	2023-11-08		
Referencia pago/ Número planilla	66858227	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202310	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202310	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 1.200	$ 185.600	$ 186.800
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 900	$ 145.000	$ 145.900
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 500	$ 80.800	$ 81.300
					Total Pagado	$ 414.000

Fecha de pago	2023-10-02		
Referencia pago/ Número planilla	66036952	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202309	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202309	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
					Total Pagado	$ 411.400

Fecha de pago	2023-09-05		
Referencia pago/ Número planilla	65058500	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202308	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202308	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 300	$ 185.600	$ 185.900
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 200	$ 145.000	$ 145.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 100	$ 80.800	$ 80.900
					Total Pagado	$ 412.000

Fecha de pago	2023-08-08		
Referencia pago/ Número planilla	64333041	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202307	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202307	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 1.300	$ 185.600	$ 186.900
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 1.000	$ 145.000	$ 146.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 600	$ 80.800	$ 81.400
					Total Pagado	$ 414.300

SAID LEONARDOJIMENEZ JIMENEZ, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago	2023-07-04		
Referencia pago/ Número planilla	63775535	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202306	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202306	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
					Total Pagado	$ 411.400

Fecha de pago	2023-06-05		
Referencia pago/ Número planilla	63180133	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202305	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202305	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 700	$ 185.600	$ 186.300
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 600	$ 145.000	$ 145.600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 300	$ 80.800	$ 81.100
					Total Pagado	$ 413.000

Fecha de pago	2023-05-05		
Referencia pago/ Número planilla	62506871	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202304	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202304	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 1.200	$ 185.600	$ 186.800
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 900	$ 145.000	$ 145.900
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 500	$ 80.800	$ 81.300
					Total Pagado	$ 414.000

Fecha de pago	2023-04-05		
Referencia pago/ Número planilla	61973826	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202303	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202303	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 300	$ 185.600	$ 185.900
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 200	$ 145.000	$ 145.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 100	$ 80.800	$ 80.900
					Total Pagado	$ 412.000

Fecha de pago	2023-03-09		
Referencia pago/ Número planilla	61335293	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202302	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202302	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 1.600	$ 185.600	$ 187.200
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 1.300	$ 145.000	$ 146.300
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 700	$ 80.800	$ 81.500
					Total Pagado	$ 415.000

SAID LEONARDOJIMENEZ JIMENEZ, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago	2023-02-08		
Referencia pago/ Número planilla	60552770	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202301	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202301	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 1.600	$ 185.600	$ 187.200
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 1.200	$ 145.000	$ 146.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 700	$ 80.800	$ 81.500
					Total Pagado	$ 414.900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900786077	4	AEM INGENIERIA SAS - AEM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNZA	CALLE 12 # 25-90 CASA 36	FUNZA-CUNDINAMARCA	5605422	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	58404447	9458404447	E	2023/11/21	2023/11/10	BANCO AV VILLAS	0	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: FUNZA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: FUNZA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
1	CC 79998951	QUINTERO MARLON	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900786077	4	AEM INGENIERIA SAS - AEM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNZA	CALLE 12 # 25-90 CASA 36	FUNZA-CUNDINAMARCA	5605422	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	58404447	9458404447	E	2023/11/21	2023/11/10	BANCO AV VILLAS	0	$359,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$359,200	$0	$0	$359,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900786077	4	AEM INGENIERIA SAS - AEM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNZA	CALLE 12 # 25-90 CASA 36	FUNZA-CUNDINAMARCA	5605422	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	55719384	9455719384	E	2023/09/19	2023/09/28	BANCO AV VILLAS	9	$362,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	79998951	QUINTERO GUARIN MARLON ROLANDO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,900	$0	$187,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,900	$0	$187,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$800	$0	$81,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$800	$0	$81,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$500	$0	$46,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$46,400	$500	$0	$46,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$500	$0	$46,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$500	$0	$46,900
TOTAL				1	$359,200	$3,700	$0	$362,900

2023/11/01 07:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900786077	4	AEM INGENIERIA SAS - AEM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNZA	CALLE 12 # 25-90 CASA 36	FUNZA-CUNDINAMARCA	5605422	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	57109354	9457109354	E	2023/10/19	2023/10/05	BANCO AV VILLAS	0	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	79998951	QUINTERO GUARIN MARLON ROLANDO		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$359,200	$0	$0	$359,200

2023/11/01 07:25 PM

SuAporte | CERTIFICADO DE PAGO ANUAL

Fecha Creación miércoles, 08 de noviembre de 2023 09:25:49 AM

Empresa SAID LEONARDOJIMENEZ JIMENEZ **Nit** 80724407

Período de consulta: 2023

SAID LEONARDOJIMENEZ JIMENEZ, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago	2023-11-08		
Referencia pago/ Número planilla	66858227	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202310	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202310	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 1.200	$ 185.600	$ 186.800
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 900	$ 145.000	$ 145.900
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 500	$ 80.800	$ 81.300
					Total Pagado	$ 414.000

Fecha de pago	2023-10-02		
Referencia pago/ Número planilla	66036952	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202309	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202309	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
					Total Pagado	$ 411.400

Fecha de pago	2023-09-05		
Referencia pago/ Número planilla	65058500	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202308	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202308	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 300	$ 185.600	$ 185.900
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 200	$ 145.000	$ 145.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 100	$ 80.800	$ 80.900
					Total Pagado	$ 412.000

Fecha de pago	2023-08-08		
Referencia pago/ Número planilla	64333041	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202307	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202307	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 1.300	$ 185.600	$ 186.900
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 1.000	$ 145.000	$ 146.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 600	$ 80.800	$ 81.400
					Total Pagado	$ 414.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SAID LEONARDOJIMENEZ JIMENEZ, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago	2023-07-04		
Referencia pago/ Número planilla	63775535	Planilla Corregida	
Periodo de Cotización	202306	Nombre de la Sucursal	
Periodo de Servicio	202306	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
					Total Pagado	$ 411.400

Fecha de pago	2023-06-05		
Referencia pago/ Número planilla	63180133	Planilla Corregida	
Periodo de Cotización	202305	Nombre de la Sucursal	
Periodo de Servicio	202305	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 700	$ 185.600	$ 186.300
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 600	$ 145.000	$ 145.600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 300	$ 80.800	$ 81.100
					Total Pagado	$ 413.000

Fecha de pago	2023-05-05		
Referencia pago/ Número planilla	62506871	Planilla Corregida	
Periodo de Cotización	202304	Nombre de la Sucursal	
Periodo de Servicio	202304	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 1.200	$ 185.600	$ 186.800
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 900	$ 145.000	$ 145.900
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 500	$ 80.800	$ 81.300
					Total Pagado	$ 414.000

Fecha de pago	2023-04-05		
Referencia pago/ Número planilla	61973826	Planilla Corregida	
Periodo de Cotización	202303	Nombre de la Sucursal	
Periodo de Servicio	202303	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 300	$ 185.600	$ 185.900
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 200	$ 145.000	$ 145.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 100	$ 80.800	$ 80.900
					Total Pagado	$ 412.000

Fecha de pago	2023-03-09		
Referencia pago/ Número planilla	61335293	Planilla Corregida	
Periodo de Cotización	202302	Nombre de la Sucursal	
Periodo de Servicio	202302	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 1.600	$ 185.600	$ 187.200
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 1.300	$ 145.000	$ 146.300
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 700	$ 80.800	$ 81.500
					Total Pagado	$ 415.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SAID LEONARDOJIMENEZ JIMENEZ, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago	2023-02-08		
Referencia pago/ Número planilla	60552770	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202301	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202301	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 1.600	$ 185.600	$ 187.200
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 1.200	$ 145.000	$ 146.200
N860903790	14-11	ARL SURA	1	$ 700	$ 80.800	$ 81.500
					Total Pagado	$ 414.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

7.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El contrato de interventoría **No. 230-2023** que tiene por objeto la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ** y cuyo valor contratado es de **$ 7.999.900** siendo este el **100%,** y la cual no ha presentado actas parciales hasta el momento

7.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Una vez se suscribe el acta de inició para la ejecución del contrato se realizó la renovación de pólizas de acuerdo con la fecha del acta de inicio, los soportes de las pólizas y su aprobación se relacionan a continuación.

Aseguradora	Descripción de los amparos	No Póliza	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	980-47-994000025938	08-09-2023	23-10-2024	$ 1.599.980.00
SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	980-47-994000025938	08-09-2023	23-10-2026	$ 399.995.00
SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	980-47-994000025938	08-09-2023	23-10-2024	$ 1.599.980.00
SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	980-47-994000025938	11-10-2023	29-01-2025	$ 1.773.080.00
SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	980-47-994000025938	11-10-2023	26-12-2026	$ 443.270.15
SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	980-47-994000025938	11-10-2023	29-01-2025	$ 1.773.080.00

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9802120858

PÓLIZA No: 980 - 47 - 994000025938 ANEXO: 5

AGENCIA EXPEDIDORA: GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT COD. AGENCIA: 980 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	12	2023	13	12	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ IDENTIFICACIÓN: CC 80.724.407

DIRECCIÓN: KR 10 G 10 53 CIUDAD: FUNZA, CUNDINAMARCA TELÉFONO: 8237063

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA IDENTIFICACIÓN: NIT 891.801.268-7

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA IDENTIFICACIÓN: NIT 891.801.268-7

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	11/10/2023	29/01/2025	1,773,080.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	11/10/2023	26/12/2026	443,270.15
CALIDAD DEL SERVICIO	11/10/2023	29/01/2025	1,773,080.60

BENEFICIARIOS
NIT 891801268 - MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ACEPTACION DE OFERTA No.230 DE 2023 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATACION BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE CONOCE EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********(0.16)	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SANDRA LILIANA DIAZ CAMPOS	7825	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUÉLLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000980212085

FIRMA TOMADOR

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9802120858

PÓLIZA No: 980 - 47 - 994000025938 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD. AGENCIA: 980 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	09	2023	14	09	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ** IDENTIFICACIÓN: CC **80.724.407**

DIRECCIÓN: KR 10 G 10 53 CIUDAD: FUNZA, CUNDINAMARCA TELÉFONO: 8237063

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.801.268-7**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.801.268-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	08/09/2023	23/10/2024	1,599,980.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	08/09/2023	23/10/2026	399,995.00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2023	23/10/2024	1,599,980.00

BENEFICIARIOS
NIT 891801268 - MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ACEPTACION DE OFERTA No.230 DE 2023 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATACION BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *****3,599,955.00	$ **********41,330	$****11,000.00	$ ********9,943	$ **********62,273

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SANDRA LILIANA DIAZ CAMPOS	7825	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000980212085

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C7b0207A0E0DFC76SA

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

ANEXOS CERTIFICADOS

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26
Funza- Cundinamarca.

Villa de Leyva, 18 diciembre de 2023

Señores:

Ing. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Supervisor del Contrato
Villa de Leyva Boyacá.

Ref.: **Contrato de Interventoría No. 230-2023**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACION Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.724.407 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la INTERVENTORIA y en calidad de interventor del contrato de obra N° 234 de 2023 cuyo objeto es **"CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ"**, celebrado entre el Municipio de Villa de Leyva y el Ing. EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, certifico que durante el periodo comprendido del 19 de noviembre de 2023 al 07 de diciembre de 2023, el contratista EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, realizó las afiliaciones de personal y el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Villa de Leyva, a los (18) días del mes de diciembre de 2023

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá
Contratista de Interventoría

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26
Funza- Cundinamarca.

Villa de Leyva, 18 diciembre de 2023

Señores:

Ing. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Supervisor del Contrato
Villa de Leyva Boyacá.

Ref.: **Contrato de Interventoría No. 230-2023**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Yo, SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.724.407 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la INTERVENTORIA y en calidad de interventor del contrato de obra N° 234 de 2023 cuyo objeto es **"CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ"**, celebrado entre el Municipio de Villa de Leyva y el Ing. EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, certifico que durante el periodo comprendido del 11 de octubre de 2023 al 07 de diciembre de 2023, el contratista EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, ha dado cumplimiento de las especificaciones técnicas, de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas.

Dada en Villa de Leyva, a los (18) días del mes de diciembre de 2023

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá
Contratista de Interventoría

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26
Funza- Cundinamarca.

Villa de Leyva, 18 diciembre de 2023

Señores:

Ing. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Supervisor del Contrato
Villa de Leyva Boyacá.

Ref.: **Contrato de Interventoría No. 230-2023**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Yo, SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.724.407 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la INTERVENTORIA y en calidad de interventor del contrato de obra N° 234 de 2023 cuyo objeto es **"CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ"**, celebrado entre el Municipio de Villa de Leyva y el Ing. EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, certifico que, durante el periodo comprendido del 11 de octubre de 2023 al 07 de diciembre de 2023, el contratista EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, ha dado cumplimiento a las normas de salud ocupacional y seguridad industrial.

Dada en Villa de Leyva, a los (18) días del mes de diciembre de 2023

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá
Contratista de Interventoría

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26
Funza- Cundinamarca.

Villa de Leyva, 18 diciembre de 2023

Señores:

Ing. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Supervisor del Contrato
Villa de Leyva Boyacá.


Ref.: **Contrato de Interventoría No. 230-2023**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Yo, SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.724.407 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la INTERVENTORIA y en calidad de interventor del contrato de obra N° 234 de 2023 cuyo objeto es **"CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ"**, celebrado entre el Municipio de Villa de Leyva y el Ing. EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, certifico que durante el periodo comprendido del 11 de octubre de 2023 al 07 de diciembre de 2023, el contratista EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, ha dado cumplimiento a la normatividad ambiental requerida para el contrato.

Dada en Villa de Leyva, a los (18) días del mes de diciembre de 2023

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá
Contratista de Interventoría

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26
Funza- Cundinamarca.

Villa de Leyva, 18 diciembre de 2023

Señores:

Ing. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Supervisor del Contrato
Villa de Leyva Boyacá.

Ref.: **Contrato de Interventoría No. 230-2023**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EQUIPO DE TRABAJO

Yo, SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.724.407 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la INTERVENTORIA y en calidad de interventor del contrato de obra N° 234 de 2023 cuyo objeto es **"CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ"**, celebrado entre el Municipio de Villa de Leyva y el Ing. EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, certifico que durante el periodo comprendido del 11 de octubre de 2023 al 07 de diciembre de 2023, el contratista EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, ha cumplido con el equipo de trabajo aprobado de acuerdo con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales de obra.

Dada en Villa de Leyva, a los (18) días del mes de diciembre de 2023

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá
Contratista de Interventoría

Villa de Leyva, 18 diciembre de 2023

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Ingeniero Civil
Especialista en Edificación Sostenible
ingsaidleojimenez@gmail.com
Cr 2c No 6-02 T7 APT 601.
Tel: 301 264 17 26
Funza- Cundinamarca.

Señores:

Ing. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Supervisor del Contrato
Villa de Leyva Boyacá.

Ref.: **Contrato de Interventoría No. 230-2023**

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Yo, SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.724.407 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la INTERVENTORIA y en calidad de interventor del contrato de obra N° 234 de 2023 cuyo objeto es **"CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ"**", celebrado entre el Municipio de Villa de Leyva y el Ing. EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, certifico que durante el periodo comprendido del 11 de octubre de 2023 al 07 de diciembre de 2023, el contratista EDWIN ORLANDO HURTADO VILLAMIL, ejecutó las cantidades de obra tal como se encuentran registradas en las memorias de cálculo y recibo a satisfacción firmada por las partes (contratista e interventor).

Dada en Villa de Leyva, a los (18) días del mes de diciembre de 2023

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá
Contratista de Interventoría

ANEXOS ACTAS DE COMITÉ

COMITE No. 1

ACTA DE COMITE DE OBRA No.001

FECHA PRESENTE ACTA: 11-octubre-2023

CONTRATO No. 230 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1. ACTA DE INICIO
2. RECORRIDO INSTALACION

DESARROLLO DEL COMITÉ

El presente comité se realiza junto con la supervisión del contrato y a su vez el representante del contrato de obra y la interventoría dándole inicio a la ejecución del proyecto esto con el fin de acordar lo que se ejecutara durante el mismo y así resaltar el alcance del contrato de obra, en este comité se define:

- Se realizará el mantenimiento total del baño que en este momento esta como de niños y niñas el cual se dejará habilitado solo para niñas (pintura, cambio de luminarias, instalación de lavamanos comunal, vidrios, cambio de tomas e interruptores entre otros).
- Se realizará el mantenimiento de los baños en la parte superior el cual quedará habilitado para niños en este se realizará (pintura total muros- techo entre otros, cambio de tomas e interruptores, cambio de vidrios, pintura en puertas, cambio de luminarias, entre otros)
- Se ejecutará un baño para personas con movilidad reducida en la parte lateral del baño de niñas este se ejecutará desde cero iniciando con cimientos y dejándolo totalmente acabado y habilitado, se tendrá que realizar un balance de costos y balancearlo con el presupuesto contractual esta labor tendrá que ser ejecutada por el contratista de obra con el acompañamiento de la interventoría del contrato.
- Se ejecutará un salón para uso de bodega el cual se tendrá que balancear respecto al contrato inicial esta labor la realizara el contratista de obra acompañado de la interventoría del contrato para validar precios y cantidades.

- Se ejecutará un salón el cual se iniciará desde la cimentación hasta la obra blanca entregándolo totalmente funcional para uso del complejo estudiantil.

Todos estos elementos que se generaran tendrá que ir soportado por unos diseños previos los cuales tendrán que ser ejecutados por el contratista de obra y revisados dándole visto bueno por parte de la interventoría del contrato para iniciar con la ejecución, de igual manera se aprueba por parte de la supervisión e interventoría que el contratista de obra inicie actividades de pintura durante la ejecución de los diseños, condicionando que solo se podrá realizar esta actividad ya que se tendrán que validar los diseños antes de iniciar actividades relevantes.

De igual forma queda en acta que se ejecutará un modificatorio de tiempo a la interventoría ya que inicialmente en pliegos se ejecuto por 45 días y el contrato de obra tiene un tiempo de ejecución de 60 días estos los asumirá y acepta la interventoría que se aumente el tiempo del contrato por parte de ellos para finalizar a conde con el contrato de obra.




COMPROMISOS:

1. Diseños, balance aterrizado y cronograma de obra, el cual se le dará un tiempo de 15 días calendario para la entrega de estos al contratista de obra.

FECHA PROXIMA REUNIÓN

La próxima reunión se realizará el día 26 de octubre del 2023 para validar avance de obra y ejecución del contrato.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. JULIO	CONTRATISTA DE OBRA	
ING SAID LEONARDO JIMENEZ	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATO INTERVENTORIA	
ARQ. ANDRES CAMILO CHARRY R	INTERVENTORIA	
ING PAULA CASTILLO	SUPERVISION	

COMITE No. 2

ACTA DE COMITE DE OBRA No.002

FECHA PRESENTE ACTA: 26-octubre-2023

CONTRATO No. 230 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1. **Visita de obra**

DESARROLLO DEL COMITÉ

En el presente comité se hace presente el contratista de obra en representación el Ing. Julio, la supervisión del contrato en representación la Ing. Paula castillo y la interventoría del contrato en representación el Ing. Said leonardo Jiménez Jiménez y a su vez el Arq. Andres camilo charry.

1. **Vista de obra:** se le informa a la supervisión del contrato los avances que por parte del contratista de obra se han venido ejecutado durante el tiempo trascurrido teniendo un avance de obra significativo teniendo en cuenta las recomendaciones y sugerencias por parte de la interventoría y a su vez de la supervisión del contrato.

Se han venido desarrollando varias actividades durante este tiempo las cuales se han visto desarrollado de la siguiente forma:

- El contratista de obra en el comité del 11-10-2023 se compromete a entregar lo mas pronto posible los diseños y balance de lo proyectado para el presente contrato dando así un visto bueno por parte de interventoría, esta actividad se ejecuto en los tiempos asignados no teniendo retroceso para la ejecución del contrato estos fueron remitidos a la supervisión para su conocimiento y la tenencia de los mismo.
- Se habilita al contratista para empezar a ejecutar actividades como es fueron la adecuación del baño para personas con movilidad reducida, en esta se vienen adelantando inicias con las excavaciones.

- Por otro lado, se viene trabajando en la adecuación y pintura de los baños existentes y la adecuación de los mismo dejando habilitado uno de ellos para niñas y el de la parte superior del complejo estudiantil el de hombres.


Estas actividades se vienen supervisando por parte de la interventora teniendo en cuenta lo ya visto en diseños entregados por el contratista de obra, de igual forma se vienen adelantando las memorias de calculo en conjunto con la interventoría y el contratista de obra.

Se le informa a la supervisión que todas las cantidades de obra se vienen validado por parte de la interventoría para tranquilidad de la misma entidad.

FECHA PROXIMA REUNIÓN

No se define fecha exacta para próximo comité

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. JULIO	CONTRATISTA DE OBRA	
ING SAID LEONARDO JIMENEZ	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATO INTERVENTORIA	
ARQ. ANDRES CAMILO CHARRY R	INTERVENTORIA	
ING PAULA CASTILLO	SUPERVISION	

6. ANEXOS MEMORIAS DE CALCULO

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 2.3	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niñas**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Lamina Frontal en cada division		0,30	2,00	5,00	3,00
	de las unidades sanitarias modulo nuevo					
					Subtotal	3,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**3,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Alfonso Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 2.4	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niñas**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	**REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO**	**DESCRIPCION**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
			Longitud	**Ancho**	**Alto**		
		Puertas modulo de divisiones				5,00	5,00
		metalicas nuevo					
						Subtotal	5,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**5,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 2.5	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niñas**	
ITEM	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	**UNIDAD** M

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Puertas modulo de divisiones	5,00			5,00	25,00
	metalicas nuevo					
					Subtotal	25,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**25,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista



Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 2.6	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niñas**	
ITEM	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	**UNIDAD** M2

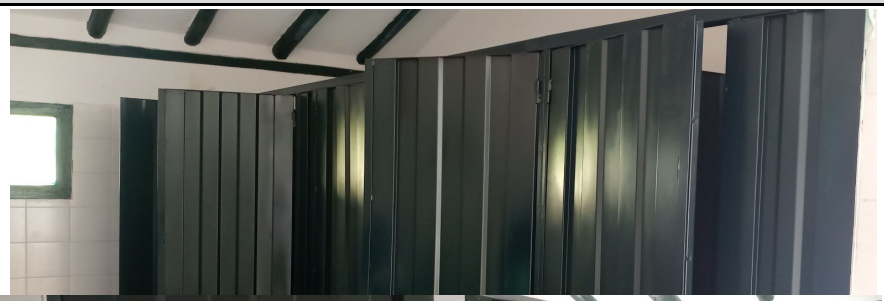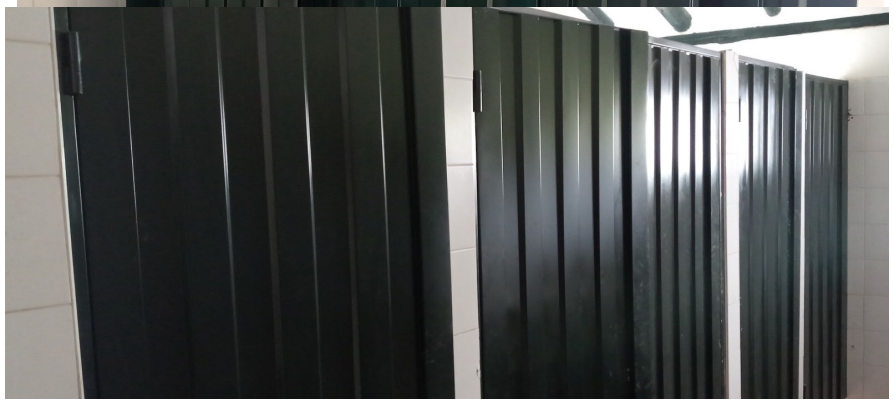DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	**REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO**	**DESCRIPCION**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
			Longitud	**Ancho**	**Alto**		
 		Puertas totales modulo de divisiones		1,00	2,00	10,00	20,00
		sanitarias metalicas dos caras					
						Subtotal	20,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**20,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 2.12	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niñas**	
ITEM	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Espejos instalados paredes baños	1,80		0,60	3,00	3,24
						Subtotal	3,24
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**3,24**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Alfonso Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 3.1	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niños**	
ITEM	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Divisiones orinal dos caras		0,60	1,00	14,00	8,40
	Division unidades sanitarias 2 caras		1,00	2,00	6,00	12,00
	Puertas en las unidades sanitarias		1,00	2,00	8,00	16,00
	dos caras					
					Subtotal	36,40
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**36,40**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 3.7	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niños**	
ITEM	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Muro antiguos orinales	2,10		0,50	1,00	1,05
						Subtotal	1,05
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,05**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:


Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 3.8	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niños**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

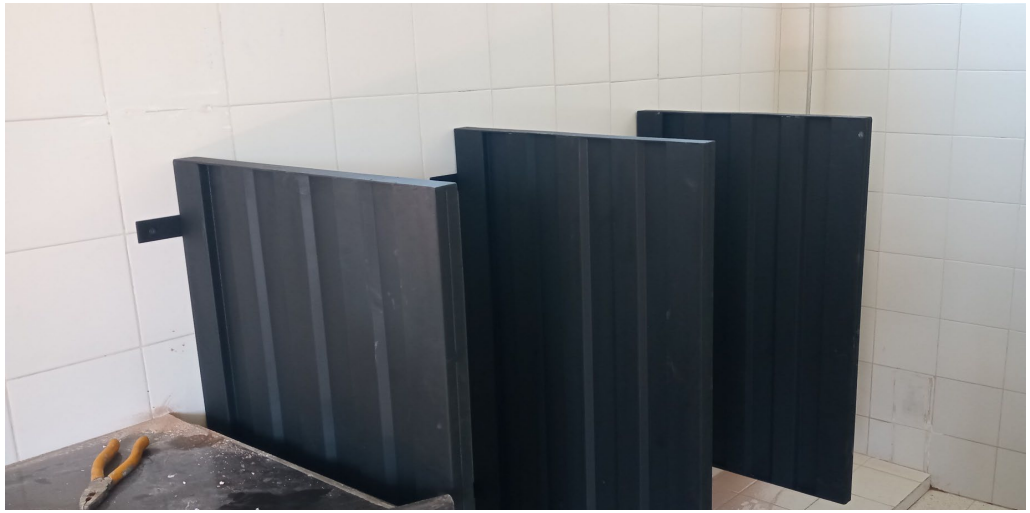

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Divisiones orinales nuevos		0,60	1,00	3,00	1,80
					Subtotal	1,80
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,80**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 3.9	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niños**	
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Baño niños	Puntos nuevos para orinales					3,00
Baño niñas	Puntos nuevos meson lavado manos					3,00
Baño niñas	Arreglo puntos baño niñas					4,00
					Subtotal	10,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**10,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 3.10	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niños**	
ITEM	PUNTO DE DESAGUES D=2"	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Baño niños	Desagues nuevos orinales					3,00
Baño niñas	Desague meson lavamanos nuevo					1,00
					Subtotal	4,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**4,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Alfonso Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 3.11	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:**	**7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño niños**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Orinales instalados nuevos					3,00
						Subtotal	3,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**3,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 4.17	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Bodega y/o almacen**	
ITEM	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Puerta principal salon nuevo				1,00	1,00
					Subtotal	1,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

Este item corresponde a la cerradura del salon nuevo

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 4.18	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Bodega y/o almacen**	
ITEM	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Muro lateral iquierdo	7,50		4,13	1,00	30,95
	Muro lateral derecho	7,50		3,55	1,00	26,63
	Muro posterior	2,40		3,70	1,00	8,88
	Muro frontal	3,40		3,70	1,00	12,58
Descuentos	Puerta		1,00	2,00	1,00	-2,00
Descuentos	Ventana		1,50	0,60	2,00	-1,80
					Subtotal	75,24
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**75,24**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

Este item corresponde a la cerradura del salon nuevo

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 5.18	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño discapacitados**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	**UNIDAD** M

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Tuberia drenaje en rampa frente ba	2,50			1,00	2,50
	discapacitados					
					Subtotal	2,50
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,50**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 5.22	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño discapacitados**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS)	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Barras de seguridad plegables				2,00	2,00
						Subtotal	2,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 5.23	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño discapacitados**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILA	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Baño niñas	Enchape meson lavado manos	2,60	1,00			2,60
Baño niñas	Enchape Debajo meson	2,60	0,80			2,08
Baño niños	Piso orinales	2,10	0,80			1,68
Baño niños	Pared orinales	0,60	0,40		3,00	0,72
Baño niñas	Arreglos paredes con enchape	1,80	0,20			0,36
Baño niñas	Pared esquina meson lavado mano	1,20	0,80			0,96
					Subtotal	8,40
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**8,40**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Alfonso Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

Estas actividades de suministro e instalacion de enchape se efetuaron en los baños de niños y niñas

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 5.24	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Baño discapacitados**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Baño discapacitados	Rejilla piso				1,00	1,00
Baño niñas	Rejilla Meson lavamanos nuevo				1,00	1,00
					Subtotal	2,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Alfonso Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 6.3	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Oficina**	
ITEM	DESMONTE VIDRIO	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Baños niños	0,35	0,40		1,00	0,14
	Baño niñas	0,35	0,40		4,00	0,56
					Subtotal	0,70
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**0,70**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Alfonso Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 6.4	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Oficina**	
ITEM	VIDRIO 4 MM	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	**REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO**	**DESCRIPCION**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
			Longitud	**Ancho**	**Alto**		
		Baños niñas	0,35	0,40		4,00	0,56
		Baños niños	0,35	0,40		1,00	0,14
						Subtotal	0,70
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**0,70**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 6.18	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Oficina**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER DE 12 W	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Bodega				1,00	1,00
	Nuevo salon				4,00	4,00
	Baño discapacitados				1,00	1,00
					Subtotal	6,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**6,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista


Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 7.13	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES 30*30 CM	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
 		Piso nuevo salon	8,40	4,30			36,12
						Subtotal	36,12
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**36,12**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 7.15	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	**REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO**	**DESCRIPCION**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
			Longitud	**Ancho**	**Alto**		
		Pañete placa inferior viga canal	7,80	0,33		2,00	5,15
						Subtotal	5,15
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**5,15**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 7.19	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**	

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Muros transversales		4,50	2,80	2,00	25,20
	Muros longitudinales		7,00	2,80	2,00	39,20
Descuentos	Ventanas		1,80	0,80	2,00	-2,88
Descuentos	Puerta		1,00	2,00	1,00	-2,00
					Subtotal	59,52
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**59,52**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 7.20	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Muros transversales		4,50	2,80	2,00	25,20
	Muro corredor		2,00	2,44	1,00	4,88
Descuentos	Ventanas		1,80	0,80	2,00	-2,88
Descuentos	Puerta		1,00	2,00	1,00	-2,00
	Culata corredor		4,50	0,90	3,00	6,08
	Columnas		0,25	2,30	6,00	3,45
					Subtotal	34,73
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**34,73**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 7.21	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Marco puerta				1,00	1,00
						Subtotal	1,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 7.22	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Puerta acceso		1,00	2,00	1,00	2,00
						Subtotal	2,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 7.23	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Ventanas posterior y frontal	1,80		0,80	2,00	2,88
					Subtotal	2,88
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,88**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 7.24	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Ventanas posterior y frontal	1,80		0,80	2,00	2,88
						Subtotal	2,88
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,88**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 7.25	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	**UNIDAD** M

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Puerta acceso	5,00	1,00	2,00	1,00	5,00
						Subtotal	5,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**5,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 7.26	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Puerta acceso dos caras		1,00	2,00	2,00	4,00
						Subtotal	4,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**4,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 7.27	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Encendedor lamparas salon				1,00	1,00
						Subtotal	1,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 7.28	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2, INCLUYE REGATAS	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Puntos instalacion lamparas en red				4,00	4,00
		tuberia EMT					
						Subtotal	4,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**4,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 7.29	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO PVC Ø 1/2, INCLUYE REGATAS	**UNIDAD** UND

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Puntos para tomas en paredes				4,00	4,00
					Subtotal	4,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**4,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 7.41	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
	Muro sobre viga de amarre posterio	4,50		0,40	1,00	1,80
	para confinamiento de base piso					
					Subtotal	1,80
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,80**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 7.45	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
		Impermeabilizacion vigacanal	8,40	0,20	1,00	2,00	16,80
						Subtotal	16,80
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**16,80**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 7.46	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Nuevo salon**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"	**UNIDAD** M

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
	Nuevo salon	bajante viga canal	3,50			2,00	7,00
						Subtotal	7,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**7,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 8.1	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	

ITEM	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Almacen y/o bodega	Placa interna	7,50	3,50		1,00	26,25
Almacen y/o bodega	Placa externa	4,50	2,00		1,00	9,00
					Subtotal	35,25
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**35,25**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 8.2	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES 30*30 CM	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Almacen y/o bodega	Tableta piso	7,50	3,50		1,00	26,25
					Subtotal	26,25
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**26,25**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría


OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 8.3	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	

ITEM	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

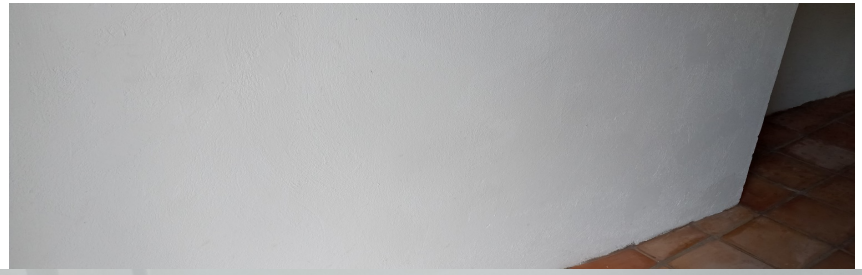



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Almacen y/o bodega	Pintura contornos socalos muros	22,00		1,00	1,00	22,00
	internos					
					Subtotal	22,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**22,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	MONUMENTO NACIONAL	
ITEM No.: 8.4	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	
ITEM	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	**UNIDAD** M

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto		
	Almacen y/o bodega	Canal drenaje de cubierta	12,00			1,00	12,00
						Subtotal	12,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**12,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 8.5	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	**UNIDAD** M

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	**REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO**	**DESCRIPCION**	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
			Longitud	**Ancho**	**Alto**		
 	Almacen y/o bodega	Estructura nueva soporte de canal	3,00			1,00	3,00
		drenaje cubierta					
						Subtotal	3,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**3,00**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 8.6	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	
ITEM	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Almacen y/o bodega	Muro remate superior contra	1,50	0,30		1,00	0,45
	canal					
					Subtotal	0,45
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**0,45**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 8.7	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	

ITEM	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Almacen y/o bodega	Muro remate superior contra	1,50	0,30		1,00	0,45
	canal					
					Subtotal	0,45
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**0,45**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 8.8	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	
ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Almacen y/o bodega	Muro remate superior contra	1,50	0,30		2,00	0,90
	canal					
					Subtotal	0,90
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**0,90**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 8.9	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	
ITEM	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**UNIDAD** M3

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Rampa salon nuevo	Conformacion base	2,70	0,80	0,20	1,00	0,43
hacia bodega						
					Subtotal	0,43
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**0,43**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 8.10	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	

ITEM	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Rampa salon nuevo	Construccion Rampa	2,50	0,50		1,00	1,25
hacia bodega						
					Subtotal	1,25
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,25**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 8.11	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Salon nuevo	Reja ampliacion ventana frontal	1,80		0,40	1,00	0,72
					Subtotal	0,72
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**0,72**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
	ITEM No.: 8.12	**MEMORIA DE CANTIDADES**	**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	
ITEM	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	**UNIDAD** M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Salon nuevo	Ampliacion ventana frontal	1,80		0,40	1,00	0,72
					Subtotal	0,72
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**0,72**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - DEPARTAMENTO DE BOYACA		
	MONUMENTO NACIONAL		
ITEM No.: 8.13	**MEMORIA DE CANTIDADES**		**FECHA:** **7 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO:	**CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**	**CONTRATO DE OBRA** 234-2023
CAPÍTULO	**Adicionales**	

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT.	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCION	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto		
Salon nuevo	Teja sobre la cubiera de fibrocemer	9,00	4,80			43,20
	Area total					
					Subtotal	43,20
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**43,20**

ELABORÓ:

Julio Alexander Sierra
Residente de Obra

Edwin Orlando Hurtado Villamil
Contratista

Vo.Bo.:

Said Leonardo Jimenez Jimenez
Interventoría

OBSERVACIONES

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se han cumplido con los requerimientos técnicos para la ejecución del objeto contractual en el proyecto 'CONTRATACIÓN BAJO EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE EN APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA SEDE PRINCIPAL (ITINAR) MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ'', siguiendo las normas y especificaciones solicitadas por la Alcaldía de villa de Leyva, Boyacá. Además, se ha verificado los procesos constructivos del contratista de obra y a su vez los insumos suministrados e instalación de elementos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

ANEXO BITÁCORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

16-Nov Se desarrolla la instalación de la teja de fibrocemento en la estructura del salón, también se efectua la aplicación de pintura blanca en la misma, se hacen trabajos de acabados y afinado en la cuneta de drenaje de aguas lluvias en el baño de descapacitados, se instalan los puntos electricos en la bodega

Contratista [signature] Interventoría [signature]

17-Nov Inician trabajos de construcción de parcetes sobre muros en el nuevo salón, se hace el retiro de formaleta de las vigas anteriormente construídas. en el taller de metalmecanica continua la fabricación de puertas y divisiones para el baño de las niñas.

Contratista [signature] Interventoría [signature]

18-Nov Continuan las labores del día anterior, el personal labora hasta el medio día

Contratista [signature] Interventoría [signature]

19-Nov No se labora

20-Nov Se avanza en la construcción de parietes sobre los muros nuevos del salón, personal electricista realiza trabajos de regatas y entubado para puntos electricos en el mismo, el grupo de interventoría realiza visita de seguimiento y control tecnico a la obra

[signature]

21-Nov Continuan los trabajos de construcción de parctes en el nuevo salón, personal de ornamentación realiza la instalación de algunas ventanas y comienzan el desmonte de divisiones en el baño de las niñas.

Contratista [signature] Interventoría

22-Nov Se hace la instalación de las bajantes de aguas lluvias para las viga canal del nuevo salón, personal de ornamentación instala nuevas puertas en los primeros cinco modulos del baño de las niñas.

Contratista [signature] Interventoría


23-Nov En el nuevo salón continúa la terminación de filos de parctes en toda el area y muros, se hace instalación de enchape de ceramica en el meson de lavado de manos del baño de niñas el personal de ornamentación continua la fabricación de las divisiones para baños.

Contratista [signature] Interventoría

24-Nov En el nuevo salón se desarrolla arreglo final y detallado de filos y parctes sobre muros construidos, en el baño de niñas se desarrollan actividades de aseo y se hacen resanes en enchapes de paredes y mesones de lavado de manos, en el taller continuan los trabajos de fabricación de ornamentación metalica

Contratista [signature] Interventoría

25-Nov Continua el desarrollo de trabajos del dia anterior, el personal labora hasta el medio dia.

Contratista  ~~Interventoría~~

26-Nov No se labora


27-Nov En el nuevo salón comienzan actividades de aplicación de pintura sobre muros, se realiza la fundida de la placa de sobrepiso en el nuevo almacen o bodega, se efectua la demolición del meson del baño de los niños y se hacen demoliciones para puntos de agua

Contratista  ~~Interventoría~~

28-Nov En el nuevo salón continuan las actividades de pintura sobre muros, se desarrollan los trabajos de corte y demolición de paredes y piso para la conformación de los puntos de agua y desagüe de los nuevos aparatos en el baño de los niños.

Contratista  ~~Interventoría~~

29-Nov En el nuevo salon terminan las actividades de pintura en los muros internos e inician los trabajos de instalación del enchape o tableta de piso, en la bodega tambien inician los trabajos de instalación de tableta de piso.

Contratista  ~~Interventoría~~

30-Nov Continuan los trabajos de instalación de la tableta para piso en el nuevo salón. se realiza la verificación de medidas para el suministro de vidrios y espejos en los baños, ingresa a la obra la teja para el nuevo salón, en el taller de ornamentación continua la fabricación de las puertas y ventanas faltantes

Contratista Interventoría

01-Dic. En el nuevo salón se inicia la instalación de la teja de barro sobre la teja de fibrocemento. se hace la instalación de la puerta y ventanas en en este mismo sitio, se instalan las divisiones en el baño de las niñas, se hacen trabajos de de desmonte y adecuaciones para la canal de aguas lluvias de la zona de la bodega

Contratista Interventoría

02-Dic Continuan las actividades del dia anterior el personal de obra labora hasta el medio dia.

Contratista Interventoría

03-Dic No se labora

04-Dic En el nuevo salon se termina la instalacion de la teja de barro sobre la teja de fibrocemento, se termina tambien la instalación de la tableta en el corredor, y se hace el embogillado final, en la bodega continua la instalacion de la tableta para piso

Contratista Interventoría

05-Dic Se hacen remates de pintura finales en muros del nuevo salón y se hace limpieza de tableta de piso y aseo final del mismo, se termina la instalación de la tableta de piso en la bodega, se funde placa de piso en el cerden del frente de la misma, se hace mejoramiento del suelo y fundida de la rampa frente al salón nuevo.

Contratista Interventoría

06-Dic Se hacen trabajos de acabados y remates en la bodega, se termina la instalación del enchape en el mesón de lavado de manos del baño de niñas, en el baño de niños continua la instalación de la tubería para el suministro de agua de los orinales nuevos y tambien los puntos de desagüe se desarrollan remates de pintura en todo el area.

Contratista Interventoría

07-Dic Se desarrollan pruebas en aparatos electricos en el salón nuevo, se desarrolla la instalación de vidrios en todas las zonas dispuestas para esto, en el baño de los niños finaliza la instalación de nuevos orinales y las divisiones metalicas de estos. Finalmente se hace la entrega de todo el proyecto con la firma del acta de cabo final y entrega a satisfacción por todas las partes

Contratista Interventoría
