ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

JC INGENIERIA VIAL S.A.S.

ACTA DE OBRA

		1	FECHA: (dd/mm/aa)
CONTRATO:	4152.010.26.1.762.2023		17/10/2023
CONTRATISTA:	JC INGENIERIA VIAL SAS		
REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA BP-26002902	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 INCLUYE CL14 x CR66 y CL 14 x CR 44	

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	+ / -	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un	4	$ 1.138.436	$ 4.553.743	10,00	$ 11.384.357	-	$ -	2,00	$ 2.276.871
2	SOCIALIZACIÓN	un	4	$ 3.237.178	$ 12.948.712	8,00	$ 25.897.424	-	$ -	2,00	$ 6.474.356
					$ 17.502.455		**$ 37.281.781**		**$ -**		**$ 8.751.227**
OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un	12	$ 785.141	$ 9.421.697	34,00	$ 26.694.809	-	$ -	2,00	$ 1.570.283
4	DEMOLICION DE CAJA	un	4	$ 114.167	$ 456.670	16,00	$ 1.826.680	-	$ -	0,00	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml	315	$ 152.060	$ 47.898.814	30,60	$ 4.653.028	-	$ -	0,00	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml	110	$ 135.195	$ 14.871.498	129,81	$ 17.549.720	-	$ -	0,80	$ 108.156
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml	40	$ 161.949	$ 6.477.960	48,23	$ 7.810.801	-	$ -	0,00	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml	80	$ 182.602	$ 14.608.194	125,70	$ 22.953.125	-	$ -	0,00	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml	80	$ 78.110	$ 6.248.783	1,63	$ 127.319	-	$ -	0,00	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml	80	$ 96.183	$ 7.694.674	110,81	$ 10.658.086	-	$ -	63,45	$ 6.102.839
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml	80	$ 114.077	$ 9.126.157	7,61	$ 868.126	-	$ -	0,00	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml	80	$ 163.046	$ 13.043.673	173,76	$ 28.330.857	-	$ -	66,40	$ 10.826.248
13	DUCTO 4" TOPO	ml	900	$ 320.070	$ 288.062.834	1.386,86	$ 443.892.024	-	$ -	266,16	$ 85.189.782
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml	400	$ 366.692	$ 146.676.611	112,25	$ 41.161.124	-	$ -	97,25	$ 35.660.751
15	TUBO PUENTE	ml	10	$ 345.403	$ 3.454.034	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
16	CAJA SENCILLA	un	42	$ 1.062.253	$ 44.614.621	102,00	$ 108.349.793	-	$ -	25,00	$ 26.556.322
17	CAJA DOBLE	un	20	$ 1.736.278	$ 34.725.566	2,00	$ 3.472.557	-	$ -	0,00	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un	5	$ 2.239.023	$ 11.195.115	11,00	$ 24.629.253	-	$ -	1,00	$ 2.239.023
19	ANCLAJE TIPO 1	un	58	$ 1.599.272	$ 92.757.787	97,00	$ 155.129.402	-	$ -	27,00	$ 43.180.349
20	ANCLAJE TIPO 2	un	2	$ 1.801.281	$ 3.602.561	1,00	$ 1.801.281	-	$ -	0,00	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un	4	$ 1.312.809	$ 5.251.236	4,00	$ 5.251.236	-	$ -	0,00	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un	1	$ 4.169.566	$ 4.169.566	7,00	$ 29.186.959	-	$ -	1,00	$ 4.169.566
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	5	$ 708.002	$ 3.540.009	6,00	$ 4.248.011	1,00	$ 708.002	1,00	$ 708.002
					$ 767.898.060		**$ 938.594.188**		**$ 708.002**		**$ 216.311.321**
MANTENIMIENTO											
24	T1	un	16	$ 2.487.997	$ 39.807.954	2	$ 4.975.994	-	$ -	0,00	$ -
25	T1X	un	4	$ 4.974.565	$ 19.898.259	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
26	T2 (3.5m)	un	4	$ 4.900.898	$ 19.603.591	1	$ 4.900.898	-	$ -	0,00	$ -
27	T2 (4.5m)	un	4	$ 6.563.025	$ 26.252.100	1	$ 6.563.025	-	$ -	0,00	$ -
28	T2 (5.5m)	un	4	$ 7.089.081	$ 28.356.324	3	$ 21.267.243	-	$ -	0,00	$ -
29	T2 (6.5m)	un	4	$ 7.625.620	$ 30.502.480	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
30	T2 (8.5m)	un	1	$ 9.811.421	$ 9.811.421	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un	10	$ 373.481	$ 3.734.807	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALLER	un	10	$ 338.696	$ 3.386.962	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml	1	$ 761.161	$ 761.161	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un	1	$ 767.546	$ 767.546	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
					$ 182.882.606		**$ 37.707.160**		**$ -**		**$ -**

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	+ / -	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
					ESPACIO PUBLICO						
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3	38	$ 158.782	$ 6.033.723	61,756	$ 9.805.753	-	$ -	15,03	$ 2.386.252
36	SUBBASE	m3	40	$ 147.390	$ 5.895.601	103,76	$ 15.293.189	-	$ -	0,15	$ 22.212
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLICO	m3	80	$ 914.258	$ 73.140.615	61,563	$ 56.284.446	-	$ -	13,76	$ 12.575.852
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg	80	$ 11.940	$ 955.211	190,746	$ 2.277.533	-	$ -	87,41	$ 1.043.727
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2	45	$ 153.338	$ 6.900.197	6	$ 920.026	-	$ -	0,00	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2	80	$ 140.618	$ 11.249.441	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
41	LOSETA 40X40	m2	80	$ 141.779	$ 11.342.301	6,32	$ 896.042	-	$ -	0,00	$ -
42	BOLARDO M60	un	32	$ 283.137	$ 9.060.392	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un	32	$ 391.882	$ 12.540.230	1	$ 391.882	-	$ -	0,00	$ -
					$ 137.117.711		$ 85.868.872		$ -		$ 16.028.042
					NO PREVISTOS						
							$ -		$ -		$ -
	TOTAL				$ 1.105.400.831		$ 1.099.452.002		$ 708.002		$ 241.090.591
				TOTAL	$ 1.105.400.831	TOTAL	$ 1.099.452.002	TOTAL		TOTAL	$ 241.090.591

JC INGENIERIA VIAL SAS
CONTRATISTA

Revisó apoyo supervisión:

SECRETARIA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MEMORIAS ACTA 01


CALLE 14 x CARRERA 66

					BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 01	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES									
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un	$ 1.138.435,69	$ -	1,00	$ 1.138.436	-	$ -	1,00	$ 1.138.436
2	SOCIALIZACIÓN	un	$ 3.237.178,04	$ -	1,00	$ 3.237.178	-	$ -	1,00	$ 3.237.178
				$ -		$ 4.375.614		$ -		$ 4.375.613,73
	OBRA CIVIL									
3	RETIRO ANCLAJE	un	$ 785.141,44	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4	DEMOLICION DE CAJA	un	$ 114.167,49	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml	$ 152.059,73	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml	$ 135.195,44	$ -	0,80	$ 108.156	-	$ -	0,80	$ 108.156
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml	$ 161.949,01	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml	$ 182.602,42	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml	$ 78.109,79	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml	$ 96.183,43	$ -	45,61	$ 4.386.926	-	$ -	45,61	$ 4.386.926
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml	$ 114.076,96	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml	$ 163.045,91	$ -	48,51	$ 7.909.357	-	$ -	48,51	$ 7.909.357
13	DUCTO 4" TOPO	ml	$ 320.069,82	$ -	168,56	$ 53.950.968	-	$ -	168,56	$ 53.950.968
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml	$ 366.691,53	$ -	97,25	$ 35.660.751	-	$ -	97,25	$ 35.660.751
15	TUBO PUENTE	ml	$ 345.403,41	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un	$ 1.062.252,87	$ -	17,00	$ 18.058.299	-	$ -	17,00	$ 18.058.299
17	CAJA DOBLE	un	$ 1.736.278,32	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un	$ 2.239.022,99	$ -	1,00	$ 2.239.023	-	$ -	1,00	$ 2.239.023
19	ANCLAJE TIPO 1	un	$ 1.599.272,19	$ -	19,00	$ 30.386.172	-	$ -	19,00	$ 30.386.172
20	ANCLAJE TIPO 2	un	$ 1.801.280,55	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un	$ 1.312.808,96	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un	$ 4.169.565,60	$ -	1,00	$ 4.169.566	-	$ -	1,00	$ 4.169.566
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	$ 708.001,81	$ -	1,00	$ 708.002	-	$ -	1,00	$ 708.002
				$ -		$ 157.577.220		$ -		$ 157.577.220
	MANTENIMIENTO									
				$ -		$ -		$ -		$ 0
	ESPACIO PUBLICO									
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3	$ 158.782,19	$ -	2,02	$ 320.105	-	$ -	2,016	$ 320.105
36	SUBBASE	m3	$ 147.390,03	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3	$ 914.257,69	$ -	1,47	$ 1.346.702	-	$ -	1,47	$ 1.346.702
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg	$ 11.940,14	$ -	12,25	$ 146.219	-	$ -	12,25	$ 146.219
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2	$ 153.337,70	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2	$ 140.618,01	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
41	LOSETA 40X40	m2	$ 141.778,76	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un	$ 283.137,25	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un	$ 391.882,18	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
				$ -		$ 1.813.025		$ -		$ 1.813.025
	TOTAL calle 14 x carrera 66			$ -		$ 163.765.859		$ -		$ 163.765.859

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN


ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
1	Diseño interseccion	0	1	Ejecutado 100%

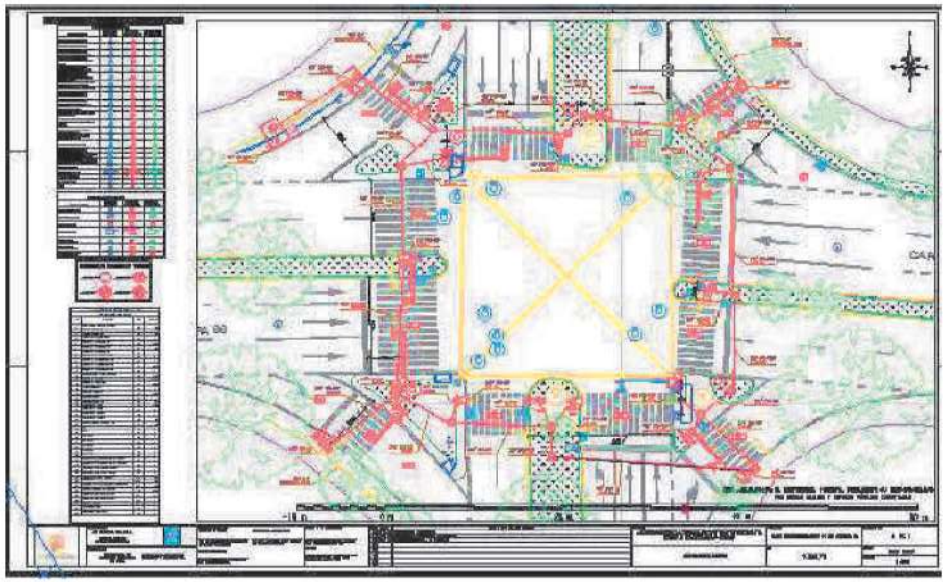


ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
2	SOCIALIZACIÓN	0	1	Ejecutado 100%



ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
3	RETIRO ANCLAJE	0	0	

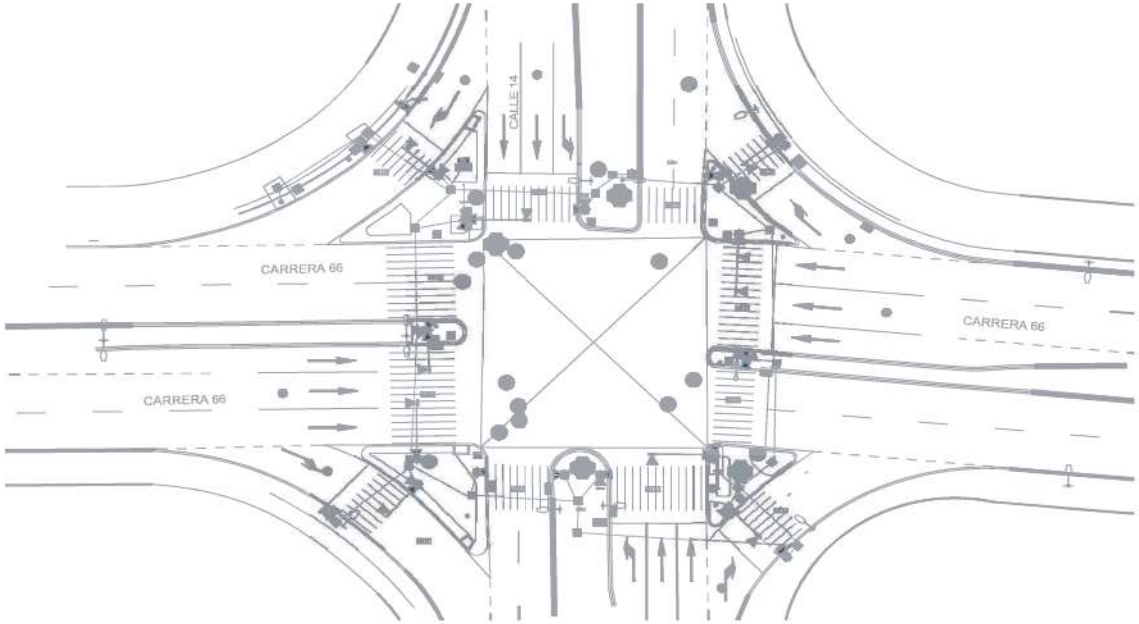


ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
5	DUCTO 2" ZONA DURA		0	Ejecutado 100%

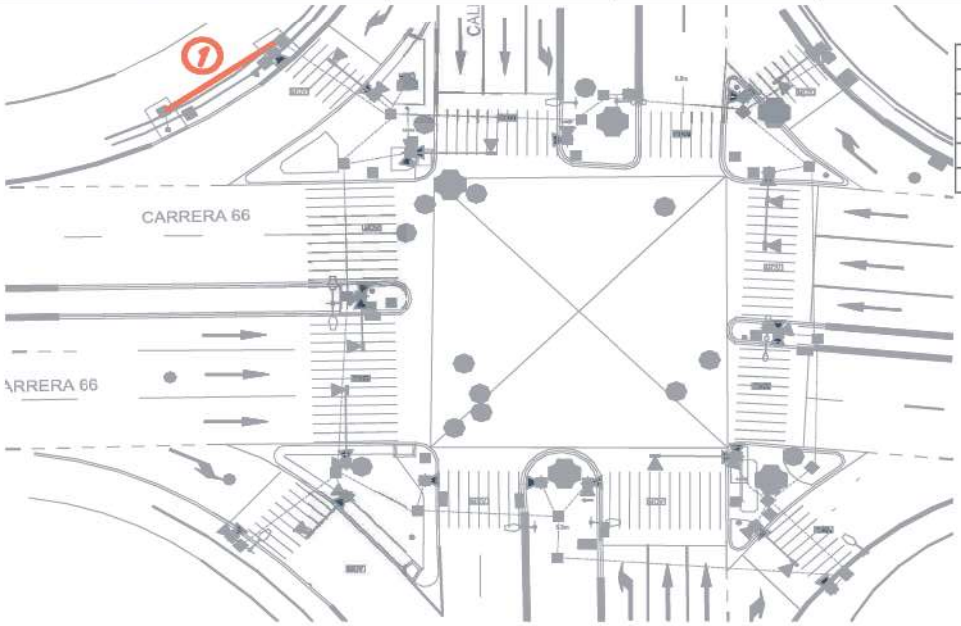


DUCTO	LONG (m)
1	0
2	
3	
4	
TOTAL	0

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
6	DUCTO 3" ZONA DURA	0	0,8	Ejecutado 100%

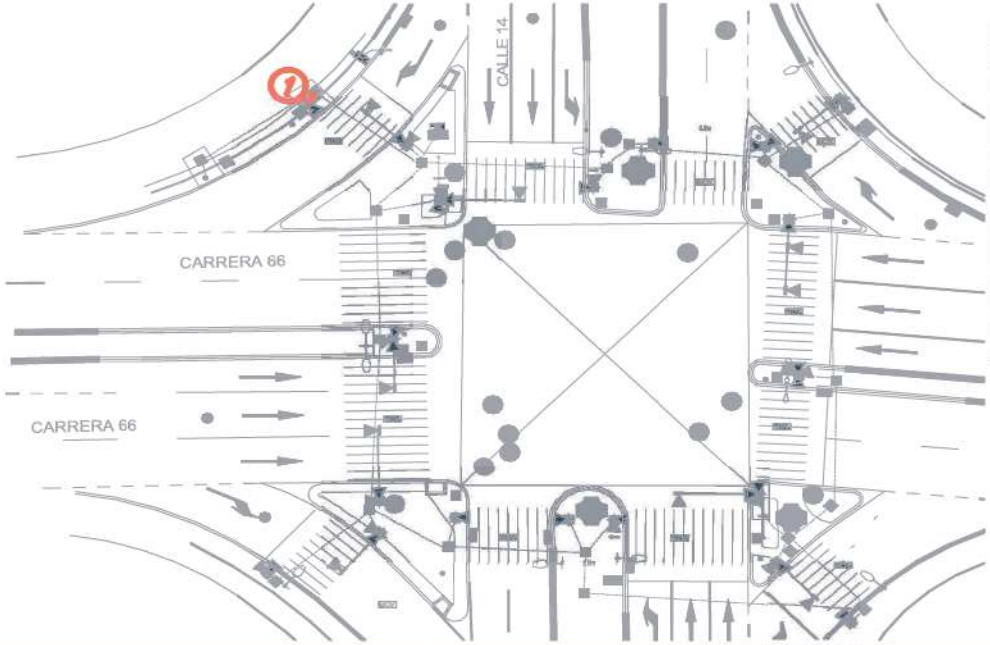


DUCTO	LONG (m)
1	0,8
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	0,8

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	0	45,61	Ejecutado 100%

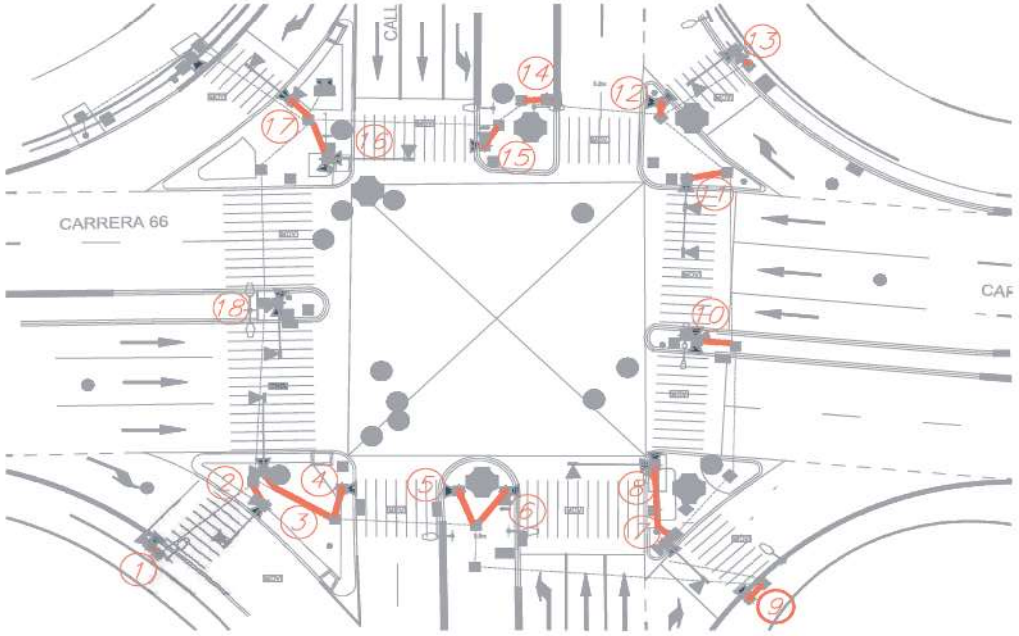


DUCTO	LONG (m)
1	0
2	1,46
3	6,14
4	3,35
5	7,66
6	7,3
7	1,8
8	6,46
9	0,4
10	2,25
11	1,2
12	0
13	2,28
14	0
15	0,88
16	1,09
17	2,84
18	0,5
TOTAL	45,61

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	0	48,51	Ejecutado 100%

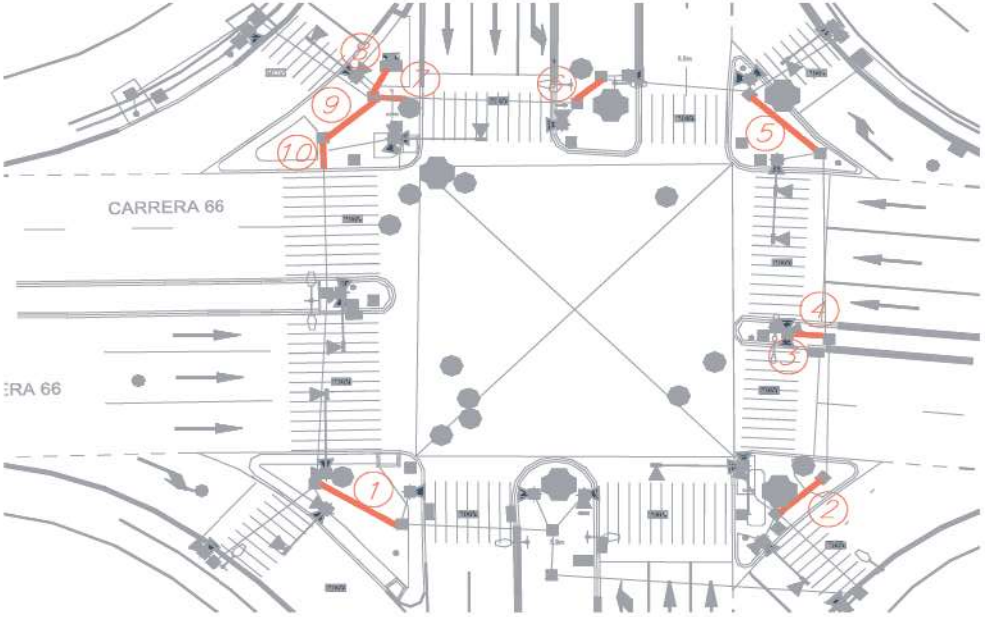


DUCTO	LONG (m)
1	7,7
2	9,38
3	2,7
4	3,4
5	6,4
6	5,5
7	1,44
8	1,44
9	6,7
10	3,85
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
TOTAL	**48,51**

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
13	DUCTO 4" TOPO	0	168,56	Ejecutado 100%

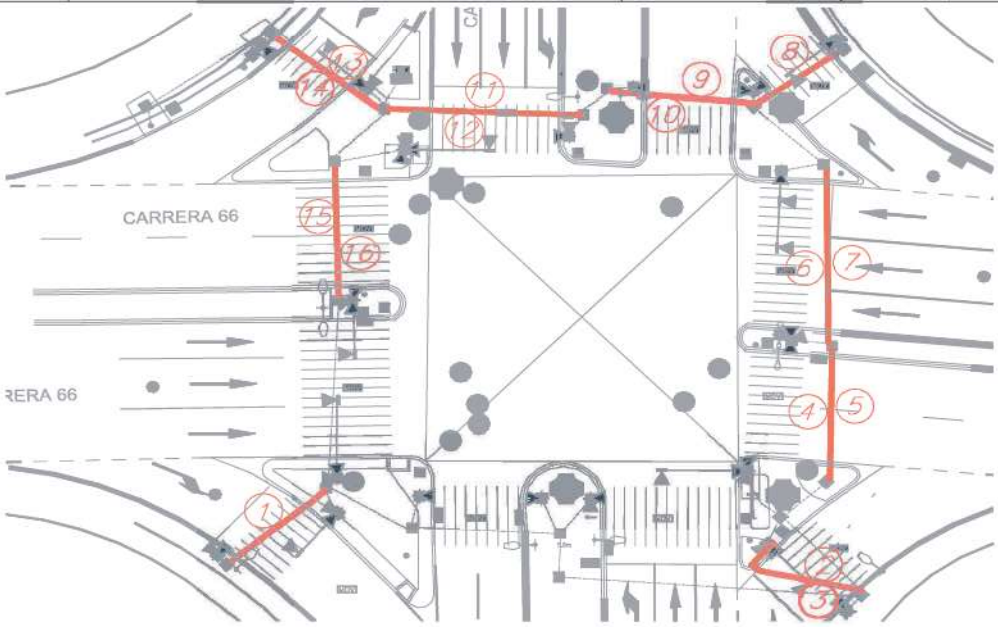


TOPO	LONG (m)
1	11,4
2	9,97
3	9,44
4	10,61
5	10,63
6	10,06
7	10,1
8	7,4
9	10,66
10	10,91
11	11,99
12	12,82
13	8,67
14	7,59
15	12,84
16	13,47
TOTAL	**168,56**

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	0	97,25	Ejecutado 100%

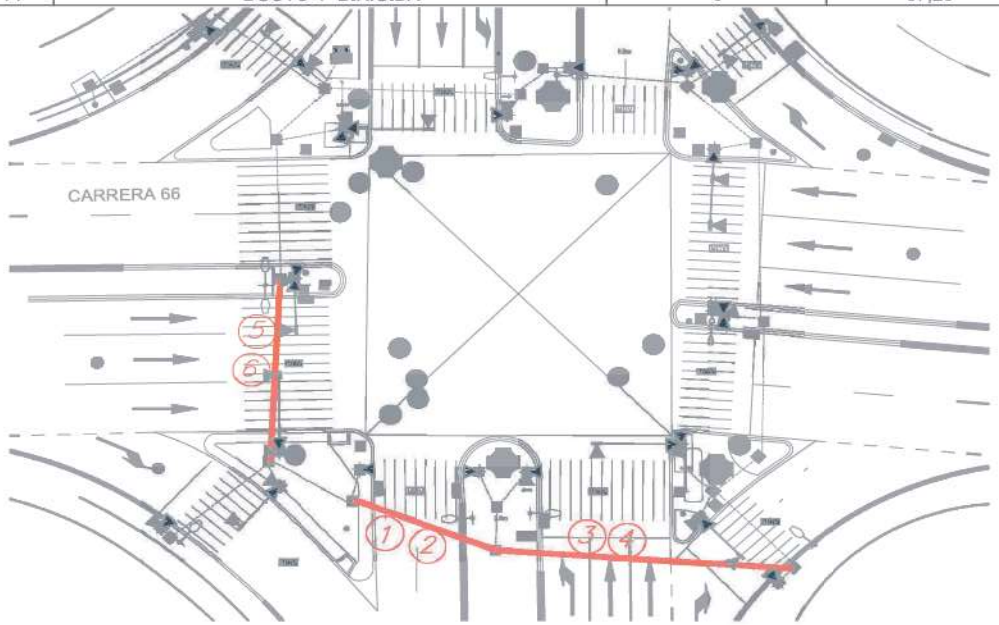


PHD	LONG (m)
1	13,88
2	13,84
3	20,8
4	21,03
5	13,84
6	13,86
TOTAL	**97,25**


ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
16	CAJA SENCILLA	0	17	Ejecutado 100%

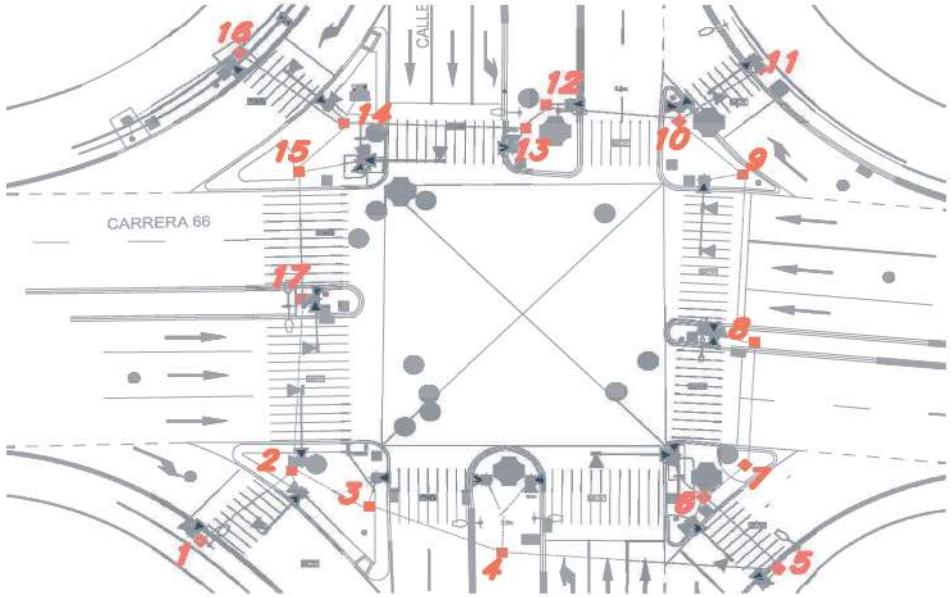


ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
17	CAJA DOBLE	0	0	

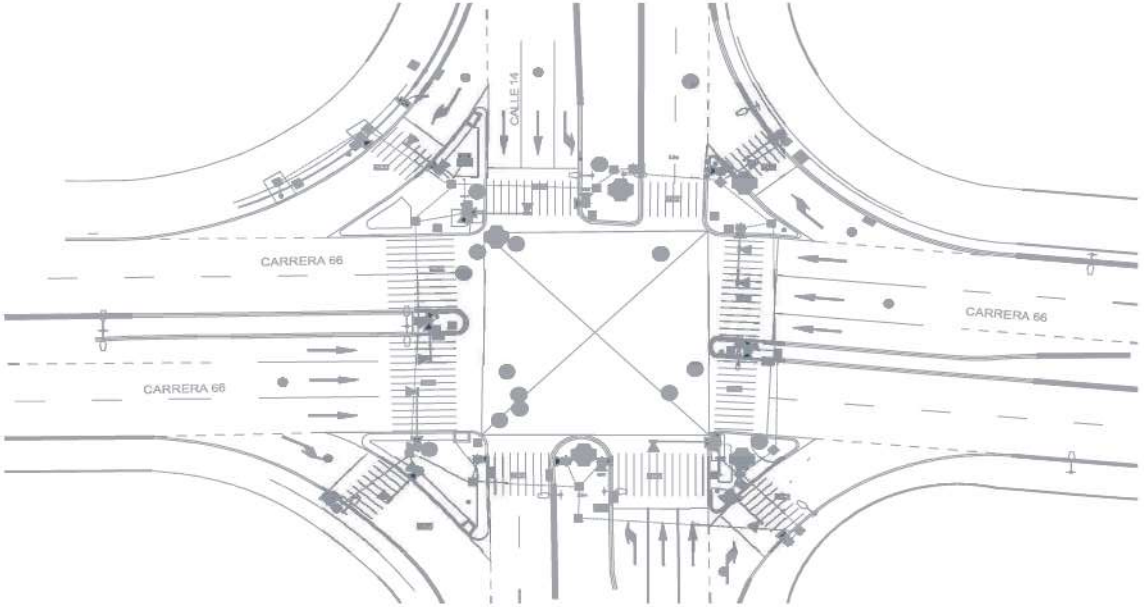


ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
18	CAJA PRINCIPAL	0	1	Ejecutado 100%

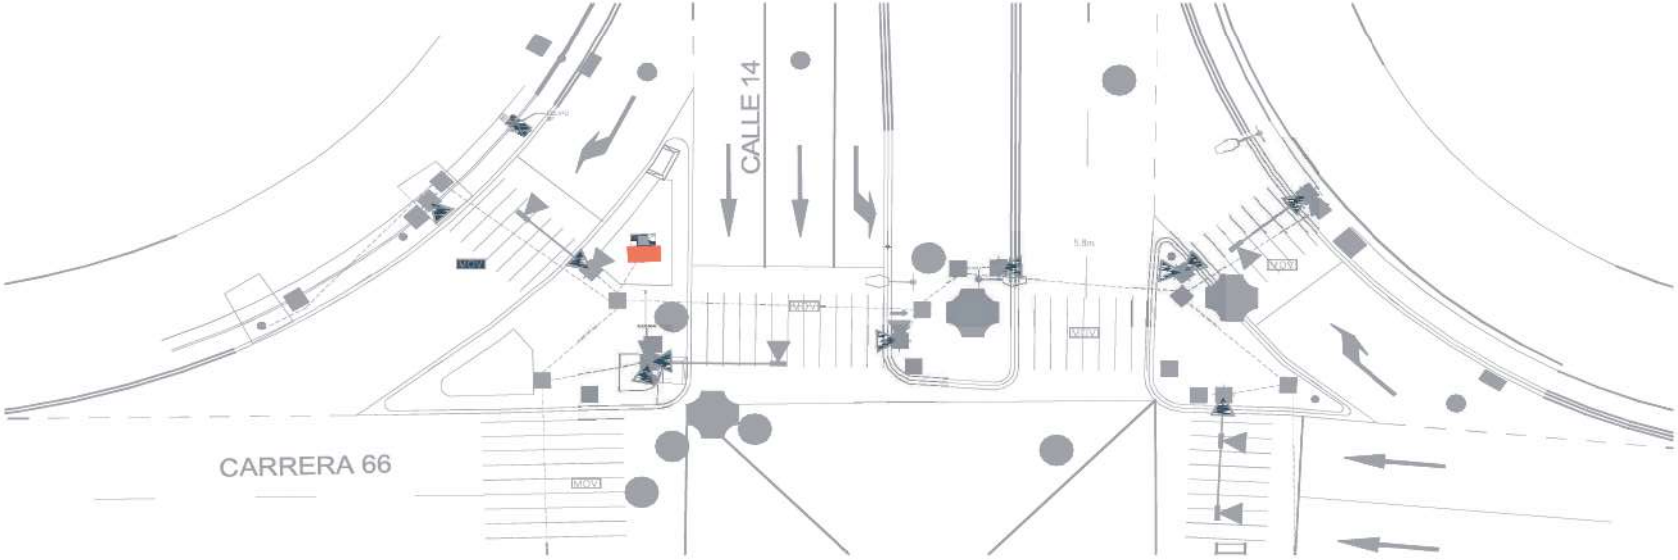

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
19	ANCLAJE TIPO 1	0	19	Ejecutado 100%

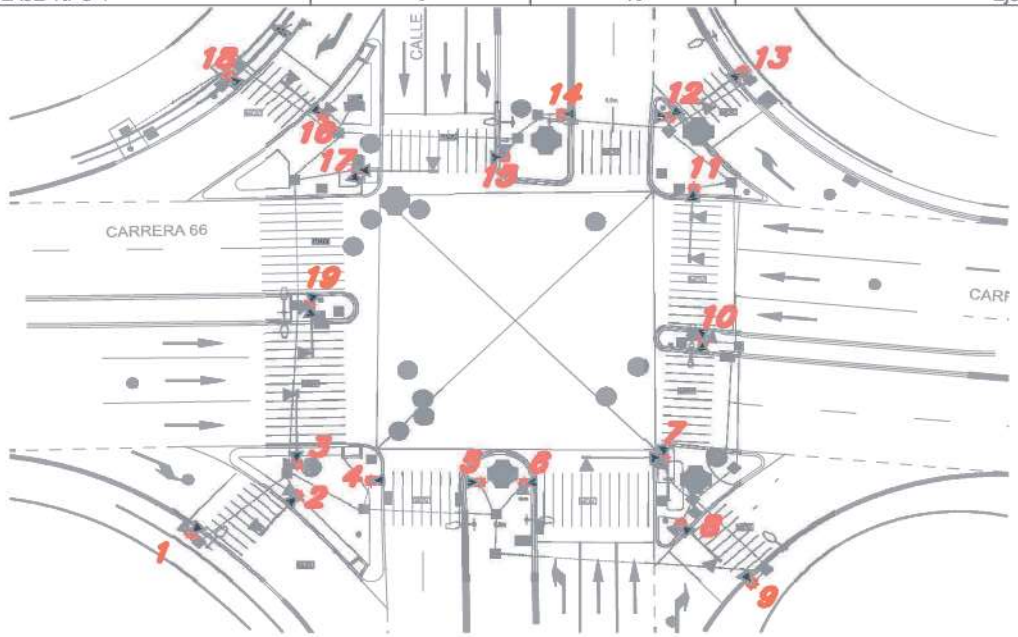


ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
22	PEDESTAL TIPO 2	0	1	Ejecutado 100%

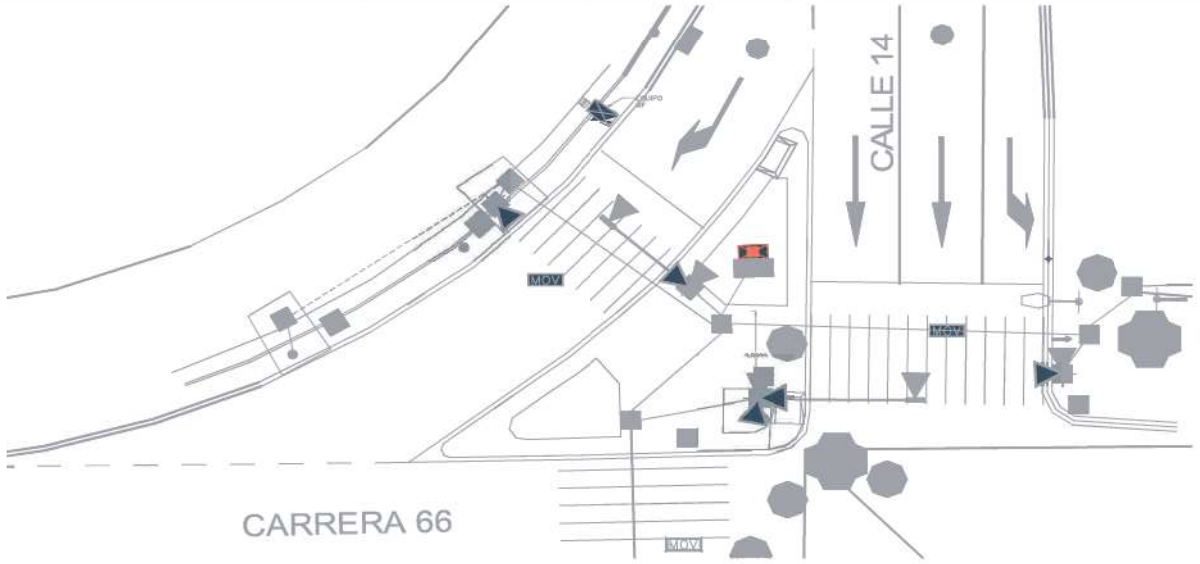

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	0	1	Ejecutado 100%




ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
35	DEMOLICION DE ANDEN	0	2,016	Ejecutado 100%

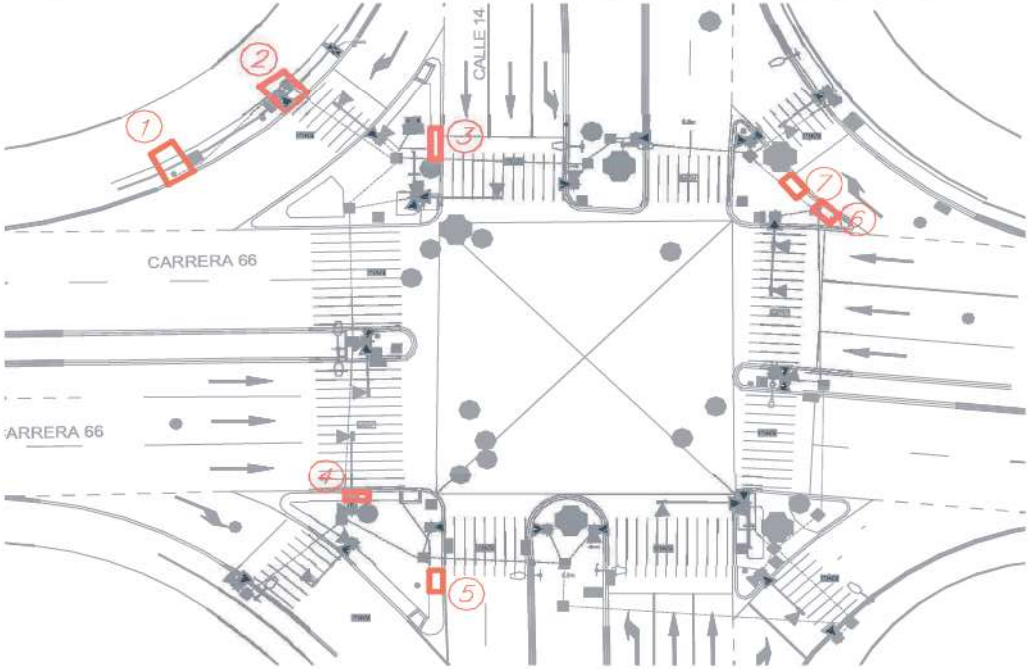


PUNTO	Area	E	VOLUMEN
1	6,85	0,1	0,685
2	2,57	0,1	0,257
3	2,14	0,1	0,214
4	2,07	0,1	0,207
5	1,1	0,1	0,11
6	1,02	0,25	0,255
7	0,96	0,3	0,288
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			2,016

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
36	SUBBASE			

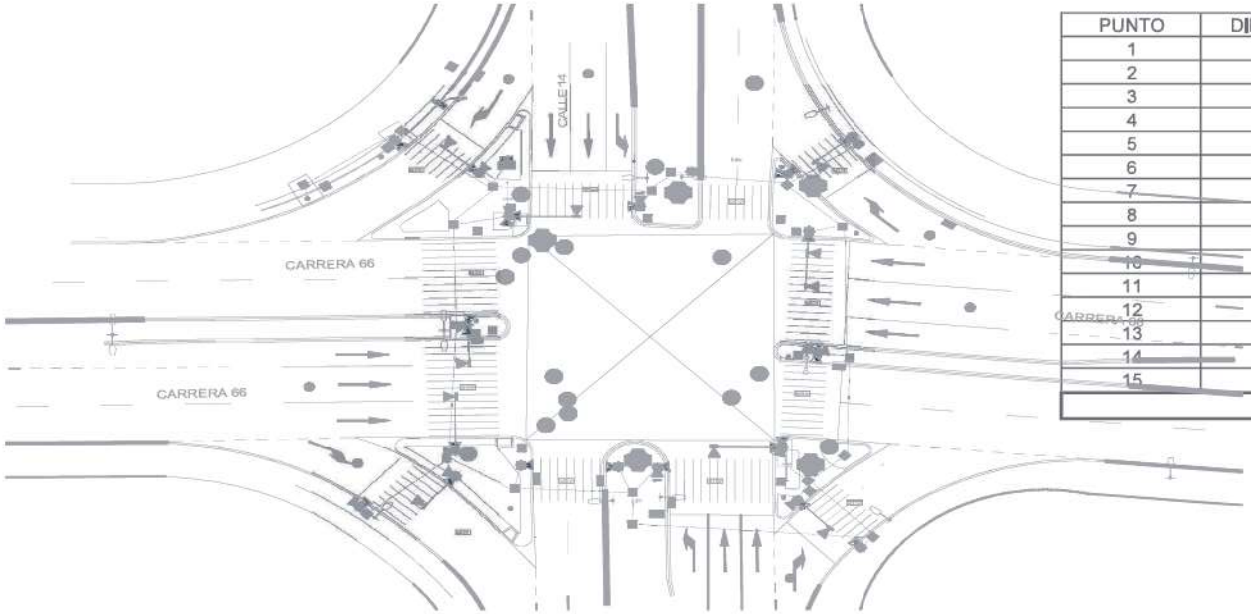


PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
37	CONCRETO 3000 PSI ESPACIO PUBLICO	0	1,473	Ejecutado 100%

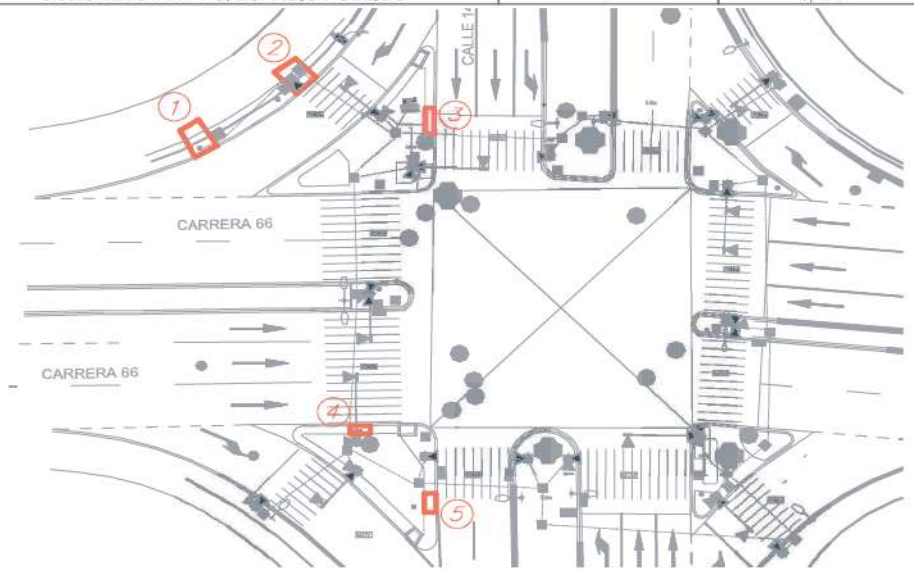

PUNTO	Area	E	VOLUMEN
1	6,85	0,1	0,685
2	2,57	0,1	0,257
3	2,14	0,1	0,214
4	2,07	0,1	0,207
5	1,1	0,1	0,11
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			1,473

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	0	12,246	Ejecutado 100%

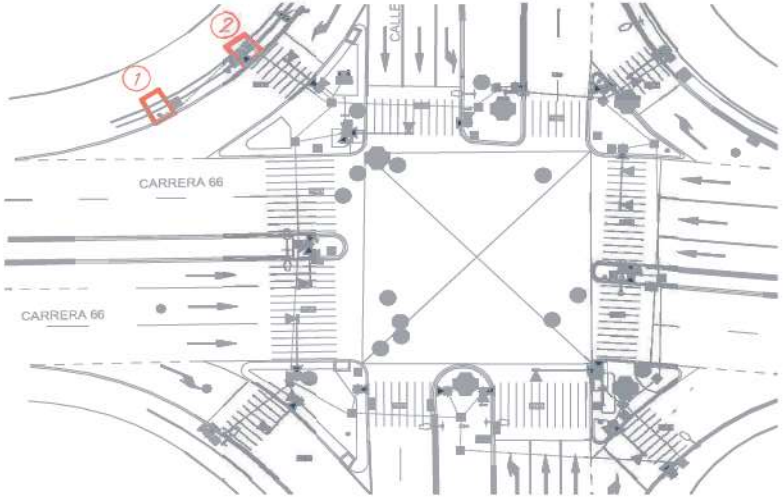

PUNTO	DIMENSIONES
1	6,85
2	2,57
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
TOTAL M2	9,42

KG/M2	M2	PESO
1,3	9,42	12,246

NO PREVISTOS IDENTIFICADOS

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 01

CALLE 14 x CARRERA 44

g


							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 01	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.435,69		$ -	1,00	$ 1.138.436	-	$ -	1,00	$ 1.138.436
2	SOCIALIZACIÓN	un		$3.237.178,04		$ -	1,00	$ 3.237.178	-	$ -	1,00	$ 3.237.178
						$ -		$ 4.375.614		$ -		$ 4.375.613,73
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$785.141,44		$ -	8,00	$ 6.281.132	-	$ -	2,00	$ 1.570.283
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$114.167,49		$ -	0,00	$ -	-	$ -		$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$152.059,73		$ -	12,60	$ 1.915.953	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$135.195,44		$ -	25,54	$ 3.452.892	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$161.949,01		$ -	0,00	$ -	-	$ -		$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$182.602,42		$ -	60,00	$ 10.956.145	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$78.109,79		$ -	0,00	$ -	-	$ -		$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$96.183,43		$ -	8,00	$ 769.467	-	$ -	17,84	$ 1.715.912
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$114.076,96		$ -	0,00	$ -	-	$ -		$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$163.045,91		$ -	4,00	$ 652.184	-	$ -	17,89	$ 2.916.891
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$320.069,82		$ -	261,30	$ 83.634.243	-	$ -	97,60	$ 31.238.814
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$366.691,53		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$345.403,41		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$1.062.252,87		$ -	16,00	$ 16.996.046	-	$ -	8,00	$ 8.498.023
17	CAJA DOBLE	un		$1.736.278,32		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$2.239.022,99		$ -	1,00	$ 2.239.023	-	$ -	-	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$1.599.272,19		$ -	13,00	$ 20.790.538	-	$ -	8,00	$ 12.794.177
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$1.801.280,55		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$1.312.808,96		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$4.169.565,60		$ -	1,00	$ 4.169.566	-	$ -	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$708.001,81		$ -	1,00	$ 708.002	-	$ -	-	$ -
						$ -		$ 152.565.190		$ -		$ 58.734.101
	MANTENIMIENTO											
						$ -		$ -		$ -		$ 0
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$158.782,19		$ -	24,7	$ 3.921.920	-	$ -	13,01	$ 2.066.147
36	SUBBASE	m3		$147.390,03		$ -	49,4	$ 7.281.067	-	$ -	0,1507	$ 22.212
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$914.257,69		$ -	24,7	$ 22.582.165	-	$ -	12,28	$ 11.229.151
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$11.940,14		$ -	146	$ 1.743.260	-	$ -	75,17	$ 897.508
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$153.337,70		$ -	0	$ -	-	$ -		$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$140.618,01		$ -	0	$ -	-	$ -		$ -
41	LOSETA 40X40	m2		$141.778,76		$ -	2	$ 283.558	-	$ -		$ -
42	BOLARDO M60	un		$283.137,25		$ -	0	$ -	-	$ -		$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$391.882,18		$ -	0	$ -	-	$ -		$ -
						$ -		$ 35.811.970		$ -		$ 14.215.017
	TOTAL calle 14 x carrera 66					$ -		$ 192.752.773		$ -		$ 77.324.732

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

Andrés Ochoa Sharon A. Rojas L

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
1	Diseño interseccion	UN	0	1	Ejecutado 100%

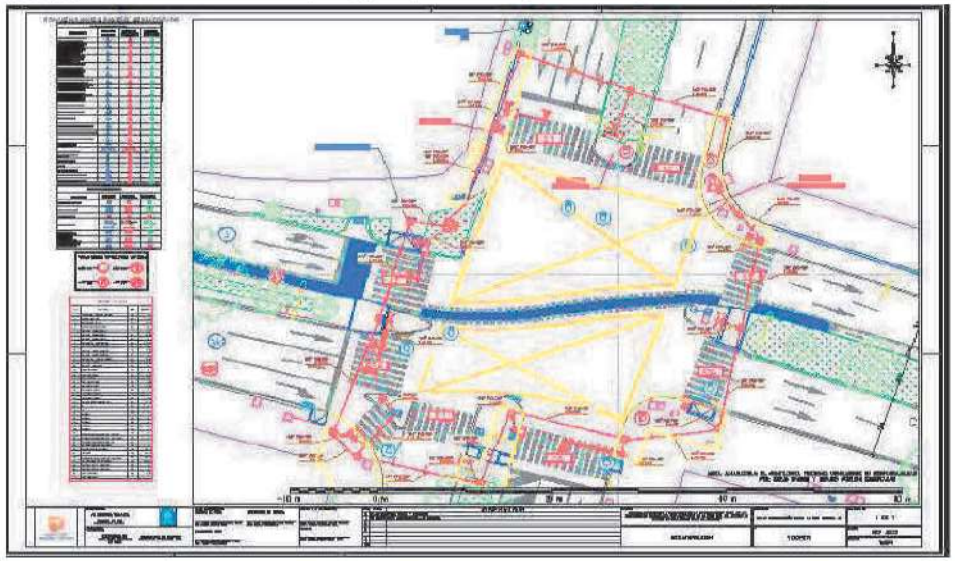


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
2	SOCIALIZACIÓN	UN	0	1	Ejecutado 100%








ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
3	RETIRO ANCLAJE	UN	0	2	Ejecucion parcial

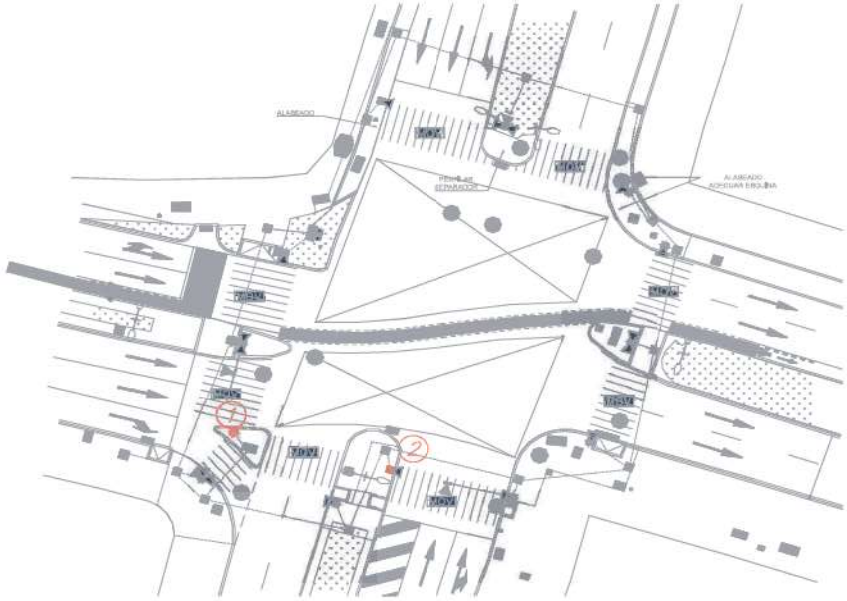


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ML	0	0	

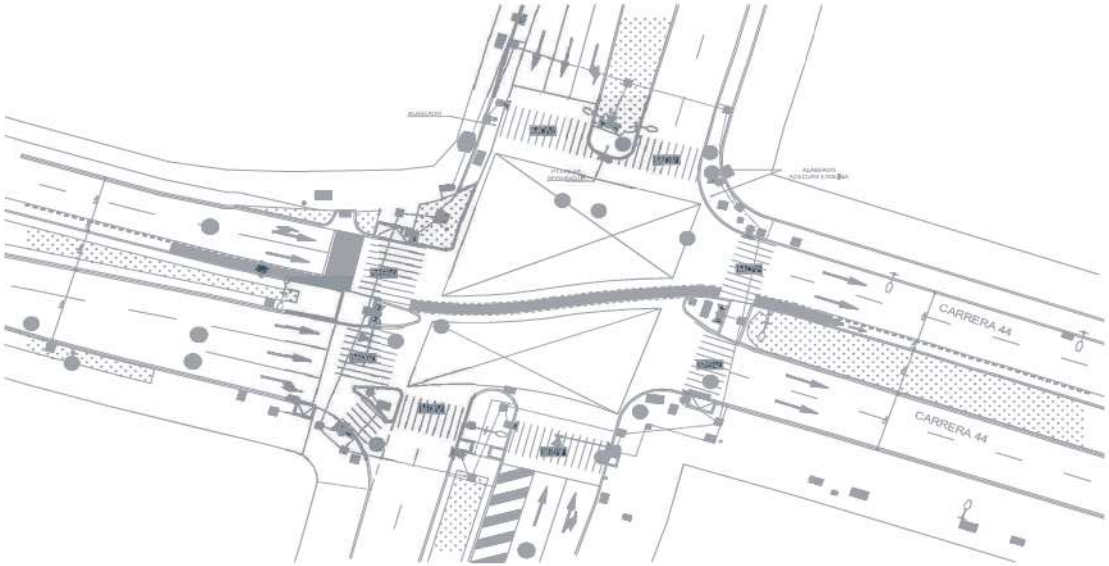


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ML	0	0	

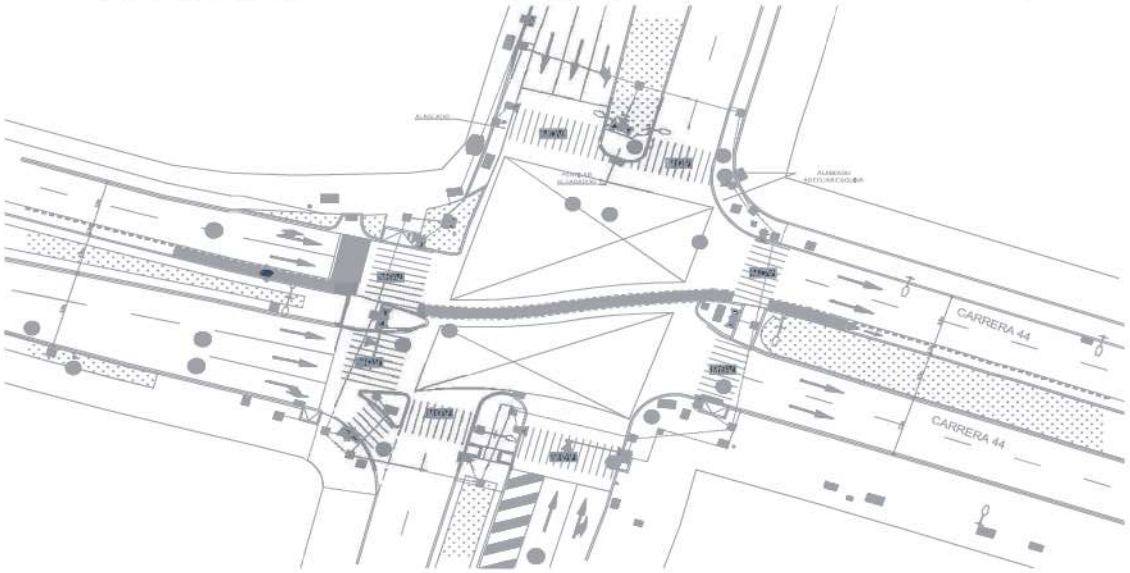


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
8	DUCTO 4X2 ZONA DURA	ML	0	0	

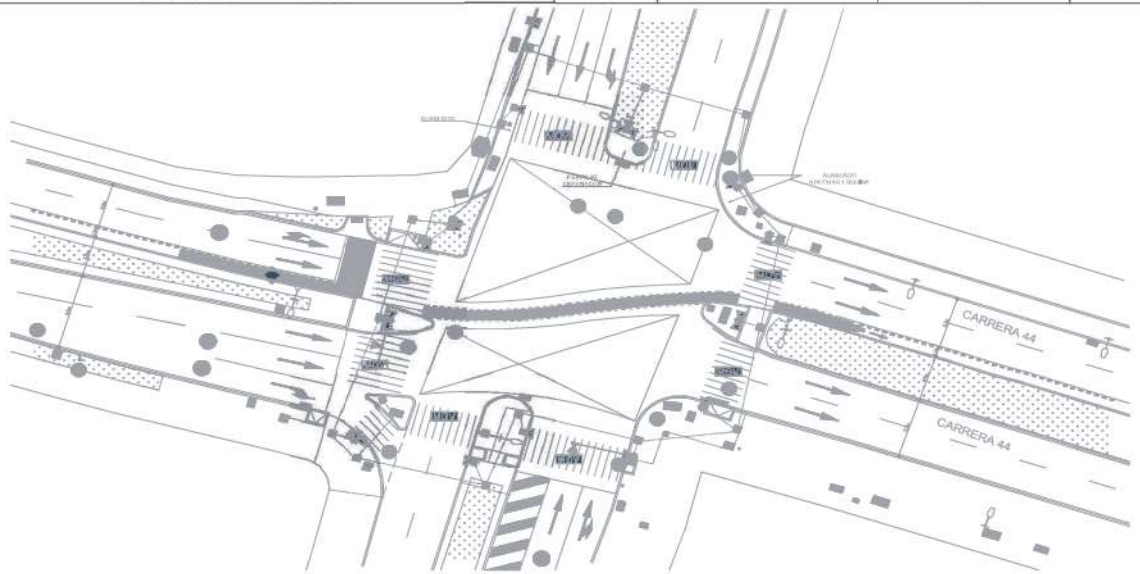


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ML	0	17,84	Ejecucion parcial

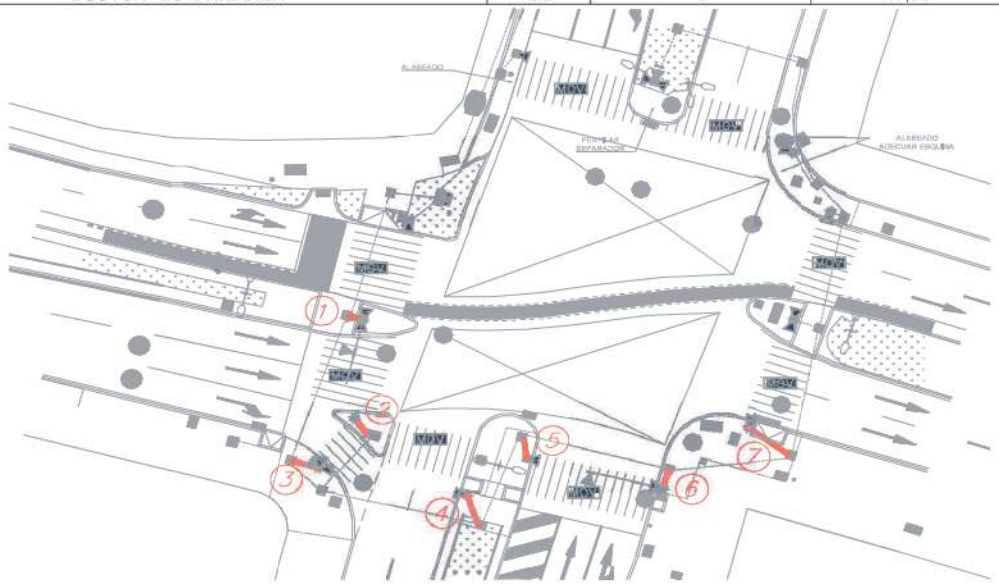


DUCTO	LONG (m)
1	1,14
2	0,54
3	1,42
4	4,8
5	3,32
6	1,07
7	5,55
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**17,84**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ML	0	17,89	Ejecucion parcial

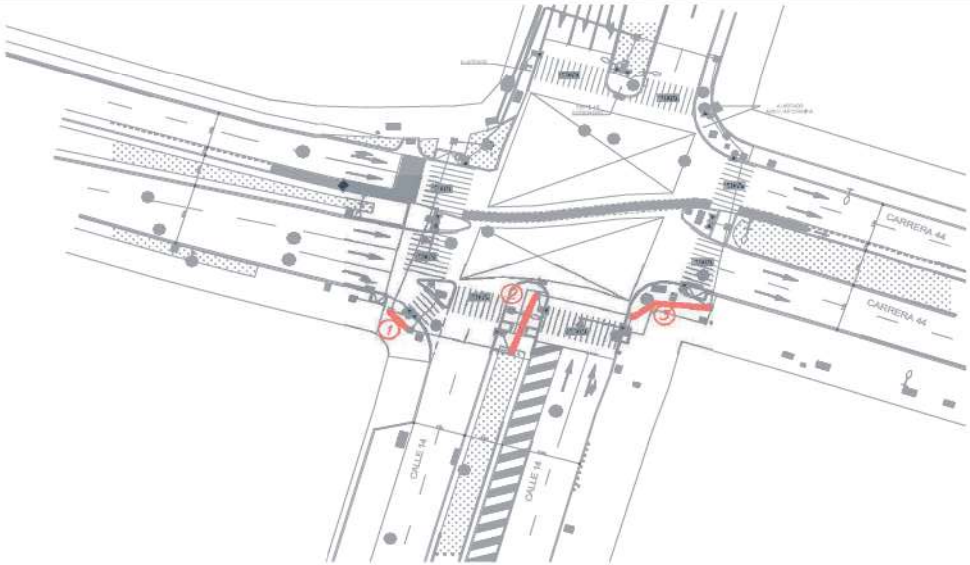


DUCTO	LONG (m)
1	3,45
2	0
3	14,44
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**17,89**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
13	DUCTO 4" TOPO	ML	0	97,6	Ejecucion parcial

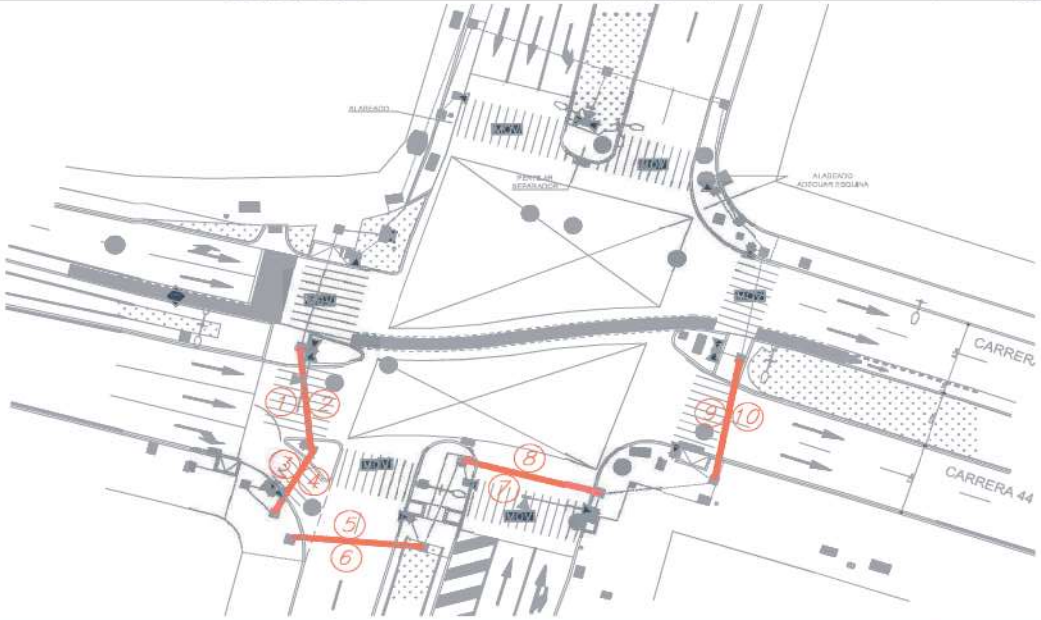


TOPO	LONG (m)
1	11,96
2	12,41
3	6,93
4	6,92
5	0
6	0
7	17,9
8	18
9	11,7
10	11,78
11	
12	
TOTAL	**97,6**


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
16	CAJA SENCILLA	UN	0	8	Ejecucion parcial

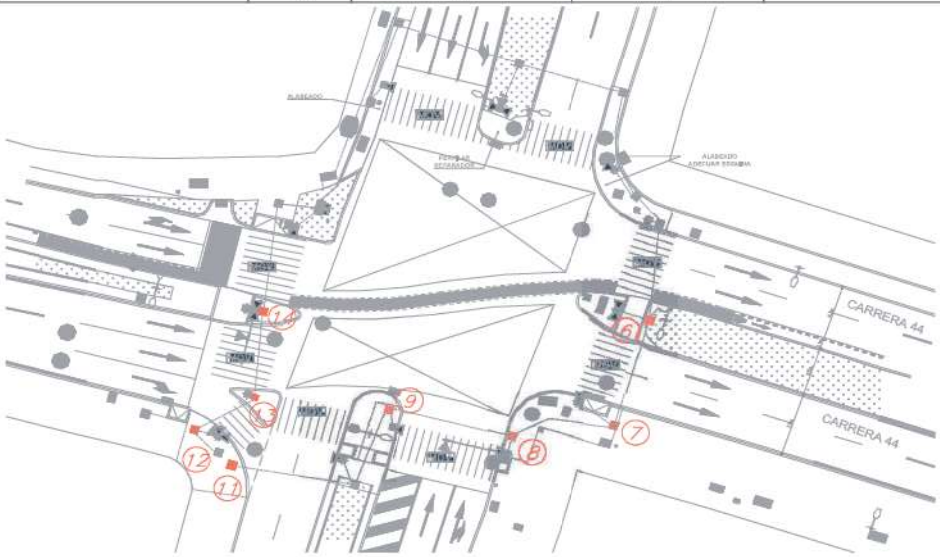


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
18	CAJA PRINCIPAL	UN	0	0	

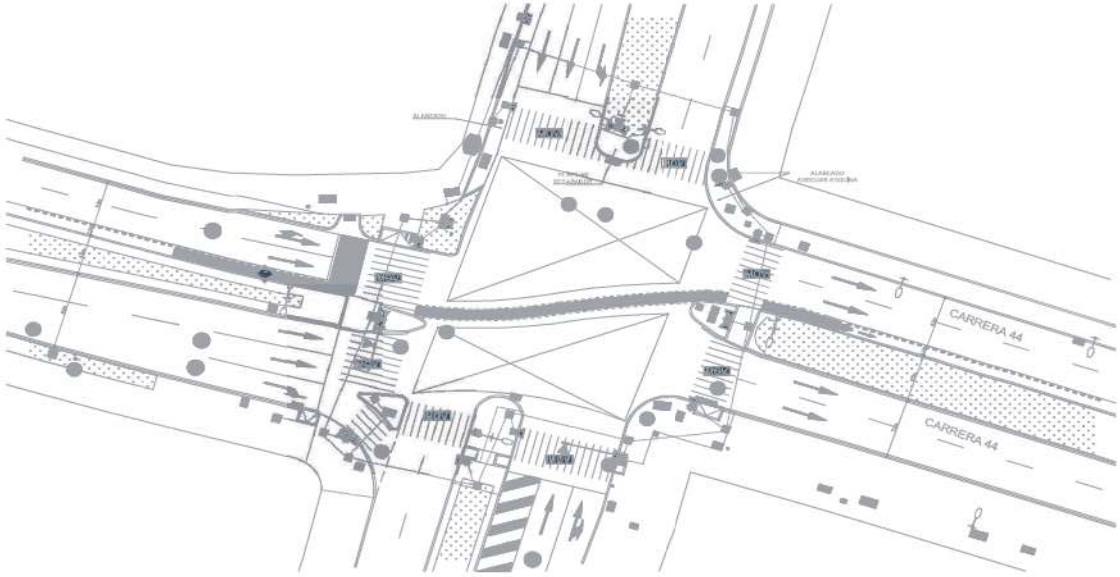


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
19	ANCLAJE TIPO 1	UN	0	8	Ejecucion parcial

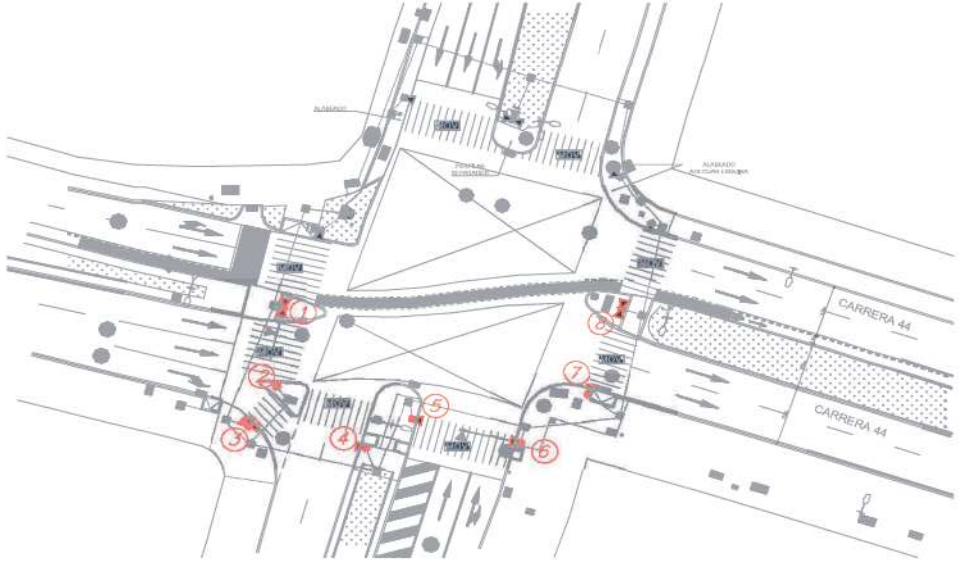


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
22	PEDESTAL TIPO 2	UN			

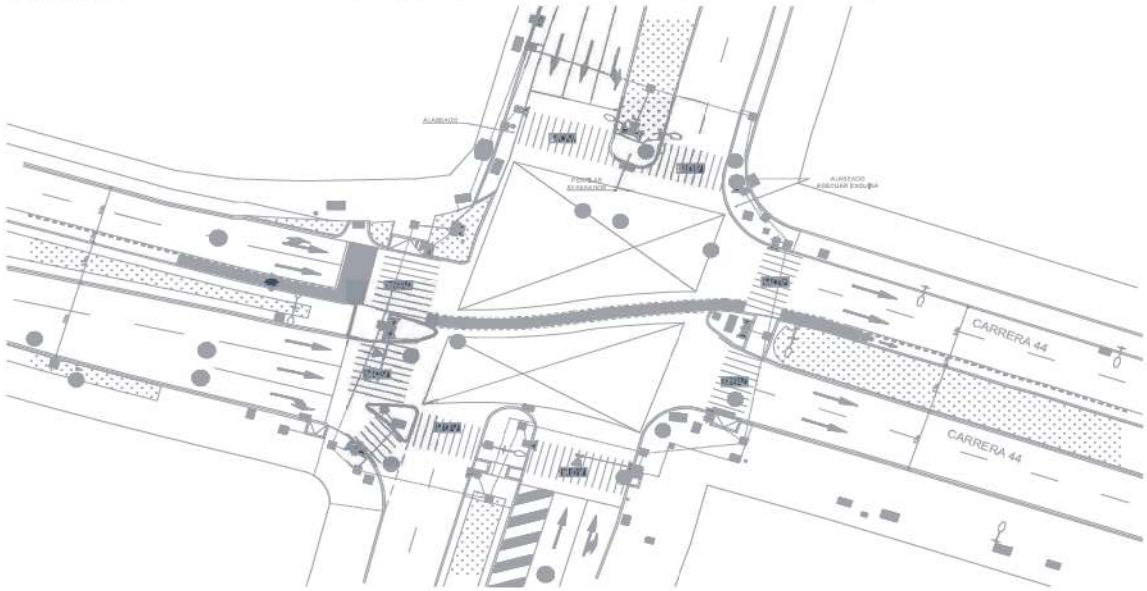

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	UN			

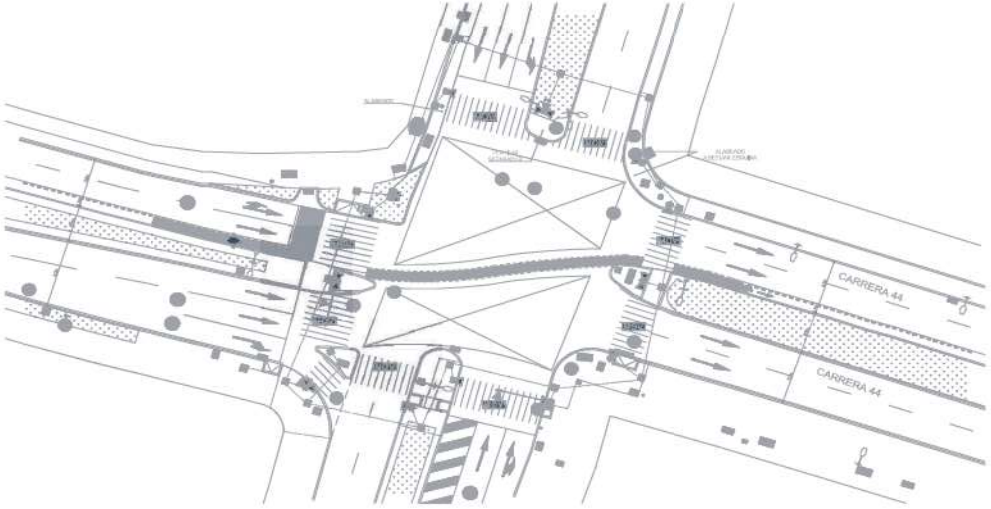


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
35	DEMOLICION DE ANDEN	M3	0	13,01	Ejecucion parcial

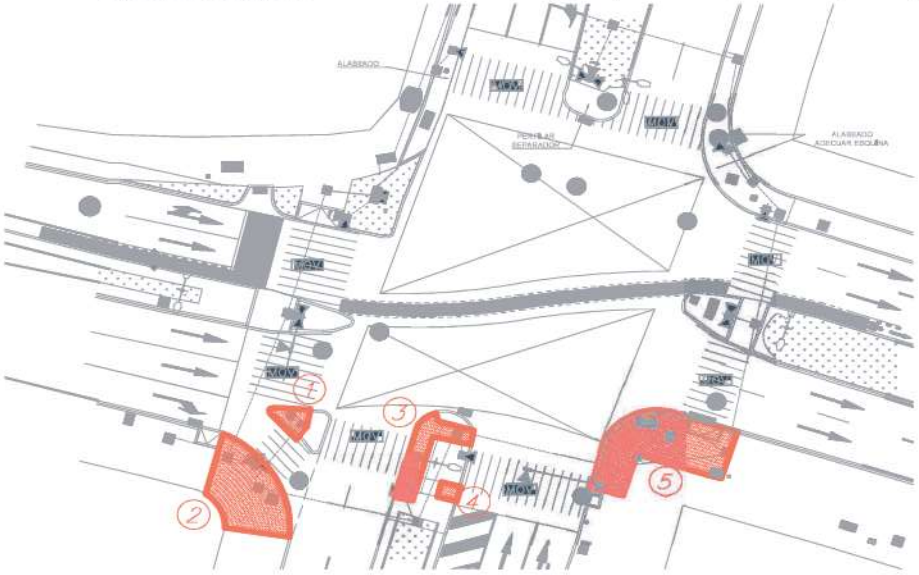


PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	3,024	0,50	1,51
2	30,372	0,13	3,95
3	17,700	0,10	1,77
4	0	0	0,00
5	57,821	0,1	5,78
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			13,01

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
36	SUBBASE	M3		0,1507	Ejecucion parcial

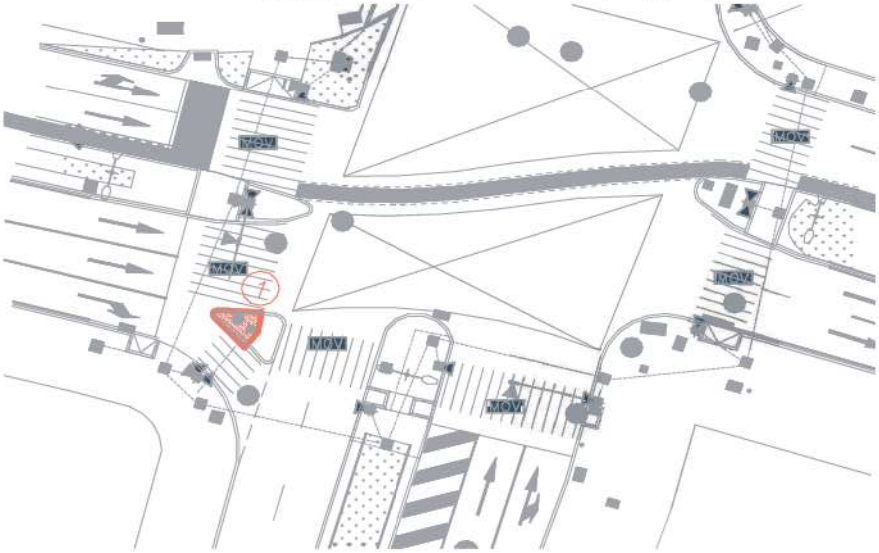


PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	3,014	0,05	0,1507
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			0,151

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
37	CONCRETO 3000 PSI ESPACIO PUBLICO	M3	0	12,28226	Ejecucion parcial

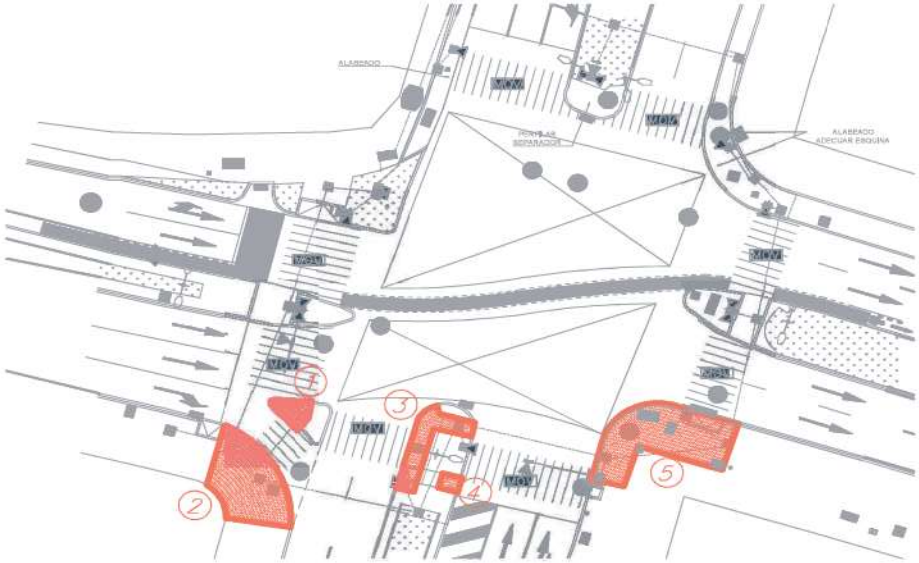

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	3,024	0,2	0,6048
2	30,372	0,13	3,94836
3	17,7	0,11	1,947
4	0	0	0
5	57,821	0,1	5,7821
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	TOTAL		12,28226


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	KG	0	75,1673	Ejecucion parcial

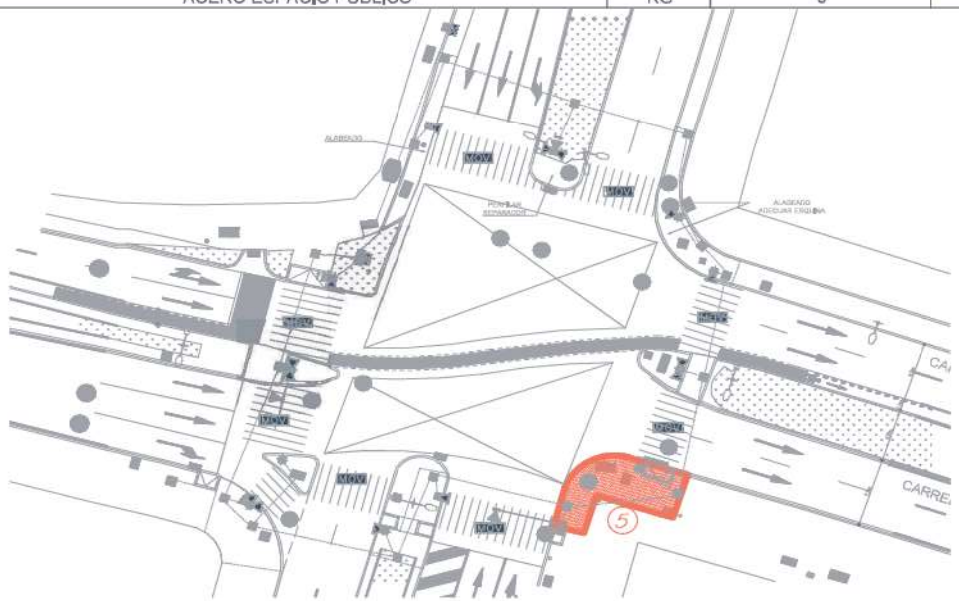

PUNTO	DIMENSIONES	AREA
1		0
2		0
3		0
4		0
5		57,821
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
	TOTAL M2	57,821


KG/M2	M2	PESO
1,3	57,821	75,1673

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
41	LOSETA 40X40	M2			

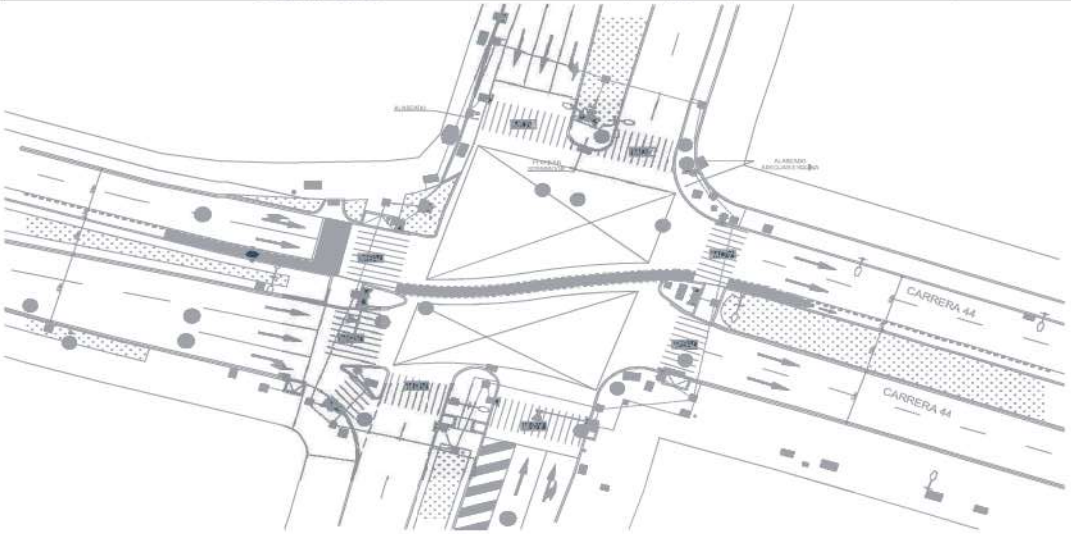

NO PREVISTOS IDENTIFICADOS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
NP	topo 3"	ml	0	7,3	Ejecucion parcial

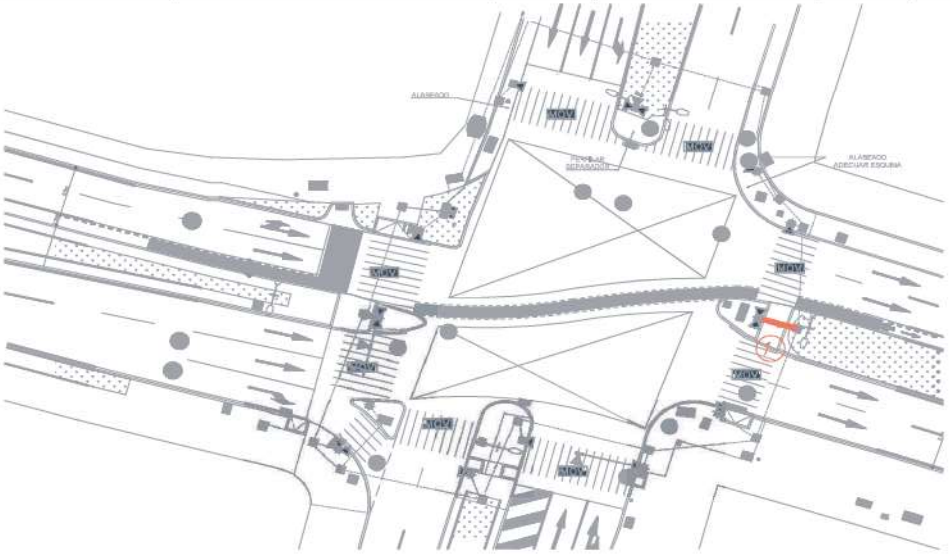

TOPO	LONG (m)
1	7,3
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**7,3**
