ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

PREACTA DE OBRA

CONTRATO:	4152.010.26.1.762.2023	2	FECHA: (dd/mm/aa)
CONTRATISTA:	JC INGENIERIA VIAL SAS		09/11/2023
REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA BP-26002902	DESCRIPCIÓN	CORTE ACTA 01 INCLUYE CL14 x CR66; CL 14 x CR 44; CL14 x CR56 Y CL113E x CR56	

	CONDICIONES CONTRACTUALES					BALANCE 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	+ / -	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES										
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un	4	$ 1.138.436	$ 4.553.743	8,00	$ 9.107.486	2,00	$ 2.276.871	4,00	$ 4.553.743
2	SOCIALIZACIÓN	un	4	$ 3.237.178	$ 12.948.712	7,00	$ 22.660.246	2,00	$ 6.474.356	5,00	$ 16.185.890
					$ 17.502.455		$ 31.767.732		$ 8.751.227		$ 20.739.633
	OBRA CIVIL										
3	RETIRO ANCLAJE	un	12	$ 785.141	$ 9.421.697	33,00	$ 25.908.667	2,00	$ 1.570.283	10,00	$ 7.851.414
4	DEMOLICION DE CAJA	un	4	$ 114.167	$ 456.670	15,00	$ 1.712.512	-	$ -	2,00	$ 228.335
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml	315	$ 152.050	$ 47.895.814	40,60	$ 6.173.625	-	$ -	0,00	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml	110	$ 135.195	$ 14.871.498	153,31	$ 20.726.813	0,80	$ 108.156	0,00	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml	40	$ 161.949	$ 6.477.960	48,23	$ 7.810.801	-	$ -	0,00	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml	80	$ 182.602	$ 14.608.194	125,70	$ 22.953.125	-	$ -	0,00	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml	80	$ 78.110	$ 6.248.783	1,63	$ 127.319	-	$ -	22,50	$ 1.765.281
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml	80	$ 96.183	$ 7.694.674	99,60	$ 9.579.870	63,45	$ 6.102.839	78,79	$ 7.578.293
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml	80	$ 114.077	$ 9.126.157	7,61	$ 868.126	-	$ -	0,00	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml	80	$ 163.046	$ 13.043.673	137,85	$ 22.475.879	66,40	$ 10.826.248	160,46	$ 26.162.347
13	DUCTO 4" TOPO	ml	900	$ 320.070	$ 288.062.834	1.464,20	$ 468.646.223	266,16	$ 85.189.782	587,67	$ 188.095.428
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml	400	$ 366.892	$ 146.676.611	59,80	$ 21.928.153	97,25	$ 35.660.751	0,00	$ -
15	TUBO PUENTE	ml	10	$ 345.403	$ 3.454.034	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
16	CAJA SENCILLA	un	42	$ 1.062.253	$ 44.614.621	100,00	$ 106.225.287	25,00	$ 26.556.322	39,00	$ 41.427.862
17	CAJA DOBLE	un	20	$ 1.736.278	$ 34.725.566	1,00	$ 1.736.278	-	$ -	1,00	$ 1.736.278
18	CAJA PRINCIPAL	un	5	$ 2.239.023	$ 11.195.115	8,00	$ 17.912.184	1,00	$ 2.239.023	4,00	$ 8.956.092
19	ANCLAJE TIPO 1	un	58	$ 1.599.272	$ 92.757.787	99,00	$ 158.327.946	27,00	$ 43.180.349	39,00	$ 62.371.615
20	ANCLAJE TIPO 2	un	2	$ 1.801.281	$ 3.602.561	1,00	$ 1.801.281	-	$ -	0,00	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un	4	$ 1.312.809	$ 5.251.236	3,00	$ 3.936.427	-	$ -	1,00	$ 1.312.809
22	PEDESTAL TIPO 2	un	1	$ 4.169.566	$ 4.169.566	5,00	$ 20.847.828	1,00	$ 4.169.566	2,00	$ 8.339.131
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	5	$ 708.002	$ 3.540.009	5,00	$ 3.540.009	1,00	$ 708.002	1,00	$ 708.002
					$ 767.898.060		$ 923.241.353		$ 216.311.321		$ 358.532.888
	MANTENIMIENTO										
					$ 182.882.606		$ 52.421.862		$ -		$ -
	ESPACIO PUBLICO										
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3	38	$ 158.732	$ 6.033.723	58,54	$ 9.295.109	15,03	$ 2.386.252	41,26	$ 6.550.835
36	SUBBASE	m3	40	$ 147.390	$ 5.895.601	97,96	$ 14.438.327	0,15	$ 22.212	0,00	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLICO	m3	80	$ 914.258	$ 73.140.615	57,09	$ 52.194.972	13,76	$ 12.575.852	37,82	$ 34.581.559
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg	80	$ 11.940	$ 955.211	202,5	$ 2.417.878	87,41	$ 1.043.727	57,88	$ 691.215
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2	45	$ 153.338	$ 6.900.197	6	$ 920.026	-	$ -	0,00	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2	80	$ 140.618	$ 11.249.441	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
41	LOSETA 40X40	m2	80	$ 141.779	$ 11.342.301	6,32	$ 896.042	-	$ -	0,00	$ -
42	BOLARDO M60	un	32	$ 283.137	$ 9.060.392	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un	32	$ 391.882	$ 12.540.230	1	$ 391.882	-	$ -	0,00	$ -
					$ 137.117.711		$ 80.554.236		$ 16.028.042		$ 41.823.609
	TOTAL				$ 262.386.097		$ -		$ -		$ -
					$ 1.105.400.831		$ 1.087.985.182		$ 241.090.591		$ 419.096.130
				TOTAL	$ 1.105.400.831	TOTAL	$ 1.087.985.182	TOTAL		TOTAL	$ 419.096.130

JC INGENIERIA VIAL SAS
CONTRATISTA

SECRETARIA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

Sharon A. Rojas C.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

BALANCE DE OBRA

1

FECHA: (DD/MM/AAAA)

CONTRATO: 4152.010.26.1.762.2023

CONTRATISTA: JC INGENIERIA VIAL SAS

17/10/2023

REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA BP-26002902

DESCRIPCIÓN BALANCE:

Ajuste a catidades por replanteo en obra. Se incluye la interseccion de la C21 K8 (ID: 100099)

CONDICIONES CONTRACTUALES							ULTIMO BALANCE (N/A)		MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
SECCION	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1	1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un	4	$ 1.138.436	$ 4.553.743		$ -	6,00	$ 6.830.614	10,00	$ 11.384.357
1	2	SOCIALIZACIÓN	un	4	$ 3.237.178	$ 12.948.712		$ -	4,00	$ 12.948.712	8,00	$ 25.897.424
Subtotal ACTIVIDADES PRELIMINARES						**$ 17.502.455**		**$ -**		**$ 19.779.326**		**$ 37.281.781**
OBRA CIVIL												
2	3	RETIRO ANCLAJE	un	12	$ 785.141	$ 9.421.697		$ -	13,00	$ 10.206.839	25,00	$ 19.628.536
2	4	DEMOLICION DE CAJA	un	4	$ 114.167	$ 456.670		$ -	11,00	$ 1.255.842	15,00	$ 1.712.512
2	5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml	315	$ 152.060	$ 47.898.814		$ -	- 300,00	-$ 45.617.918	15,00	$ 2.280.896
2	6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml	110	$ 135.195	$ 14.871.498		$ -	- 82,10	-$ 11.099.546	27,90	$ 3.771.953
2	7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml	40	$ 161.949	$ 6.477.960		$ -	- 31,70	-$ 5.133.784	8,30	$ 1.344.177
2	8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml	80	$ 182.602	$ 14.608.194		$ -	- 56,30	-$ 10.280.516	23,70	$ 4.327.677
2	9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml	80	$ 78.110	$ 6.248.783		$ -	- 68,07	-$ 5.316.933	11,93	$ 931.850
2	10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml	80	$ 96.183	$ 7.694.674		$ -	100,02	$ 9.620.267	180,02	$ 17.314.941
2	11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml	80	$ 114.077	$ 9.126.157		$ -	- 32,02	-$ 3.652.744	47,98	$ 5.473.412
2	12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml	80	$ 163.046	$ 13.043.673		$ -	181,50	$ 29.592.833	261,50	$ 42.636.506
2	13	DUCTO 4" TOPO	ml	900	$ 320.070	$ 288.062.834		$ -	377,91	$ 120.957.584	1.277,91	$ 409.020.417
2	14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml	400	$ 366.692	$ 146.676.611		$ -	- 250,10	-$ 91.709.551	149,90	$ 54.967.060
2	15	TUBO PUENTE	ml	10	$ 345.403	$ 3.454.034		$ -	- 10,00	-$ 3.454.034	-	$ -
2	16	CAJA SENCILLA	un	42	$ 1.062.253	$ 44.614.621		$ -	57,00	$ 60.548.414	99,00	$ 105.163.034
2	17	CAJA DOBLE	un	20	$ 1.736.278	$ 34.725.566		$ -	- 18,00	-$ 31.253.010	2,00	$ 3.472.557
2	18	CAJA PRINCIPAL	un	5	$ 2.239.023	$ 11.195.115		$ -	6,00	$ 13.434.138	11,00	$ 24.629.253
2	19	ANCLAJE TIPO 1	un	58	$ 1.599.272	$ 92.757.787		$ -	34,00	$ 54.375.254	92,00	$ 147.133.041
2	20	ANCLAJE TIPO 2	un	2	$ 1.801.281	$ 3.602.561		$ -	- 1,00	-$ 1.801.281	1,00	$ 1.801.281
2	21	PEDESTAL TIPO 1	un	4	$ 1.312.809	$ 5.251.236		$ -	-	$ -	4,00	$ 5.251.236
2	22	PEDESTAL TIPO 2	un	1	$ 4.169.566	$ 4.169.566		$ -	6,00	$ 25.017.394	7,00	$ 29.186.959
2	23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	5	$ 708.002	$ 3.540.009		$ -	1,00	$ 708.002	6,00	$ 4.248.011
Subtotal OBRA CIVIL						**$ 767.898.060**		**$ -**		**$ 116.397.249**		**$ 884.295.309**
POSTES SEMAFORICOS Y MANTENIMIENTO												
3	24	T1	un	16	$ 2.487.997	$ 39.807.954		$ -	- 14,00	-$ 34.831.959	2,00	$ 4.975.994
3	25	T1X	un	4	$ 4.974.565	$ 19.898.259		$ -	- 4,00	-$ 19.898.259	-	$ -
3	26	T2 (3.5m)	un	4	$ 4.900.898	$ 19.603.591		$ -	- 3,00	-$ 14.702.693	1,00	$ 4.900.898
3	27	T2 (4.5m)	un	4	$ 6.563.025	$ 26.252.100		$ -	- 3,00	-$ 19.689.075	1,00	$ 6.563.025
3	28	T2 (5.5m)	un	4	$ 7.089.081	$ 28.356.324		$ -	- 1,00	-$ 7.089.081	3,00	$ 21.267.243
3	29	T2 (6.5m)	un	4	$ 7.625.620	$ 30.502.480		$ -	- 4,00	-$ 30.502.480	-	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							ULTIMO BALANCE (N/A)		MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
SECCION	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
3	30	T2 (8.5m)	un	1	$ 9.811.421	$ 9.811.421		$ -	- 1,00	-$ 9.811.421	-	$ -
3	31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un	10	$ 373.481	$ 3.734.807		$ -	- 10,00	-$ 3.734.807	-	$ -
3	32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALLER	un	10	$ 338.696	$ 3.386.962		$ -	- 10,00	-$ 3.386.962	-	$ -
3	33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml	1	$ 761.161	$ 761.161		$ -	- 1,00	-$ 761.161	-	$ -
3	34	REPARACIÓN BASE POSTE	un	1	$ 767.546	$ 767.546		$ -	- 1,00	-$ 767.546	-	$ -
Subtotal POSTES SEMAFORICOS Y MANTENIMIENTO						**$ 182.882.606**		**$ -**		**-$ 146.175.446**		**$ 37.707.160**
OBRAS DE ESPACIO PUBLICO												
4	35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3	38	$ 158.782	$ 6.033.723		$ -	59,97	$ 9.522.152	97,97	$ 15.555.875
4	36	SUBBASE	m3	40	$ 147.390	$ 5.895.601		$ -	66,08	$ 9.739.931	106,08	$ 15.635.532
4	37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLICO	m3	80	$ 914.258	$ 73.140.615		$ -	1,17	$ 1.066.024	81,17	$ 74.206.640
4	38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg	80	$ 11.940	$ 955.211		$ -	271,61	$ 3.243.015	351,61	$ 4.198.226
4	39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2	45	$ 153.338	$ 6.900.197		$ -	50,67	$ 7.769.621	95,67	$ 14.669.818
4	40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2	80	$ 140.618	$ 11.249.441		$ -	- 80,00	-$ 11.249.441	0,00	$ -
4	41	LOSETA 40X40	m2	80	$ 141.779	$ 11.342.301		$ -	- 72,30	-$ 10.250.605	7,70	$ 1.091.696
4	42	BOLARDO M60	un	32	$ 283.137	$ 9.060.392		$ -	- 32,00	-$ 9.060.392	0,00	$ -
4	43	BOLARDO M62-M63	un	32	$ 391.882	$ 12.540.230		$ -	- 31,00	-$ 12.148.347	1,00	$ 391.882
Subtotal OBRAS DE ESPACIO PUBLICO						**$ 137.117.711**		**$ -**		**-$ 11.368.041**		**$ 125.749.670**
TOTAL						**$ 1.105.400.831**		**$ -**		**-$ 20.366.911**		**$ 1.085.033.920**

CUADRO RESUMEN		
Valor total del contrato	$	1.105.400.831
Valor proyectado a ejecutar	$	1.085.033.920
Saldo previsto a favor de la entidad	$	20.366.911

OBSERVACIONES

Debido al siniestro ocurrido el 18 de septiembre de 2023 en la Calle 21 con Carrera 8 se requiere reparar esta interseccion de manera prioritaria; como resultado de la incorporacion de esta interseccion en el presupuesto no es posible ejecutar las actividades requeridas por la secretaria de movilidad en la Calle 73 con Carrera 25U. En el presente balance se incluye solamente el diseño de esta intersección; Se estudiará la disponibilidad de recursos, así como el plazo contractual restante y capacidad de ejecución del contratista para ejecutar estas obras.

JC INGENIERIA VIAL SAS
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 02

CALLE 11 x CARRERA 6


							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 02	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	1,00	$ 785.141	-	$ -	1,00	$ 785.141
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	2,00	$ 192.366	-	$ -	0,40	$ 38.473
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	1,00	$ 1.736.278	-	$ -	1,00	$ 1.736.278
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	1,00	$ 1.599.272	-	$ -	1,00	$ 1.599.272
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 4.313.057**		**$ -**		**$ 4.159.164**
	MANTENIMIENTO											
24	T1	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALL	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	0,6	$ 95.269	-	$ -	0,48	$ 76.001
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	1,2	$ 176.868	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	0,6	$ 548.555	-	$ -	0,45	$ 408.353
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -

41	LOSETA 40X40	m2		$	141.779,00		$ -	0	$ -		-	$ -		-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$	283.137,00		$ -	0	$ -		-	$ -		-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$	391.882,00		$ -	0	$ -		-	$ -		-	$ -
							$ -		**$ 820.692**			**$ -**			**$ 484.354**
	TOTAL calle 11 x carrera 6						**$ -**		**$ 5.133.749**			**$ -**			**$ 4.643.518**

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
3	RETIRO ANCLAJE	UN	0	1	Ejecutado 100%

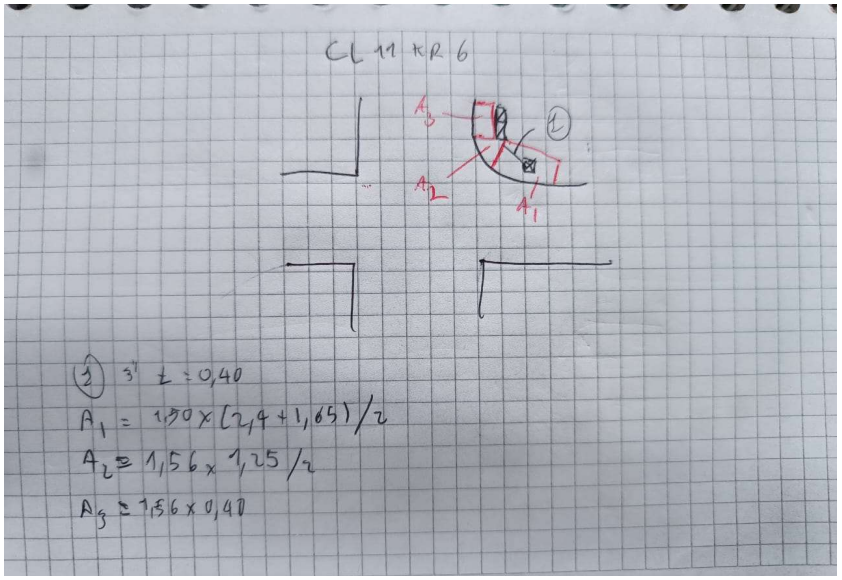

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ML	0	0,4	Ejecutado 100%

DUCTO	LONG (m)
1	0,4
2	
3	
4	
TOTAL	**0,4**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
17	CAJA DOBLE	UN	0	1	Ejecutado 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
35	DEMOLICION DE ANDEN	M3	0	0,48	Ejecutado 100%

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	((1.5*(2.4+1.85))/2)*0.1	0,10	0,32
2	((1.56*1.25)/2)*0.1	0,10	0,10
3	(1.56*0.4)*0.1	0,10	0,06
TOTAL			0,48

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
37	CONCRETO 3000 PSI ESPACIO PUBLICO	M3	0	0,45	Ejecucion parcial

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	(((1.5*(2.4+1.85))/2)-(0.8*0.8))*	0,10	0,29
2	((1.56*1.25)/2)*0.1	0,10	0,10
3	(1.56*0.4)*0.1	0,10	0,06
TOTAL			0,45

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 02

CALLE 13E x CARRERA 56

							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 02	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	-	$ -	1,00	$ 1.138.436
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	1,00	$ 3.237.178	-	$ -	1,00	$ 3.237.178
						$ -		**$ 4.375.614**		**$ -**		**$ 4.375.614,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	4,00	$ 3.140.564	-	$ -	2,00	$ 1.570.282
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	2,00	$ 228.334		$ -	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	1,63	$ 127.319	-	$ -	9,74	$ 760.791
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	11,80	$ 1.134.959	-	$ -	9,88	$ 950.288
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	0,51	$ 58.179	-	$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	37,25	$ 6.073.464	-	$ -	27,33	$ 4.456.047
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	182,36	$ 58.367.965	-	$ -	98,70	$ 31.590.909
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	10,00	$ 10.622.530	-	$ -	5,00	$ 5.311.265
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	1,00	$ 1.736.278	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	1,00	$ 2.239.023	-	$ -	1,00	$ 2.239.023
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	6,00	$ 9.595.632	-	$ -	5,00	$ 7.996.360
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	1,00	$ 4.169.566	-	$ -	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	1,00	$ 708.002	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 98.201.816**		**$ -**		**$ 54.874.965**
	MANTENIMIENTO											
24	T1	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALL	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	19,11	$ 3.034.324	-	$ -	15,95	$ 2.532.936
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	25,5	$ 3.758.445	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	18,46	$ 16.877.203	-	$ -	15,95	$ 14.584.504
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -

41	LOSETA 40X40	m2		$	141.779,00		$ -	4,32	$	612.485	-	$	-	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$	283.137,00		$ -	0	$	-	-	$	-	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$	391.882,00		$ -	0	$	-	-	$	-	-	$ -
							$ -		**$**	**24.282.457**		**$**	**-**		**$ 17.117.440**
	TOTAL calle 13E x carrera 56						**$ -**		**$**	**126.859.887**		**$**	**-**		**$ 76.368.019**


JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
1	Diseño interseccion	UN	0	1	Ejecutado 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
2	SOCIALIZACIÓN	UN	0	2	Ejecutado 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
3	RETIRO ANCLAJE	UN	0	2	Ejecutado 100%

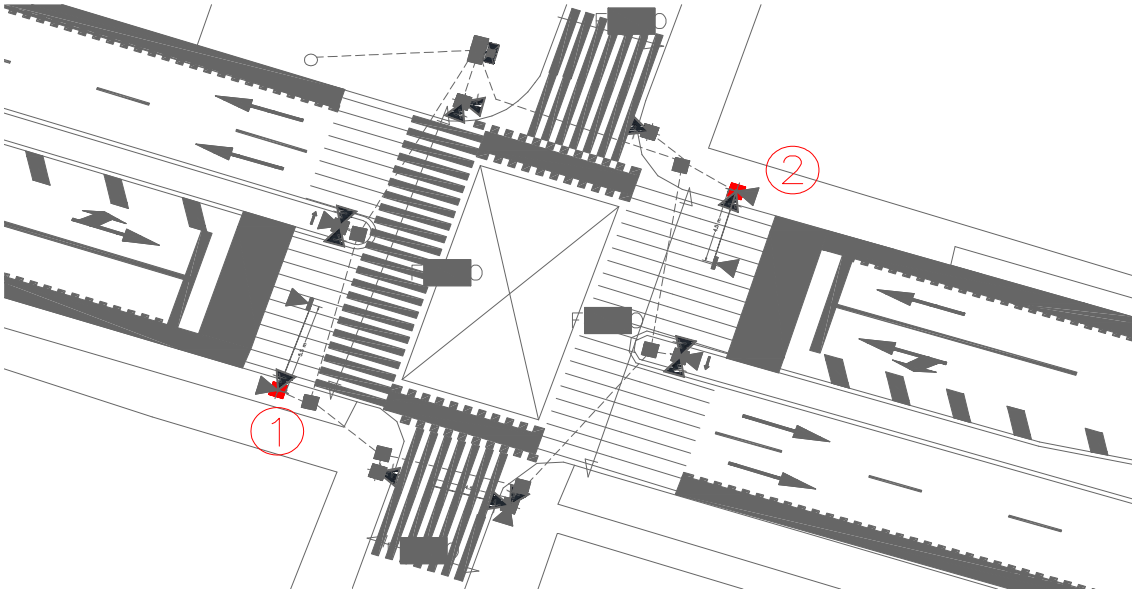


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ML	0	0	

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
8	DUCTO 4X2 ZONA DURA	ML	0	0	


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ML	0	9,74	

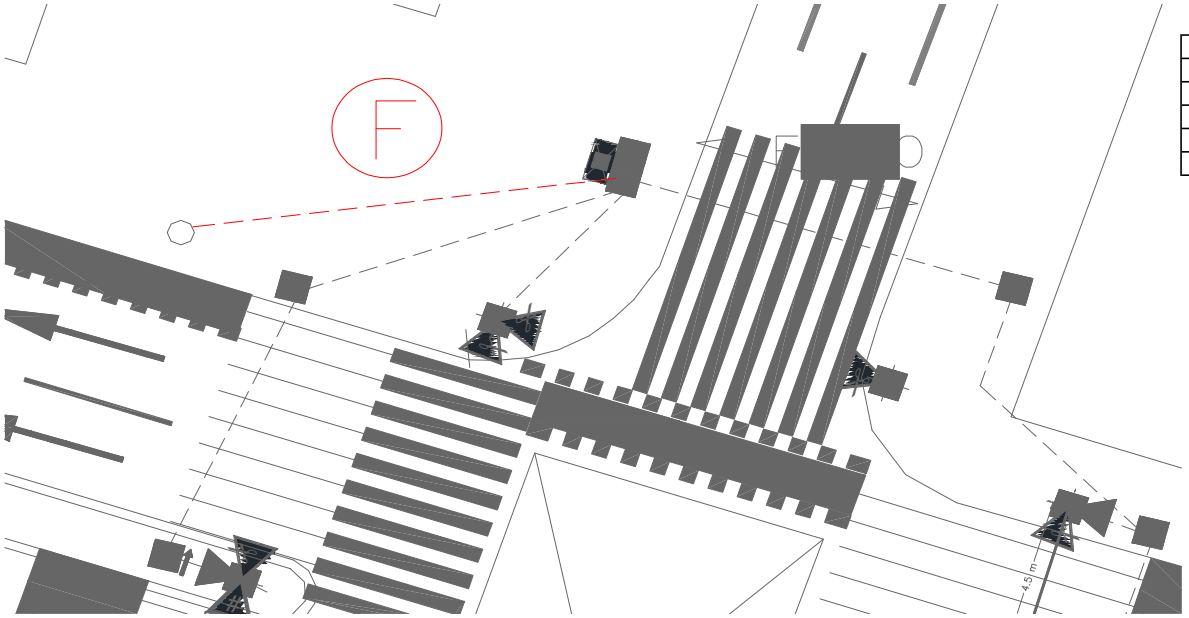


DUCTO	LONG (m)
F	9,74
TOTAL	**9,74**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ML	0	9,88	Ejecucion parcial

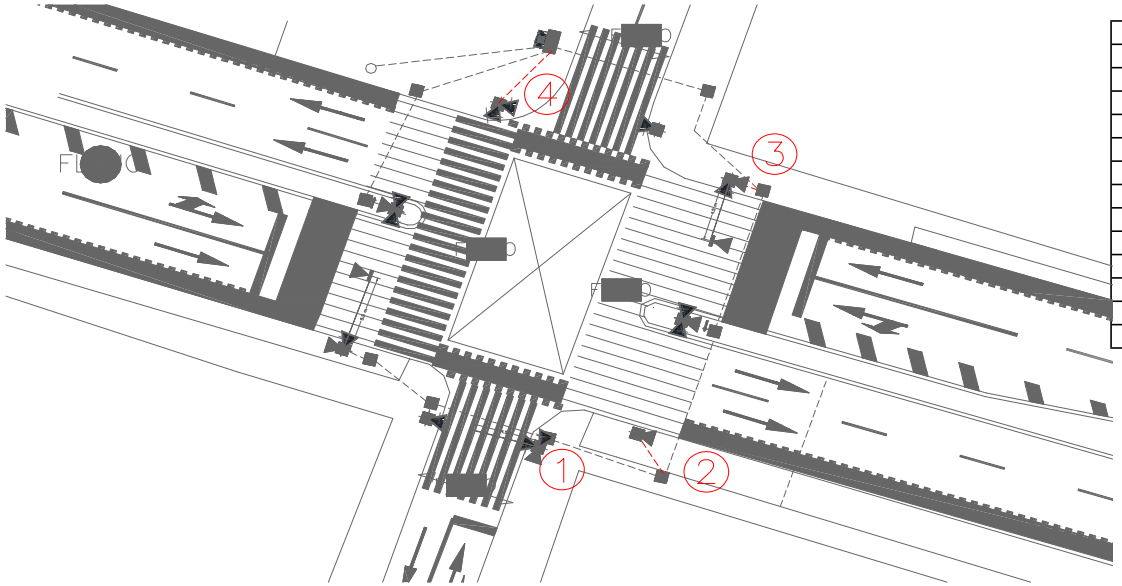


DUCTO	LONG (m)
1	0,6
2	3,66
3	0,8
4	4,82
5	
6	
TOTAL	**9,88**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ML	0	27,33	Ejecucion parcial

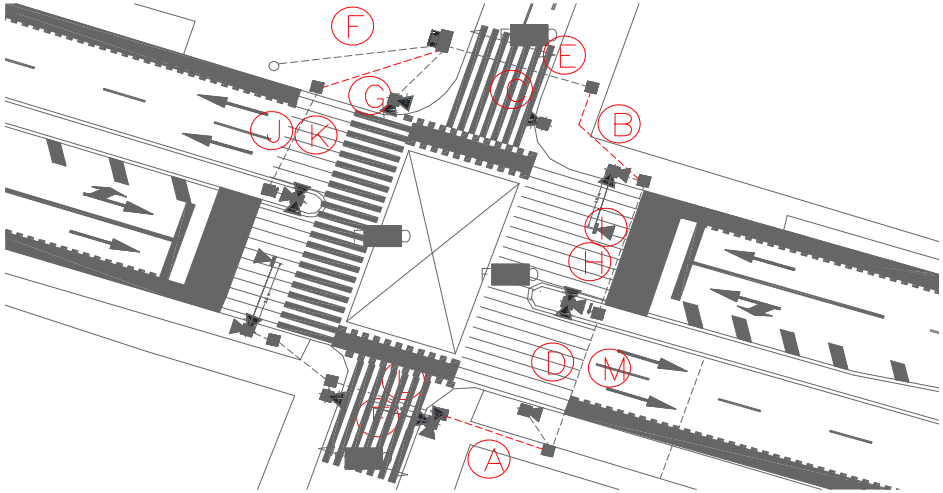


DUCTO	LONG (m)
A	6,56
B	8,6
C	
D	
E	
F	
G	12,17
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
TOTAL	**27,33**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
13	DUCTO 4" TOPO	ML	0	98,7	Ejecucion parcial

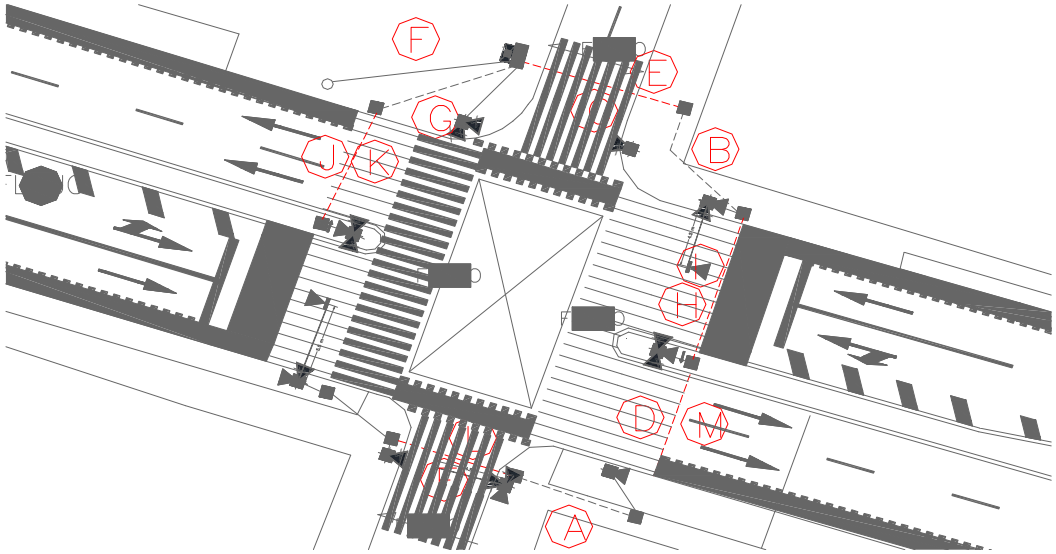


TOPO	LONG (m)
A	0
B	0
C	10,95
D	7,3
E	10,95
F	5,9
G	0
H	9
I	9
J	7,2
K	7,2
L	5,9
M	7,3
N	9
O	9
P	
Q	
TOTAL	**98,7**


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
16	CAJA SENCILLA	UN	0	5	Ejecucion parcial

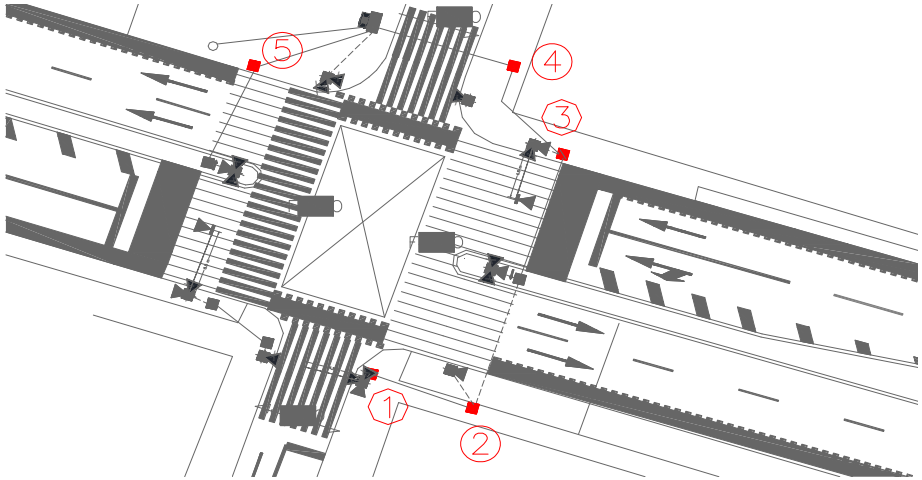

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
18	CAJA PRINCIPAL	UN	0	1	

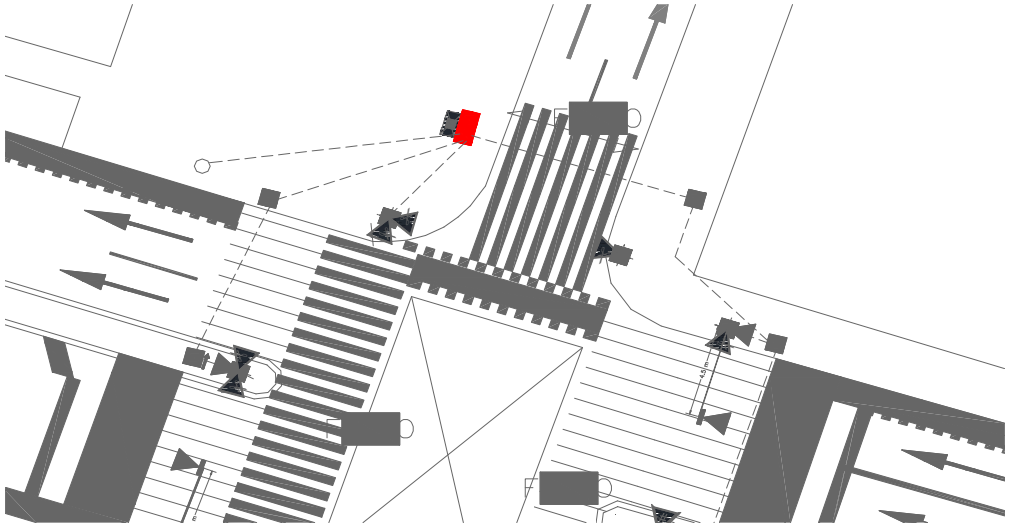


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
19	ANCLAJE TIPO 1	UN	0	5	Ejecucion parcial

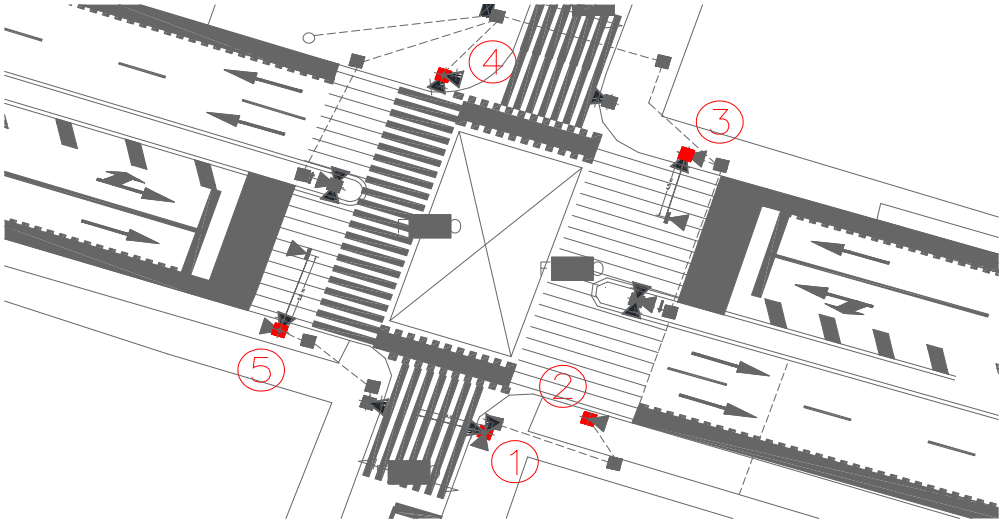

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
22	PEDESTAL TIPO 2	UN	0	0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	UN	0	0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
35	DEMOLICION DE ANDEN	M3	0	15,95	Ejecucion parcial

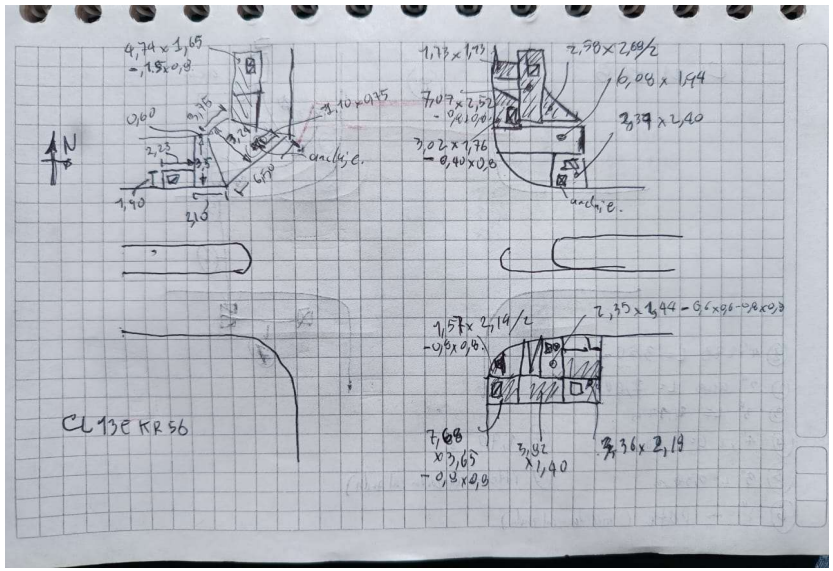


PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	((7.68*3.65)-(0.8*0.8))*0.1	0,10	2,74
2	(3.82*1.4)*0.1	0,10	0,53
3	3.36*2.18*0.1	0,10	0,73
4	(((1.57*2.19)/2)-(0.8*0.8))*0.1	0,10	0,11
5	((2.35*1.44)-(0.6*0.6)-(0.8*0.8)	0,10	0,24
6	((2.37*2.4)-((0.8*0.8))*2)*0.1	0,10	0,44
7	(6.08*1.94)*0.1	0,10	1,18
8	((7.07*2.52)-(0.8*0.8))*0.1	0,10	1,72
9	((2.58*2.68)/2)*0.1	0,10	0,35
10	(1.73*1.13)*0.1	0,10	0,20
11	((3.02*1.76)-(0.9*0.8))*0.1	0,10	0,46
12	((2.23*1.9)-(0.8*0.8))*0.1	0,10	0,36
13	((0.6+2.1)/2)*3.5	0,10	4,73
14	((3.24*5.13)-(1.1*0.75)-(0.8*0.8	0,10	1,51
15	(4.74*1.65)*0.1	0,10	0,66
TOTAL			15,95

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
36	SUBBASE	M3		0,0	Ejecucion parcial

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			0,000

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
37	CONCRETO 3000 PSI ESPACIO PUBLICO	M3	0	15,95	Ejecucion parcial

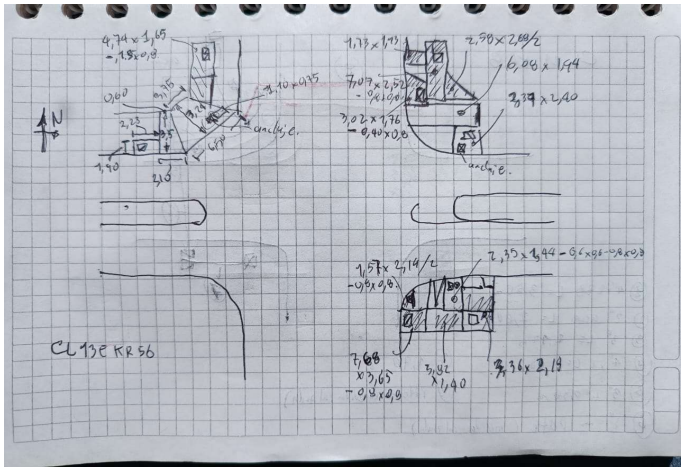

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	((7.68*3.65)-(0.8*0.8))*0.1	0,10	2,74
2	(3.82*1.4)*0.1	0,10	0,53
3	3.36*2.18*0.1	0,10	0,73
4	(((1.57*2.19)/2)-(0.8*0.8))*0.1	0,10	0,11
5	((2.35*1.44)-(0.6*0.6)-(0.8*0.8)	0,10	0,24
6	((2.37*2.4)-((0.8*0.8))*2)*0.1	0,10	0,44
7	(6.08*1.94)*0.1	0,10	1,18
8	((7.07*2.52)-(0.8*0.8))*0.1	0,10	1,72
9	((2.58*2.68)/2)*0.1	0,10	0,35
10	(1.73*1.13)*0.1	0,10	0,20
11	((3.02*1.76)-(0.9*0.8))*0.1	0,10	0,46
12	((2.23*1.9)-(0.8*0.8))*0.1	0,10	0,36
13	((0.6+2.1)/2)*3.5	0,10	4,73
14	((3.24*5.13)-(1.1*0.75)-(0.8*0.8	0,10	1,51
15	(4.74*1.65)*0.1	0,10	0,66
TOTAL			15,95

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 02

CALLE 21 x CARRERA 8

							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 02	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	-	$ -	-	$ -
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	1,00	$ 3.237.178	-	$ -	1,00	$ 3.237.178
						$ -		**$ 4.375.614**		**$ -**		**$ 3.237.178,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	2,00	$ 1.570.282	-	$ -	1,00	$ 785.141
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	1,00	$ 114.167		$ -	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	2,00	$ 304.120	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -	5,00	$ 675.975	-	$ -		$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	4,20	$ 403.969
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	14,00	$ 2.282.644	-	$ -	14,10	$ 2.298.949
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	27,00	$ 8.641.890	-	$ -	-	$ -
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	4,00	$ 4.249.012	-	$ -	3,00	$ 3.186.759
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	1,00	$ 2.239.023	-	$ -	1,00	$ 2.239.023
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	4,00	$ 6.397.088	-	$ -	4,00	$ 6.397.088
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	1,00	$ 1.312.809	-	$ -	1,00	$ 1.312.809
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	1,00	$ 708.002	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 28.495.012**		**$ -**		**$ 16.623.738**
	MANTENIMIENTO											
24	T1	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALL	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**

ESPACIO PUBLICO													
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	3	$ 476.346	-	$ -	3,18	$ 505.342
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	4	$ 589.560	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	3	$ 2.742.774	-	$ -	3,18	$ 2.909.731
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
41	LOSETA 40X40	m2		$ 141.779,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$ 283.137,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$ 391.882,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 3.808.680**		**$ -**		**$ 3.415.073**
	TOTAL calle 21 x carrera 8					**$ -**		**$ 36.679.306**		**$ -**		**$ 23.275.989**


JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
1	Diseño interseccion	UN	0	0	Ejecucion parcial

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
2	SOCIALIZACIÓN	UN	0	1	Ejecutado 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
3	RETIRO ANCLAJE	UN	0	1	Ejecucion parcial

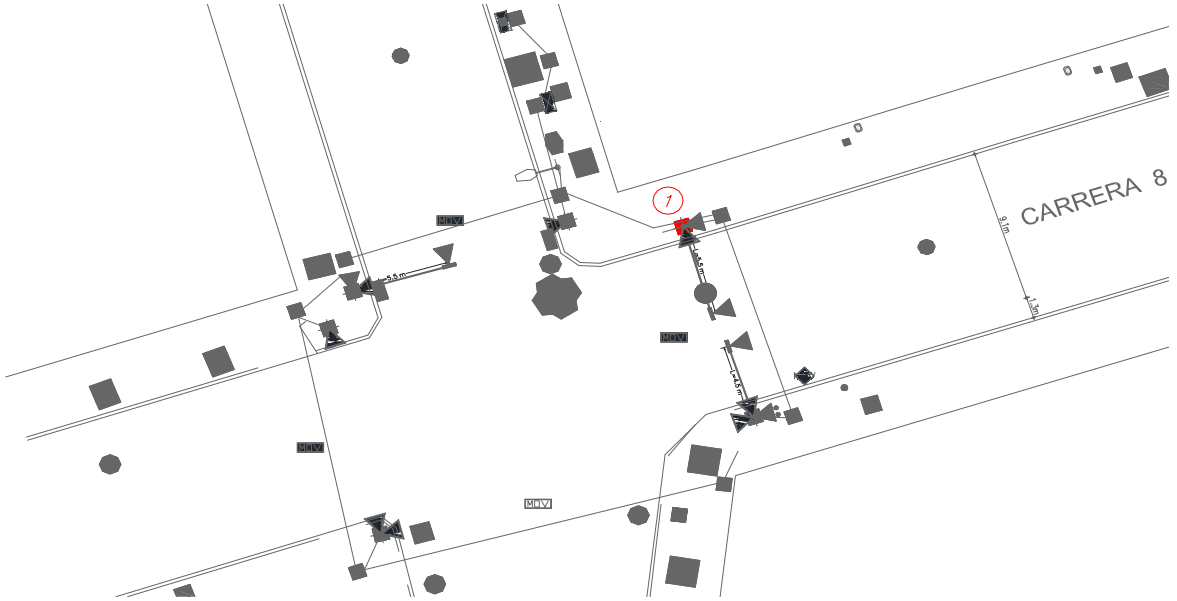

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ML	0	0	

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
TOTAL	


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ML	0	0	

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
8	DUCTO 4X2 ZONA DURA	ML	0	0	


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ML	0	4,2	Ejecucion parcial

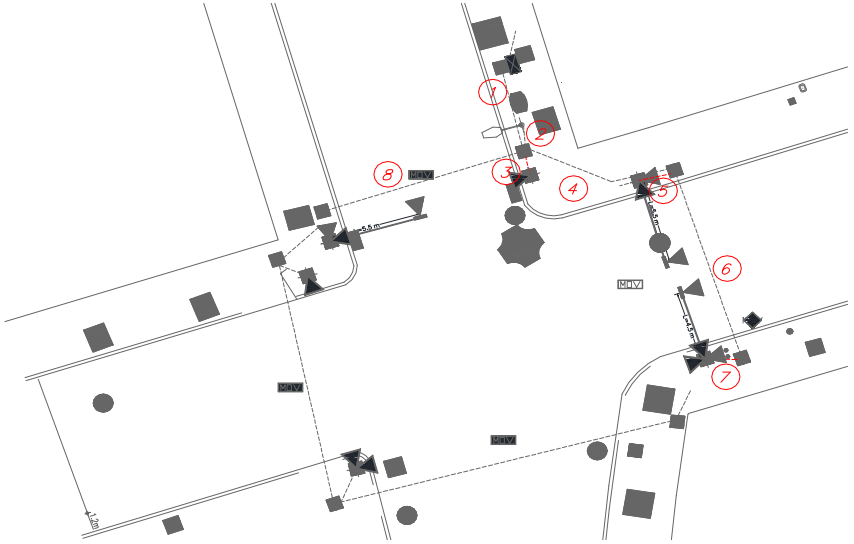

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	2,12
4	
5	0,38
6	
7	1,7
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**4,2**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ML	0	14,1	Ejecucion parcial

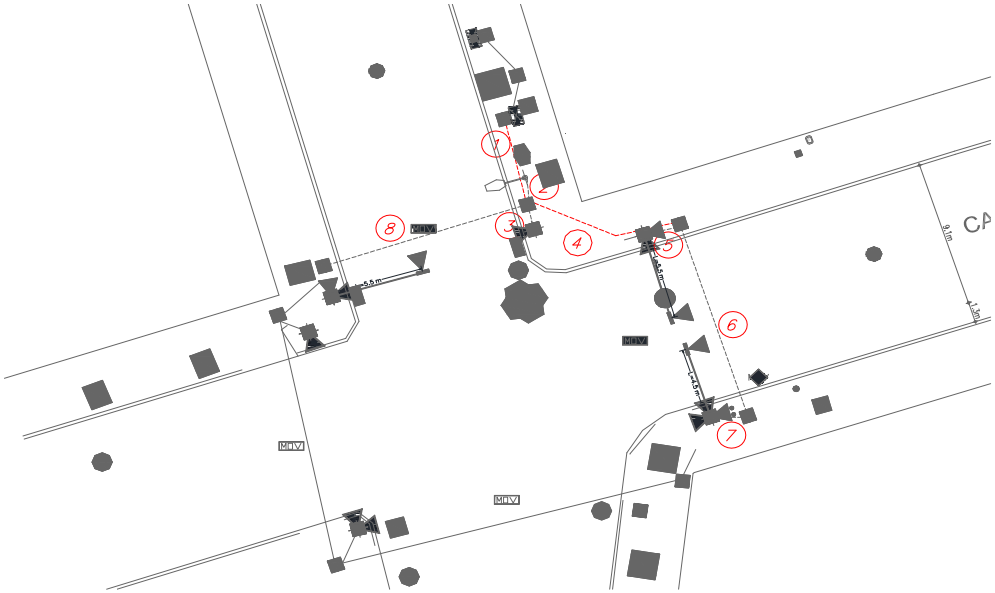


DUCTO	LONG (m)
1	3,5
2	
3	
4	10,6
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**14,1**


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
13	DUCTO 4" TOPO	ML	0	0	Ejecucion parcial

TOPO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**0**


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
16	CAJA SENCILLA	UN	0	3	Ejecucion parcial

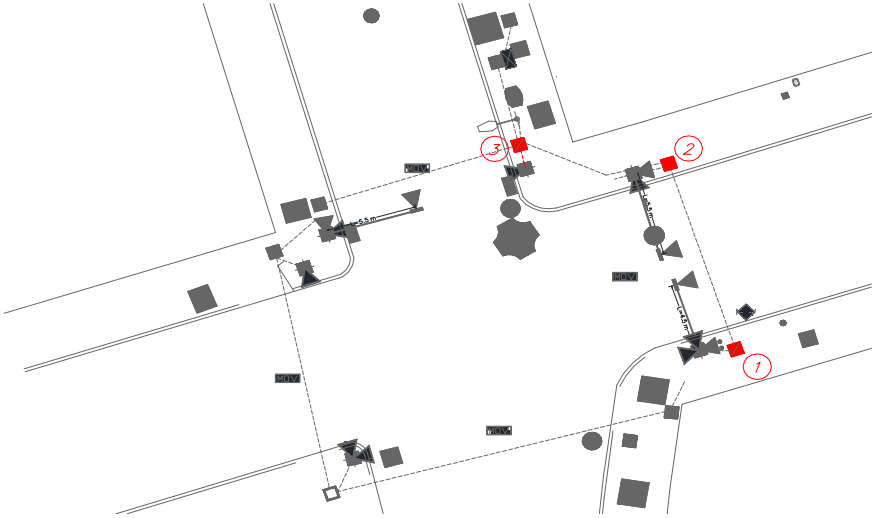

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
18	CAJA PRINCIPAL	UN	0	1	

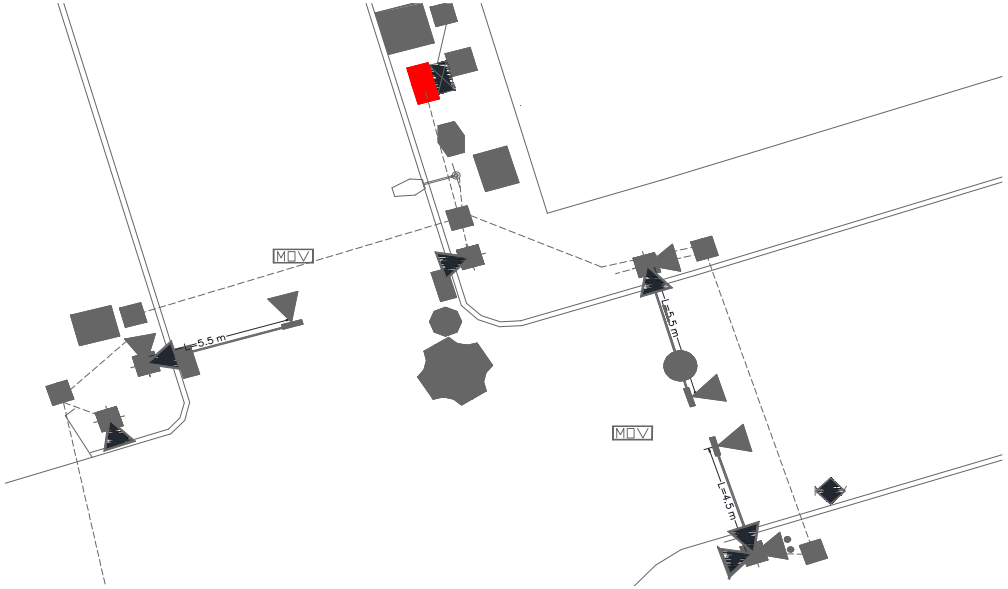


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
19	ANCLAJE TIPO 1	UN	0	4	Ejecucion parcial

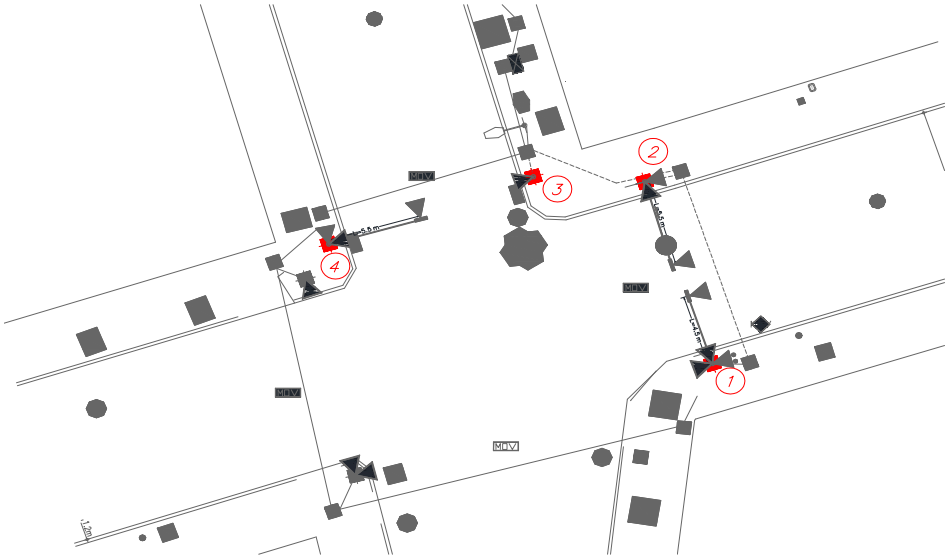

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
21	PEDESTAL TIPO 1	UN	0	0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	UN			

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
35	DEMOLICION DE ANDEN	M3	0	3,18	Ejecucion parcial

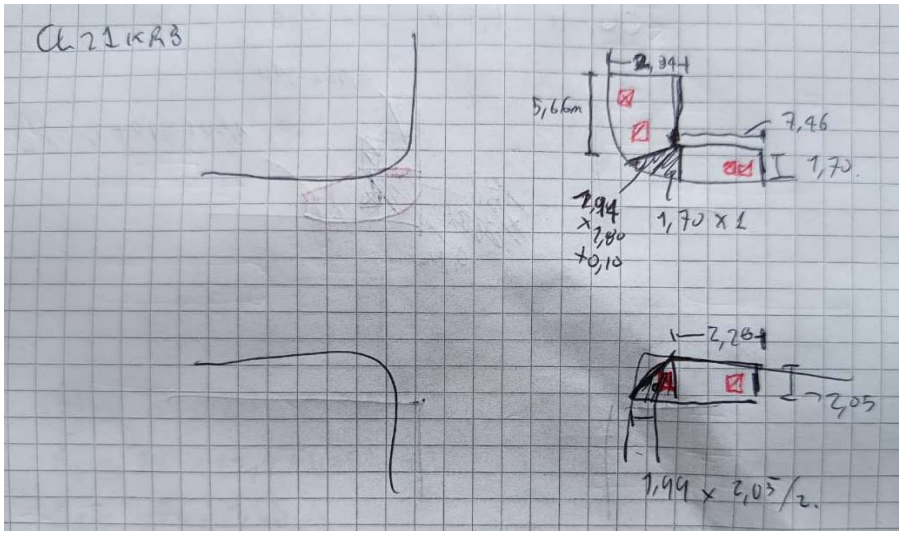


PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	(2.28*2.05)*0.1	0,10	0,47
2	((1.99*2.05)/2)*0.1	0,10	0,20
3	((2.34*5.66)-(0.8*0.8)-(0.8*0.8))*0.1	0,10	1,20
4	((7.46*1.7)-(0.8*0.8)-(0.8*0.8))*0.1	0,1	1,14
5	((1.94*1.8)/2)*0.1	0,1	0,17
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			3,18

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
36	SUBBASE	M3		0	Ejecucion parcial

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			0,000

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
37	CONCRETO 3000 PSI ESPACIO PUBLICO	M3	0	3,18	Ejecucion parcial

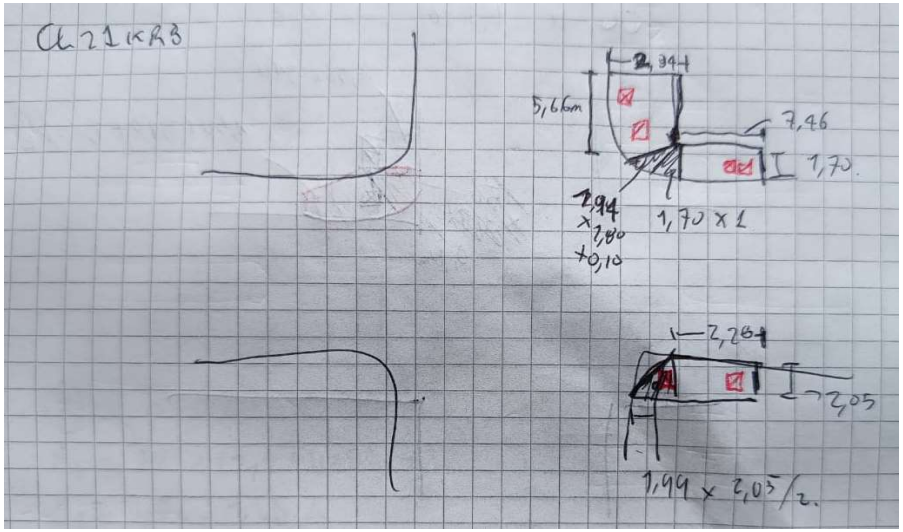

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	(2.28*2.05)*0.1	0,10	0,47
2	((1.99*2.05)/2)*0.1	0,10	0,20
3	((2.34*5.66)-(0.8*0.8)-(0.8*0.8))*0.1	0,10	1,20
4	((7.46*1.7)-(0.8*0.8)-(0.8*0.8))*0.1	0,1	1,14
5	((1.94*1.8)/2)*0.1	0,1	0,17
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			3,18

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	KG	0	0	Ejecucion parcial


PUNTO	DIMENSIONES	AREA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
	TOTAL M2	0

KG/M2	M2	PESO
1,3	0	0

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
41	LOSETA 40X40	M2			

NO PREVISTOS IDENTIFICADOS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
NP	topo 3"	ml	0	0	Ejecucion parcial

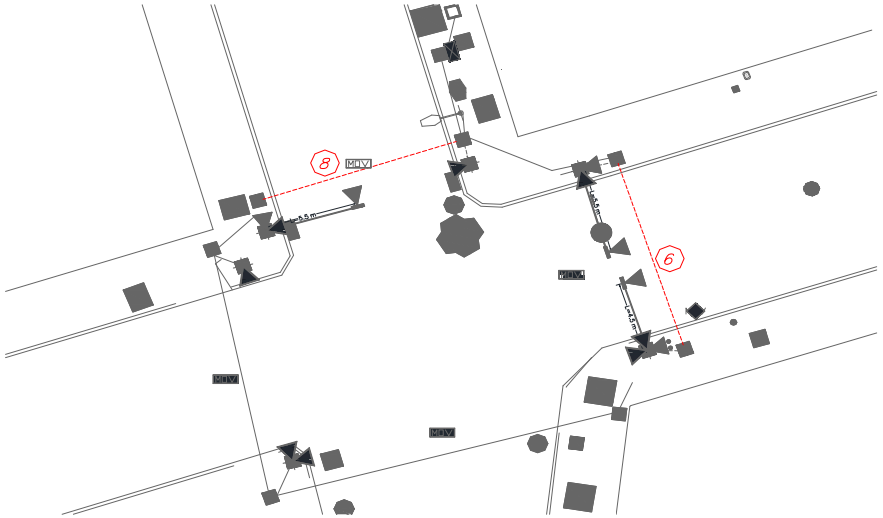

TOPO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	12,5
7	
8	12,5
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**25**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 02

CALLE 14 x CARRERA 39

							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 02	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	-	$ -	1,00	$ 1.138.436
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	1,00	$ 3.237.178	-	$ -	1,00	$ 3.237.178
						$ -		**$ 4.375.614**		**$ -**		**$ 4.375.614,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	2,00	$ 1.570.282	-	$ -	-	$ -
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	1,00	$ 114.167		$ -	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	3,00	$ 456.180	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -	33,00	$ 4.461.435	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	42,00	$ 7.669.284	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	13,00	$ 1.250.379	-	$ -	-	$ -
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	23,00	$ 3.750.058	-	$ -	47,23	$ 7.700.663
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	220,00	$ 70.415.400	-	$ -	166,46	$ 53.278.852
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	15,00	$ 15.933.795	-	$ -	4,00	$ 4.249.012
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	1,00	$ 2.239.023	-	$ -	-	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	16,00	$ 25.588.352	-	$ -	4,00	$ 6.397.088
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	1,00	$ 1.801.281	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	1,00	$ 4.169.566	-	$ -	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	1,00	$ 708.002	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 140.127.204**		**$ -**		**$ 71.625.615**
	MANTENIMIENTO											
24	T1	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALL	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**


ESPACIO PUBLICO													
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	1	$ 158.782	-	$ -	-	$ -
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	1	$ 147.390	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	2	$ 1.828.516	-	$ -	-	$ -
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -	6	$ 920.028	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
41	LOSETA 40X40	m2		$ 141.779,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$ 283.137,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$ 391.882,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 3.054.716**		**$ -**		**$ 0**
	TOTAL calle 14 x carrera 39					**$ -**		**$ 147.557.534**		**$ -**		**$ 76.001.229**

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

Sharon A. Rojas L

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
1	Diseño interseccion	UN	0	1	Ejecutado 100%

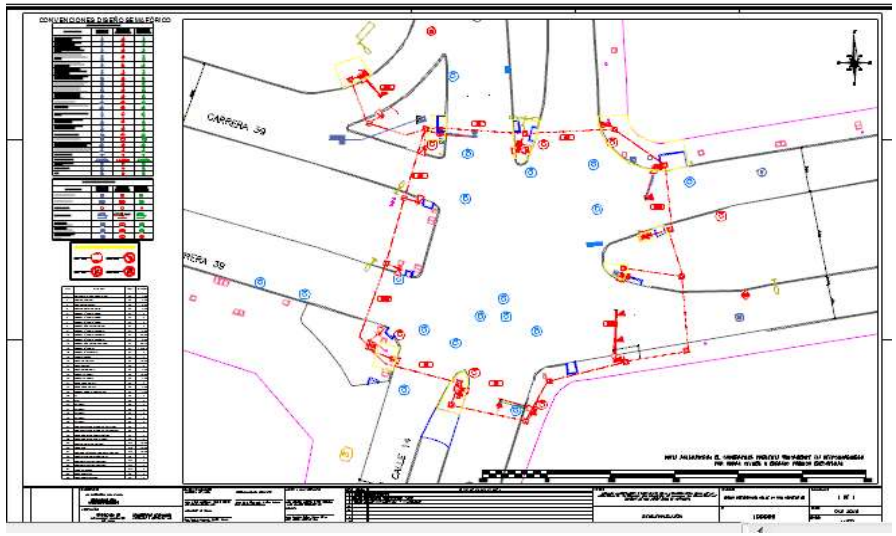

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
2	SOCIALIZACIÓN	UN	0	1	Ejecutado 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
3	RETIRO ANCLAJE	UN	0	0	Ejecucion parcial

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ML	0	0	

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ML	0	0	

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
8	DUCTO 4X2 ZONA DURA	ML	0	0	

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ML	0	0	Ejecucion parcial


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**0**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ML	0	47,23	Ejecucion parcial

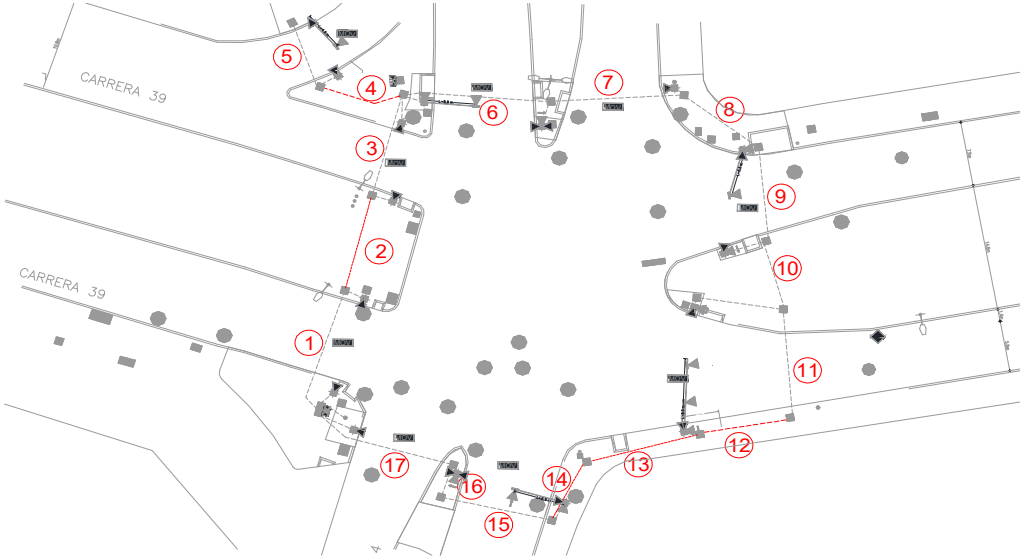


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	8,5
5	
6	
7	
8	
9	
10	10,8
11	
12	8,9
13	11,78
14	7,25
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
TOTAL	**47,23**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
13	DUCTO 4" TOPO	ML	0	166,46	Ejecucion parcial

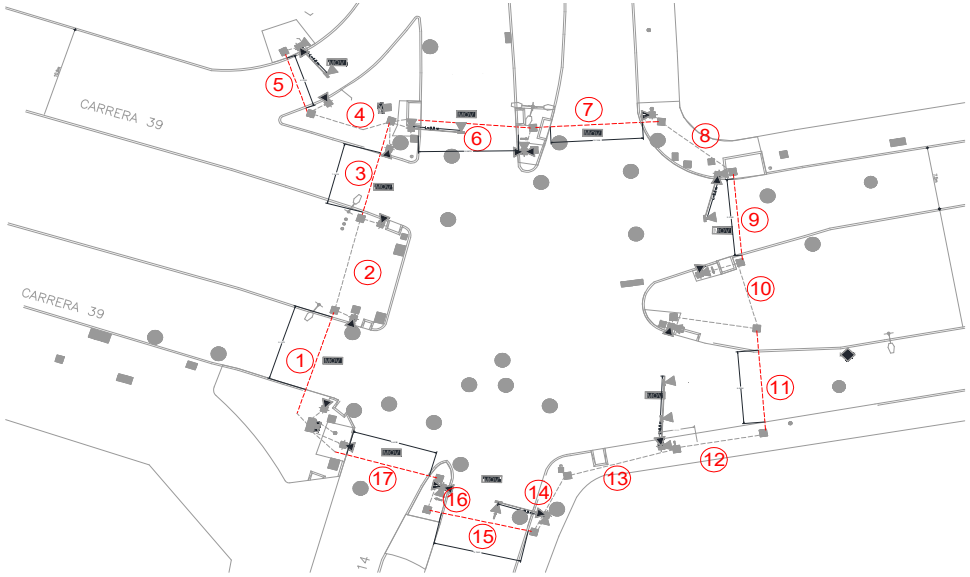


DUCTO	LONG (m)
1	18,4
2	14,8
3	
4	0
5	16,78
6	21,98
7	20,28
8	
9	18,46
10	0
11	17,36
12	0
13	0
14	0
15	19,5
16	
17	18,9
18	
19	
20	
21	
22	
TOTAL	**166,46**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
16	CAJA SENCILLA	UN	0	4	Ejecucion parcial

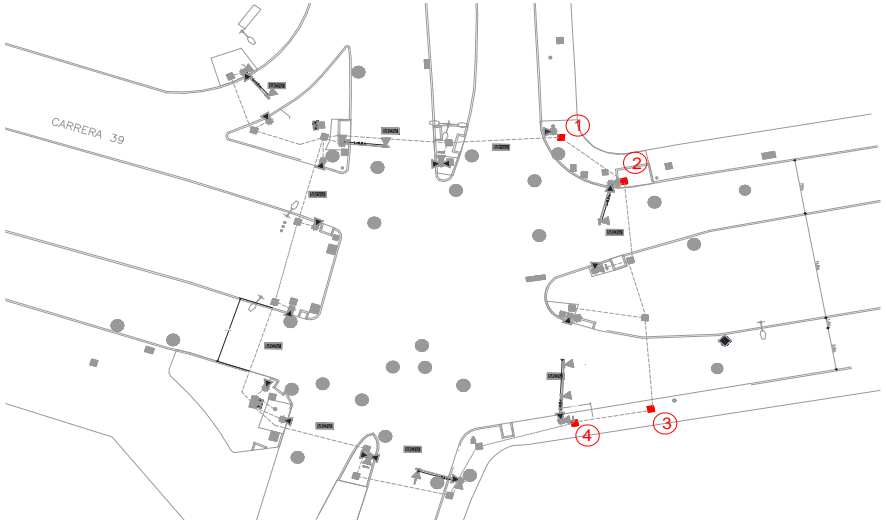

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
18	CAJA PRINCIPAL	UN	0	0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
19	ANCLAJE TIPO 1	UN	0	4	Ejecucion parcial

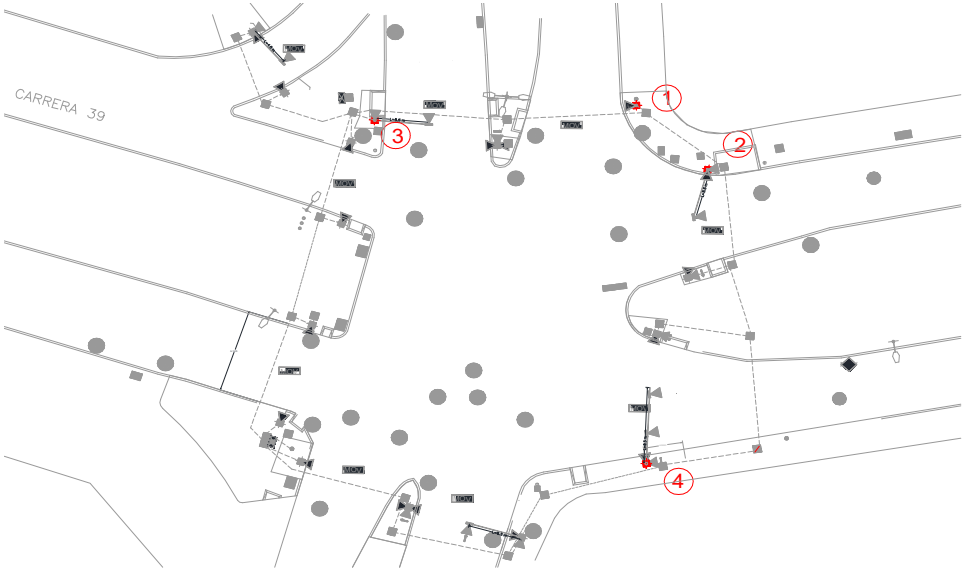

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
22	PEDESTAL TIPO 2	UN	0	0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	UN	0	0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
35	DEMOLICION DE ANDEN	M3	0	0	Ejecucion parcial

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
36	SUBBASE	M3		0	Ejecucion parcial

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
37	CONCRETO 3000 PSI ESPACIO PUBLICO	M3	0	0	Ejecucion parcial

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	KG	0	0	Ejecucion parcial

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 02

CALLE 14 x CARRERA 44


							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 02	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	1,00	$ 1.138.436	-	$ -
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	1,00	$ 3.237.178	1,00	$ 3.237.178	-	$ -
						$ -		**$ 4.375.614**		**$ 4.375.614**		**$ 0,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	8,00	$ 6.281.128	2,00	$ 1.570.282	2,00	$ 1.570.282
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 114.167
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	12,60	$ 1.915.956	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -	25,54	$ 3.452.880	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	60,00	$ 10.956.120	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	0,00	$ -		$ -	12,86	$ 1.004.495
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	8,00	$ 769.464	17,84	$ 1.715.905	12,73	$ 1.224.410
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	4,00	$ 652.184	17,89	$ 2.916.893	35,56	$ 5.797.916
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	261,30	$ 83.634.291	97,60	$ 31.238.832	133,68	$ 42.786.958
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	16,00	$ 16.996.048	8,00	$ 8.498.024	6,00	$ 6.373.518
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	1,00	$ 2.239.023	-	$ -	1,00	$ 2.239.023
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	13,00	$ 20.790.536	8,00	$ 12.794.176	5,00	$ 7.996.360
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	1,00	$ 4.169.566	-	$ -	1,00	$ 4.169.566
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	1,00	$ 708.002	-	$ -	1,00	$ 708.002
						$ -		**$ 152.565.198**		**$ 58.734.112**		**$ 73.984.697**
	MANTENIMIENTO											
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	24,7	$ 3.921.915	13,01	$ 2.066.144	12,68	$ 2.013.356
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	49,4	$ 7.281.066	0,15	$ 22.212	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	24,7	$ 22.582.173	12,28	$ 11.229.154	9,28	$ 8.484.314
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -	146	$ 1.743.240	75,17	$ 897.498	57,89	$ 691.207
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
41	LOSETA 40X40	m2		$ 141.779,00		$ -	2	$ 283.558	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$ 283.137,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$ 391.882,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 35.811.952**		**$ 14.215.008**		**$ 11.188.877**
	TOTAL calle 14 x carrera 44					**$ -**		**$ 192.752.764**		**$ 77.324.734**		**$ 85.173.574**

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

Sharon A. Rojas C

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
1	Diseño interseccion	UN	1	0	Ejecutado 100%

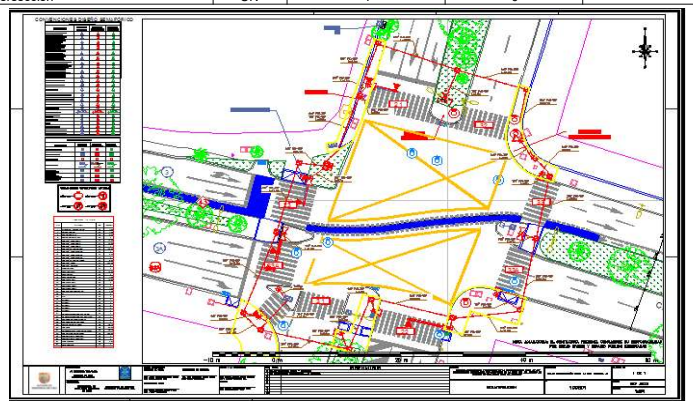


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
2	SOCIALIZACIÓN	UN	1	0	Ejecutado 100%









ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
3	RETIRO ANCLAJE	UN	2	2	Ejecucion 100%

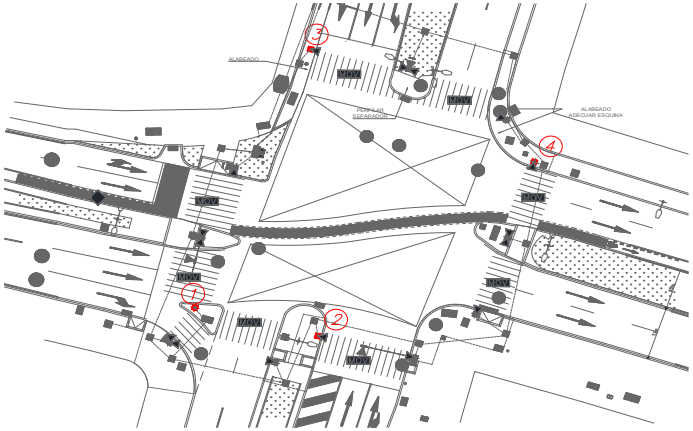

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
4	DEMOLICION DE CAJA	UN	0	1	Ejecucion 100%

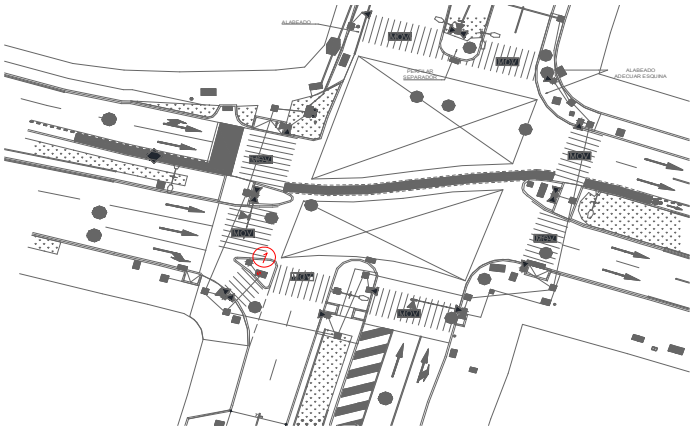


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ML	0	0	

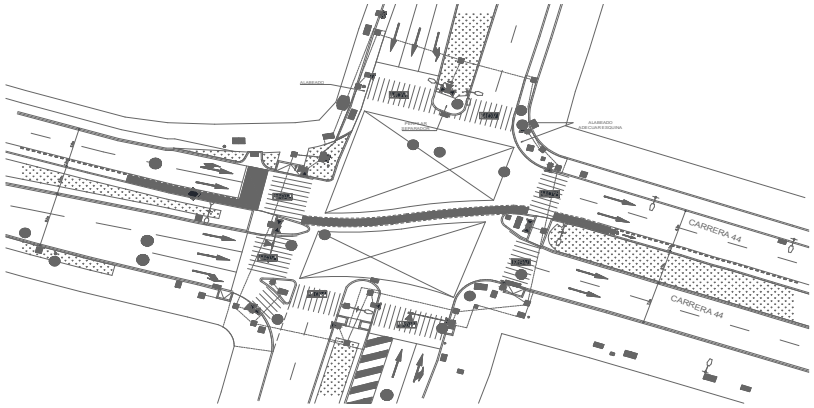


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
8	DUCTO 4X2 ZONA DURA	ML	0	0	

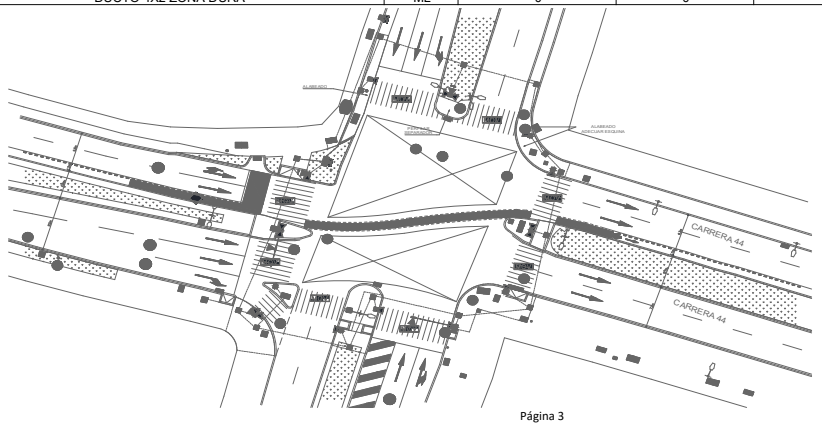


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ML	0	12,86	Ejecucion 100%

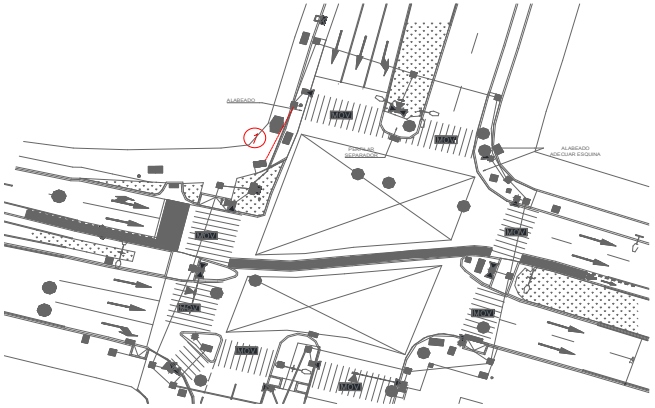


DUCTO	LONG (m)
1	12,86
2	
3	
4	
TOTAL	**12,86**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ML	17,84	12,73	Ejecucion 100%

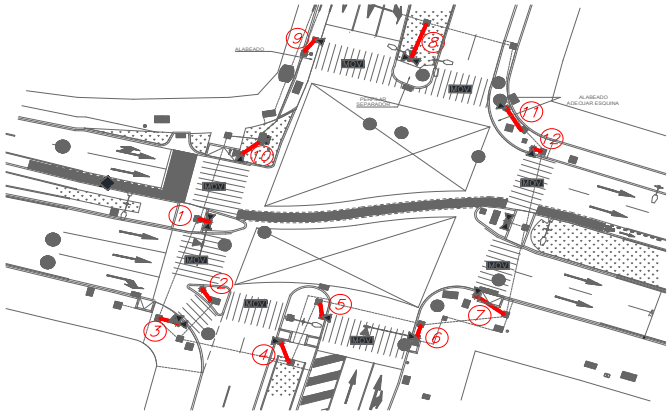


DUCTO	LONG (m)
1	1,14
2	0,54
3	1,42
4	4,8
5	3,32
6	1,07
7	5,55
8	1,67
9	1,03
10	1,2
11	4,75
12	4,08
TOTAL	**30,57**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ML	17,89	35,56	Ejecucion 100%

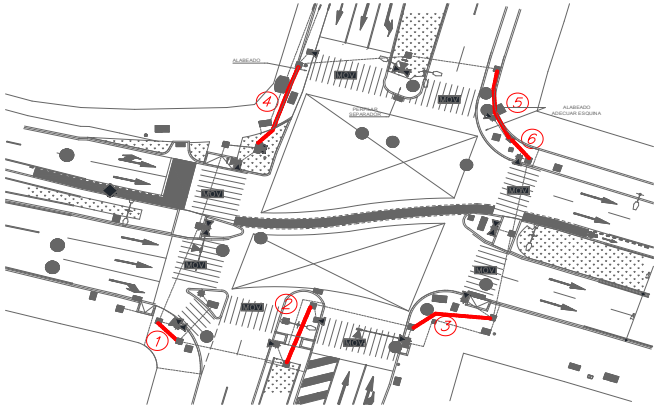


DUCTO	LONG (m)
1	3,45
2	9
3	14,44
4	12,86
5	7,4
6	6,3
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**53,45**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
13	DUCTO 4" TOPO	ML	97,6	133,68	Ejecucion 100%

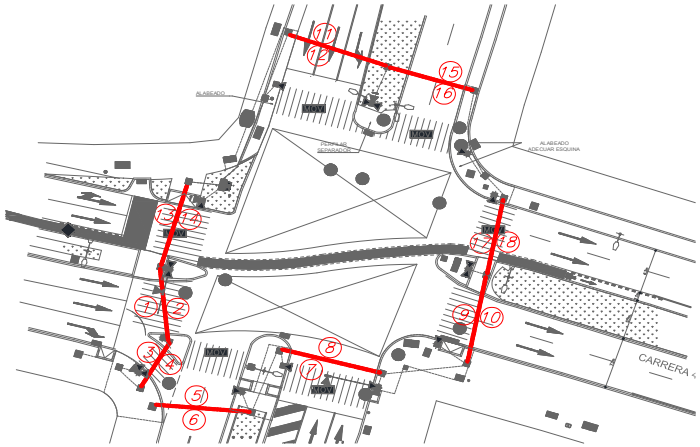


TOPO	LONG (m)
1	11,96
2	12,41
3	6,93
4	6,92
5	11,73
6	11,79
7	17,9
8	18
9	11,7
10	11,78
11	18,76
12	18
13	11,13
14	11,03
15	12,1
16	12
17	13,56
18	13,58
TOTAL	**231,28**


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
16	CAJA SENCILLA	UN	8	6	Ejecucion 100%

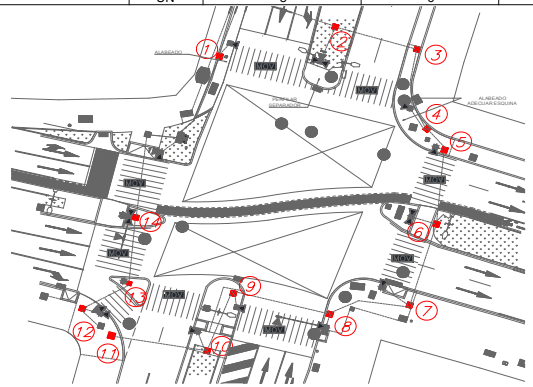


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
18	CAJA PRINCIPAL	UN	0	1	

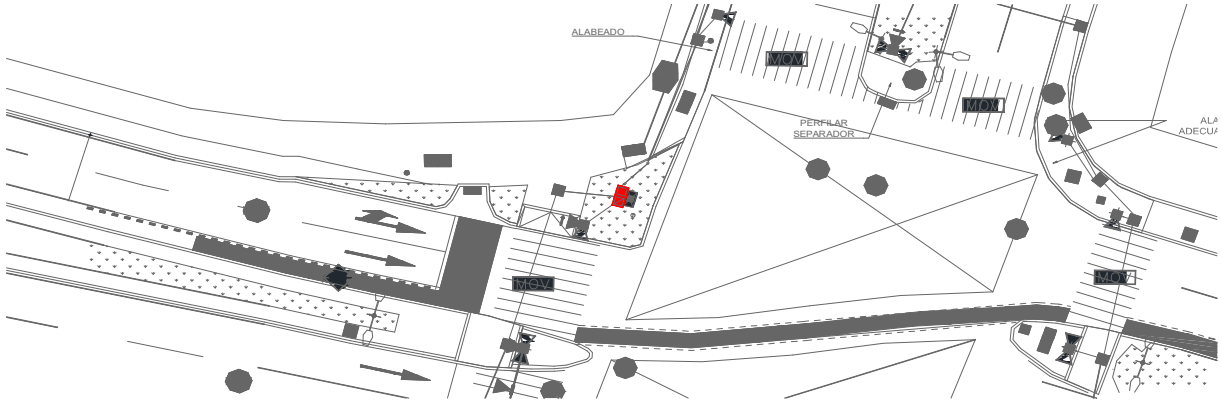


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
19	ANCLAJE TIPO 1	UN	8	5	Ejecucion 100%

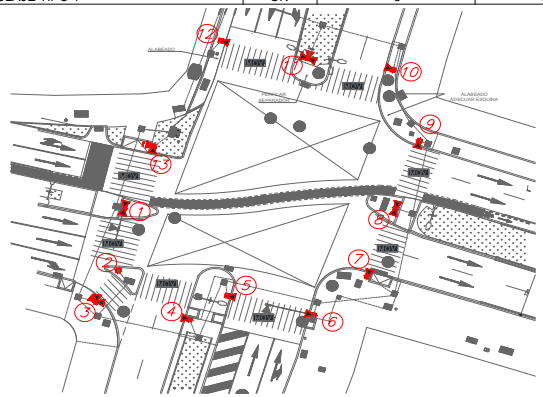

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
22	PEDESTAL TIPO 2	UN	0	1	Ejecucion 100%

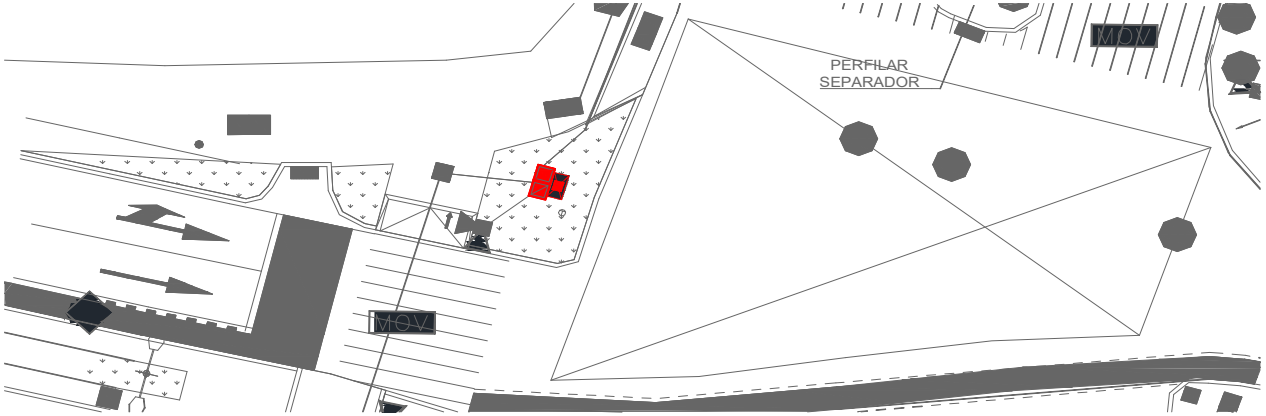

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	UN	0	1	Ejecucion 100%

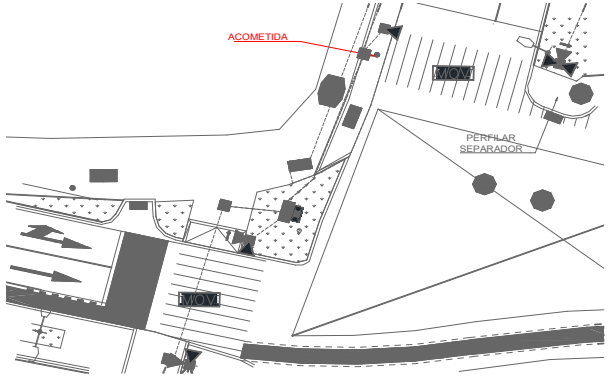


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
35	DEMOLICION DE ANDEN	M3	13,01	12,68	Ejecucion parcial



PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	3,024	0,50	1,51
2	30,372	0,13	3,95
3	17,700	0,10	1,77
4	2,98	0,1	0,30
5	57,821	0,1	5,78
6	44,533	0,1	4,45
7	39,7049	0,1	3,97
8	2,98	0,1	0,30
9	2,55	0,1	0,26
10	3,020	0,3	0,906
11	1,23	0,3	0,369
12	2	0,2	0,4
13	1,44	0,3	0,432
14	6,47	0,2	1,294
15			0
	TOTAL		25,69

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
36	SUBBASE	M3		0,1507	Ejecucion parcial

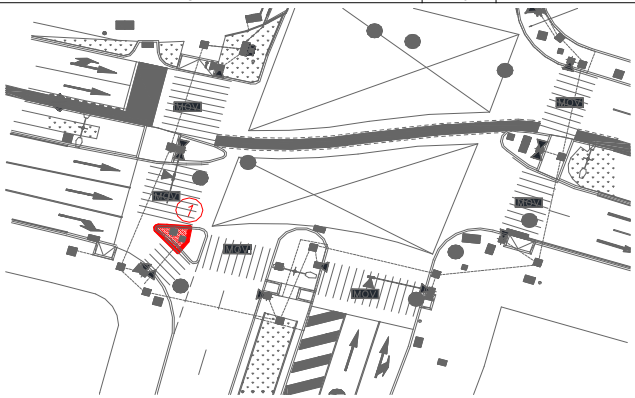


PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	3,014	0,05	0,1507
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	TOTAL		0,151

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
37	CONCRETO 3000 PSI ESPACIO PUBLICO	M3	12,28	9,28	Ejecucion parcial



PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	3,024	0,2	0,605
2	30,372	0,13	3,948
3	17,7	0,11	1,947
4	2,98	0,1	0,298
5	57,821	0,1	5,782
6	44,533	0,1	4,453
7	39,70	0,1	3,970
8	2,98	0,1	0,298
9	2,55	0,1	0,255
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	TOTAL		21,56


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	KG	75,17	57,89	Ejecucion parcial

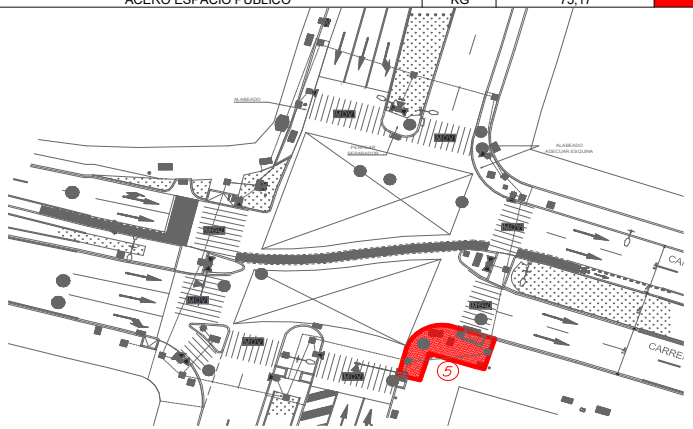

PUNTO	DIMENSIONES	AREA
1		0,000
2		0,000
3		0,000
4		0,000
5		57,82
6		44,53
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
	TOTAL M2	102,35354


KG/M2	M2	PESO
1,3	102,3535381	133,0596

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
41	LOSETA 40X40	M2			

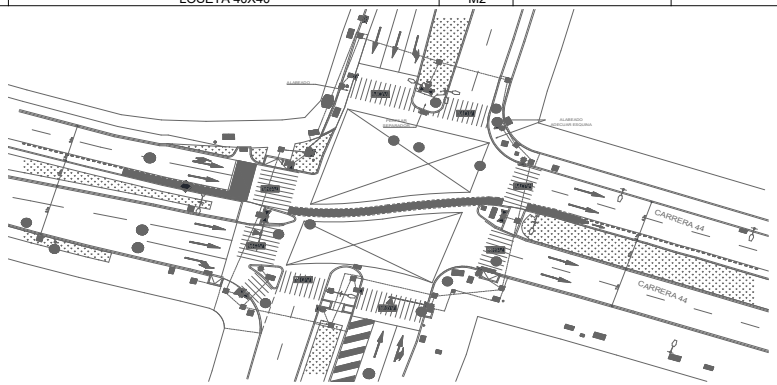

NO PREVISTOS IDENTIFICADOS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
NP	topo 3"	ml	0	7,3	Ejecucion parcial

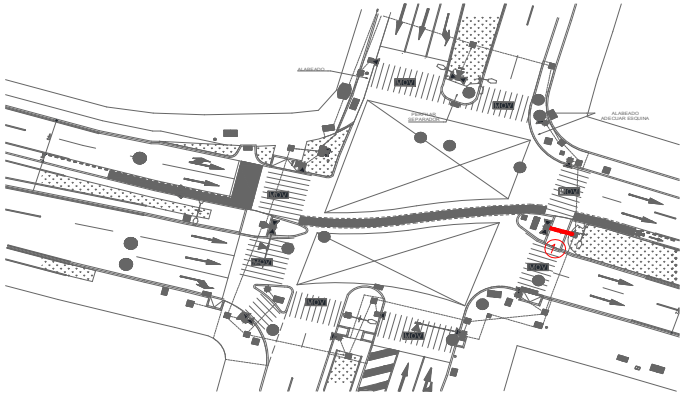

TOPO	LONG (m)
1	7,3
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**7,3**


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 02


CALLE 14 x CARRERA 56

							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 02	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	-	$ -	1,00	$ 1.138.436
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	1,00	$ 3.237.178	-	$ -	1,00	$ 3.237.178
						$ -		**$ 4.375.614**		**$ -**		**$ 4.375.614,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	6,00	$ 4.710.846	-	$ -	2,00	$ 1.570.282
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	7,00	$ 799.169		$ -	1,00	$ 114.167
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	11,00	$ 1.672.660	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -	14,10	$ 1.906.250	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -	7,30	$ 1.182.228	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	22,70	$ 4.145.065	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	24,40	$ 2.346.865	-	$ -	51,58	$ 4.961.119
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	7,10	$ 809.947	-	$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	9,00	$ 1.467.414	-	$ -	36,24	$ 5.908.787
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	229,36	$ 73.411.255	-	$ -	157,19	$ 50.311.803
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	15,00	$ 5.500.380	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	17,00	$ 18.058.301	-	$ -	18,00	$ 19.120.554
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	1,00	$ 2.239.023	-	$ -	1,00	$ 2.239.023
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	17,00	$ 27.187.624	-	$ -	17,00	$ 27.187.624
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	1,00	$ 4.169.566	-	$ -	1,00	$ 4.169.566
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	1,00	$ 708.002	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 150.314.595**		**$ -**		**$ 115.582.925**
	MANTENIMIENTO											
24	T1	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALL	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	10,13	$ 1.608.462	-	$ -	8,96	$ 1.423.193
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	20,26	$ 2.986.121	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	10,13	$ 9.261.434	-	$ -	8,96	$ 8.194.668
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -	32,5	$ 388.050	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -

41	LOSETA 40X40	m2		$ 141.779,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$ 283.137,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$ 391.882,00		$ -	1	$ 391.882	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 14.635.949**		**$ -**		**$ 9.617.861**
NO PREVISTOS												
NP	TOPO 2"	ML		$ 312.892,30		$ -		$ -		$ -	-	$ -
						$ -		$ -		$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
TOTAL calle 14 x carrera 56						**$ -**		**$ 169.326.157**		**$ -**		**$ 129.576.400**



JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA




SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
1	Diseño interseccion	UN	0	1	Ejecutado 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
2	SOCIALIZACIÓN	UN	0	1	Ejecutado 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
3	RETIRO ANCLAJE	UN	0	2	Ejecucion parcial

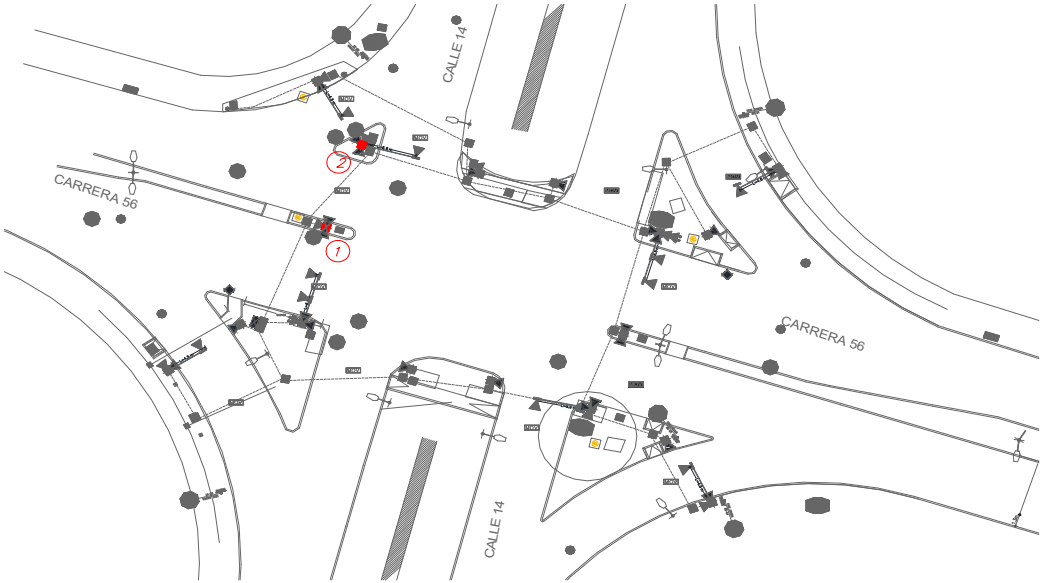

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
NP	TOPO 2"	ML	0	0	

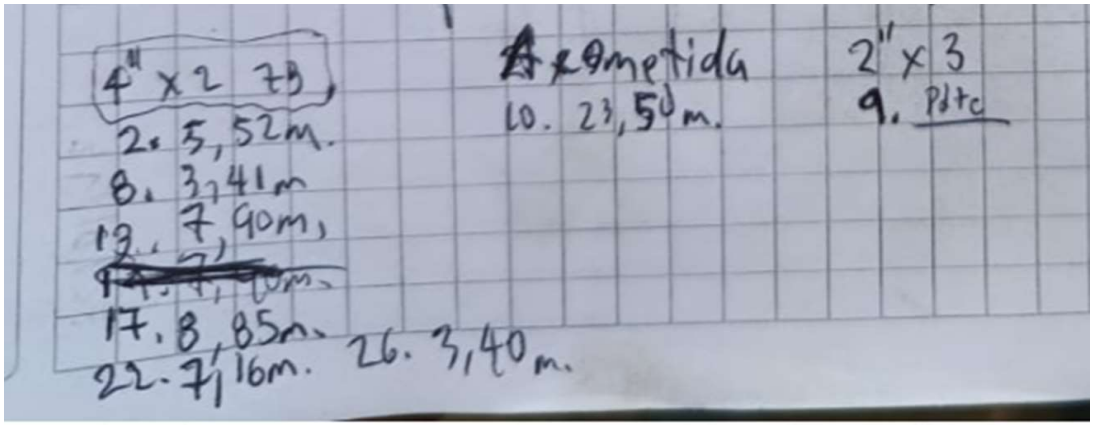

DUCTO	LONG (m)	
10	23,5	
9	6,5	tapado
9	6,5	tapado
9	6,5	tapado
TOTAL	**43**	

PENDIENTE POR NP


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ML	0	0	

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
8	DUCTO 4X2 ZONA DURA	ML	0	0	


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ML	0	51,58	Ejecucion parcial

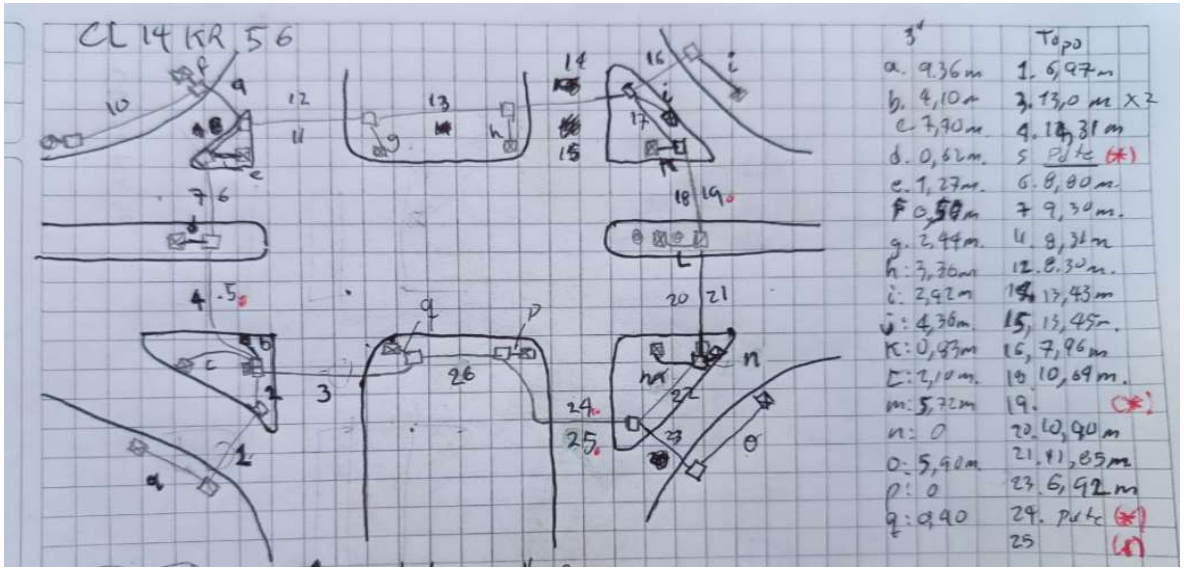


DUCTO	LONG (m)
a	9,36
b	4,1
c	7,7
d	0,62
e	1,27
f	0,5
g	2,44
h	3,36
i	2,92
j	4,36
k	0,83
l	2,1
m	5,72
n	0
o	5,9
p	0
q	0,4
TOTAL	**51,58**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ML	0	36,24	Ejecucion parcial

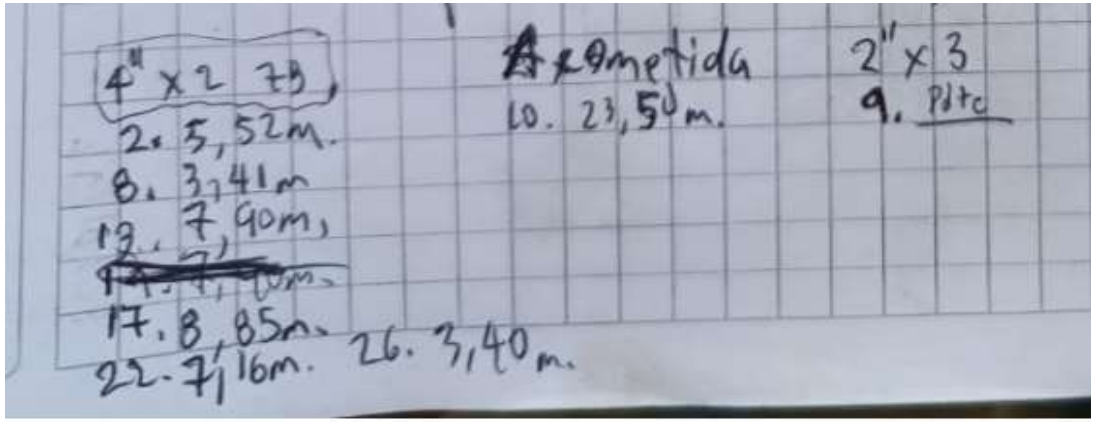


DUCTO	LONG (m)
2	5,52
8	3,41
13	7,9
17	8,85
22	7,16
26	3,4
TOTAL	**36,24**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
13	DUCTO 4" TOPO	ML	0	157,19	

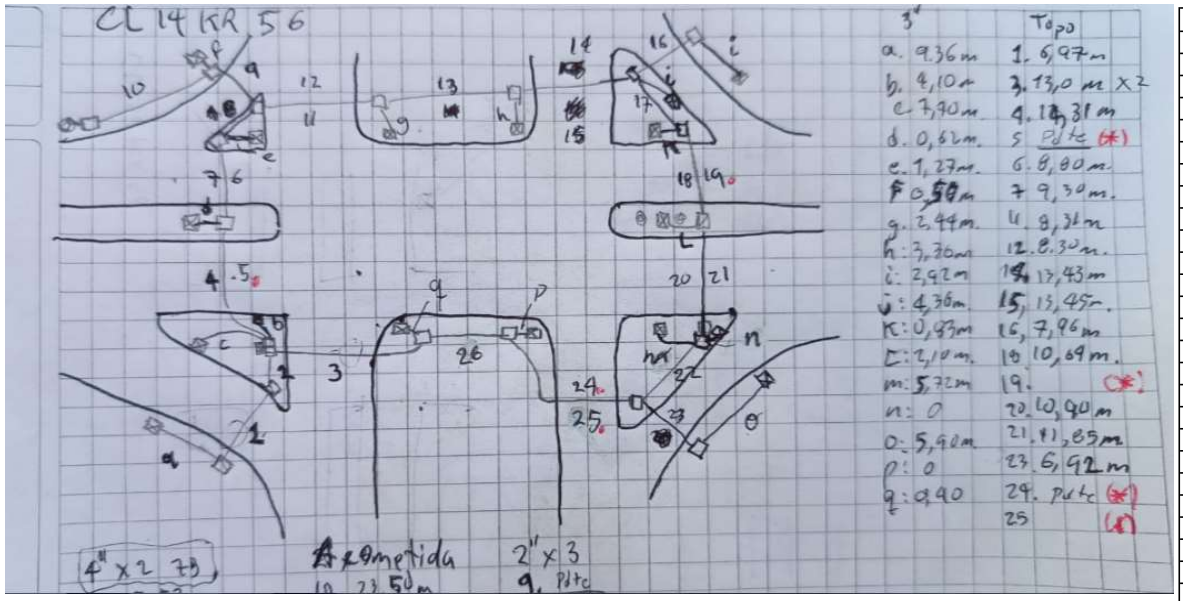


TOPO	LONG (m)	
1	6,97	
2	0	
3	26	
4	14,31	
5	0	tapado
6	8,8	
7	9,3	
8	0	
9	0	
10	0	
11	8,31	
12	8,3	
13	0	
14	13,43	
15	13,45	
16	7,96	
17	0	
18	10,69	
19	0	tapado
20	10,9	
21	11,85	
22	0	
23	6,92	
24	0	tapado
25	0	tapado
26		
TOTAL	157,19	


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
16	CAJA SENCILLA	UN	0	18	Ejecucion parcial

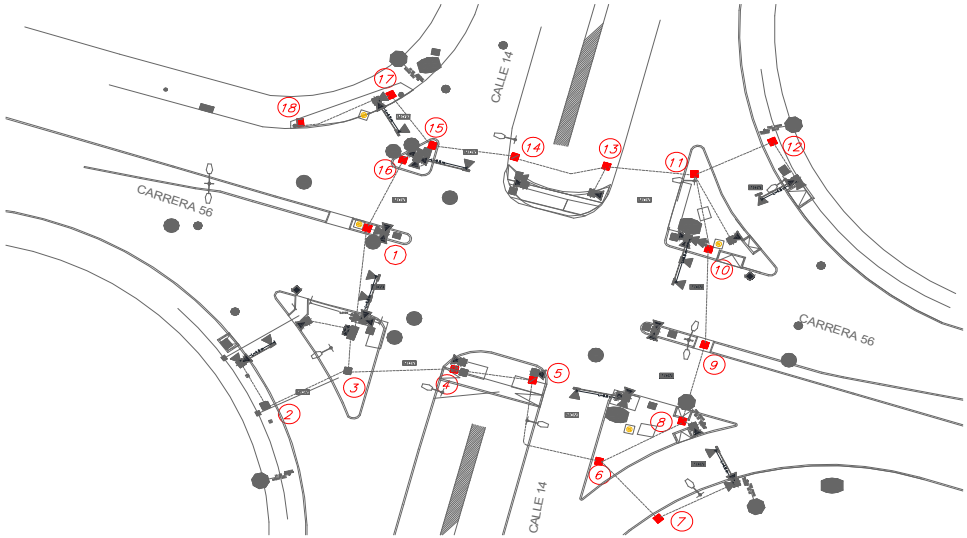


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
18	CAJA PRINCIPAL	UN	0	1	

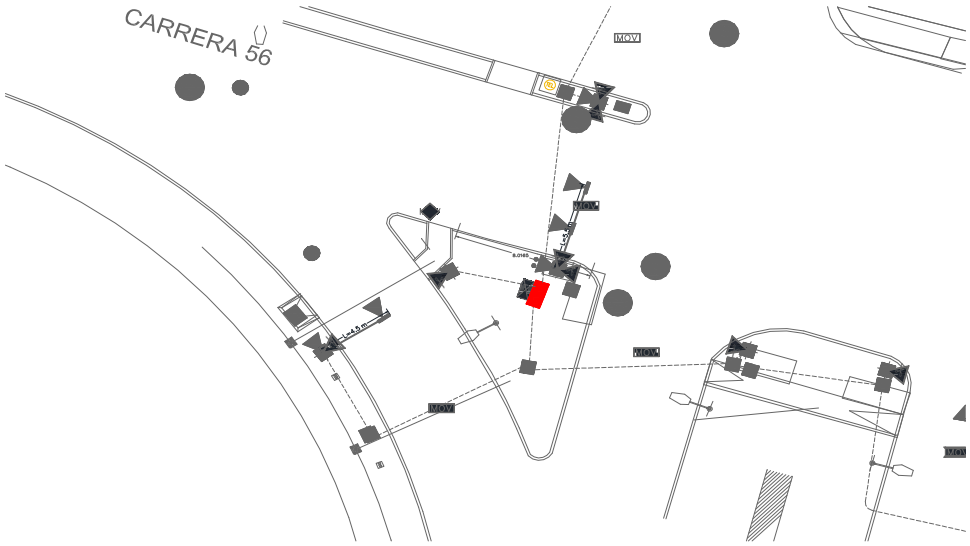

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
19	ANCLAJE TIPO 1	UN	0	17	Ejecutado 100%

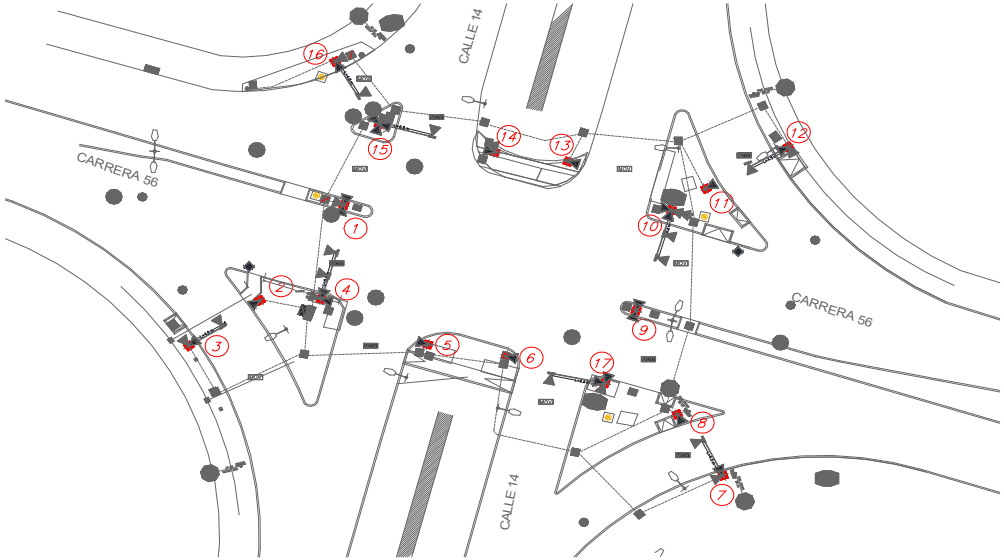


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
22	PEDESTAL TIPO 2	UN		1	

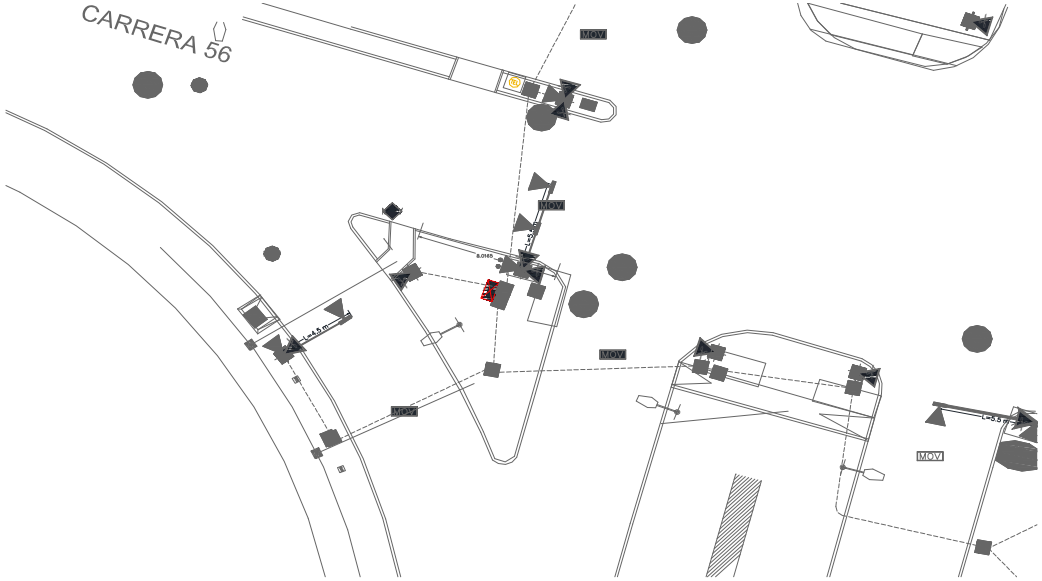

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	UN	0	0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
35	DEMOLICION DE ANDEN	M3	0	8,96	Ejecucion parcial

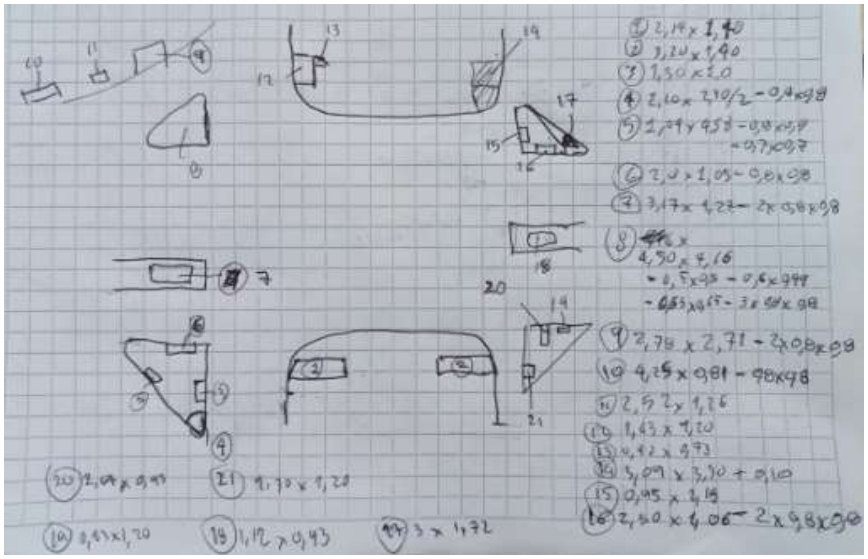


PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	(2,14 x 1.40)	0,10	0,30
2	(3.2 x 1.40)	0,10	0,45
3	(1.5 x 1.0)	0,10	0,15
4	(2.10x2.3/2)-(.8x.8)	0,10	0,18
5	(1.04x4.58)-(.8*.8)-(.7x.7)	0,10	0,36
6	(1.05x2.0)-(.8*.8)	0,10	0,15
7	(317x1.27)-2x(0.8x0.8)	0,10	0,275
8	(4.5x4.16)-(.5x.5)-(.6x.99)	0,10	1,553
9	((2.78*2.71)-(2*0.8*0.8))	0,10	0,625
10	((4.25*0.81)-(0.8*0.8))	0,10	0,280
11	(2.52*1.26)	0,10	0,318
12	(1.63*9.2)	0,10	1,500
13	0.9*0.73)	0,10	0,066
14	((3.9*3.3)+0.1)	0,10	1,297
15	(0.95*2.18)	0,10	0,2071
16	(2.5*1.06)-(2*0.8*0.8)	0,10	0,137
17	(3*1.72)	0,10	0,516
18	(1.12*0.93)	0,10	0,104
19	(0.83*1.2)	0,10	0,100
20	(2.64*0.93)	0,10	0,246
21	(1.3*1.2)		0,156
TOTAL			8,96

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
36	SUBBASE	M3	0	0	Ejecucion parcial

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			0,000

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
37	CONCRETO 3000 PSI ESPACIO PUBLICO	M3	0	8,96	Ejecucion parcial

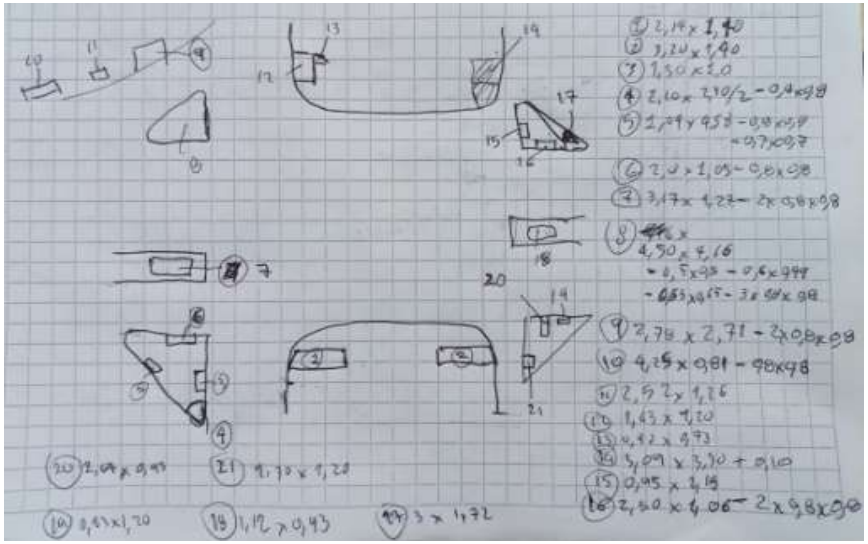

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1	(2,14 x 1.40)	0,10	0,30
2	(3.2 x 1.40)	0,10	0,45
3	(1.5 x 1.0)	0,10	0,15
4	(2.10x2.3/2)-(.8x.8)	0,10	0,18
5	(1.04x4.58)-(.8*.8)-(.7x.7)	0,10	0,36
6	(1.05x2.0)-(.8*.8)	0,10	0,15
7	(317x1.27)-2x(0.8x0.8)	0,10	0,275
8	(4.5x4.16)-(.5x.5)-(.6x.99)	0,10	1,553
9	((2.78*2.71)-(2*0.8*0.8))	0,10	0,625
10	((4.25*0.81)-(0.8*0.8))	0,10	0,280
11	(2.52*1.26)	0,10	0,318
12	(1.63*9.2)	0,10	1,500
13	0.9*0.73)	0,10	0,066
14	((3.9*3.3)+0.1)	0,10	1,297
15	(0.95*2.18)	0,10	0,2071
16	(2.5*1.06)-(2*0.8*0.8)	0,10	0,137
17	(3*1.72)	0,10	0,516
18	(1.12*0.93)	0,10	0,104
19	(0.83*1.2)	0,10	0,100
20	(2.64*0.93)	0,10	0,246
21	(1.3*1.2)		0,156
TOTAL			8,96

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 02

CALLE 72W x CARRERA 28D

							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 02	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	-	$ -	1,00	$ 1.138.436
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	1,00	$ 3.237.178	-	$ -	1,00	$ 3.237.178
						$ -		**$ 4.375.614**		**$ -**		**$ 4.375.614,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	2,00	$ 1.570.282	-	$ -	2,00	$ 1.570.282
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	2,00	$ 228.334		$ -	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	17,95	$ 1.726.485	-	$ -	-	$ -
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	22,52	$ 2.569.014	-	$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	55,66	$ 17.815.096	-	$ -	31,64	$ 10.127.015
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	18,37	$ 6.736.132	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	7,00	$ 7.435.771	-	$ -	3,00	$ 3.186.759
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	5,00	$ 7.996.360	-	$ -	3,00	$ 4.797.816
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 46.077.474**		**$ -**		**$ 19.681.872**
	MANTENIMIENTO											
24	T1	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALL	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	8,69	$ 1.379.816	-	$ -	-	$ -
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	17,38	$ 2.561.638	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	8,69	$ 7.944.902	-	$ -	-	$ -
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -	173,8	$ 2.075.172	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

41	LOSETA 40X40	m2		$	141.779,00		$ -	3,38	$	479.213	-	$	-	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$	283.137,00		$ -		$	-	-	$	-	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$	391.882,00		$ -		$	-	-	$	-	-	$ -
							$ -		**$**	**14.440.741**		**$**	**-**		**$ 0**
	TOTAL calle 72W x carrera 28D						**$ -**		**$**	**64.893.829**		**$**	**-**		**$ 24.057.486**


JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
1	Diseño interseccion	UN	0	1	Ejecutado 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
2	SOCIALIZACIÓN	UN	0	1	Ejecutado 100%

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
3	RETIRO ANCLAJE	UN	0	2	Ejecucion parcial

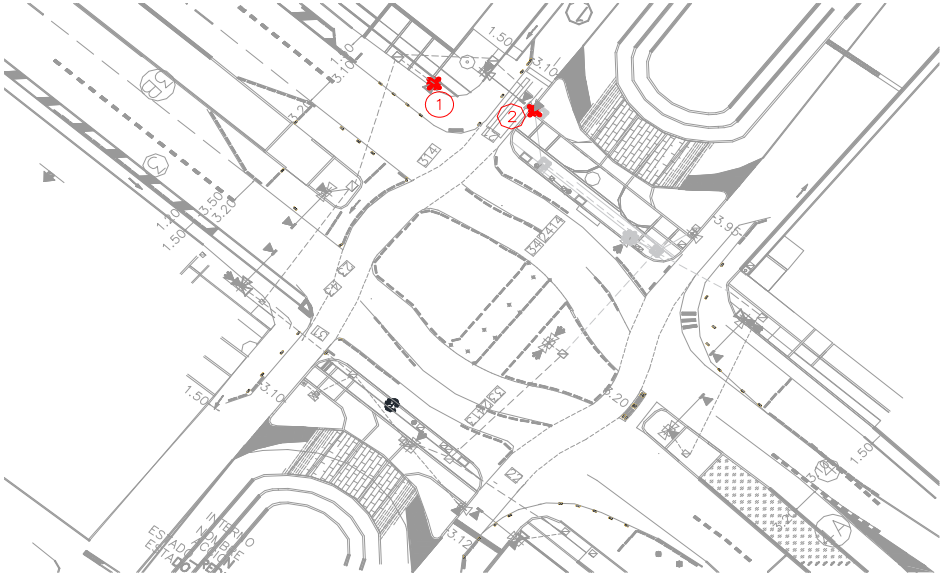

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ML	0	0	

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ML	0	0	

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
8	DUCTO 4X2 ZONA DURA	ML	0	0	

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ML	0	0	Ejecucion parcial

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**0**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ML	0	0	Ejecucion parcial


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**0**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
13	DUCTO 4" TOPO	ML	0	31,64	Ejecucion parcial

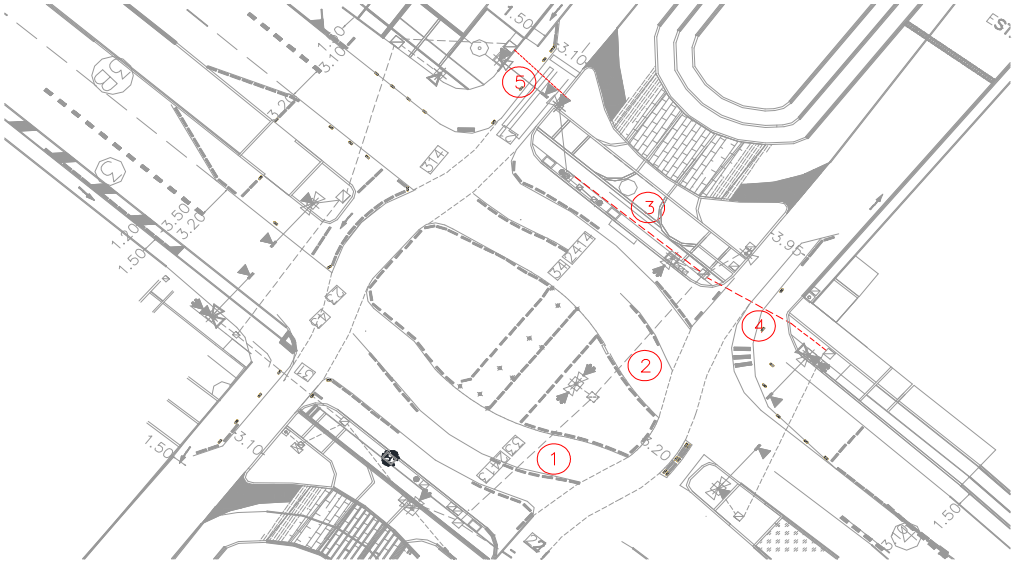


TOPO	LONG (m)
1	
2	
3	15,5
4	12,69
5	3,45
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**31,64**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
16	CAJA SENCILLA	UN	0	3	Ejecucion parcial

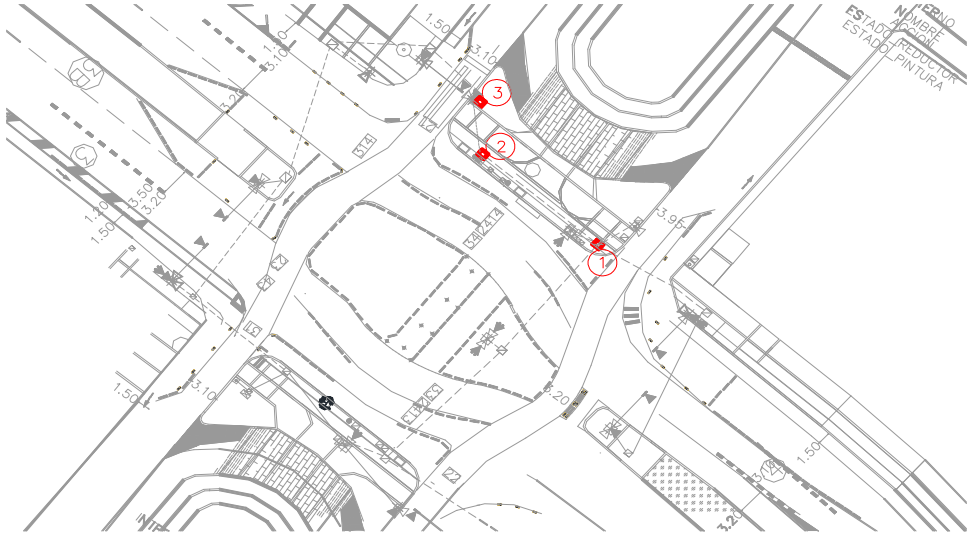

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 1	OBSERVACION
18	CAJA PRINCIPAL	UN	0	0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
19	ANCLAJE TIPO 1	UN	0	3	Ejecucion parcial

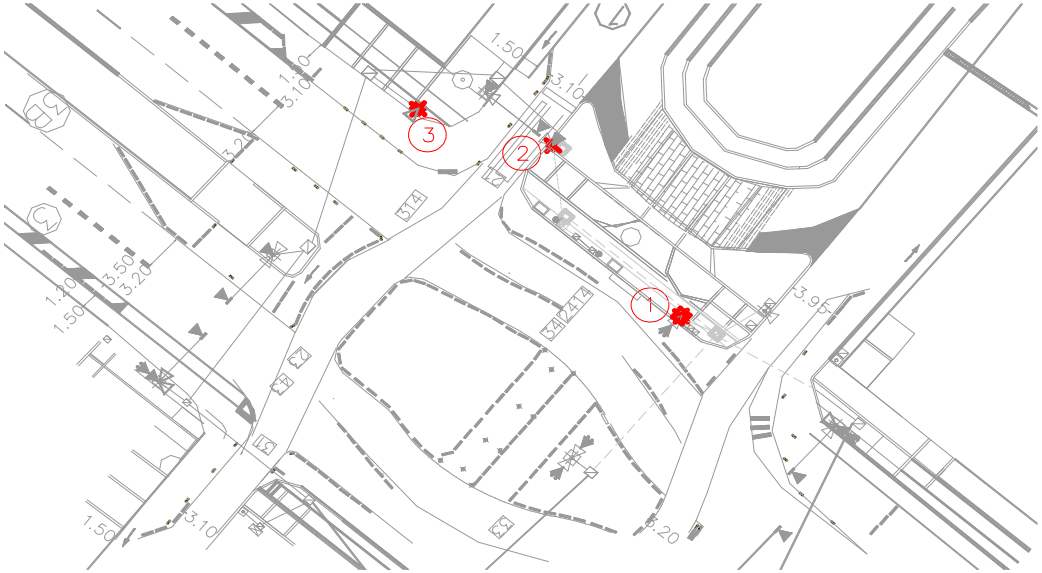

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
22	PEDESTAL TIPO 2	UN	0	0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	UN	0	0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
35	DEMOLICION DE ANDEN	M3	0	0	Ejecucion parcial

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			0,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
36	SUBBASE	M3		0	Ejecucion parcial

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			0,000

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
37	CONCRETO 3000 PSI ESPACIO PUBLICO	M3	0	0	Ejecucion parcial

PUNTO	DIMENSIONES	E	VOLUMEN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			0

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	KG	0	0	Ejecucion parcial

PUNTO	DIMENSIONES	AREA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
	TOTAL M2	0

KG/M2	M2	PESO
1,3	0	0

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
41	LOSETA 40X40	M2			

NO PREVISTOS IDENTIFICADOS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 2	OBSERVACION
NP	topo 3"	ml	0	0	Ejecucion parcial

TOPO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
TOTAL	**0**
