ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ACTA DE OBRA

CONTRATO:	4152.010.26.1.762.2023	4	FECHA: (dd/mm/aa)
CONTRATISTA:	JC INGENIERIA VIAL SAS		12/12/2023

REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA BP-26002902

DESCRIPCIÓN: CORTE ACTA 04

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE 3		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	+ / -	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES										
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un	4	$ 1.138.436	$ 4.553.743	11,00	$ 12.522.793	7,00	$ 7.969.050	0,00	$ -
2	SOCIALIZACIÓN	un	4	$ 3.237.178	$ 12.948.712	8,00	$ 25.897.424	7,00	$ 22.660.246	0,00	$ -
					$ 17.502.455		**$ 38.420.217**		**$ 30.629.296**		**$ -**
	OBRA CIVIL										
3	RETIRO ANCLAJE	un	12	$ 785.141	$ 9.421.697	25,00	$ 19.628.536	17,00	$ 13.347.404	0,00	$ -
4	DEMOLICION DE CAJA	un	4	$ 114.167	$ 456.670	16,00	$ 1.826.680	8,00	$ 913.340	0,00	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml	315	$ 152.060	$ 47.898.814	15,00	$ 2.280.896	-	$ -	0,00	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml	110	$ 135.195	$ 14.871.498	27,90	$ 3.771.953	0,80	$ 108.156	0,00	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml	40	$ 161.949	$ 6.477.960	8,30	$ 1.344.177	-	$ -	0,00	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml	80	$ 182.602	$ 14.608.194	23,70	$ 4.327.677	-	$ -	0,00	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml	80	$ 78.110	$ 6.248.783	11,93	$ 931.850	26,90	$ 2.101.153	0,00	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml	80	$ 96.183	$ 7.694.674	180,02	$ 17.314.941	197,23	$ 18.970.258	0,00	$ -
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml	80	$ 114.077	$ 9.126.157	113,68	$ 12.968.269	147,22	$ 16.794.410	13,99	$ 1.595.937
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml	80	$ 163.046	$ 13.043.673	265,50	$ 43.288.689	254,24	$ 41.452.792	0,00	$ -
13	DUCTO 4" TOPO	ml	900	$ 320.070	$ 288.062.834	1.509,29	$ 483.078.446	1.060,30	$ 339.370.025	39,50	$ 12.642.758
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml	400	$ 366.692	$ 146.676.611	131,53	$ 48.230.937	126,05	$ 46.221.467	82,03	$ 30.079.706
15	TUBO PUENTE	ml	10	$ 345.403	$ 3.454.034	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
16	CAJA SENCILLA	un	42	$ 1.062.253	$ 44.614.621	107,00	$ 113.661.057	87,00	$ 92.416.000	6,00	$ 6.373.517
17	CAJA DOBLE	un	20	$ 1.736.278	$ 34.725.566	2,00	$ 3.472.557	2,00	$ 3.472.557	0,00	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un	5	$ 2.239.023	$ 11.195.115	14,00	$ 31.346.322	7,00	$ 15.673.161	0,00	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un	58	$ 1.599.272	$ 92.757.787	92,00	$ 147.133.041	80,00	$ 127.941.775	0,00	$ -
20	ANCLAJE TIPO 2	un	2	$ 1.801.281	$ 3.602.561	1,00	$ 1.801.281	-	$ -	0,00	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un	4	$ 1.312.809	$ 5.251.236	8,00	$ 10.502.472	3,00	$ 3.938.427	0,00	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un	1	$ 4.169.566	$ 4.169.566	7,00	$ 29.186.959	6,00	$ 25.017.394	0,00	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	5	$ 708.002	$ 3.540.009	6,00	$ 4.248.011	6,00	$ 4.248.011	0,00	$ -
					$ 767.898.060		**$ 980.344.750**		**$ 751.986.330**		**$ 50.691.918**
	MANTENIMIENTO										
24	T1	un	16	$ 2.487.997	$ 39.807.954	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
25	T1X	un	4	$ 4.974.565	$ 19.898.259	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
26	T2 (3.5m)	un	4	$ 4.900.898	$ 19.603.591	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
27	T2 (4.5m)	un	4	$ 6.563.025	$ 26.252.100	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
28	T2 (5.5m)	un	4	$ 7.089.081	$ 28.356.324	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
29	T2 (6.5m)	un	4	$ 7.625.620	$ 30.502.480	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
30	T2 (8.5m)	un	1	$ 9.811.421	$ 9.811.421	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un	10	$ 373.481	$ 3.734.807	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALLER	un	10	$ 338.696	$ 3.386.962	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -
					$ 761.161	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -

Powered by CamScanner

					$ 182.882.606		$ -		$ -		$ -			
						ESPACIO PUBLICO								
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3	38	$ 158.782	$ 6.033.723	98,5689	$ 15.650.986	85,04	$ 13.502.075	1,58	$ 250.876			
36	SUBBASE	m3	40	$ 147.390	$ 5.895.601	106,0827	$ 15.635.532	9,88	$ 1.456.390	0,00	$ -			
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLICO	m3	80	$ 914.258	$ 73.140.615	81,166	$ 74.206.640	79,40	$ 72.592.061	0,54	$ 493.699			
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg	80	$ 11.940	$ 955.211	177,8062	$ 2.123.030	145,30	$ 1.734.941	0,00	$ -			
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2	45	$ 153.338	$ 6.900.197	95,67	$ 14.669.818	-	$ -	0,00	$ -			
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2	80	$ 140.618	$ 11.249.441	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -			
41	LOSETA 40X40	m2	80	$ 141.779	$ 11.342.301	7,7	$ 1.091.696	1,28	$ 181.477	0,00	$ -			
42	BOLARDO M60	un	32	$ 283.137	$ 9.060.392	0	$ -	-	$ -	0,00	$ -			
43	BOLARDO M62-M63	un	32	$ 391.882	$ 12.540.230	1	$ 391.882	-	$ -	0,00	$ -			
					$ 137.117.711		$ 123.769.584		$ 89.466.944		$ 744.575			
						NO PREVISTOS								
44	NP-01 DUCTO 2" TOPO	ml		$ 312.892,30		52,78	$ 16.514.455,59	52,78	$ 16.514.456	-	$ -			
45	NP-02 DUCTO 3" TOPO	ml		$ 313.093,59		41,60	$ 13.024.693,34	54,34	$ 17.013.506	-	$ -			
46	NP-03 BARANDA TUBERIA REDONDA	ml		$ 367.747,93		14,40	$ 5.295.570,19	-	$ -	-	$ -			
47	NP-04 POSTE T1 TRONCOCÓNICO	un		$ 2.442.495,72		13,00	$ 31.752.444,36	-	$ -	12,00	$ 29.309.949			
48	NP-05 POSTE T2 (L=3,5) TRONCOCÓNICO	un		$ 4.832.509,00		1,00	$ 4.832.509,00	-	$ -	-	$ -			
49	NP-06 POSTE T2 (L=4,5) TRONCOCÓNICO	un		$ 5.971.509,00		1,00	$ 5.971.509,00	-	$ -	1,00	$ 5.971.509			
50	NP-07 POSTE T2 (L=5,5) TRONCOCÓNICO	un		$ 6.239.509,00		5,00	$ 31.197.545,00	-	$ -	4,00	$ 24.958.036			
51	NP-08 TAPA PARA CAJA SENCILLA .	un		$ 525.832,08		9,00	$ 4.732.488,72	-	$ -	-	$ -			
52	NP-09 ROTURA Y EMPALME A CAJA EXIS	un		$ 154.934,82		27,00	$ 4.183.240,14	-	$ -	14,00	$ 2.169.087			
53	NP-10 MARCO PARA TAPA ESPECIAL	un		$ 201.192,96		1,00	$ 201.192,96	-	$ -	-	$ -			
					$ 262.306.097		$ 117.705.648		$ 33.527.961		$ 62.408.581			
	TOTAL				$ 1.105.400.831		$ 1.260.240.199		$ 905.610.532		$ 113.845.074			
			TOTAL	$ 1.105.400.831		TOTAL	$ 1.260.240.199	TOTAL		TOTAL	$ 113.845.074			

JC INGENIERIA VIAL SAS
CONTRATISTA

SECRETARIA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE MOVILIDAD

BALANCE DE OBRA

1

FECHA: (DD/MM/AAAA) 12/12/2023

CONTRATO: 4152.010.26.1.762.2023

CONTRATISTA: JC INGENIERIA VIAL SAS

REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA BP-26002902

DESCRIPCIÓN BALANCE: Ajuste a cantidades por replanteo en obra y ejecución realizada y verificada.

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE 4		MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
SECCION	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1	1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un	4	1.138.435,69	$ 4.553.743	11,00	$ 12.522.793	0,00	$ -	11,00	$ 12.522.793
1	2	SOCIALIZACIÓN	un	4	3.237.178,04	$ 12.948.712	8,00	$ 25.897.424	0,00	$ -	8,00	$ 25.897.424
Subtotal ACTIVIDADES PRELIMINARES						$ 17.502.455		$ 38.420.217		$ -		$ 38.420.217
OBRA CIVIL												
2	3	RETIRO ANCLAJE	un	12	785.141,44	$ 9.421.697	25,00	$ 19.628.536	9,00	$ 7.066.273	21,00	$ 16.487.970
2	4	DEMOLICION DE CAJA	un	4	114.167,49	$ 456.670	16,00	$ 1.826.680	7,00	$ 799.172	11,00	$ 1.255.842
2	5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml	315	152.059,73	$ 47.898.814	15,00	$ 2.280.896	- 315,00	-$ 47.898.814	-	$ -
2	6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml	110	135.195,44	$ 14.871.498	27,90	$ 3.771.953	- 102,20	-$ 13.816.974	7,80	$ 1.054.524
2	7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml	40	161.949,01	$ 6.477.960	8,30	$ 1.344.177	- 39,00	-$ 6.316.011	1,00	$ 161.949
2	8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml	80	182.602,42	$ 14.608.194	23,70	$ 4.327.677	- 80,00	-$ 14.608.194	-	$ -
2	9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml	80	78.109,79	$ 6.248.783	11,93	$ 931.850	- 45,60	-$ 3.561.806	34,40	$ 2.686.977
2	10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml	80	96.183,43	$ 7.694.674	180,02	$ 17.314.941	143,95	$ 13.845.605	223,95	$ 21.540.279
2	11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml	80	114.076,96	$ 9.126.157	113,68	$ 12.968.269	100,30	$ 11.441.919	180,30	$ 20.568.076
2	12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml	80	163.045,91	$ 13.043.673	265,50	$ 43.288.689	218,80	$ 35.674.445	298,80	$ 48.718.118
2	13	DUCTO 4" TOPO	ml	900	320.069,82	$ 288.062.834	1.509,29	$ 483.078.446	394,37	$ 126.227.414	1.294,37	$ 414.290.247
2	14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml	400	366.691,53	$ 146.676.611	131,53	$ 48.230.937	- 174,67	-$ 64.050.009	225,33	$ 82.626.602
2	15	TUBO PUENTE	ml	10	345.403,41	$ 3.454.034	-	$ -	- 10,00	-$ 3.454.034	-	$ -
2	16	CAJA SENCILLA	un	42	1.062.252,87	$ 44.614.621	107,00	$ 113.661.057	64,00	$ 67.984.184	106,00	$ 112.598.805
2	17	CAJA DOBLE	un	20	1.736.278,32	$ 34.725.566	2,00	$ 3.472.557	- 18,00	-$ 31.253.010	2,00	$ 3.472.557
2	18	CAJA PRINCIPAL	un	5	2.239.022,99	$ 11.195.115	14,00	$ 31.346.322	9,00	$ 20.151.207	14,00	$ 31.346.322
2	19	ANCLAJE TIPO 1	un	58	1.599.272,19	$ 92.757.787	92,00	$ 147.133.041	36,00	$ 57.573.799	94,00	$ 150.331.585
2	20	ANCLAJE TIPO 2	un	2	1.801.280,55	$ 3.602.561	1,00	$ 1.801.281	- 2,00	-$ 3.602.561	-	$ -
2	21	PEDESTAL TIPO 1	un	4	1.312.808,96	$ 5.251.236	8,00	$ 10.502.472	4,00	$ 5.251.236	8,00	$ 10.502.472
2	22	PEDESTAL TIPO 2	un	1	4.169.565,60	$ 4.169.566	7,00	$ 29.186.959	6,00	$ 25.017.394	7,00	$ 29.186.959
2	23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	5	708.001,81	$ 3.540.009	6,00	$ 4.248.011	1,00	$ 708.002	6,00	$ 4.248.011
Subtotal OBRA CIVIL						$ 767.898.060		$ 980.344.750		$ 183.179.235		$ 951.077.295
POSTES SEMAFORICOS Y MANTENIMIENTO												
3	24	T1	un	16	2.487.997,10	$ 39.807.954	-	$ -	16,00	$ 39.807.954	-	$ -
3	25	T1X	un	4	4.974.564,70	$ 19.898.259	-	$ -	4,00	$ 19.898.259	-	$ -
3	26	T2 (3.5m)	un	4	4.900.897,80	$ 19.603.591	-	$ -	4,00	$ 19.603.591	-	$ -
3	27	T2 (4.5m)	un	4	6.563.025,10	$ 26.252.100	-	$ -	4,00	$ 26.252.100	-	$ -
3	28	T2 (5.5m)	un	4	7.089.081,10	$ 28.356.324	-	$ -	4,00	$ 28.356.324	-	$ -
3	29	T2 (6.5m)	un	4	7.625.620,10	$ 30.502.480	-	$ -	4,00	$ 30.502.480	-	$ -

Powered by CamScanner

CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE 4		MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
SECCION	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
3	30	T2 (8.5m)	un	1	9.811.420,90	$ 9.811.421	-	$ -	- 1,00	$ 9.811.421	-	$ -
3	31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un	10	373.480,70	$ 3.734.807	-	$ -	- 10,00	$ 3.734.807	-	$ -
3	32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALLER	un	10	338.696,20	$ 3.386.962	-	$ -	- 10,00	-$ 3.386.962	-	$ -
3	33	REPARACION TRAMO POSTE	ml	1	761.161,10	$ 761.161	-	$ -	- 1,00	-$ 761.161	-	$ -
3	34	REPARACION BASE POSTE	un	1	767.546,20	$ 767.546	-	$ -	- 1,00	-$ 767.546	-	$ -
Subtotal POSTES SEMAFORICOS Y MANTENIMIENTO						$ 182.882.606		$ -		-$ 182.882.606		$ -
OBRAS DE ESPACIO PUBLICO												
4	35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3	38	158.782,19	$ 6.033.723	98,57	$ 15.650.986	65,62	$ 10.419.430	103,62	$ 16.453.153
4	36	SUBBASE	m3	40	147.390,03	$ 5.895.601	106,08	$ 15.635.532	7,59	$ 1.119.383	47,59	$ 7.014.984
4	37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLICO	m3	80	914.257,69	$ 73.140.615	81,17	$ 74.206.640	4,28	$ 3.911.194	84,28	$ 77.051.810
4	38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg	80	11.940,14	$ 955.211	177,81	$ 2.123.030	65,31	$ 779.765	145,31	$ 1.734.976
4	39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2	45	153.337,70	$ 6.900.197	95,67	$ 14.669.818	50,67	$ 7.769.621	95,67	$ 14.669.818
4	40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2	80	140.618,01	$ 11.249.441	-	$ -	- 80,00	-$ 11.249.441	0,00	$ -
4	41	LOSETA 40X40	m2	80	141.778,76	$ 11.342.301	7,70	$ 1.091.696	- 75,34	-$ 10.681.612	4,66	$ 660.689
4	42	BOLARDO M60	un	32	283.137,25	$ 9.060.392	-	$ -	- 32,00	-$ 9.060.392	0,00	$ -
4	43	BOLARDO M62 M63	un	32	391.882,18	$ 12.540.230	1,00	$ 391.882	- 32,00	-$ 12.540.230	0,00	$ -
Subtotal OBRAS DE ESPACIO PUBLICO						$ 137.117.711		$ 123.769.581		-$ 19.532.281		$ 117.585.430
NO PREVISTOS												
5	44	NP-01 DUCTO 2" TOPO	ml	-	$ 312.892,30		52,78	$ 16.514.456		$ 16.514.456	52,78	$ 16.514.456
5	45	NP-02 DUCTO 3" TOPO	ml	-	$ 313.093,59		41,60	$ 13.024.693		$ 13.024.693	61,64	$ 19.299.083
5	46	NP-03 BARANDA TUBERÍA REDONDA	ml	-	$ 367.747,93		14,40	$ 5.295.570		$ 5.295.570	14,40	$ 5.295.570
5	47	NP-04 POSTE T1 TRONCOCÓNICO	un	-	$ 2.442.495,72		13,00	$ 31.752.444		$ 31.752.444	13,00	$ 31.752.444
5	48	NP-05 POSTE T2 (L=3.5) TRONCOCÓNICO	un	-	$ 4.832.509,00		1,00	$ 4.832.509		$ 4.832.509	1,00	$ 4.832.509
5	49	NP-06 POSTE T2 (L=4.5) TRONCOCÓNICO	un	-	$ 5.971.509,00		1,00	$ 5.971.509		$ 5.971.509	1,00	$ 5.971.509
5	50	NP-07 POSTE T2 (L=5.5) TRONCOCÓNICO	un	-	$ 6.239.509,00		5	$ 31.197.545		$ 31.197.545	5,00	$ 31.197.545
5	51	NP-08 TAPA PARA CAJA SENCILLA	un	-	$ 525.832,08		9,00	$ 4.732.489		$ 4.732.489	9,00	$ 4.732.489
5	52	NP-09 ROTURA Y EMPALME A CAJA EXISTENTE	un	-	$ 154.934,82		27,00	$ 4.183.240		$ 4.183.240	31,00	$ 4.802.979
5	53	NP-10 MARCO PARA TAPA ESPECIAL	un	-	$ 201.192,96		1,00	$ 201.193		$ 201.193	1,00	$ 201.193
Subtotal							165,78	$ 117.705.648	-	$ 117.705.648		$ 124.599.783
TOTAL						$ 1.105.400.831		$ 1.260.240.199,00		$ 216.175.645		$ 1.231.682.725,00

CUADRO RESUMEN		
Valor total del contrato	$	1.260.240.199,00
Valor proyectado a ejecutar	$	1.231.682.725,00
Saldo proyectado a favor de la entidad	$	28.557.474,00

OBSERVACIONES

JC INGENIERIA VIAL SAS
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

Powered by CamScanner

MEMORIAS ACTA 04

CALLE 72U x CARRERA 28D


ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	BALANCE 1 CANTIDAD	BALANCE 1 VALOR POR CANTIDAD	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR POR CANTIDAD	ACTA 04 CANTIDAD	ACTA 04 VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	-	$ -	-	$ -
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	1,00	$ 3.237.178	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 4.375.614**		**$ -**		**$ 0,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	1,00	$ 114.167		$ -	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	7,50	$ 585.825	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	9,67	$ 930.090	-	$ -	-	$ -
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	9,27	$ 1.057.494	3,15	$ 359.343	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	2,56	$ 417.398	-	$ -	-	$ -
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	42,73	$ 13.676.157	17,19	$ 5.502.003	-	$ -
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	19,28	$ 7.069.822	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	6,00	$ 6.373.518	1,00	$ 1.062.253	-	$ -
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	1,00	$ 2.239.023	-	$ -	-	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	4,00	$ 6.397.088	-	$ -	-	$ -
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	1,00	$ 1.312.809	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 40.173.390**		**$ 6.923.599**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	11,4804	$ 1.822.881	-	$ -	-	$ -
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	19,134	$ 2.820.160	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -	95,67	$ 14.669.846	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
41	LOSETA 40X40	m2		$ 141.779,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$ 283.137,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$ 391.882,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 19.312.888**		**$ -**		**$ 0**
	NO PREVISTOS											
44	NP-01 DUCTO 2" TOPO	ML		$ 312.892,30		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
45	NP-02 DUCTO 3" TOPO	ML		$ 313.093,59		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
46	NP-03 BARANDA TUBERÍA REDON	ml		$ 367.747,93		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47	NP-04 POSTE T1 TRONCOCÓNICO	un		$ 2.442.495,72		$ -	-	$ -	-	$ -	4,0	$ 9.769.983
48	NP-05 POSTE T2 (L=3,5) TRONCOC	un		$ 4.832.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	NP-06 POSTE T2 (L=4,5) TRONCOC	un		$ 5.971.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50	NP-07 POSTE T2 (L=5,5) TRONCOC	un		$ 6.239.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	1,0	$ 6.239.509
51	NP-08 TAPA PARA CAJA SENCILLA	un		$ 525.832,08		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	NP-09 ROTURA Y EMPALME A CAJ	un		$ 154.934,82		$ -	5,00	$ 774.674	-	$ -	-	$ -
53	NP-10 MARCO PARA TAPA ESPEC	un		$ 201.192,96		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 774.674**		**$ -**		**$ 16.009.492**
	TOTAL calle 72U x carrera 28D					**$ -**		**$ 64.636.566**		**$ 6.923.599**		**$ 16.009.492**


JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
47	POSTE T1 TRONCOCÓNICO	UN	0	4	Ejecucion parcial

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
50	POSTE T2 (L=5,5) TRONCOCÓNICO	UN	0	1	Ejecucion parcial

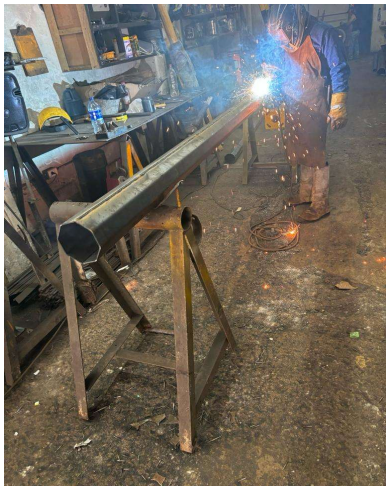ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

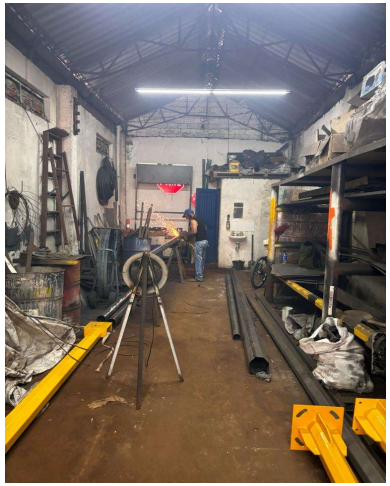MEMORIAS ACTA 04

CALLE 14 x CARRERA 56


					BALANCE 3		ACUMULADO		ACTA 04	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES									
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un	$1.138.436,00	$ -	1,00	$ 1.138.436	1,00	$ 1.138.436	-	$ -
2	SOCIALIZACIÓN	un	$ 3.237.178,00	$ -	1,00	$ 3.237.178	1,00	$ 3.237.178	-	$ -
				$ -		**$ 4.375.614**		**$ 4.375.614**		**$ 0,00**
	OBRA CIVIL									
3	RETIRO ANCLAJE	un	$ 785.141,00	$ -	6,00	$ 4.710.846	2,00	$ 1.570.282	-	$ -
4	DEMOLICION DE CAJA	un	$ 114.167,00	$ -	7,00	$ 799.169	1,00	$ 114.167	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml	$ 152.060,00	$ -	11,00	$ 1.672.660	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml	$ 135.195,00	$ -	14,10	$ 1.906.250	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml	$ 161.949,00	$ -	7,30	$ 1.182.228	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml	$ 182.602,00	$ -	22,70	$ 4.145.065	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml	$ 78.110,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml	$ 96.183,00	$ -	24,40	$ 2.346.865	51,58	$ 4.961.119	-	$ -
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml	$ 114.077,00	$ -	7,10	$ 809.947	-	$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml	$ 163.046,00	$ -	9,00	$ 1.467.414	36,24	$ 5.908.787	-	$ -
13	DUCTO 4" TOPO	ml	$ 320.070,00	$ -	229,36	$ 73.411.255	183,86	$ 58.848.070	39,50	$ 12.642.765
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml	$ 366.692,00	$ -	15,00	$ 5.500.380	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml	$ 345.403,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un	$ 1.062.253,00	$ -	17,00	$ 18.058.301	18,00	$ 19.120.554	-	$ -
17	CAJA DOBLE	un	$ 1.736.278,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un	$ 2.239.023,00	$ -	1,00	$ 2.239.023	1,00	$ 2.239.023	-	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un	$ 1.599.272,00	$ -	17,00	$ 27.187.624	17,00	$ 27.187.624	-	$ -
20	ANCLAJE TIPO 2	un	$ 1.801.281,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un	$ 1.312.809,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un	$ 4.169.566,00	$ -	1,00	$ 4.169.566	1,00	$ 4.169.566	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un	$ 708.002,00	$ -	1,00	$ 708.002	1,00	$ 708.002	-	$ -
				$ -		**$ 150.314.595**		**$ 124.827.194**		**$ 12.642.765**
	MANTENIMIENTO									
24	T1	un		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALLER	un		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO									
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3	$ 158.782,00	$ -	10,13	$ 1.608.462	8,96	$ 1.422.687	-	$ -
36	SUBBASE	m3	$ 147.390,00	$ -	20,26	$ 2.986.121	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLICO	m3	$ 914.258,00	$ -	10,13	$ 9.261.434	8,96	$ 8.191.752	-	$ -
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg	$ 11.940,00	$ -	32,50	$ 388.050	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2	$ 153.338,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2	$ 140.618,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41	LOSETA 40X40	m2	$ 141.779,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un	$ 283.137,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

43	BOLARDO M62-M63	un	$ 391.882,00	$ -	1,00	$ 391.882	-	$ -	-	$ -
				$ -		**$ 14.635.949**		**$ 9.614.438**		**$ 0**
NO PREVISTOS										
44	NP-01 DUCTO 2" TOPO	ML	$ 312.892,30	$ -	43,00	$ 13.454.369	43,00	$ 13.454.369	-	$ -
45	NP-02 DUCTO 3" TOPO	ML	$ 313.093,59	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
46	NP-03 BARANDA TUBERÍA REDONDA	ml	$ 367.747,93	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47	NP-04 POSTE T1 TRONCOCÓNICO	un	$ 2.442.495,72	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	NP-05 POSTE T2 (L=3,5) TRONCOCÓNICO	un	$ 4.832.509,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	NP-06 POSTE T2 (L=4,5) TRONCOCÓNICO	un	$ 5.971.509,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50	NP-07 POSTE T2 (L=5,5) TRONCOCÓNICO	un	$ 6.239.509,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
51	NP-08 TAPA PARA CAJA SENCILLA	un	$ 525.832,08	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	NP-09 ROTURA Y EMPALME A CAJA EXISTENTE	un	$ 154.934,82	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53	NP-10 MARCO PARA TAPA ESPECIAL	un	$ 201.192,96	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				$ -		$ -		$ -	-	$ -
				$ -		**$ 13.454.369**		**$ 13.454.369**		**$ 0**
TOTAL calle 14 x carrera 56				**$ -**		**$ 182.780.526**		**$ 152.271.616**		**$ 12.642.765**

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
13	DUCTO 4" TOPO	183,86	39,5	

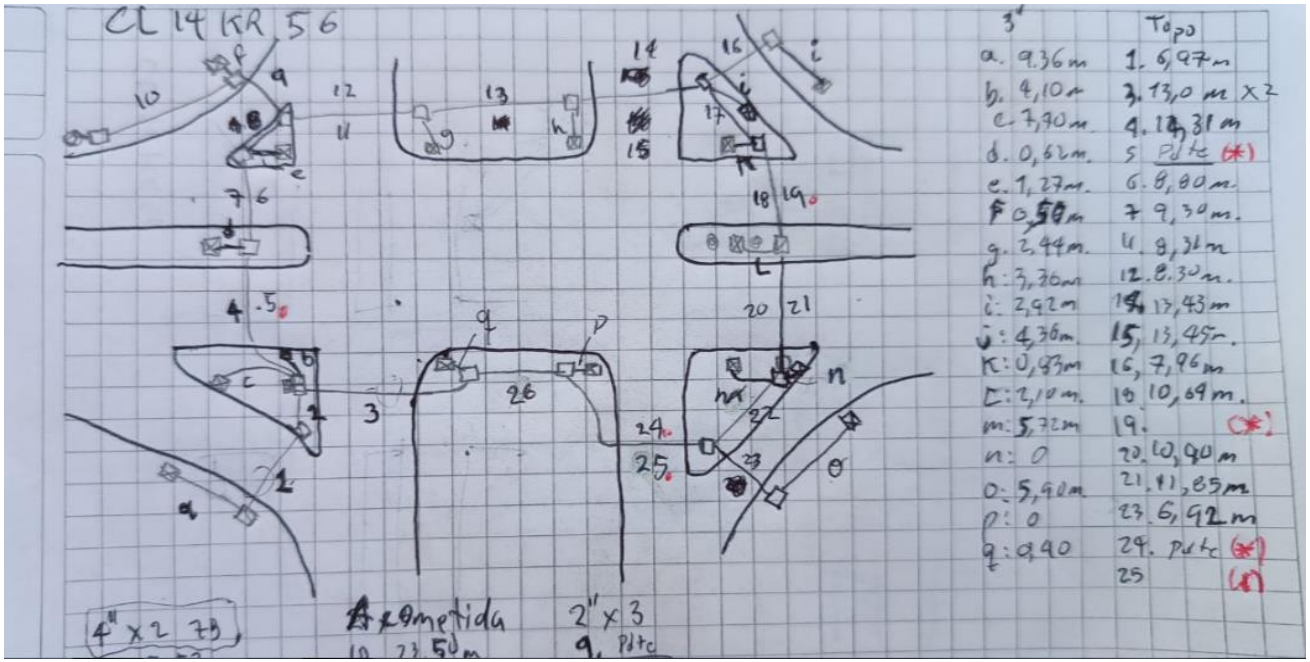

TOPO	LONG (m)
1	6,97
2	0
3	26
4	14,31
5	15,25
6	8,8
7	9,3
8	0
9	0
10	0
11	8,31
12	8,3
13	0
14	13,43
15	13,45
16	7,96
17	0
18	10,69
19	11,42
20	10,9
21	11,85
22	0
23	6,92
24	19,9
25	19,6
26	
TOTAL	**223,36**

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 04

CALLE 14 x CARRERA 39


							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 04	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	1,00	$ 1.138.436	-	$ -
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	1,00	$ 3.237.178	1,00	$ 3.237.178	-	$ -
						$ -		**$ 4.375.614**		**$ 4.375.614**		**$ 0,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	2,00	$ 1.570.282	-	$ -	-	$ -
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	1,00	$ 114.167		$ -	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	2,80	$ 218.708	4,30	$ 335.873	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	32,02	$ 3.079.780	32,76	$ 3.150.955	-	$ -
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	8,58	$ 978.781	-	$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	58,73	$ 9.575.692	56,40	$ 9.195.794	-	$ -
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	236,32	$ 75.638.942	222,28	$ 71.145.160	-	$ -
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	16,00	$ 16.996.048	15,00	$ 15.933.795	-	$ -
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	1,00	$ 2.239.023	1,00	$ 2.239.023	-	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	15,00	$ 23.989.080	14,00	$ 22.389.808	-	$ -
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	1,00	$ 1.801.281	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	1,00	$ 4.169.566	1,00	$ 4.169.566	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	1,00	$ 708.002	1,00	$ 708.002	-	$ -
						$ -		**$ 141.079.351**		**$ 129.267.976**		**$ 0**
	MANTENIMIENTO											
24	T1	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALL	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	16,058	$ 2.549.721	17,18	$ 2.727.875	-	$ -
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	16,058	$ 2.366.789	9,73	$ 1.434.105	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	16,058	$ 14.681.155	15,74	$ 14.390.421	-	$ -
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41	LOSETA 40X40	m2		$ 141.779,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$ 283.137,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$ 391.882,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

						$ -		$ 19.597.665		$ 18.552.400			$ 0
NO PREVISTOS													
44	NP-01 DUCTO 2" TOPO	ML		$ 312.892,30		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
45	NP-02 DUCTO 3" TOPO	ML		$ 313.093,59		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
46	NP-03 BARANDA TUBERÍA REDON	ml		$ 367.747,93		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
47	NP-04 POSTE T1 TRONCOCÓNICO	un		$ 2.442.495,72		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
48	NP-05 POSTE T2 (L=3,5) TRONCOC	un		$ 4.832.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
49	NP-06 POSTE T2 (L=4,5) TRONCOC	un		$ 5.971.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
50	NP-07 POSTE T2 (L=5,5) TRONCOC	un		$ 6.239.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
51	NP-08 TAPA PARA CAJA SENCILLA	un		$ 525.832,08		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
52	NP-09 ROTURA Y EMPALME A CAJ	un		$ 154.934,82		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
53	NP-10 MARCO PARA TAPA ESPEC	un		$ 201.192,96		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
						$ -		$ -		$ -			$ 0
TOTAL calle 14 x carrera 39						$ -		$ 165.052.630		$ 152.195.990		$ -	

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ML	32,76	0	Ejecucion parcial

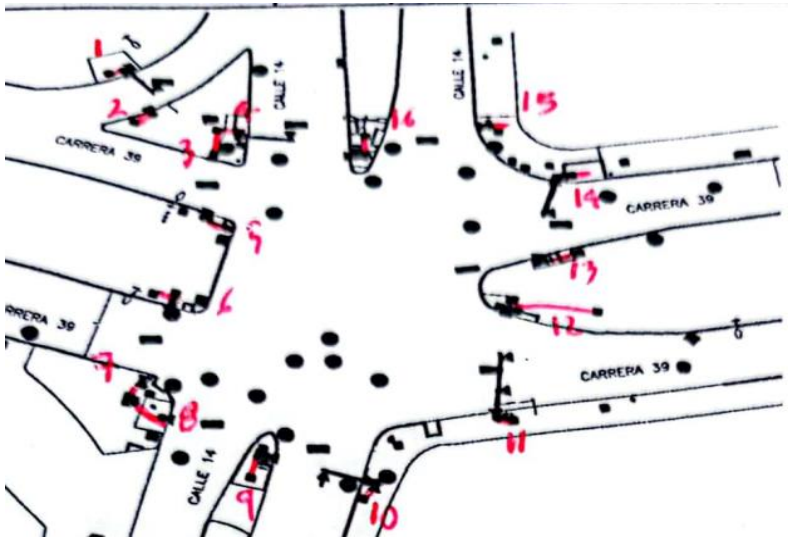


DUCTO	LONG (m)
1	0,51
2	0,52
3	1,50
4	3,32
5	0,48
6	0,90
7	0,78
8	4,91
9	
10	0,15
11	0,60
12	9,88
TOTAL	
13	3,37
14	0,84
15	2,40
16	2,40

pdte

DUCTO	LONG (m)
1	0,51
2	0,52
3	1,5
4	3,32
5	0,48
6	0,9
7	0,78
8	4,91
9	
10	0,15
11	0,6
12	9,88
13	3,37
14	0,84
15	2,6
16	2,4
TOTAL	**32,76**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
19	ANCLAJE TIPO 1	UN	14	0	Ejecucion parcial

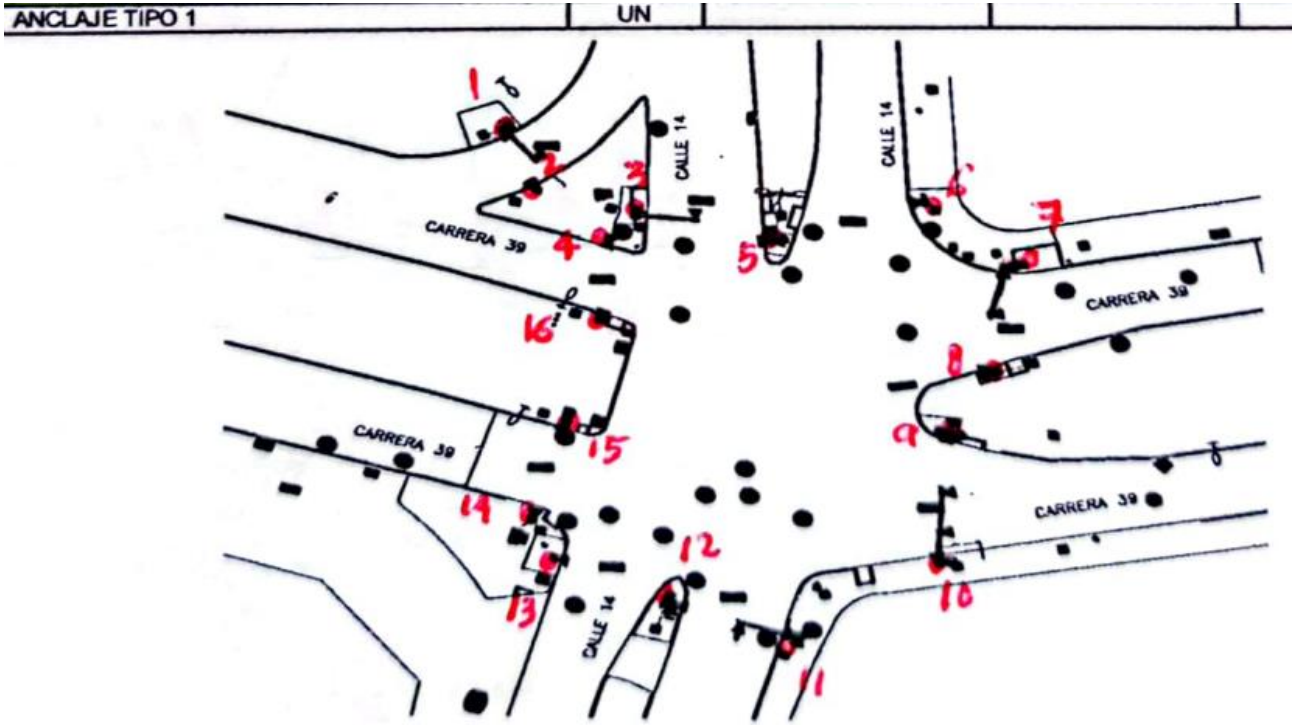

pendientes 2

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 04

CALLE 72W x CARRERA 28D

							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 04	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	1,00	$ 1.138.436	-	$ -
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	1,00	$ 3.237.178	1,00	$ 3.237.178	-	$ -
						$ -		**$ 4.375.614**		**$ 4.375.614**		**$ 0,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	2,00	$ 1.570.282	2,00	$ 1.570.282	-	$ -
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	2,00	$ 228.334	2,00	$ 228.334	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	17,95	$ 1.726.485	8,72	$ 838.716	-	$ -
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	22,52	$ 2.569.014	9,55	$ 1.089.435	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	146,27	$ 46.815.113	52,40	$ 16.771.668	-	$ -
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	7,00	$ 7.435.771	6,00	$ 6.373.518	-	$ -
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	5,00	$ 7.996.360	4,00	$ 6.397.088	-	$ -
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 68.341.359**		**$ 33.269.041**		**$ 0**
	MANTENIMIENTO											
24	T1	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALL	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	8,69	$ 1.379.816	1,34	$ 212.768	-	$ -
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	17,38	$ 2.561.638	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	8,69	$ 7.944.902	1,97	$ 1.801.088	-	$ -
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
41	LOSETA 40X40	m2		$ 141.779,00		$ -	3,38	$ 479.213	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$ 283.137,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$ 391.882,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

						$ -		$ 12.365.569		$ 2.013.856			$ 0		
NO PREVISTOS															
44	NP-01 DUCTO 2" TOPO	ML		$ 312.892,30		$ -	0	$ -		$ -	-	$ -			
45	NP-02 DUCTO 3" TOPO	ML		$ 313.093,59		$ -	0	$ -	19,90	$ 6.230.562	-	$ -			
46	NP-03 BARANDA TUBERÍA REDON	ml		$ 367.747,93		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -			
47	NP-04 POSTE T1 TRONCOCÓNICO	un		$ 2.442.495,72		$ -	11,00	$ 26.867.453	-	$ -	11,0	$ 26.867.453			
48	NP-05 POSTE T2 (L=3,5) TRONCOC	un		$ 4.832.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -			
49	NP-06 POSTE T2 (L=4,5) TRONCOC	un		$ 5.971.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -			
50	NP-07 POSTE T2 (L=5,5) TRONCOC	un		$ 6.239.509,00		$ -	2,00	$ 12.479.018	-	$ -	2,0	$ 12.479.018			
51	NP-08 TAPA PARA CAJA SENCILLA	un		$ 525.832,08		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -			
52	NP-09 ROTURA Y EMPALME A CAJ	un		$ 154.934,82		$ -	5,00	$ 774.674	-	$ -	-	$ -			
53	NP-10 MARCO PARA TAPA ESPEC	un		$ 201.192,96		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -			
						$ -		$ 40.121.145		$ 6.230.562			$ 39.346.471		
TOTAL calle 72W x carrera 28D						$ -		$ 125.203.687		$ 45.889.074			$ 39.346.471		

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA


SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
47	POSTE T1 TRONCOCÓNICO	UN	0	11	Ejecucion parcial

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
50	POSTE T2 (L=5,5) TRONCOCÓNICO	UN	0	2	Ejecucion parcial





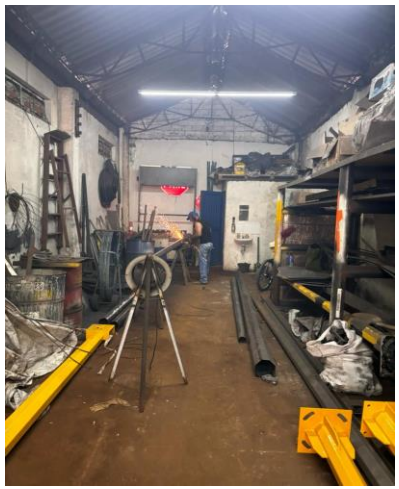

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 04

CALLE 25 Y 26 x CARRERA 98

INGENIERIA VIAL S.A.S.


							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 04	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	-	$ -	-	$ -
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 1.138.436**		**$ -**		**$ 0,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	65,70	$ 7.494.859	134,52	$ 15.345.638	13,99	$ 1.595.937
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	98,87	$ 31.645.561	31,37	$ 10.040.596		$ -
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	-	$ -	28,80	$ 10.560.730	-	$ -
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	8,00	$ 8.498.024	-	$ -	6,00	$ 6.373.518
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 47.638.444**		**$ 35.946.964**		**$ 7.969.455**
	MANTENIMIENTO											
24	T1	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALL	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	0	$ -	0,43	$ 68.276	0,12	$ 19.054
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	0	$ -	-	$ -	0,54	$ 493.699
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
41	LOSETA 40X40	m2		$ 141.779,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$ 283.137,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$ 391.882,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -

						$ -	0	$ -		$ 68.276			$ 512.753
NO PREVISTOS													
44	NP-01 DUCTO 2" TOPO	ML		$ 312.892,30		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
45	NP-02 DUCTO 3" TOPO	ML		$ 313.093,59		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
46	NP-03 BARANDA TUBERÍA REDON	ml		$ 367.747,93		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
47	NP-04 POSTE T1 TRONCOCÓNICO	un		$ 2.442.495,72		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
48	NP-05 POSTE T2 (L=3,5) TRONCOC	un		$ 4.832.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
49	NP-06 POSTE T2 (L=4,5) TRONCOC	un		$ 5.971.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
50	NP-07 POSTE T2 (L=5,5) TRONCOC	un		$ 6.239.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
51	NP-08 TAPA PARA CAJA SENCILLA	un		$ 525.832,08		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
52	NP-09 ROTURA Y EMPALME A CAJ	un		$ 154.934,82		$ -	10,00	$ 1.549.348	-	$ -	14,0	$	2.169.087
53	NP-10 MARCO PARA TAPA ESPECI	un		$ 201.192,96		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
						$ -		$ 1.549.348		$ -			$ 2.169.087
TOTAL calle 25 y 16 x carrera 98						$ -		$ 50.326.228		$ 36.015.240		$	10.651.295

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA


SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
11	DUCTO 4" EN ZONA BLANDA	ML	134,52	13,99	Ejecucion parcial

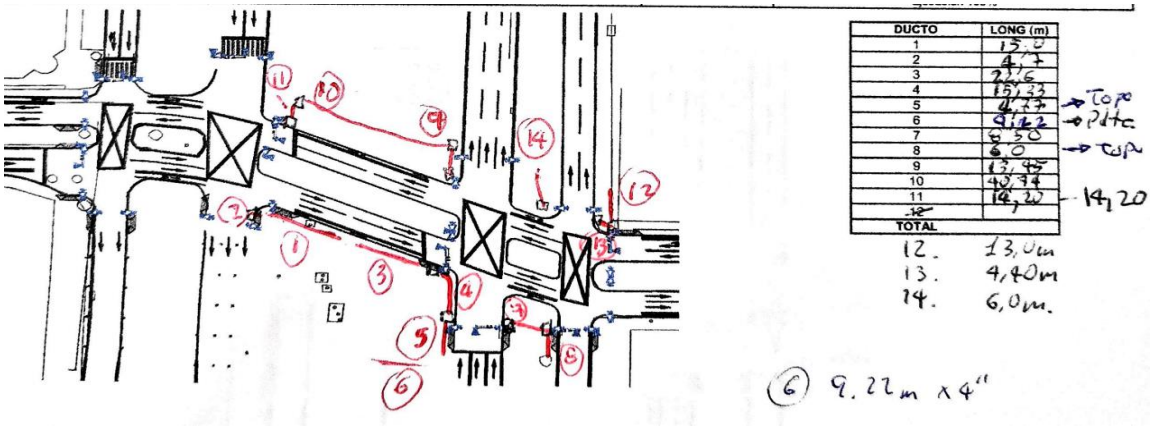

DUCTO	LONG (m)
1	15
2	4,7
3	22,6
4	15,33
5	4,77
6	9,22
7	8,5
8	0
9	13,45
10	40,74
11	14,2
12	0
13	0
14	0
15	
16	
TOTAL	**148,51**


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
13	DUCTO 4"TOPO	ML	31,37	15,00	Ejecucion parcial

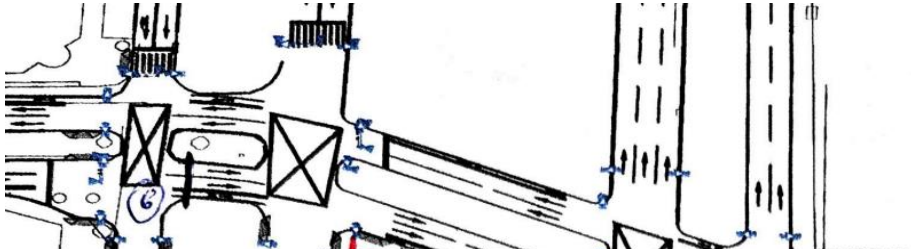

TOPO	LONG (m)
1	2,10
2	9,66
3	8,9
4	9,12
5	4,77
6	9,10
7	
8	
9	
10	

26,6


DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	
4	
5	4,77
6	9
7	




10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
TOTAL	


8	6
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
TOTAL	**19,77**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
14	DUCTO 4"DIRIGIDA	ML	28,8	0	Ejecucion parcial

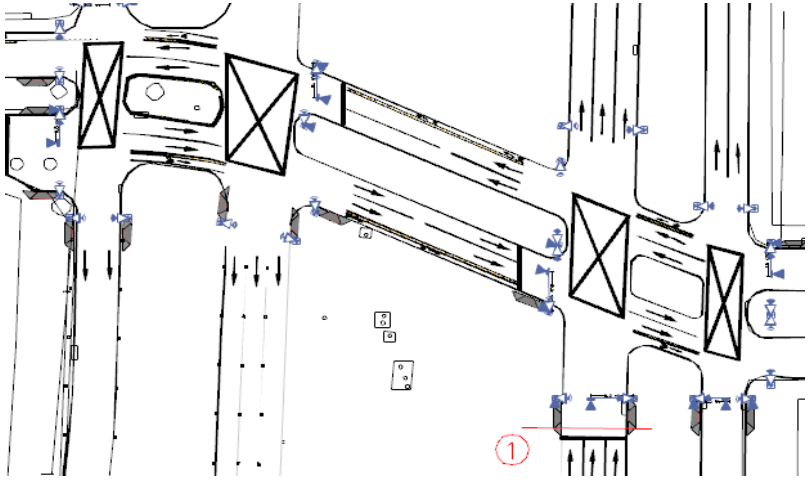


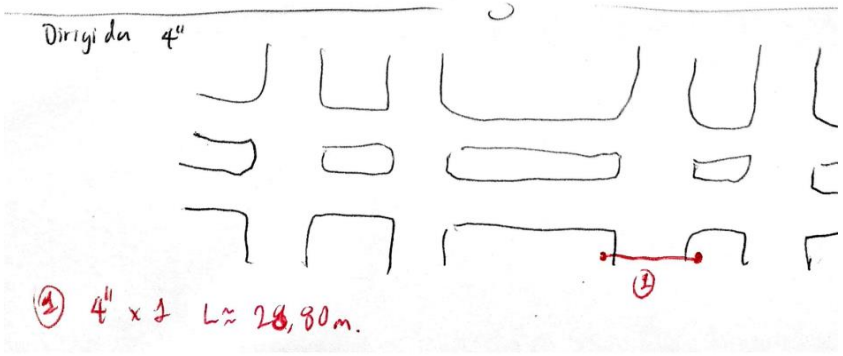

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
16	CAJA SENCILLA	UN	0	7,00	Ejecutado 100%

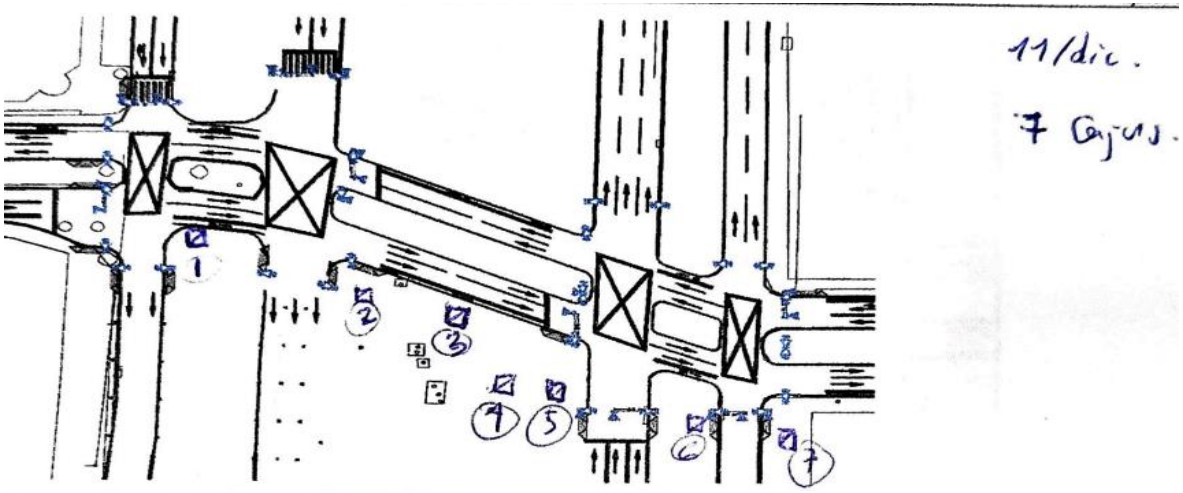


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 3	OBSERVACION
35	DEMOLICION DE ANDEN	M3	0,43	0,12	Ejecutado 100%

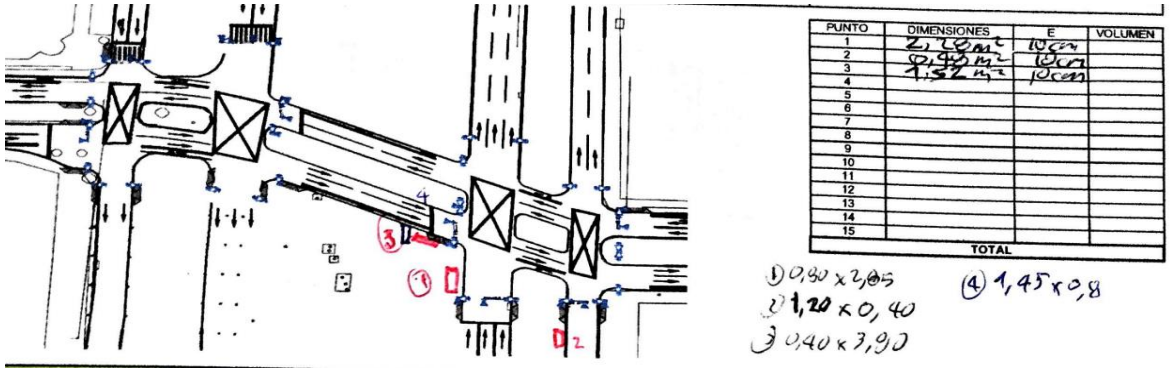


PUNTO	AREA	E	VOLUMEN
1	2,280	0,10	0,23
2	0,480	0,10	0,05
3	1,520	0,10	0,15
4	1,184	0,10	0,12
TOTAL			0,55

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 3	OBSERVACION
37	CONCRETO ESPACIO PUBLICO	M3	0	0,54	Ejecutado 100%

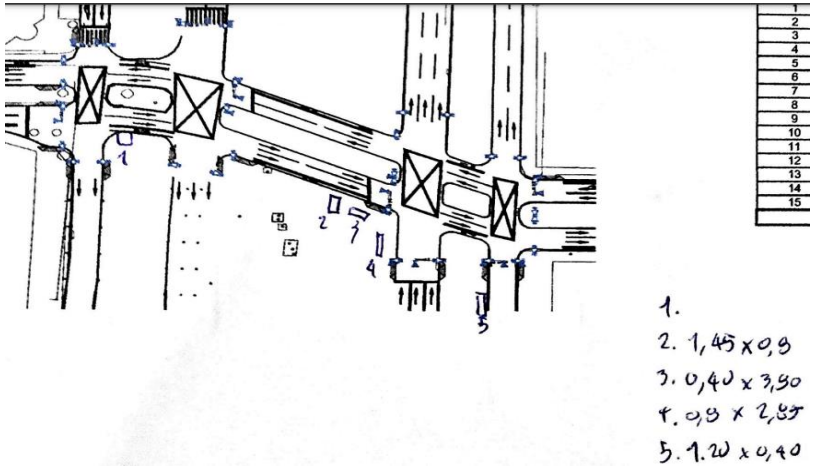

PUNTO	AREA	E	VOLUMEN
1	1,160	0,10	0,12
2	1,520	0,10	0,15
3	2,280	0,10	0,23
4	0,480	0,10	0,05
5			
TOTAL			0,54

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
52	ROTURA Y EMPALME A CAJA	M3	0	14,00	Ejecutado 100%

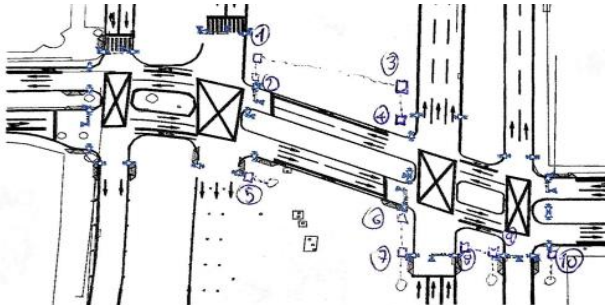

11/dic.	Retiro caja existente	UNIDAD.
1		2
2		1
3		2
4		1
5		1
6		1
7		2
8		1
9		2
10		1

JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORIAS ACTA 03

CALLE 5 x CARRERA 79


							BALANCE 1		ACUMULADO		ACTA 03	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR POR CANTIDAD
	PRELIMINARES											
1	DISEÑO DE INTERSECCIÓN	un		$1.138.436,00		$ -	1,00	$ 1.138.436	-	$ -	-	$ -
2	SOCIALIZACIÓN	un		$ 3.237.178,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 1.138.436**		**$ -**		**$ 0,00**
	OBRA CIVIL											
3	RETIRO ANCLAJE	un		$ 785.141,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4	DEMOLICION DE CAJA	un		$ 114.167,00		$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
5	DUCTO 2" ZONA DURA	ml		$ 152.060,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6	DUCTO 3" ZONA DURA	ml		$ 135.195,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
7	DUCTO 4" ZONA DURA	ml		$ 161.949,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
8	DUCTO 4"X2 ZONA DURA	ml		$ 182.602,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
9	DUCTO 2" ZONA BLANDA	ml		$ 78.110,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
10	DUCTO 3" ZONA BLANDA	ml		$ 96.183,00		$ -	6,00	$ 577.098	-	$ -	-	$ -
11	DUCTO 4" ZONA BLANDA	ml		$ 114.077,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
12	DUCTO 4"X2 ZONA BLANDA	ml		$ 163.046,00		$ -	33,00	$ 5.380.518	-	$ -	-	$ -
13	DUCTO 4" TOPO	ml		$ 320.070,00		$ -	146,55	$ 46.905.053	20,00	$ 6.401.400	-	$ -
14	DUCTO 4" DIRIGIDA	ml		$ 366.692,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	82,03	$ 30.079.745
15	TUBO PUENTE	ml		$ 345.403,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
16	CAJA SENCILLA	un		$ 1.062.253,00		$ -	7,00	$ 7.435.771	2,00	$ 2.124.506	-	$ -
17	CAJA DOBLE	un		$ 1.736.278,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	CAJA PRINCIPAL	un		$ 2.239.023,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
19	ANCLAJE TIPO 1	un		$ 1.599.272,00		$ -	3,00	$ 4.797.816	-	$ -	-	$ -
20	ANCLAJE TIPO 2	un		$ 1.801.281,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
21	PEDESTAL TIPO 1	un		$ 1.312.809,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
22	PEDESTAL TIPO 2	un		$ 4.169.566,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
23	DUCTO PARA ACOMETIDA	un		$ 708.002,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ 65.096.256**		**$ 8.525.906**		**$ 30.079.745**
	MANTENIMIENTO											
24	T1	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	T1X	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	T2 (3.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27	T2 (4.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	T2 (5.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	T2 (6.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	T2 (8.5m)	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31	MANTENIMIENTO POSTE EN SITIO	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32	MANTENIMIENTO POSTE EN TALL	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	REPARACIÓN TRAMO POSTE	ml				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34	REPARACIÓN BASE POSTE	un				$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						$ -		**$ -**		**$ -**		**$ 0**
	ESPACIO PUBLICO											
35	DEMOLICIÓN DE ANDÉN	m3		$ 158.782,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
36	SUBBASE	m3		$ 147.390,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
37	CONCRETO 3000 ESPACIO PUBLIC	m3		$ 914.258,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
38	ACERO ESPACIO PUBLICO	kg		$ 11.940,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
39	ADOQUIN 20x10 COLORES	m2		$ 153.338,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
40	ADOQUIN 60x14 COLORES	m2		$ 140.618,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
41	LOSETA 40X40	m2		$ 141.779,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
42	BOLARDO M60	un		$ 283.137,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
43	BOLARDO M62-M63	un		$ 391.882,00		$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -

						$ -		$ -		$ -			$ 0
NO PREVISTOS													
44	NP-01 DUCTO 2" TOPO	ML		$ 312.892,30		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
45	NP-02 DUCTO 3" TOPO	ML		$ 313.093,59		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
46	NP-03 BARANDA TUBERÍA REDON	ml		$ 367.747,93		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
47	NP-04 POSTE T1 TRONCOCÓNICO	un		$ 2.442.495,72		$ -	1,00	$ 2.442.496	-	$ -	1,000	$	2.442.496
48	NP-05 POSTE T2 (L=3,5) TRONCOC	un		$ 4.832.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
49	NP-06 POSTE T2 (L=4,5) TRONCOC	un		$ 5.971.509,00		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
50	NP-07 POSTE T2 (L=5,5) TRONCOC	un		$ 6.239.509,00		$ -	2,00	$ 12.479.018	-	$ -	2,000	$	12.479.018
51	NP-08 TAPA PARA CAJA SENCILLA	un		$ 525.832,08		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
52	NP-09 ROTURA Y EMPALME A CAJ	un		$ 154.934,82		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
53	NP-10 MARCO PARA TAPA ESPEC	un		$ 201.192,96		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$	-
						$ -		**$ 14.921.514**		**$ -**			**$ 14.921.514**
TOTAL calle 5 x carrera 79						**$ -**		**$ 81.156.206**		**$ 8.525.906**		**$**	**45.001.259**


JC INGENIERIA VIAL
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUPERVISIÓN


ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
13	DUCTO 4"TOPO	ML	20	0,00	Ejecucion parcial

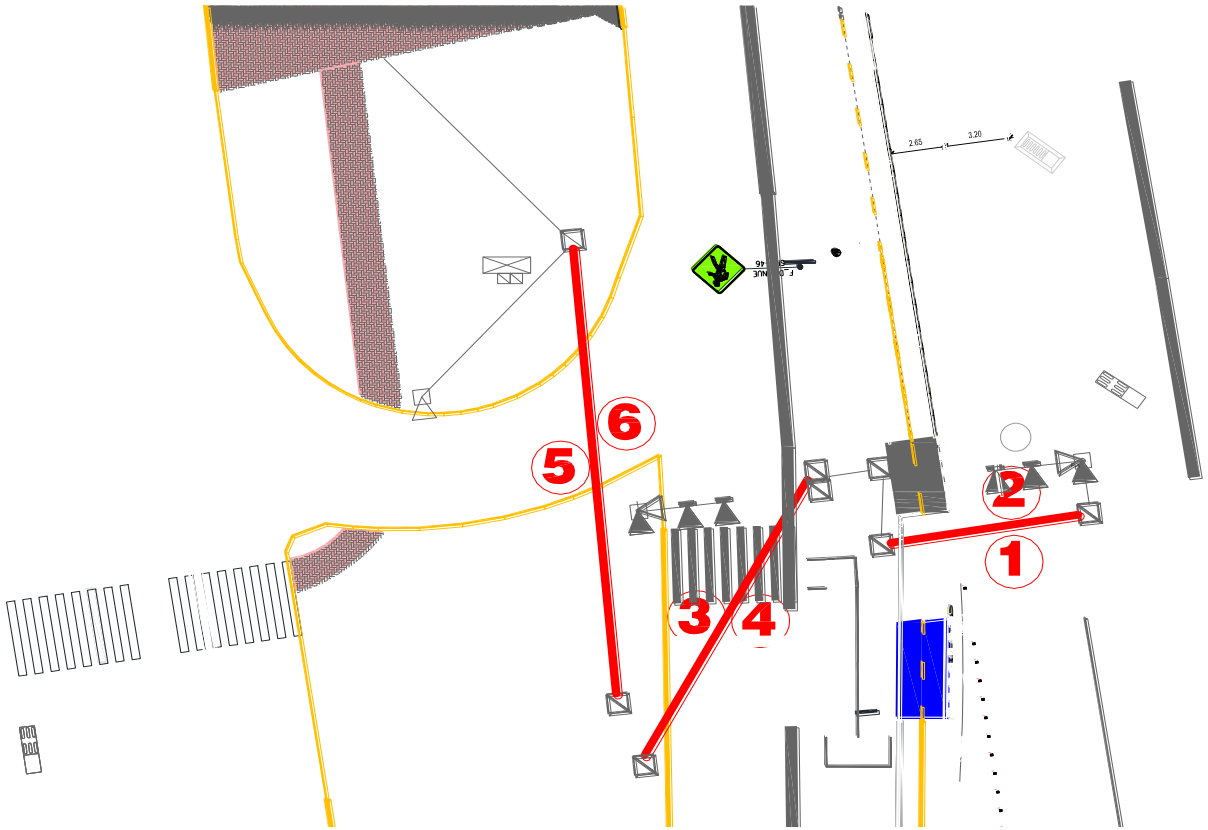


DUCTO	LONG (m)
1	8,87
2	8,8
3	
4	
5	
6	
7	
TOTAL	**17,67**

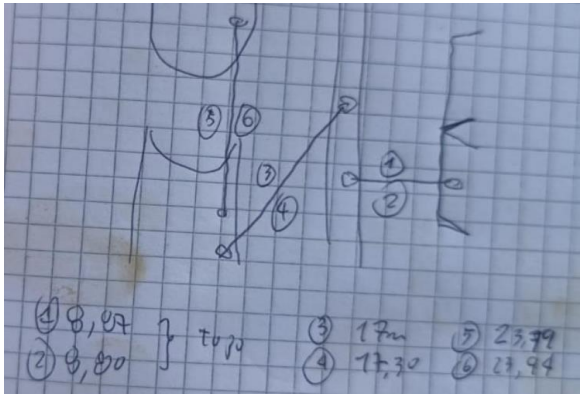

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
14	DUCTO 4"DIRIGIDA	ML	0	82,03	Ejecucion parcial

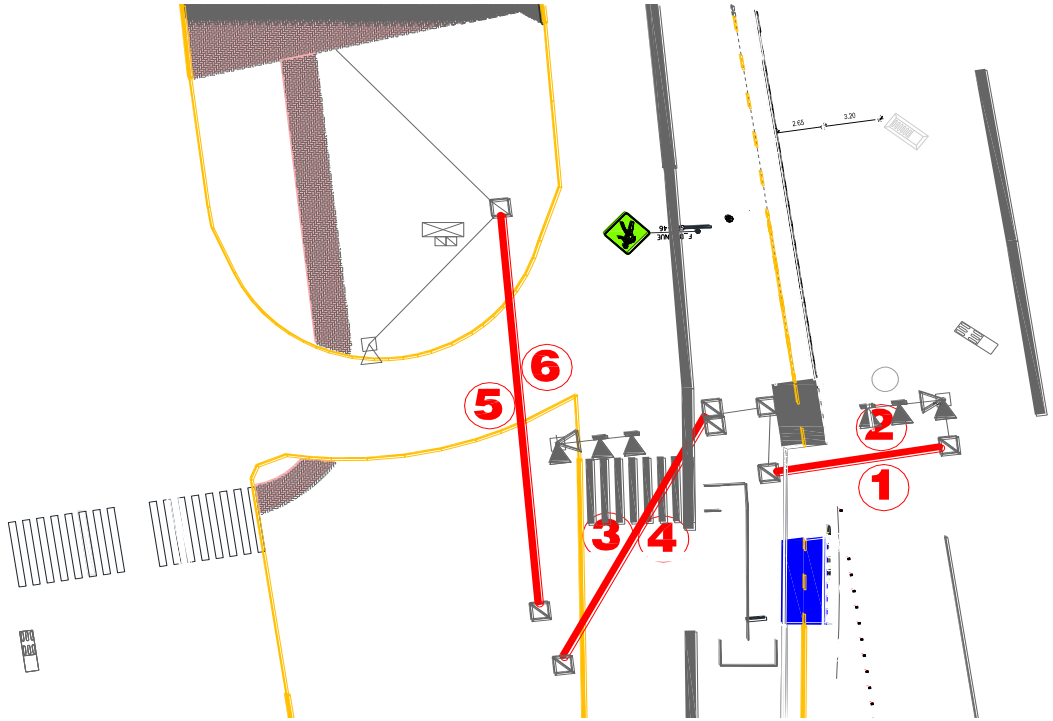

DUCTO	LONG (m)
1	
2	
3	17
4	17,3
5	23,79
6	23,94
7	
TOTAL	82,03

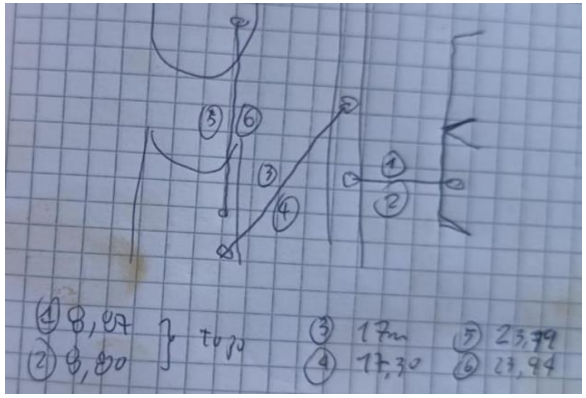

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
47	POSTE T1 TRONCOCÓNICO	UN	0	1	Ejecucion parcial

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACUM. ANTERIOR	ACTA 4	OBSERVACION
50	POSTE T2 (L=5,5) TRONCOCÓNICO	UN	0	2	Ejecucion parcial

