INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2295-22 MANAURE- LA GUAJIRA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **NOVIEMBRE** DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE MANAURE – GUAJIRA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 2 # 4 oeste – 32 barrio Manaure abajo		
BENEFICIARIO:	MANAURE – LA GUAJIRA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.470.717.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 698.013.885,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 2.168.730.885,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/04/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	HERNANDO DE JESUS PEREZ PEREZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR	27/12/2022	19/02/2023
	HÉCTOR IVÁN AYALA DUEÑAS	20/02/2023	30/06/2023
	EDGAR GONZALEZ PATIÑO	1/07/2023	20/07/2023
	HERNANDO DE JESUS PEREZ PEREZ	21/07/2023	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JULIO CESAR JARAVA DIAZ	01/02/2023	18/07/2023
	EDINSON GARCIA DIAZ	01/08/2023	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2022	No. 168722	27/12/2022	31/12/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2023	No. 22623	20/01/2023	31/12/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA 2023	No. 2-2022-060095	14/12/2022	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3526817–1	06/01/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06/01/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 31/12/2023
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 30/04/2023
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 29/01/2024
	FECHA: 30/06/2024
	FECHA: 30/10/2024
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 98.047.997
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 49.024.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	$ 1.225.597.003
VALOR INTERVENTORÍA	$ 98.048.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 659.733.990
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORÍA	$ 38.279.895

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**UN PRIMER DESEMBOLSO, del cuarenta por ciento (40%) del valor del convenio equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800),** contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza**.**	NO APLICA	08/03/2023	$ 588.286.800,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	**UN SEGUNDO DESEMBOLSO** del veinte cinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	DD/MM/AAAA	$ 367.679.250,00
TERCER DESEMBOLSO	**UN TERCER DESEMBOLSO** del veinte cinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro	70%	DD/MM/AAAA	$ 367.679.250,00

	fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP**.**			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	**UN ÚLTIMO DESEMBOLSO,** del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700),** contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 147.071.700,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 588.286.800,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **SURAMERICANA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	Cumplimiento	$ 294.143.400,00	29/12/2022	30/10/2024
	Calidad de servicio	N/A	N/A	N/A

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. Del contrato: CONTRATO DE OBRA 094 DE 2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	$ 1.225.597.003.2
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 659.733.990
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRUCCION SACUDETE	
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/05/2023	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	06/02/2024 (4 MESES)	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	06/02/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.983.378.993,07
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	3017851 aprobada: 24/05/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del contrato: 08/05/2023 HASTA 08/02/2024 Pago salarios prestaciones: 08/05/2023 HASTA 08/10/2026 Estabilidad de la obra: 08/10/2023 HASTA 08/10/2028 Calidad del servicio: 08/10/2023 HASTA 08/10/2028		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría a Estudios, Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. Del contrato : CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.100 DE 2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		$147.072.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 38.279.895,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERSACUTEDE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/05/2023		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	06/02/2024 (4 MESES)	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	06/02/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$185.351.895,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	**No. 46-44-101011675 Aprobada: 19/05/2023**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**Cumplimiento del Contrato: 08/05/2023 HASTA 07/02/2024** **Buen manejo de anticipo: 08/05/2023 HASTA 07/02/2024** **Pago de salarios: 08/05/2023 HASTA 08/10/2026** **Calidad del Servicio: 08/05/2023 HASTA 08/05/2028**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	

INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**50%**
% EJECUTADO DE OBRA	**45%**
Durante el periodo que comprende desde de noviembre se realizaron actividades físicas relacionadas a instalaciones hidráulicas, sanitarias y desagües, acero de refuerzo, concreto de zapatas, vigas, columnas, bordillos de confinamiento, colocación de material geotextil, concreto de placa cancha, mampostería, permitiendo a través de esto generar un porcentaje de ejecución del 32,3%, por lo tanto, en este periodo se tiene un porcentaje acumulado del 45% en la ejecución física en referencia a lo contratado Se realizó reuniones con el objetivo de realizar seguimientos al convenio.	
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: El contratista logro avanzar al 45% toda vez que se realizó la ejecución de los Ítems **1. Instalación hidráulica, sanitarias y desagües** **2. Fundida de zapatas, pedestales, vigas de cimentación y bordillo de confinamiento** **3. Instalación de geotextil y fundida de placa**	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

18/10/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

HERNANDO DE JESUS PEREZ PEREZ Supervisor Convenio No. 2295-22 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**EDINSON GARCIA DIAZ** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

	INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO – FONSECON** Convenio Interadministrativo No. **2295 de 2022**, MUNICIPIO DE **MANAURE – LA GUAJIRA** INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN 9 DENOVIEMBRE – 8 DE DICIEMBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	**CALLE 2 No 4 oeste 32 barrio Manaure abajo**		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.470.717.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$659.733.990,05 $38.279.895,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.168.730.885,05
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de Dic -2022		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	25-jul-2023	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30-Abr-2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	**ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA**	**DESDE:** 11 DE ENERO -2023	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	DD-MES-AAAA	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	623-54	22-02-2023	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	6423	02-10-2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	23-206	03-04-2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	23-689	04-10-2023	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 92022	23-12-2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3526817-1 Suramericana	06- enero-2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	06-enero-2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA	**FECHA:** 31/12/2023	
	SEGUNDA PRORROGA	**FECHA:** 30/04/2024	
	N/A	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	N/A	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	N/A	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA: 06/1/2023 PÓLIZA INICIAL DEL CONVENIO**		
	N/A		
	N/A		

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 98.048.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 49.024.000

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$ 0
VALOR DE OBRA	$ 1.225.597.000
VALOR INTERVENTORÍA	$ 98.048.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$659.733.990,05
VALOR ADICIONAL DE INERVENTORIA	$38.279.895,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	UN PRIMER DESEMBOLSO, del cuarenta por ciento (40%) del valor del convenio equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($588.286.800), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. Aprobación de Póliza	NO APLICA	HA SIDO PAGADO	$ 588.286.800
SEGUNDO DESEMBOLSO	UN SEGUNDO DESEMBOLSO del veinticinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del Supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	NO HA SIDO PAGADO	$ 367.679.250
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO del veinte cinco (25%) del valor del convenio equivalente a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($367.679.250), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	NO HA SIDO PAGADO	$ 367.679.250,00

ULTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, del diez por ciento (10%) del valor del convenio equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($147.071.700), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el	100%	NO HA SIDO PAGADO	$147.071.700,00
	municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 588.286.800
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 588.286.800

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: <u>suramericana</u>

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3526817-1	Cumplimiento	$ 294.143.400,00	29/12/2022	29/01/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra (Adjudicado)***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
CONTRATO DE OBRA 094 DE 2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.		$1.225.597.003,20
Nota aclaratoria CONTRATO DE OBRA 094 DE 2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.		$98.047.999,82
Link de Consulta:	Detalle del proceso: LOP-002 DE 2023 (contratos.gov.co)		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/11/2023		$659.733.990,05
	DD/MM/AAA A		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN SACÚDETE		$1.323.645.003,20
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/05/2023		CINCO MESES
Prórrogas, Suspensiones y	PRÓRROGA	04/10/2023	CUATRO (4) MESES
	SUSPENSIÓN	N/A	

Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	REINICIO	N/A	
Fecha Inicial de terminación del contrato	08/10/2023	**Fecha Actual de terminación del contrato**	07/02/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$1.983.378.993,07
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**PREVISORA SEGUROS**		
PÓLIZA No.	3017851 **aprobada:** 24/05/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del contrato: 08/05/2023 HASTA 08/02/2024		
	Pago salarios prestaciones: 08/05/2023 HASTA 08/10/2026		
	Estabilidad de la obra: 08/10/2023 HASTA 08/10/2028		
	Calidad del servicio: 08/10/2023 HASTA 08/10/2028		
PÓLIZA No.	**1012941**		
	Responsabilidad civil: 08/05/2023 HASTA 08/10/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra (Adjudicado)***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.100 DE 2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.		$147.072.000,00
Link de Consulta:	Detalle del proceso: CMA-001 DE 2023 (contratos.gov.co)		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/11/2023		$ 38.279.895,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERSACUTEDE		$147,072,000.00
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/05/2023		CINCO (5) MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	4/10/2023	CUATRO (4) MESES
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	08/10/2023	**Fecha Actual de terminación del contrato**	07/02/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$185,351,895.00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. 46-44-101011675 **Aprobada:** 19/05/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 08/05/2023 HASTA 07/02/2024		
	Buen manejo de anticipo: 08/05/2023 HASTA 07/02/2024		
	Pago de salarios: 08/05/2023 HASTA 08/10/2026		
	Calidad del Servicio: 08/05/2023 HASTA 08/05/2028		

5. INFORME TÉCNICO

INTRODUCCIÓN	Se firma un convenio interadministrativo celebrado entre la nación-Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de MANAURE (LA GUAJIRA), cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE MANAURE - LA GUAJIRA", de este convenio de derivan dos contratos, el de estudio, diseño y obra y el de interventoría, posterior a la adjudicación de los contratos derivados viene la etapa de ejecución, esta tiene dos partes, la primera corresponde al estudio y diseño, al hacer entrega de los documentos requeridos viene la ejecución de la obra, en las dos etapas están integradas con la interventoría respectiva.
GENERALIDADES	• El día 27 de diciembre de 2022 se firma el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2095 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA. El 06 de enero de 2023 se firma el acta de inicio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2020 DE 2095 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA, por parte del señor alcalde del Municipio de Manaure Elven Manuel Meza Barros y el supervisor de convenio No.2095 de 2022 del Ministerio Norman Eduardo Ortiz Tovar. • El día 11 de enero de 2023 fue expedida la designación del supervisor para el convenio interadministrativo No 2095 de 2022 designando a la funcionaria ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA. Quien funge como directora de planeación y obras del Municipio de Manaure, La Guajira. • El municipio incorporo los recursos del convenio al presupuesto del municipal, mediante decreto No 012 del 09 de febrero de 2023 • El día 20 de febrero del 2023 el municipio inicio el proceso precontractual en la plataforma Secop I de obra para la "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", Proceso de licitación Obras pública No 002 de 2023, por un valor de $1.225.597.003.20. • El día 08 de marzo de 2023 recibió el único giro a la fecha por

	parte de la nación-Ministerio del Interior-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-FONSECON por valor de $588.286.800. ese mismo día se realizó apertura del proceso de LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA No. 002 DE 2023 para contratar ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA • El día 31 de marzo de firma el contrato de CONTRATO DE OBRA 094 DE 2023 cuyo objeto es ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. • El día 19 de abril se adjudica el contrato de interventoría y se procede a los tramites de legalización del contrato para suscribir acta de inicio. • Durante el periodo que comprende desde el 9 de noviembre al 8 de diciembre se realizaron actividades físicas relacionadas a instalaciones hidráulicas, sanitarias y desagües, acero de refuerzo, concreto de zapatas, vigas, columnas, bordillos de confinamiento, colocación de material geotextil, concreto de placa cancha, mampostería, permitiendo a través de esto generar un porcentaje de ejecución del 35,15%, por lo tanto, en este periodo se tiene un porcentaje acumulado del 47.85% en la ejecución física en referencia a lo contratado.

- ***Avance de Estudios y Diseños***

CONTRATO DE OBRA N° 094 de 2023	
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FÍSICO EJECUTADO:	100%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 98.048.000
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	$ 98.048.000
OBSERVACIONES:	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños***

CONTRATO DE OBRA N° 100 de 2023	
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FÍSICO EJECUTADO:	100%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 49.024.000
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	$ 49.024.000
OBSERVACIONES:	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.


FECHA OFICIO	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVÍA	CARGO QUIEN RECIBE

- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA	DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

- ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

ACTA N°	**% EJECUCIÓN**	**EGRESO N°**	**FECHA**	**VALOR OBRA**	**ANTICIPO**		**ACUMULADO**
					AMORTIZADO	**SALDO**	
	35.15		08/12/2023	$678.910.629,78			$ 922.271.231,78
TOTALES							

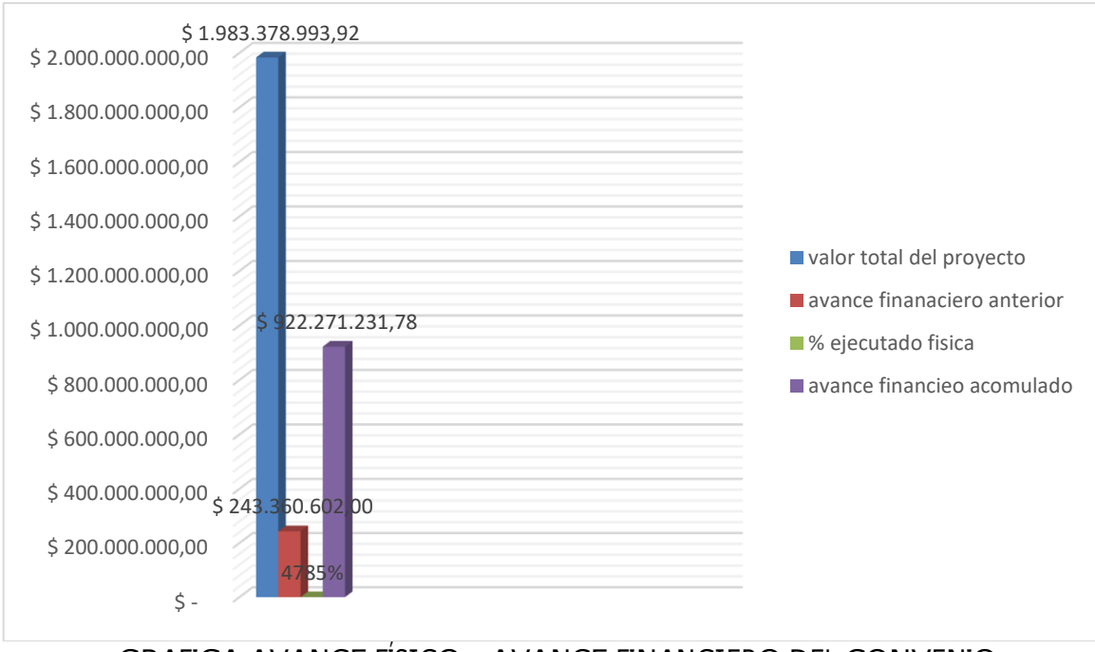

GRAFICA AVANCE FÍSICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	VISITAS TÉCNICAS	EJECUTADO	47.85
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DESAGÜES, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO DE ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS, BORDILLOS DE CONFINAMIENTO, COLOCACIÓN DE MATERIAL GEOTEXTIL, CONCRETO DE PLACA CANCHA, MAMPOSTERÍA .		
	OBSERVACIONES:		
	N/A		

















PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS.	**N/A**

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA Supervisor del Convenio Directora de planeación y obras publicas	

Se Anexa (X) Folio, a saber: N/A
