FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL							
Página: 1 de 1				DIA	27	MES	4	AÑO	2023						
SEMANA N°	33	DEL	20 de abril de 2023				AL	26 de abril de 2022							
FECHA INICIO :	1 de julio de 2022		FECHA TERMINO :		27 de junio de 2023										

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORRES	NIT O C.C.	3.249.514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
PRELIMINARES	3,6615%	3,6615%		
CIMIENTOS	0,1938%	0,1938%		
INS. SANITARIAS Y PTAR	1,4946%	0,9872%		EL ATRASO SE DEBE A QUE SE NECESITA CAMBIAR LA ESPECIFICACION DEL TANQUE FAFA DE 20000 LT POR LO 4 DE 5000 LT (SOLICITUD HECHA A LA SUERVISION)
PISOS-BASES-RELLENOS	0,3842%	0,3842%		
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,6868%	0,6868%		
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	5,8322%	5,4322%		SE PRESENTA ATRASO POR CAMBIO DE ESPECIFICACION PARCIAL DE ACOMETIDA DESDE BOCATOMA HASTA PUNTO DE ACOMETIDA DE BASE
OBRAS EXTERIORES	26,7995%	26,7620%		
NO PREVISTOS	9,6636%	9,6636%	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	
BM-26 BASES MILITARES	45,4879%	44,9533%	SE AVANZA EN PARTE INTERNA DE MODULARES (CIELO RASO, PISOS, REDES ELECTRICAS, PUERTAS Y VENTANAS)	
TOTALES	94,20%	92,72%	Semana Anterior	91,40%

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	3.525.659.318,55	3.269.151.884,52	**256.507.434,03**		1,32%	92,72%

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1	DIA	27	MES	4	AÑO	2023

SEMANA N°	33	DEL	20 de abril de 2023	AL	26 de abril de 2022


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	-	INSPECTOR	-
INGENIEROS	1,0	OBREROS	5,0
TOPÓGRAFO	-	AYUDANTES	11,0
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI [ ] NO [X]

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

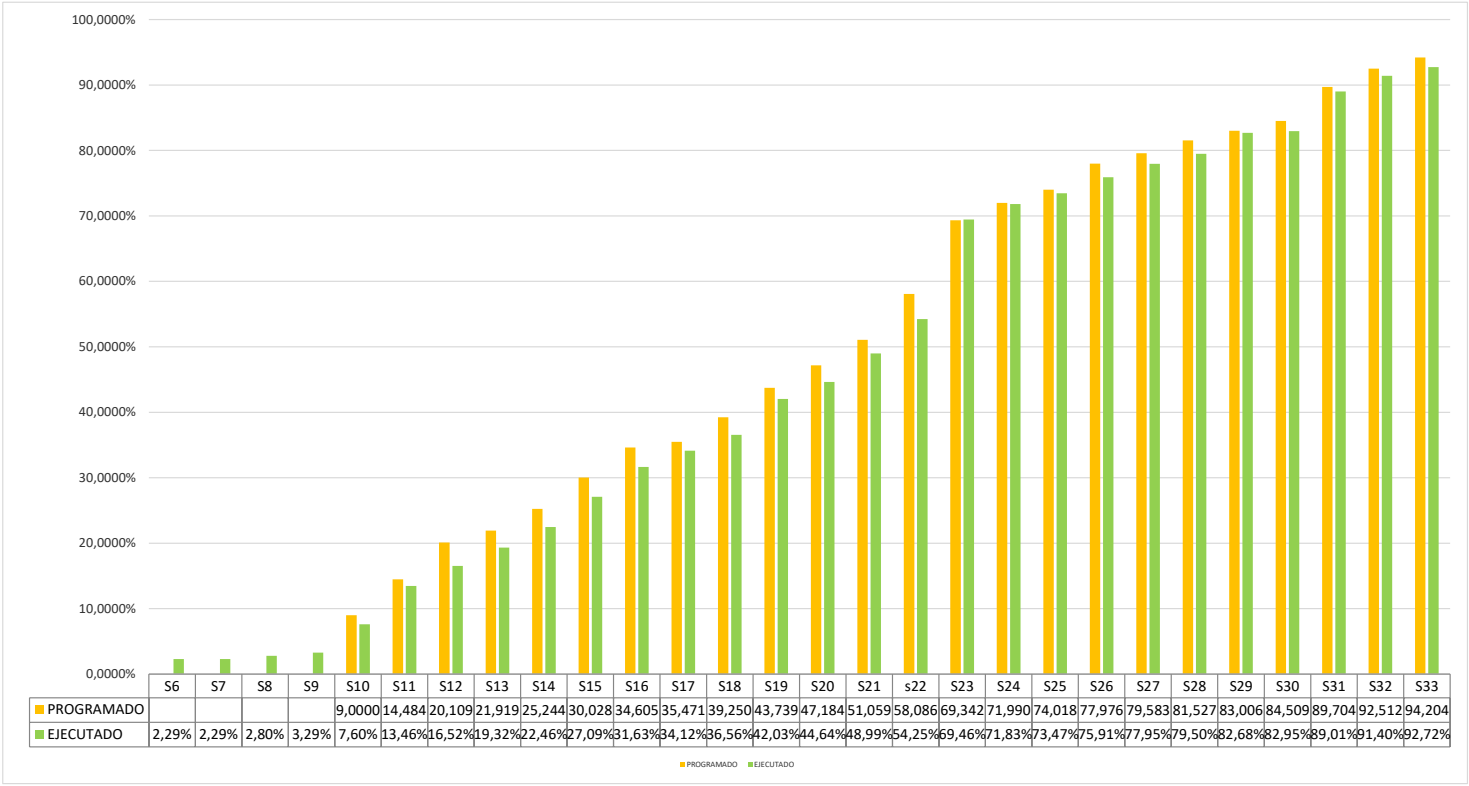

	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	s22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33
PROGRAMADO					9,0000	14,484	20,109	21,919	25,244	30,028	34,605	35,471	39,250	43,739	47,184	51,059	58,086	69,342	71,990	74,018	77,976	79,583	81,527	83,006	84,509	89,704	92,512	94,204
EJECUTADO	2,29%	2,29%	2,80%	3,29%	7,60%	13,46%	16,52%	19,32%	22,46%	27,09%	31,63%	34,12%	36,56%	42,03%	44,64%	48,99%	54,25%	69,46%	71,83%	73,47%	75,91%	77,95%	79,50%	82,68%	82,95%	89,01%	91,40%	92,72%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se recibio por parte dSe de obra Balance, con solicitud de cambio de especificacion de algunos items, y creacion de Items No Previstos, el cual fue tramitado ante la entidad contratante mediante comunicación CENAC-ARGELIA-068-2022-C -solicitud inclusion np, adicion presupuestal
Se realiza remates en Andenes y Cunetas solicitados por la Interventoria
Se Avanza con cercado de alambre de puas y Caballos de Frisa
Se continua con trabajo en modulos, con piso laminado, instalaciones electricas internas y cielo raso metalico, Mobiliario de Alojamientos, aparatos sanitarios de Comando de Comunicaciones
Se realiza aseo programado a Planta de Tratamiento de Agua Potable y hace revision de valvulas
Se avanza con instalaciones internas de rancho de tropa y avanza con la estructura de la Enfermeria
Se Continua con fabricacion de mobiliario de rancho de tropa en acero y con instrumentos de enfermeria
Se realizaron durante la Semana Reunion SST, Manejo Ambiental de desechos, Movimientos de Personal Militar dentro de la Base para intervencion de Obra

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:	Versión:	Fecha de Emisión: 26/04/2023	Página:

SEMANA N°	33	DEL	20 de abril de 2023	AL	26 de abril de 2022
FECHA INICIO :	1/07/2022	FECHA TERMINO :	27/06/2023		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3249514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 1

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
CABALLOS DE FRISA	



Fotografia 2

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
CABALLOS DE FRISA	



Fotografia 3

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
ALOJAMIENTOS 8H	



Fotografia 4

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS	
CENTRO DE ACOPIO	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL									
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión: 26/04/2023**			**Página:**	
SEMANA N°	33	**DEL**	20 de abril de 2023			**AL**	26 de abril de 2022		
FECHA INICIO :	**1/07/2022**		**FECHA TERMINO :**	**27/06/2023**					

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO	**DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN**				
INTERVENTOR	**NESTOR ROJAS TORREZ**	**NIT O C.C.**	**3249514**	**CONTRATO N°**	**No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022**
CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS ARGELIA**	**NIT O C.C.**	**901.585.221-1**	**CONTRATO N°**	**163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO






Fotografia 5

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
DEPOSITO	



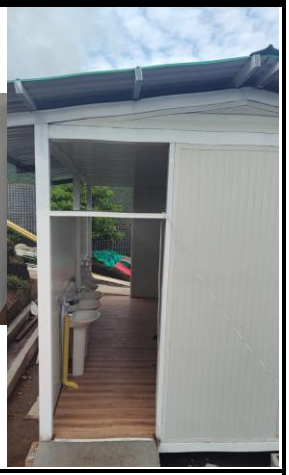

Fotografia 6

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
BAÑO No 1	
