INGETECO S.A.S.
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA COLOMBIANA
NIT. 900.301.744-8

PIEDECUESTA, 28 DE DICIEMBRE DE 2023

Señores:
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
ATTE. INGENIERO CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA SUPERVISOR DEL CONTRATO 308 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P.

Asunto: Informe único con objeto "REALIZAR INTERVENCIONES VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"

CONTRATO 308 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023

De manera atenta me permito remitir los siguientes documentos correspondientes al contrato de obra 308 de 13 de diciembre de 2023 cuyo objeto es:

"REALIZAR INTERVENCIONES VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"
Expedientes:

- ✓ Informe de actividades del contratista N° 1 (Original a color)
- ✓ Factura
- ✓ Certificación Cuenta Bancaria (1 copias)
- ✓ Planilla de Seguridad Social (2 copias)
- ✓ Rut (1 copia)
- ✓ Pago de Estampillas (Original y copia)
- ✓ Contrato (1 copia)

Cordial saludo,

Janeth Xiomara Noriega Bohórquez
C.C 1.102.350.707
REPRESENTA LEGAL INGETECO
NIT.900301744-8

INGETECO S.A.S.
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA COLOMBIANA
NIT. 900.301.744-8

INFORME ÚNICO CON OBJETO: "REALIZAR INTERVENCIONES VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"

CONTRATO DE OBRA 308 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023, ENTRE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P E INGETECO S.A.S.

INGETECO
NIT.900301744-8

28 DE DICIEMBRE DE 2023
PIEDECUESTA, SANTANDER.

INGETECO S.A.S.
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA COLOMBIANA
NIT. 900.301.744-8

PIEDECUESTA, 28 DE DICIEMBRE DE 2023

Señores:
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
ATTE. INGENIERO CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA SUPERVISOR DEL CONTRATO 308 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P.

REF: Informe único con objeto "REALIZAR INTERVENCIONES VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"

En ejecución de recursos del desembolso final del contrato de obra No 308 DE 2023, cuyo objeto es **"REALIZAR INTERVENCIONES VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"**, se hace entrega del INFORME FINAL relacionando las actividades desarrolladas.

Agradeciendo su atención a la presente.

Janeth Xiomara Noriega Bohórquez
C.C .1.102.350.707
REPRESENTA LEGAL INGETECO
NIT.900301744-8

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 308 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO NO. Y FECHA:	308 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	INGETECO
NIT O C.C. NO.	900301744-8
OBJETO:	"REALIZAR INTERVENCIONES VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($59.988.434,00) - (incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL:	N/A
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	NO APLICA
NIT O C.C. NO. DEL INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR:	ING CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA
FECHA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE SUSPENSIÓN	N° 01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INGETECO S.A.S.

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA COLOMBIANA

NIT. 900.301.744-8

ACTA DE REINICIACIÓN	N° 01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA-SANTANDER
OFICINA GESTORA:	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES
VALOR A PAGAR	$59.988.434,00

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

2.1. CONTRATO DE OBRA Y CANTIDADES EJECUTADAS.

REALIZAR INTERVENCIONES VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER					
PRESUPUESTOS DE OBRA					
RECONSTRUCCIÓN CAJA VÁLVULA REGULADORA SECTOR NAVARRA REAL Y REHABILITACIÓN PAVIMENTO, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER					
ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	Vr. UNITARIO	V/TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				
1.1	Cerramiento con lona Verde H=2m con separación de 3 m (Incluye madera rolliza)	ml	8,00	$ 24.213	$ 193.704
1.3	Pasacalles informativo	un	1,00	$ 390.978	$ 390.978
1.4	Rotura de pavimento en flexible e=15 cm (incluye corte y retiro)	ml	11,76	$ 29.750	$ 349.860
1.5	Señalización preventiva	ml	7,00	$ 4.614	$ 32.298
				VALOR CAPÍTULO	**$ 966.840**
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2.1	Excavación manual de material común y/o conglomerado Prof= 0 a 2,50 mts con entibados	m^3	4,00	$ 55.083	$ 220.332
2.2	Relleno compactado con material de préstamo	m^3	0,90	$ 66.674	$ 60.007
2.3	Relleno en material común compactado	m^3	2,40	$ 38.540	$ 92.496
2.4	Cargue, retiro y disposición de material sobrante	m^3	3,00	$ 69.090	$ 207.270
				VALOR CAPÍTULO	**$ 580.105**
3,0	**VÍAS, BASES, SUB-BASES Y ANDENES**				
3,1	Suministro, conformación y compactación de Base Granular	m^3	1,76	$ 199.672	$ 351.423
3,2	Pavimento en concreto hidráulico (incluye dilataciones, anclajes epóxicos y acabados)	m^3	2,35	$ 812.524	$ 1.909.431
				VALOR CAPÍTULO	**$ 2.260.854**
4,0	**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**				
4.1	Mampostería de ladrillo Temosa para cajas de válvulas	m2	15,00	$ 77.832	$ 1.167.480
4.2	Friso 1:4 impermeabilizado	m2	15,00	$ 35.100	$ 526.500
4.3	Limpieza general	m2	15,96	$ 7.088	$ 113.124
				VALOR CAPÍTULO	**$ 1.807.104**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 5.614.903**
REPARACIONES FILTRACIONES TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA CARRERA 15 ENTRE CALLES 9 Y 10 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER					

1.1	Mediacaña en mortero 1:3 impermeabilizado piso pared.	m	27,00	$ 23.100	$ 623.700
1.2	Escafilada de acabado en estuco y pintura pared existente, incluye disposición final	m2	3,00	$ 3.650	$ 10.950
1.3	Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones	m2	3,00	$ 21.105	$ 63.315
1.4	Estuco plástico pared interior y/o exterior	m2	3,00	$ 11.842	$ 35.526
				VALOR CAPÍTULO	**$ 733.491**
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 733.491**
	REUBICACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL TRAMO- UBICADO EN EL PASO ELEVADO SOBRE LA QUEBRADA VILLA CONCHA A LA ALTURA DEL CONDOMINIO MONTE REAL, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.				
1.0	**PRELIMINARES**				
1.1	Cerramiento con lona Verde H=2m con separación de 3 m (Incluye madera rolliza)	ml	80,00	$ 24.213	$ 1.937.040
1.2	Localización y replanteo (incluye equipo de topografía)	ml	64,00	$ 6.275	$ 401.600
1.3	Pasacalles Informativo	un	1,00	$ 390.978	$ 390.978
1.4	Rotura de pavimento en concreto e<=20 cm (incluye corte y retiro)	ml	14,00	$ 82.031	$ 1.148.434
1.5	Demolición de Andenes en concreto (Incluye retiro)	m2	4,00	$ 15.800	$ 63.200
1.6	Señalización preventiva	ml	64,00	$ 4.614	$ 295.296
				VALOR CAPÍTULO	**$ 4.236.548**
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2.1	Excavación manual de material común y/o conglomerado Prof= 0 a 2,50 mts con entibados	m^3	35,00	$ 55.083	$ 1.927.905
2.2	Relleno compactado con material de préstamo	m^3	6,67	$ 66.674	$ 444.716
2.3	Relleno en material común compactado	m^3	3,59	$ 38.540	$ 138.359
2.4	Relleno de zanja con arena para cimentación de tubería	m^3	8,00	$ 114.016	$ 912.128
2.5	Cargue, retiro y disposición de material sobrante	m^3	36,00	$ 69.087	$ 2.487.132
				VALOR CAPÍTULO	**$ 5.910.240**
3,0	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
3,1	Cercha Metálica cuadrada en ángulo de 2"x3/16". Protegida con lámina galvanizada, Incluye Platinas, Anclajes (Incluye. Transp. e instal.)	ml	7,00	$ 358.900	$ 2.512.300
3,2	Estructura en concreto 3000 psi para soporte de cercha (incluye elementos metálicos para anclaje)	un	2,00	$ 95.650	$ 191.300
				VALOR CAPÍTULO	**$ 2.703.600**
4,0	**VÍAS, BASES, SUB-BASES Y ANDENES**				
4,1	Suministro, conformación y compactación de Base Granular	m^3	3,00	$ 199.521	$ 598.563
4,2	Pavimento en concreto hidráulico (incluye dilataciones, anclajes epóxicos y acabados)	m^3	4,00	$ 812.450	$ 3.249.800

4,3	Vías peatonales, rampas y andenes en Concreto 21 MPa e=0.10 m	m2	2,00	$ 73.683	$ 147.366
				VALOR CAPÍTULO	**$ 3.995.729**
5.0	**OBRAS DE ACUEDUCTO**				
5,1	Suministro e instalación tubería PVC Unión Platino RDE 21 D=6"	ml	70,00	$ 132.740	$ 9.291.800
5,2	Suministro e instalación unión reparación D=6"	un	2,00	$ 259.987	$ 519.974
5,3	Suministro e instalación PVC Codo 90° RDE 21 6"	un	3,00	$ 392.084	$ 1.176.252
5,4	Suministro e instalación PVC Codo 45° RDE 21 6"	un	4,00	$ 351.850	$ 1.407.400
5,5	Suministro e instalación de Tee de 6"X2" HD	un	1,00	$ 516.890	$ 516.890
				VALOR CAPÍTULO	**$ 12.912.316**
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 29.758.433**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA DE ACCESO A VÁLVULAS DE CONTROL DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.				
1.0					
1.1	Suministro e instalación de escaleras para tanques de almacenamiento, con de protección dorsal, con normativa ISO 14122-4 - Acero cold rolled 3/4" - (Incluye jaula en platina de 2" 3/16- Anclajes de 5/8 x 4")	gbl	2,00	$ 4.164.525	$ 8.329.050
				VALOR CAPÍTULO	**$ 8.329.050**
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 8.329.050**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 44.435.877**
				ADMINISTRACIÓN (29.00%)	$ 12.886.404
				IMPREVISTOS (1.00%)	$ 444.359
				UTILIDAD (5.00%)	$ 2.221.794
				COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 59.988.434**

1. METODOLOGÍA EMPLEADA

Con el fin de mitigar los daños causados a la comunidad por los efectos del paso del tiempo se realizó la rehabilitación de sección del sistema de acueducto de diferentes lugares del municipio.

- **Cerramiento con lona verde H=2m con separación de 3 m**

  Se realizó aislamiento de las zonas a intervenir por medio de lona verde con altura de 2m, suministrando 8 metros lineales en el sector navarra real, 80 metros lineales en el condominio monte real.

- **Rotura de pavimento en concreto: e=15 cm (incluye corte y retiro).**

  Para poder realizar la reposición de la zona afectada, fue necesario ejecutar rotura y corte en pavimentos con espesor de 15 cm, de la siguiente manera: 11, 76 ml en navarra real, 14 ml en el paso elevado sobre la quebrada villa concha a la altura del condominio monte real, para luego proceder a las siguientes actividades.

- **Demolición de Andenes en concreto.**

  Se realizó la demolición de estructuras en concreto reforzado, retirando anclajes, refuerzos y realizando la disposición final de ellas.

- **Señalización preventiva.**

  Con el fin de cumplir con las normas de HSQE, se realizó el suministro de señalización preventiva con el fin de realizar el aislamiento de la obra en curso.

- **Excavación manual de material común y/o conglomerado Prof= 0 a 2,50 mts con entibados**

  Para realizar el acceso a la tubería antigua y el suministro de la nueva tubería PVC fue necesario realizar excavación para acceder a los elementos cubiertos bajo tierra, distribuidos de la siguiente manera:

  - 4 metros cúbicos en el sector de Navarra real.
  - 35 metros cúbicos en el paso elevado sobre la quebrada villa concha a la altura del condominio monte real

- **Relleno compactado con material de préstamo, relleno en material común compactado, relleno de zanja con arena para cimentación de tubería.**

  Una vez realizada la extracción de la tubería antigua y reposición de la nueva tubería, es necesario rellenar con material común para poder proceder al capítulo de vías, bases y andenes, distribuido de la siguiente manera:

  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO:

  - 0,90 metros cúbicos en el sector de Navarra real.
  - 6,67 metros cúbicos en el paso elevado sobre la quebrada villa concha a la altura del condominio monte real

  RELLENO EN MATERIAL COMÚN COMPACTADO:

- 2,40 metros cúbicos en el sector de Navarra real.
- 3,59 metros cúbicos en el paso elevado sobre la quebrada villa concha a la altura del condominio monte real

RELLENO DE ZANJA CON ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA:

- 8 metros cúbicos en el paso elevado sobre la quebrada villa concha a la altura del condominio monte real

- **Suministro, conformación y compactación de Base Granular**

Se realizó el suministro e instalación de capa homogénea de base granular, la cual fue compactada con mediante un vibrador, para reducir los vacíos y nivelar el terreno, distribuidos de la siguiente manera:

- 1,76 metros cúbicos en el sector de Navarra real.
- 3,0 metros cúbicos en el paso elevado sobre la quebrada villa concha a la altura del condominio monte real

- **Cargue, retiro y disposición de material sobrante**

Todo el material sobrante y/o desechos provenientes de la ejecución de la obra, son cargados y retirados para dar una correcta disposición.

- **Pavimento en concreto hidráulico (incluye dilataciones, anclajes Epóxicos y acabados).**

Se realizó suministro de concreto de 3000 psi. Se hace nivelación las respectivas dilataciones y terminaciones con los respectivos anclajes.

- 2,35 metros cúbicos en el sector de Navarra real.
- 4,0 metros cúbicos en el paso elevado sobre la quebrada villa concha a la altura del condominio monte real

- **Vías peatonales, rampas y andenes en concreto 21 MPa e=0.10 m.**

Se suministraron e instalaron 2 metros cuadros de concreto de 3000 Psi con espesor de 10 cm en el sector de paso elevado sobre la quebrada villa concha a la altura del condominio monte real.

- **Mampostería de ladrillo Temosa para cajas de válvulas.**

Para realizar la estructura que brinda protección y aislamiento a las válvulas de paso y/o corte, se construyeron cajas de inspección con ladrillo temosa (15 metros cuadrados).

- **Friso 1:4 impermeabilizado**

Con el fin de generar revestimientos, proteger de humedades, favorecer el aislamiento térmico en las cajas de inspección se instalaron 15 metros cúbicos en Navarra real y 3 metros cuadrados en la carrera 15 entre calle 9 y 10.

- **Estructura en concreto 3000 psi para soporte de cercha (incluye elementos metálicos para anclaje)**

  Para generar soporte a la cercha metálica a instalar, se suministraron 2 unidades de estructuras en concreto con anclajes metálicos.

- **Cercha metálica cuadrada en ángulo de 2"x3/16", protegida con lámina galvanizada, incluye platinas, anclajes (incluye. transp. e instal).**

  Se suministraron 7 metros lineales de cercha en ángulo 2"x3/16"

en el tanque de almacenamiento ubicado en la carrera 15 entre calle 9 y 10 se realizaron las siguientes obras:

- **Mediacaña en mortero 1:3 impermeabilizado piso pared.**

  Suministro e instalación de 27 metros lineales de mediacaña en mortero 1:3 impermeabilizado, con el fin de suavizar el ángulo de encuentro mediante y asegurar la continuidad de la base con las paredes, evitar la acumulación de suciedad y la proliferación de hongos, bacterias en zonas de difícil acceso.

- **Escafilada de acabado en estuco y pintura pared existente, incluye disposición final.**

  Retiro de 3 metros cuadrados de pared existente y suministro de pintura

En las obras de acueducto se suministraron 70 metros lineales de tubería PVC Unión Platino RDE 21 D=6", con 2 uniones de reparación D=6", 3 codos de 90° RDE 21 6", 4 codos de 45° RDE 21 6" y 1 Tee de 6"X2" HD.


- **Limpieza general de la obra.**


  Se realiza limpieza final y general de la obra en todos los sitios donde se intervino la vía y los andenes. Se realizó aseo general de la obra y, se retiran los escombros y el material que se reemplazó. Se retiran las cintas y colombinas y se deja el lugar 100% limpio.

Porcentaje de ejecución: **100%**

REGISTRO FOTOGRAFICO


Cerramiento con lona Verde H=2m con separación de 3 m (Incluye madera rolliza)

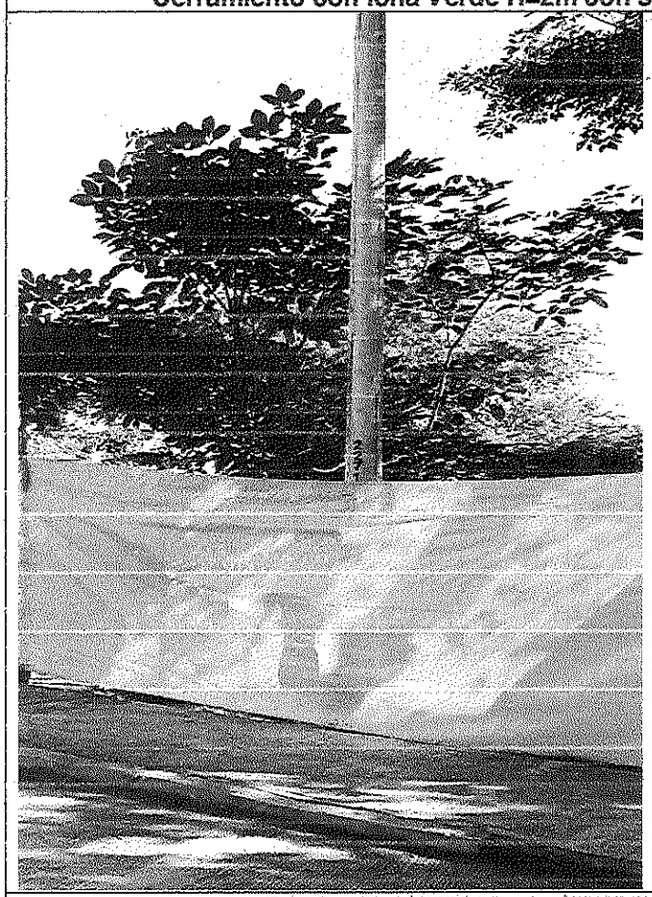

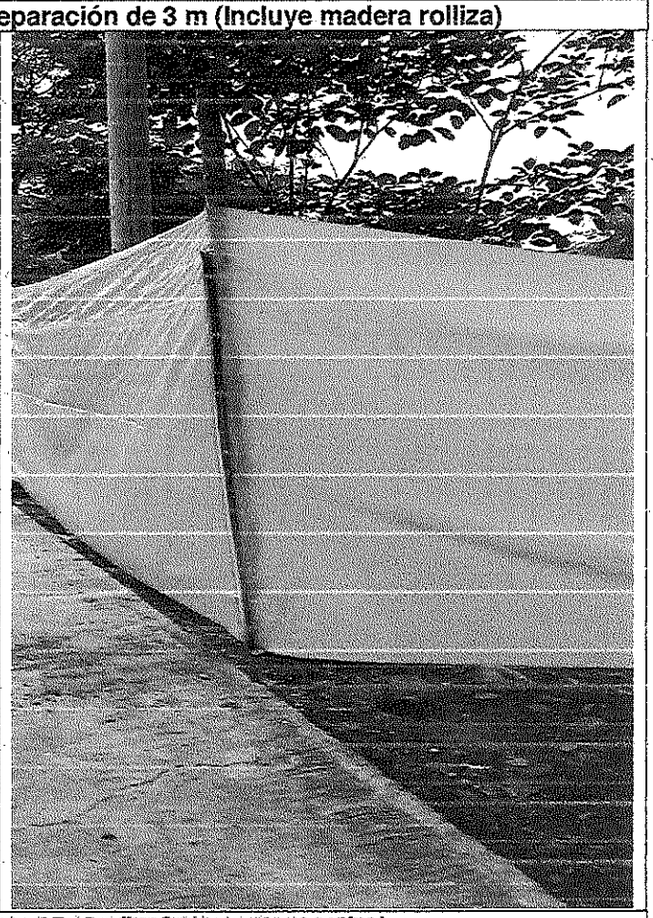


Rotura de pavimento en flexible e=15 cm (incluye corte y retiro)



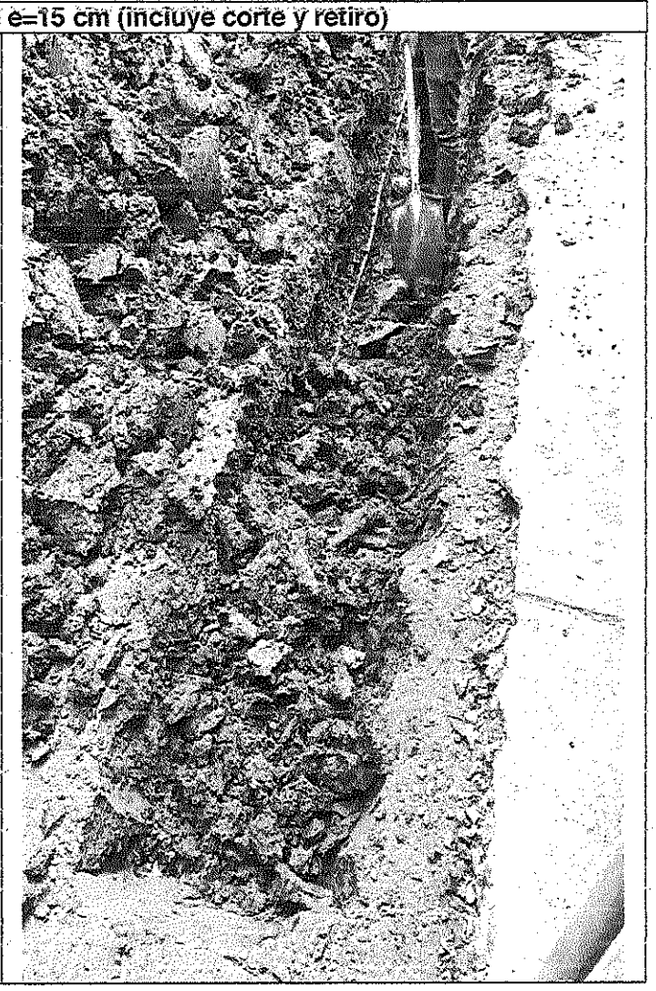


Excavación manual de material común y/o conglomerado Prof= 0 a 2,50 mts con entibados

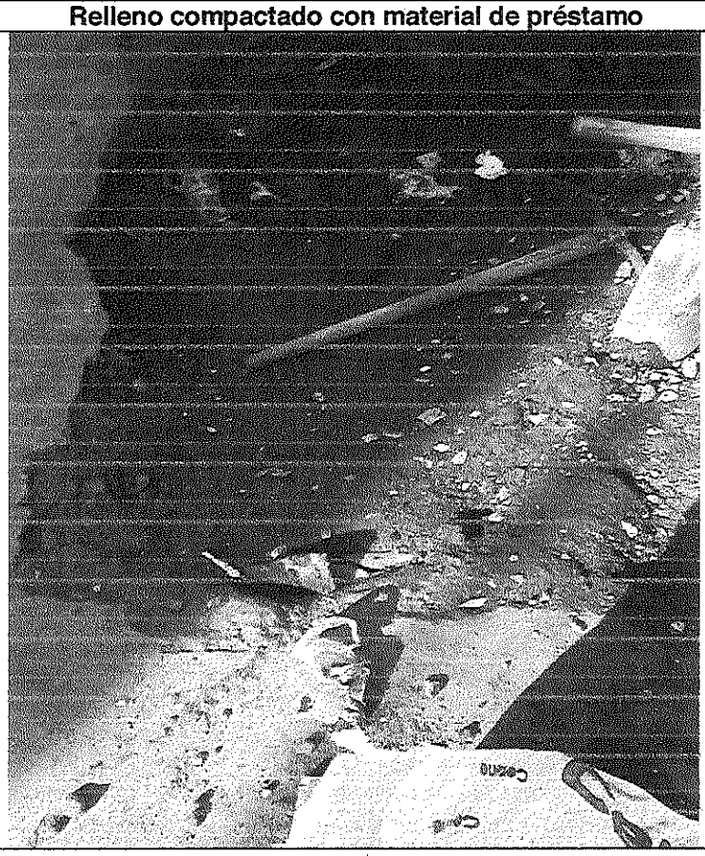Relleno compactado con material de préstamo


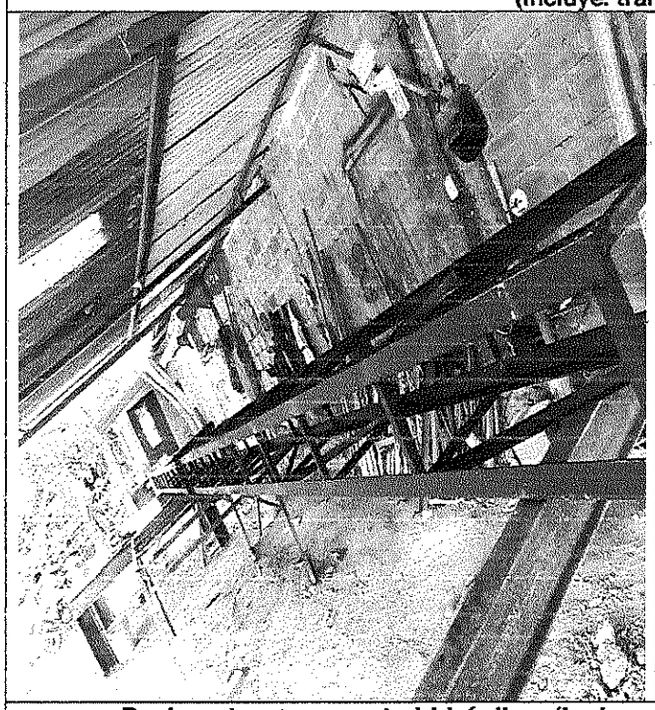
Cargue, retiro y disposición de material sobrante




Suministro, conformación y compactación de Base Granular

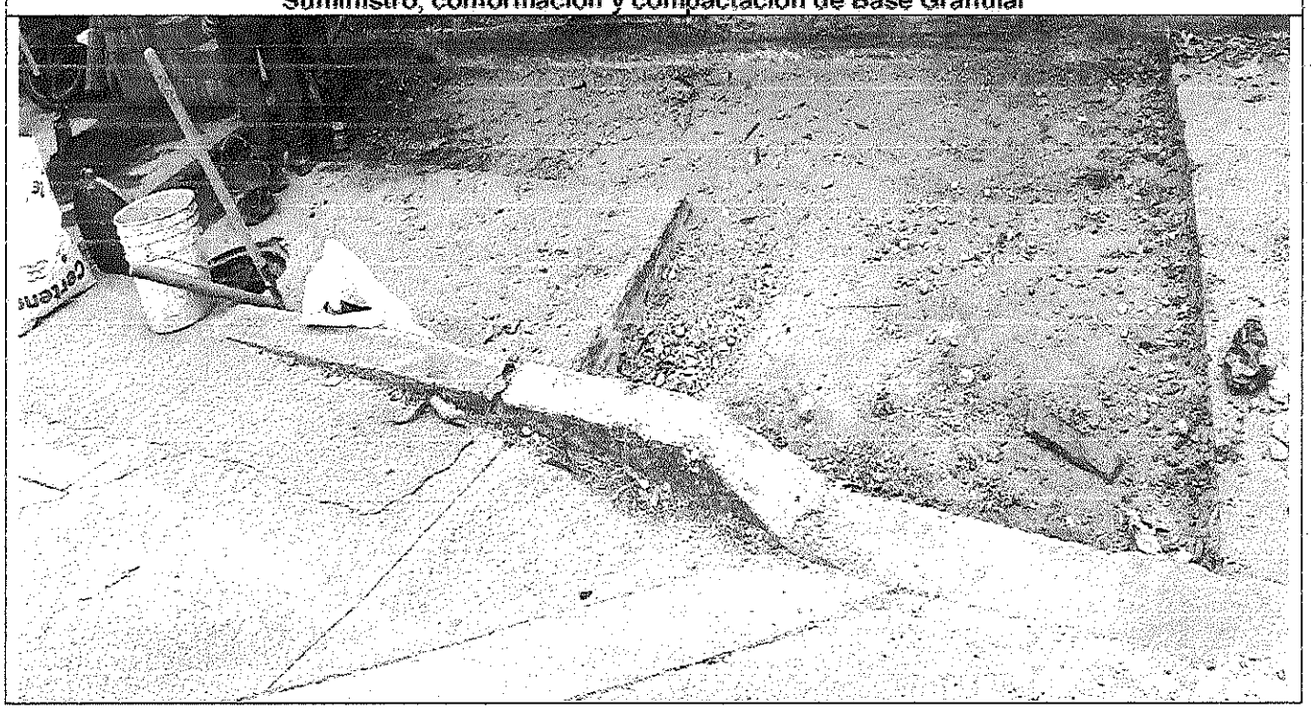

Cercha metálica cuadrada en ángulo de 2"x3/16". protegida con lámina galvanizada, incluye platinas, anclajes (incluye. transp. e instal).



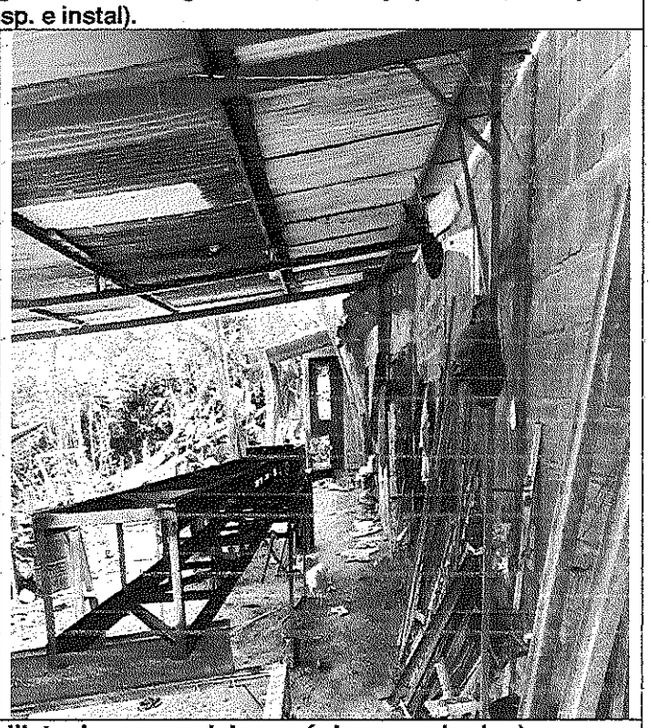


Pavimento en concreto hidráulico (Incluye dilataciones, anclajes epóxico y acabados)





Mampostería de ladrillo Temosa para cajas de válvulas



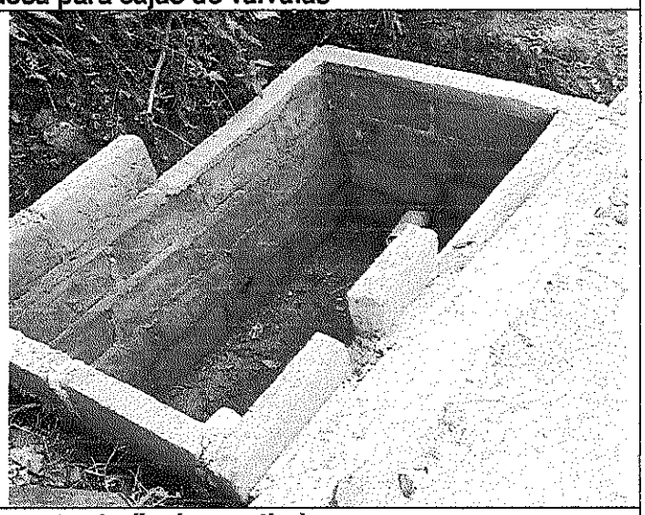

Demolición de Andenes en concreto (Incluye retiro)





2. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Así mismo, se relacionan los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

- **RUEDA ARDILA ALEXANDER**

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	12/ 2023
	Fecha de pago	27/12/2023
	Nº de Planilla	28580316
	Ingreso Base de Cotización	$ 657.334
	Valor cotizado	$ 26.300
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	12/ 2023
	Fecha de pago	27/12/2023
	Nº de Planilla	28580316
	Ingreso Base de Cotización	$ 657.334
	Valor cotizado	$105.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	12/ 2023
	Fecha de pago	27/12/2023
	Nº de Planilla	28580316
	Ingreso Base de Cotización	$ 657.334
	Valor cotizado	$ 45.800
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación	COMFENALCO

- **RUEDA ARDILA YORGAN DARÍO**

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	12/ 2023
	Fecha de pago	27/12/2023
	Nº de Planilla	28580316
	Ingreso Base de Cotización	$ 657.334
	Valor cotizado	$ 26.300
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	12/ 2023
	Fecha de pago	27/12/2023
	Nº de Planilla	28580316
	Ingreso Base de Cotización	$ 657.334
	Valor cotizado	$105.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	12/ 2023
	Fecha de pago	27/12/2023
	Nº de Planilla	28580316
	Ingreso Base de Cotización	$ 657.334
	Valor cotizado	$ 45.800
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación	COMFENALCO

	Nº de Planilla	28580316
	Ingreso Base de Cotización	$ 657.334
	Valor cotizado	$ 26.300
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	12/ 2023
	Fecha de pago	27/12/2023
	Nº de Planilla	28580316
	Ingreso Base de Cotización	$ 657.334
	Valor cotizado	$105.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	12/ 2023
	Fecha de pago	27/12/2023
	Nº de Planilla	28580316
	Ingreso Base de Cotización	$ 657.334
	Valor cotizado	$ 45.800
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	
	I.C.B.F.	
	Caja de Compensación	COMFENALCO

Por lo anterior, INGETECO hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los Veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023

Janeth Xiomara Noriega Bohórquez
CC.1.102.350.707
REPRESENTANTE LEGAL INGETECO

Ing. Cristian Ricardo Medina M.
Director de operaciones
SUPERVISOR DEL CONTRATO
