1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato: OBRA [X]	INTERVENTORÍA [ ]
Informe Número: ____1_____	Periodo comprendido entre el _9 de noviembre_ hasta el _30 de noviembre de 2024_
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4161.010.26.1.1990.2023 de 2023	
Nombre Completo del Contratista: Explosiones Técnicas Controladas S.A.S	
Documento de identificación del contratista: NIT. 901.005.788- 6	
Nombre (s) del Supervisor (es): CESAR AUGUSTO LEMOS	
Organismo: Secretaría de Seguridad y Justicia	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 42.6%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 42.6%
Objeto del contrato: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA IMPLOSIÓN CONTROLADA CON EXPLOSIVOS DE LA MINA “MARTÍNEZ” Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, UBICADOS EN EL PNN FARALLONES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

9 de noviembre de 2023	9 de febrero de 2024

Modificación del contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($417.627.917) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos relacionados.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
417.627.917	177.809.315	0	239.818.602

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 20 de noviembre de 2023.
La certificación expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de Ley, firmada por el señor Darío Augusto Quiroz Cortes, T.P. 255215-7.

La planilla correspondiente al periodo de noviembre 2023 se paga mes vencido, en consecuencia, no se anexa.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de pago: N/A

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

1. GENERALIDADES

1.1.1 Ubicación del Proyecto

CIUDAD:	Cali
UBICACIÓN:	Parque Nacional Natural Farallones de Cali
COORDENADAS:	3º24’22.68000” N, 76º41’10.14000” W
INTERVENCIÓN:	Se realizará por medio de explosivos, maquinaria y personal especializado la implosión de la mina “Martínez” ubicada en el PNN Farallones del distrito de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

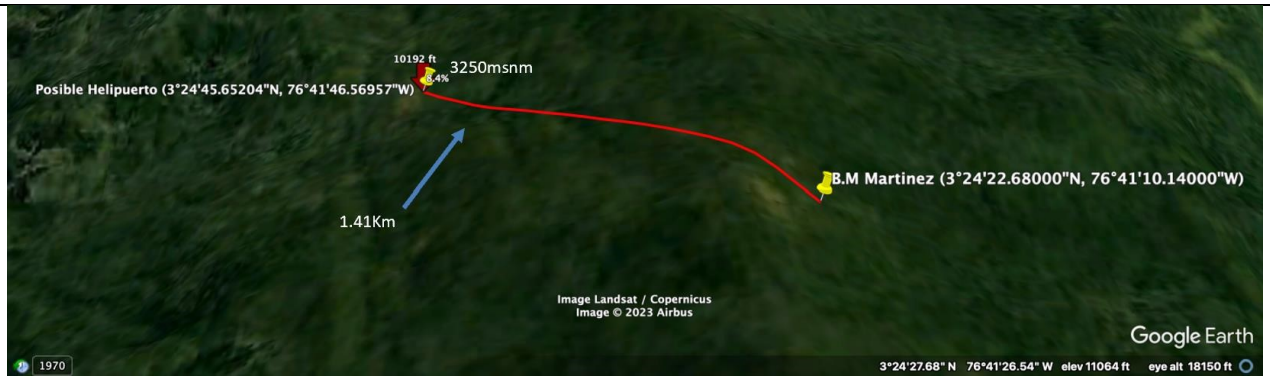


Imagen N°1. Localización y coordenadas del proyecto en el PNN Farallones de Cali.

1.1.2 Alcance del Contrato

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 4161.010.32.1.1956.2023, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica.

El alcance del contrato se enfoca la implosión de la mina Martínez.

CONTRATO DE OBRA N°: 4161.010.26.1.1990.2023

CONTRATISTA: Explosiones Técnicas Controladas S.A.S

NIT: 901005788- 6

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO LÓPEZ COLMENARES

CÉDULA DE CIUDADANÍA: N° 3190181 DE SUPATÁ.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.2 Objeto del contrato de obra

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA IMPLOSIÓN CONTROLADA CON EXPLOSIVOS DE LA MINA "MARTÍNEZ" Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, UBICADOS EN EL PNN FARALLONES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

1.3 Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos.

I. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN:** Por medio de la Resolución No. 4161.010.21.1.1410.2023 de 31 de agosto de 2023, **LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI** adjudicó el contrato No. 4161.010.32.1.1956.2023 a la empresa **EXPLOSIONES TÉCNICAS CONTROLADAS S.A.S,** cuyo objeto se describe en el numeral 1.2 del presente informe.

II. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Por medio de la resolución No. 4161.010.21.1.1410.2023 de 31 de agosto de 2023, el **DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA**, adjudico el contrato No. 4161.010.26.1.1990.2023 cuyo plazo de ejecución es de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio con fecha 9 de noviembre de 2023.

El pliego se publicó el día 31 de agosto de 2023, sin embargo, por retrasos en la publicación del contrato, fue firmado hasta el 18 de septiembre, y aprobado por la entidad estatal hasta el 2 de octubre de 2023, por lo cual el acta de inicio tendrá fecha del 9 de noviembre de 2023.

III. **VALOR:** el valor inicial del contrato es de CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($417.627.917.), valor que incluye, costos asociados por Administración, utilidad y demás costos directos e indirectos que se deriven de la celebración del contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.4 Directorio Telefónico del Personal del Contratista, Interventoría y MVCT.

Personal que participa en el proyecto:

NOMBRE		CORREO ELECTRÓNICO
EXPLOSIONES TÉCNICAS CONTROLADAS SAS		
FERNANDO LÓPEZ COLMENARES	REPRESENTANTE LEGAL	fernandolopez.extecc@gmail.com
ROSSBEL EDUARDO PALENCIA BRAVO	INGENIERO RESIDENTE	rosbeleduardo@hotmail.com
DIANA LUCIA RICO SALAZAR	AUXILIAR DE INGENIERÍA	operaciones.extecc@gmail.com
SANDRA PATRICIA PEÑA ROA	TESORERÍA	sandrapena.extecc@gmail.com
INTERVENTORÍA CMAA S.A.S		
CRISTOBAL MESA GONZÁLEZ,	REPRESENTANTE LEGAL	Interventoriamina3@outlook.com
JUAN CARLOS MURCIA DURAN	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	Interventoriamina3@outlook.com

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA SUSCRIBIÓ LAS SIGUIENTES GARANTÍAS ÚNICAS A FAVOR DE **DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA**, NIT: 890.399.011-3, EXPEDIDAS POR LA SEGUROS DEL ESTADO S.A. PÓLIZA DE: CUMPLIMIENTO No. 25-44-101185825 Y RESPONSABILIDAD CIVIL No. 25-40-101049222.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

VIGENCIA PÓLIZAS

A continuación, se relacionan los amparos de las pólizas de origen del contrato y mediante el ANEXO 1 PÓLIZAS CONTRATO se adjuntan los documentos.

Aseguradora	Póliza N°	Amparos		VIGENCIA			Valor asegurado
			%	Tiempo	Desde	Hasta	
PÓLIZAS CONTRATO INICIAL							
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101185825	Cumplimiento del contrato	10%	Por la duración del contrato y seis (06) meses más.	2/10/2023	6/07/2024	$ 41.762.791,70
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25-44-101185825	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	Por la duración del contrato y tres (3) años más.	2/10/2023	5/01/2027	$ 20.881.395,85
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	24-40-101049222	Responsabilidad civil por daños a terceros	200 SMMLV	Por toda la ejecución del contrato	2/10/2023	5/01/2024	$ 232.000.000,00

2.3 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO
1. Ejecutar el contrato adjudicado en los términos y condiciones señalados en los pliegos de condiciones y en la propuesta.	En proceso
2. Atender y pagar las reclamaciones y siniestros que presente la entidad, o sus beneficiarios en los términos, plazos y condiciones señalados en	En proceso

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

la oferta presentada y de conformidad con la legislación vigente, sin dilataciones.	
3. Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato.	En proceso
4. Tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de protección y seguridad industrial del personal contratado.	En proceso
5. En caso de pérdida o daño de un bien de la institución, beneficiario, usuario o aledaño, por mal manejo, descuido o desconocimiento de las funciones a realizar por el personal subcontratado, deberá responder por el valor total del bien afectado, garantizando las especificaciones técnicas de este.	En proceso
6. Durante el período de la garantía y/o ejecución del contrato, el contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali.	En proceso

2.4 Actas parciales ANEXO No 2 ACTAS PARCIALES

A la fecha se ha generado la siguiente acta de obra:

- **Acta parcial No 1** por un valor de ($177.809.315,76) Ciento setenta y siete millones ochocientos nueve mil trescientos quince pesos con setenta y seis centavos M/Cte.

2.5 Balance financiero del contrato

A la fecha el contrato tiene un valor total de ($417.627.917) de los cuales se cobra:

- Acta parcial No 1 $177.809.315

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR DEL CONTRATO	$ 417.627.917	$ -
VALOR A PAGAR (ACTA PARCIAL 1)	$ -	$ 177.809.315
SALDO	$ 239.818.62	$ 177.809.315
SALDO	**$ 239.818.602**	**$ 239.818.602**

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1 Cronograma detallado del contrato

Se anexa cronograma general de obra. ANEXO 3 PROGRAMACIÓN Avance de obra programado 100%; avance de obra ejecutado 42,6%.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

CRONOGRAMA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**FARALLONES DE CALI**	**93 días**	**9/11/23**	**9/02/24**
2	ACTA DE INICIO	0 días	9/11/23	9/11/23
3	**PRELIMINARES**	**2 días**	**29/11/23**	**30/11/23**
4	CAMPAMENTO BASE 18M2 EN MADERA	1 día	29/11/23	29/11/23
5	LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO / IMPLOSIÓN	1 día	30/11/23	30/11/23
6	**SELLAMIENTO BOCAMINAS**	**14 días**	**30/11/23**	**13/12/23**
7	PERFORACIÓN MECÁNICA DE TERRENO EN BOCAMINA PARA INSTALACIÓN DE EXPLOSIVOS	14 días	30/11/23	13/12/23
8	SOLICITUD DE CUPO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS PARA EL SELLAMIENTO DE BOCAMINAS	6 días	8/12/23	13/12/23
9	**TRANSPORTE**	**11 días**	**29/11/23**	**9/12/23**
10	TRANSPORTE, ESCOLTA, CARGUE Y DESCARGUE ESPECIAL DE EXPLOSIVOS EN HELICÓPTERO	2 días	8/12/23	9/12/23
11	TRANSPORTE DE MATERIALES	1 día	29/11/23	29/11/23
12	**ASEO FINAL**	**16 días**	**29/11/23**	**14/12/23**
13	LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA INTERVENIDA (BOCAMINA)	1 día	13/12/23	13/12/23
14	ASEO PERMANENTE DEL ÁREA DE TRABAJO (CAMPAMENTOS Y/O ZONAS DE TRABAJO)	16 días	29/11/23	14/12/23
15	TRASLADO DESDE CAMPAMENTO HASTA BOCAMINA/BOCAMINA HASTA ZONA DE ACOPIO	1 día	30/11/23	30/11/23
16	RECOLECCIÓN, RETIRO DEL PERSONAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS/SOBRANTES	1 día	14/12/23	14/12/23
17	**DETONACIÓN DE TAMBORES**	**6 días**	**8/12/23**	**13/12/23**
18	DETONACIÓN DE TAMBORES (CORDÓN 38GRS)	6 días	8/12/23	13/12/23
19	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	**1 día**	**9/11/23**	**9/11/23**
20	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	1 día	9/11/23	9/11/23

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

BALANCE CANTIDADES PROYECTADAS VS EJECUTADAS

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	% EJECUCIÓN
1	**PRELIMINARES**				**$ 14.488.420,00**	
1.1	CAMPAMENTO BASE 18M2 EN MADERA	UND	1	$ 12.388.420,00	$ 12.388.420,00	0%
1.2	LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO / IMPLOSIÓN	M2	30	$ 70.000,00	$ 2.100.000,00	0%
2	**SELLAMIENTO BOCAMINAS**				**$ 190.899.418,00**	
2.1	PERFORACIÓN MECÁNICA DE TERRENO EN BOCAMINA PARA INSTALACIÓN DE EXPLOSIVOS	UND	399	$ 180.761,00	$ 72.123.639,00	0%
2.2	SOLICITUD DE CUPO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS PARA SELLAMIENTO DE BOCAMINAS	UND	1	$ 118.775.779,00	$ 118.775.779,00	100%
3	**TRANSPORTE**				**$ 36.874.800,00**	
3.1	TRANSPORTE, ESCOLTA, CARGUE Y DESCARGUE ESPECIAL DE EXPLOSIVOS EN HELICÓPTERO	VJE	1	$ 33.124.800,00	$ 33.124.800,00	0%
3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	VJE	25	$ 150.000,00	$ 3.750.000,00	0%
4	**ASEO FINAL**				**$ 7.725.000,00**	
4.1	LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA INTERVENIDA (BOCAMINA)	UND	1	$ 975.000,00	$ 975.000,00	0%
4.2	ASEO PERMANENTE DEL ÁREA DE TRABAJO (CAMPAMENTOS Y/O ZONAS DE TRABAJO)	M2	30	$ 100.000,00	$ 3.000.000,00	0%
4.3	TRASLADO DESDE CAMPAMENTO HASTA BOCAMINA / BOCAMINA HASTA ZONA DE ACOPIO	VJE	10	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00	0%
4.4	RECOLECCIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS /SOBRANTES	M3	15	$ 150.000,00	$ 2.250.000,00	0%
5	**DETONACIÓN DE TAMBORES**				**$ 37.674.480,00**	
5.1	DETONACIÓN DE TAMBORES (CORDÓN 38 GRS)	UND	6	$ 6.279.080,00	$ 37.674.480,00	0%
6	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**				**$ 6.442.049,00**	
6.1	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	UND	1	$ 6.442.049,00	$ 6.442.049,00	100%
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 294.104.167,00**	
ADMINISTRACIÓN				**37%**	**$ 108.818.541,79**	
UTILIDAD				**5%**	**$ 14.705.208,35**	
VALOR TOTAL OFERTA					**$ 417.627.917,14**	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3.2 Descripción de las actividades desarrolladas

PRELIMINARES

1. Obtención del cupo:

La semana del dieciséis (16) de octubre del presente año, se movilizó el representante legal de EXTECC SAS, a la ciudad de Cali con el fin de establecer la ubicación del polvorín en el que será almacenado el material explosivo requerido para la implosión. Más tarde el día Veinte (20) de octubre se realizó la solicitud para la visita al polvorín del proyecto, generando como resultado la revista de inspección y el concepto favorable, documentos mediante los cuales se acepta el almacenamiento del material en el polvorín determinado por la empresa.

El día veintitrés (23) de octubre se radicó ante el Departamento de Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE), la carpeta para la solicitud del cupo de explosivos. El cupo de explosivos fue entregado el día veinte (20) de noviembre, contando así con la autorización para el uso de explosivos en el proyecto. ANEXO 4 SOPORTES CUPO DE EXPLOSIVOS.

2. Entrega plan de manejo ambiental

Tras la firma del contrato se inició con la elaboración del plan de manejo ambiental, el cual fue realizado por una profesional de la ingeniería ambiental, esta actividad conllevo un periodo de ejecución de veinte (20) días, desde el inicio de su construcción, hasta la entrega a satisfacción de manera digital y se inicia con la implementación para el proyecto. ANEXO 5 SOPORTES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4.1 Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados.

No.	DESCRIPCIÓN	UND	VR. UNIT	CANT	VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**				
1.1	CAMPAMENTO BASE 18M2 EN MADERA	UND	$ 12.388.420,00		$ -
1.2	LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO / IMPLOSIÓN	M2	$ 70.000,00		$ -
2	**SELLAMIENTO BOCAMINAS**				
2.1	PERFORACIÓN MECÁNICA DE TERRENO EN BOCAMINA PARA INSTALACIÓN DE EXPLOSIVOS	UND	$ 180.761,00		$ -
2.2	SOLICITUD DE CUPO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS PARA SELLAMIENTO DE BOCAMINAS	UND	$ 118.775.779,00	1	$ 118.775.779,00
3	**TRANSPORTE**				
3.1	TRANSPORTE, ESCOLTA, CARGUE Y DESCARGUE ESPECIAL DE EXPLOSIVOS EN HELICÓPTERO	VJE	$ 33.124.800,00		$ -
3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	VJE	$ 150.000,00		$ -
4	**ASEO FINAL**				
4.1	LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA INTERVENIDA (BOCAMINA)	UND	$ 975.000,00		$ -
4.2	ASEO PERMANENTE DEL ÁREA DE TRABAJO (CAMPAMENTOS Y/O ZONAS DE TRABAJO)	M2	$ 100.000,00		$ -
4.3	TRASLADO DESDE CAMPAMENTO HASTA BOCAMINA / BOCAMINA HASTA ZONA DE ACOPIO	VJE	$ 150.000,00		$ -
4.4	RECOLECCIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS /SOBRANTES	M3	$ 150.000,00		$ -
5	**DETONACIÓN DE TAMBORES**				
5.1	DETONACIÓN DE TAMBORES (CORDÓN 38 GRS)	UND	$ 6.279.080,00		$ -
6	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**				
6.1	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	UND	$ 6.442.049,00	1	$ 6.442.049,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 125.217.828,00**
ADMINISTRACIÓN			**37%**		**$ 46.330.596,36**
UTILIDAD			**5%**		**$ 6.260.891,40**
VALOR TOTAL OFERTA					**$ 177.809.315,76**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. CONCLUSIONES

Dada la naturaleza del proyecto, se estima realizar un único evento, es decir, una única implosión, por lo que las actividades realizadas hasta el momento han sido de carácter logístico y administrativo, todo orientado a la obtención de permisos y establecer los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto de este contrato.

Se estableció mediante la entrega y aprobación del plan de manejo ambiental los parámetros a seguir antes, durante y después de la implosión, siguiendo las recomendaciones dadas por la subdirección de gestión y manejo de áreas protegidas.

Se obtuvo a satisfacción el permiso para el uso de explosivos en la mina Martínez, con el fin de realizar las actividades necesarias de manera legal, segura y efectiva.

ANEXOS

Anexo 1. Pólizas Contrato

Anexo 2. Actas parciales

Anexo 3. Programación de obra

Anexo 4. Soportes cupo de explosivos

Anexo 5. Soportes plan de manejo ambiental (PMA)

Anexo 6. Memorias actas parciales

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





Foto No. 1	Descripción: Revista de inspección al polvorín	Foto No. 2	Descripción: Revista de inspección al polvorín





Foto No. 3	Descripción: Inspección de la mina para realizar el plan de manejo ambiental	Foto No. 4	Descripción: Inspección de la mina para realizar el plan de manejo ambiental

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, las obras o interventoría con base en las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

1. Iniciar con la construcción del campamento
2. Mantener zona de intervención organizada y aseada

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

JUAN CARLOS MURCIA D.
Nombre y firma del Interventor
CMAA SAS

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 7 de diciembre de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
