INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1

CONTRATO No. 240 DE 2023

CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO, SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO URBANÍSTICO CIUDADELA LOS ALCARAVANES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE



OCTUBRE - 2023

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1

CONTRATO No. 240 DE 2023

CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO, SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO URBANÍSTICO CIUDADELA LOS ALCARAVANES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

Presentado por:
CONTRATISTA: **INDISCON INGENIERIA S.A.S**
R/L HUGO CESAR SAENZ CARVAJAL

Presentado a:
DINAMO DE COLOMBIA LTDA
R/L JORGE PEREZ LUGO
Interventoría Contratada

OCTUBRE, 2023

CONTENIDO

OBJETIVO....4
CAPITULO I. GENERALIDADES....4
1.1. LOCALIZACIÓN....4
1.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO....5
1.2 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO....5
CAPITULO II. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA....5
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA....5
2.2.1 RELACION DE ACTAS GENERADAS....6
2.2.2 CONTROL DE POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO....6
INFORME ADMINISTRATIVO....7
2.3.1 CONTROL DEL PERSONAL....7
2.3.2 CONTROL DE EQUIPO....7
3.1 ESTADO ECONOMICO DE LA OBRA....8
CAPITULO IV. INFORME ASPECTO TECNICO....8
4.1 INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA....8
4.2 AVANCE FISICO DE LA OBRA 10
4.3 OBRA EJECUTADA....11
4.4 GRAFICO AVANCE DE OBRA....15
CONCLUSIONES (RECOMENCDACIONES, SUGERENCIAS, PROPUESTAS)....16


OBJETIVO


Presentar ante el interventor contratado por la Empresa de energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P, el Informe mensual de obra No. 1, las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual No. 240-2023, durante el periodo comprendido entre el 06 de septiembre hasta el 05 de octubre de 2023. El documento consta de cuatro capítulos los cuales contienen la información TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y UN REGISTRO FOTOGRAFICO de las actividades ejecutadas.

CAPITULO I. GENERALIDADES

1.1. LOCALIZACIÓN

El presente proyecto se realiza en el municipio de Paz de Ariporo, donde se realiza la electrificación de la Ciudadela Alcaravanes etapa 2.

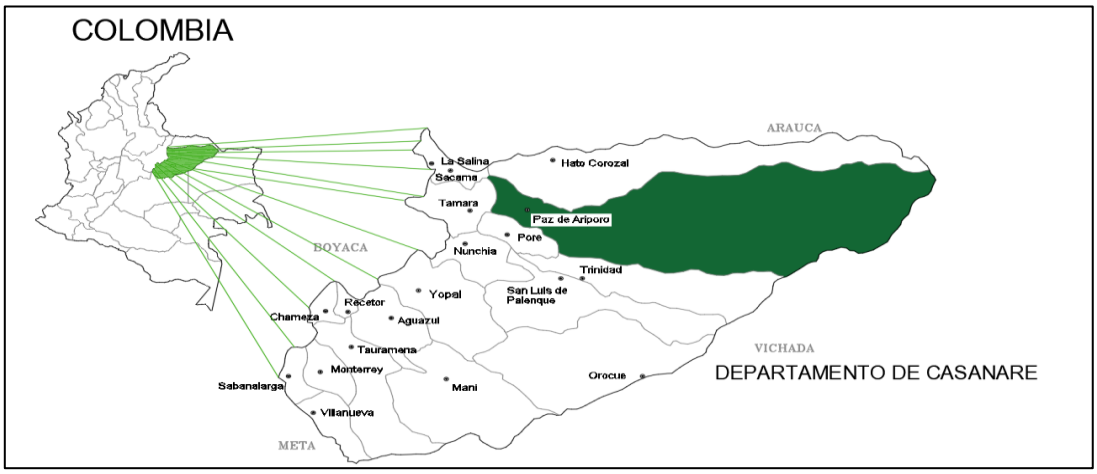

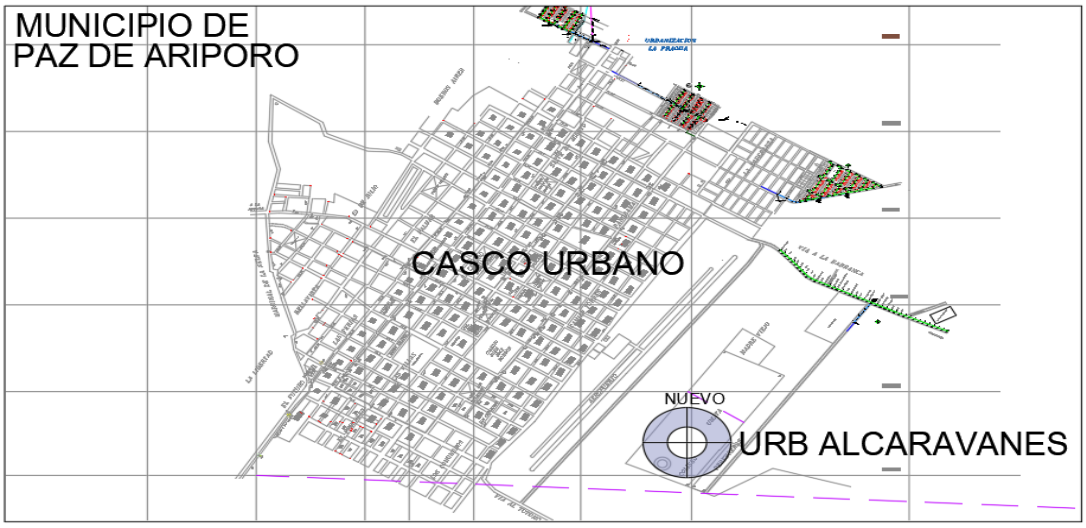

La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P, Celebró contrato No. 240 de 2023 con el contratista INDISCON INGENIERIA S.A.S, representado legalmente por HUGO CESAR SAENZ CAVAJAL.

1.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO, SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO URBANÍSTICO CIUDADELA LOS ALCARAVANES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.2 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
Nombre del Contratante:	ENERCA S.A E.S.P
Nombre del Contratista:	INDISCON INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.840.475-3
Representante Legal:	HUGO CESAR SANEZ CARVAJAL
Número del Contrato:	240 de 2023
Fecha del Contrato:	27 de mayo de 2021
Plazo Ejecución:	CUATRO (4) MESES
Valor fiscal:	$ 660.509.881
Fecha Acta de Iniciación:	06 de septiembre de 2023
Fecha de terminación actual:	05 de enero del 2024
Nombre del interventor	DINAMO DE COLOMBIA LTDA

CAPITULO II. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO, SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO URBANÍSTICO CIUDADELA LOS ALCARAVANES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. **N° CONTRATO:** 240 del 2023
2. **CONTRATISTA:** INDISCON INGENIERIA S.A.S.
3. **VALOR INICIAL CONTRATO:** Seiscientos Sesenta Millones Quinientos Nueve Mil Ochocientos ochenta y un Pesos MCTE ($660.509.881).

4. **VALOR ANTICIPO:** Ciento Noventa y Nueve Millones Noventa y Tres Mil Ochocientos Veinticinco Pesos MCTE ($264.203.952)

2.2.1 RELACION DE ACTAS GENERADAS

ACTA N°	DESCRIPCION	FECHA
Acta N° 1	Inicio	06 de septiembre de 2023

2.2.2 CONTROL DE POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 605-47-994000102981 ASEGURADORA SOLIDARIA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
GARANTÍA	**DESDE**	**HASTA**	
Cumplimiento del Contrato	15/08/2023	25/04/2024	**$66,050,988.10**
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	15/08/2023	25/04/2024	**$264.203.952.40**
Salarios y Prestaciones Sociales	15/08/2023	25/12/2026	**$66. 050,988.10**
Calidad-Estabilidad			**$132.101.976.20**

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No. 605-74-994000022555 ASEGURADORA SOLIDARIA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
GARANTÍA	**DESDE**	**HASTA**	
Responsabilidad Civil	15/08/2023	25/04/2024	**$66. 050,988.10**

INFORME ADMINISTRATIVO

2.3.1 CONTROL DEL PERSONAL

N°	CARGO	NOMBRE	Septiembre	Octubre
			DIAS LAB.	DIAS LAB.
1	DIRECTOR DE OBRA	John Jairo Correa Garcés	25	5
2	INGENIERO RESIDENTE	Víctor Manuel Bernal López	25	5
4	TECNICO ELECTRICISTA	Gildardo Tolosa	25	5
5	Ayudante	Hugo Cesar Sáenz	25	5

2.3.2 CONTROL DE EQUIPO

CONTROL DE EQUIPO												
TIEMPO 2023	SEPTIEMBRE				OCTUBRE							
	SEMANA				SEMANA				SEMANA			
DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CAMIONETA				1								
GRUA												
ESTACION TOPOGRÁFICA												
HERRAMIENTA ELÉCTRICA MENOR												

CAPITULO III. INFORME FINACIERO DE LA OBRA

3.1 ESTADO ECONOMICO DE LA OBRA

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$660.509.881		
Valor anticipo 40%			$264.203.952
Valor Ejecutado Presente Informe octubre 2023		$ 0.00	
Saldo a Favor del Contratista			$396.305.929
Saldo a Favor del Contratante		$660.509.881	
SUMAS IGUALES	**$660.509.881**	**$660.509.881**	**$660.305.881**

CAPITULO IV. INFORME ASPECTO TECNICO

4.1 INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA

Los materiales que se usan en las instalaciones eléctricas de energía son nuevos, de primera calidad y se ajustan a los requisitos establecidos en las especificaciones. Todos los materiales son productos normalizados de fabricante reconocidos que hayan producido continuamente este tipo de materiales y con el respectivo certificado de producto RETIE. Todos los materiales recibirán los tratamientos de protección adecuados para las condiciones ambientales existentes en el área. Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para proteger los materiales por lo tanto deberán ser resistentes a la corrosión y diseñados para dicho ambiente.

Normatividad aplicable

Entre las normas aplicables se encuentran:

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE.
- Norma Técnica Colombiana-NTC2050.
- Norma Técnica Colombiana-NTC4552.
- Norma Técnica Colombiana-NTC2797.
- Norma Técnica Colombiana-NTC818.
- Norma Técnica Colombiana-NTC819.
- Estándar IEEE 80.
- Normas de construcción de ENERCA vigentes.

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS

Dentro de las actividades más representativas programadas para ejecutar durante la construcción de la obra tenemos las siguientes:

DESCRIPCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Redes de media y baja tensión: Se construirán con conductores tipo ACSR en los calibres obtenidos de los cálculos de regulación. La red de media a 13.2 Kv es en tres conductores y en baja tensión tres y cuatro conductores, según planos.

Transporte de postería: Esta actividad involucra las acciones previas al anclaje de los postes, relacionadas con el transporte general y local, acopio y anclaje. La postería se transportará en tracto mula desde los sitios de venta o distribución hasta el sitio de acopio y de allí se trasladó a los frentes de trabajo mediante la utilización de grúas.

Hincada de la postearía: Los postes de 8 metros se enterrarán a una profundidad de 1.40 ms y un diámetro De hueco de 0.45 ms. Los de 10 metros se enterrarán a una profundidad de 1.60 m y un diámetro de 0.5 m y los de 12 mts se enterrarán a una profundidad de 1.8ms y un ancho de hueco de 0.6ms.

Conexiones a tierra: Todos los transformadores llevan conexión a tierra mediante bajante en cinta band-it conectado a varilla en acero inoxidable de 2.40 mts.

Tendido de los conductores Colocación de los herrajes: Consiste en la colocación de las crucetas, herrajes (pernos. Espárragos, grapas etc.) Necesarios para la colocación de los aisladores que soportaran las líneas.
Todos los herrajes se colocarán en tal forma que se facilite su inspección y reemplazo y quedan instalados en forma segura.

Tendida de los conductores:
- Los conductores se riegan sobre el piso usando los carretes del empaque y luego se izan hasta las poleas o apoyos provisionales de tendido.
-Los soportes de los carretes de conductores han sido de construcción fuerte, y proveen mecanismos para poder Frenar los carretes.
-Los conductores se desenrollarán en la dirección y forma indicada por los fabricantes.
-Los cables luego de izarse se conectarán a los conductores por medio de conectadores giratorios y mordazas.
-Se evita que los conductores sufran dobladuras, torcederas o desgastes, en ningún caso se permite arrastrar sobre las crucetas ni elementos de apoyo.

-En terrenos rocosos y sobre cercas, carreteables o en general en aquellos sitios en los cuales el roce pueda deteriorar el cable, los conductores serán colocados sobre entarimados y/o andamios de madera.

Tensionado de los conductores: Consiste en el levantamiento de los conductores para obtener flechas y tensiones apropiadas para un buen funcionamiento en la red.

Dicho tensionamiento se realiza cuando las condiciones del ambiente (Visibilidad y viento) permitan obtener un normal desarrollo de las actividades. Para la instalación de los conductores se usarán poleas especiales, las cuales se colocaron directamente en la cadena de aisladores o en la cruceta. Las flechas de los conductores de un mismo vano son iguales, para obtener la misma separación entre los conductores. Una vez que las medidas sean satisfactorias, se fijaran los cables a los dispositivos definitivos, evitando que se deslizaran debido a los esfuerzos del viento o cambios de temperatura.

Instalación de los accesorios para cables: Los empalmes de cables se harán en la forma indicada por los fabricantes, con una cuidadosa limpieza de los conductores. En los apoyos de retención los puentes se harán en forma continua, pero si debido a circunstancias de la construcción, tales como vanos muy grandes, cabos muy cerca de la estructura, etc., es necesario hacer empalmes en los conductores de circuito, mediante grapas o conectadores de empalme a ambos lados de la grapa, con las puntas envueltas por 4 capas de cinta aislante. En donde se usaran dispositivos terminales del tipo de compresión, las conexiones de los puentes se harán con dispositivos terminales de conexiones de puentes del mismo tipo, los cuales se unirán con pernos a los dispositivos terminales.

Prueba de la línea: Una vez terminada la construcción de la línea se efectúa una revisión física de la misma, estructura por estructura, verificando que todos los elementos de cada una de ellas hayan sido correctamente colocados, que las conexiones se encuentren correctas y que no haya contactos a tierra de los conductores o entre estos.

Al igual que se verifica que la zona se encuentre totalmente despejada y libre de cualquier obstáculo (vegetación).

4.2 AVANCE FISICO DE LA OBRA .

ACTIVIDADES ELECTRICAS

No se adelanto ninguna actividad para este periodo.

4.3 OBRA EJECUTADA


ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT	VR. UNIT. DIRECTO	VR. PARCIAL	CANT EJECUTADA	VR. PARCIAL
100	**RED DE MEDIA TENSION**						
101	REPLANTEO EN MEDIA TENSIÓN	km	0,158	$ 456.198,26	$ 72.079,33	0	0
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE EN M.T.	und	4	$ 89.862,00	$ 359.448,00	0	0
103	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA POSTE CONCRETO 12MX1050KG	und	4	$ 2.407.976,91	$ 9.631.907,64	0	0
104	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCTURA R-560, CON AISLADOR SUSPENSION SINTETICO-POLIMERICO PARA 15 KV	und	2	$ 1.298.008,41	$ 2.596.016,82	0	0
105	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCTURA R-550 PARA 13.2 KV	und	2	$ 838.011,45	$ 1.676.022,90	0	0
106	CIMENTACION PARA POSTE 12M	und	4	$ 122.054,36	$ 488.217,44	0	0
107	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO RED PRIMARIA TRIFASICA 3 HILO 3 Nº 2 ACSR	m	158	$ 15.337,92	$ 2.423.391,36	0	0
200	**RED DE BAJA TENSION**						
201	REPLANTEO EN BAJA TENSIÓN	km	1,269	$ 456.198,26	$ 578.915,59	0	0
202	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE EN B.T.	und	61	$ 75.852,24	$ 4.626.986,64	0	0

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT	VR. UNIT. DIRECTO	VR. PARCIAL	CANT EJECUTADA	VR. PARCIAL
203	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA POSTE CONCRETO 8 MX510KG	und	36	$ 1.041.407,21	$ 37.490.659,56	0	0
204	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA POSTE CONCRETO 8 MX1050KG	und	12	$ 1.508.670,95	$ 18.104.051,40	0	0
205	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA POSTE CONCRETO 10 MX510KG	und	5	$ 1.311.428,21	$ 6.557.141,05	0	0
206	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA POSTE CONCRETO 10 MX1050KG	und	8	$ 1.701.514,23	$ 13.612.113,84	0	0
207	CIMENTACION PARA POSTE BT	und	20	$ 88.680,90	$ 1.773.618,00	0	0
300	**RED TRENZADA BAJA TENSIÓN**						
301	SUMINISTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN LA 320 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS	und	85	$ 75.041,09	$ 6.378.492,65	0	0
302	SUMINSTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA RETENCIÓN SENCILLA LA 321 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS	und	33	$ 108.374,02	$ 3.576.342,66	0	0
303	SUMINSTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA RETENCIÓN DOBLE LA 327 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS	und	2	$ 188.972,16	$ 377.944,32	0	0


ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT	VR. UNIT. DIRECTO	VR. PARCIAL	CANT EJECUTADA	VR. PARCIAL
304	SUMINSTRO Y VESTIDA ESTRUCTURA RETENCIÓN DOBLE LA 324 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS	und	8	$ 177.161,66	$ 1.417.293,28	0	0
305	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA TIPO INTEMPERIE PARA ACOMETIDAS (CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS)	und	33	$ 666.529,83	$ 1.995.484,39	0	0
306	SUMINISTRO, TENDIDA Y TENSIONADA RED TRENZADA ALUM. XLPE 3x2/0+1x1/0 (3X70mm² + 1x50mm²)	m	918	$ 47.008,18	$ 43.153.509,24	0	0
307	SUMINISTRO, TENDIDA Y TENSIONADA RED TRENZADA ALUM. XLPE 2X35mm² + 1x35mm² (2x2 + 1x2)	m	1269	$ 25.128,29	$ 31.887.800,01	0	0
308	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	und	41	$ 671.057,60	$ 27.513.361,60	0	0
400	**ALUMBRADO PUBLICO**						
401	LUMINARIA DE 32 LEDS, 28-110W, 2700-13350LM, CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN HASTA 700MA, INCLUYE FUSIBLE Y DPS, BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA. SUMINISTRO E INSTALACION	Und	74	$ 1.760.733,90	$ 130.294.308,60	0	0
402	BRAZO NORMA ET832 SOPORTES PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTES DE CONCRETO. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	74	$ 524.818,57	$ 38.836.574,18	0	0

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT	VR. UNIT. DIRECTO	VR. PARCIAL	CANT EJECUTADA	VR. PARCIAL
500	**TRANSFORMADORES**						
501	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCTURA 710 TRANSF. MONO. 5 KVA 13,2KV/480-240V	und	1	$ 7.805.332,00	$ 7.805.332,00	0	0
502	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCTURA 711 TRANSF. TRIF. 75 KVA 13,2KV/208-120V	und	2	$ 27.007.392,80	$ 54.014.785,60	0	0
503	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN ACERO PARA TRANSFORMADOR	und	3	$ 2.276.363,80	$ 6.829.091,40	0	0
504	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO INTERPERIE INCLUYE MEDIDA Y ACCESORIOS	und	1	$ 4.559.459,26	$ 4.559.459,26	0	0
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 478.630.348,76**		**0**
				ADMINISTRACION 27%	$ 129.230.194,17		0
				IMPREVISTOS 2%	$ 9.572.606,98		0
				UTILIDAD 5%	$ 23.931.517,44		0
				SUBTOTAL	**$ 641.364.667,35**		**0**
				RETIE 2%	$ 9.572.606.98		0
				RETILAP 2%	$ 9.572.606.98		0
				AJUSTE AL PESO	-0,31		0
				VALOR TOTAL OBRA	**660.509.881,00**		**0**

4.4 GRAFICO AVANCE DE OBRA

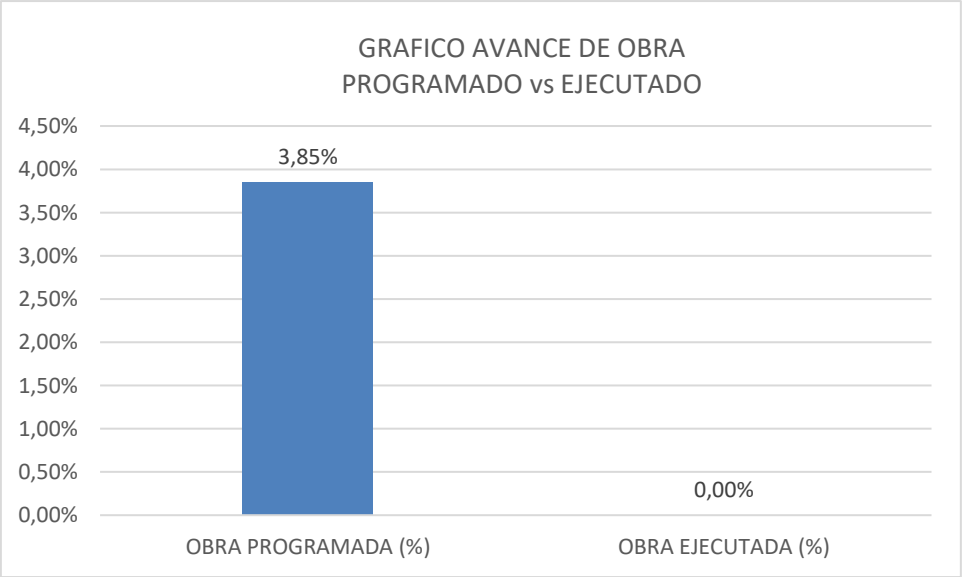

Avance de Obra del 0%

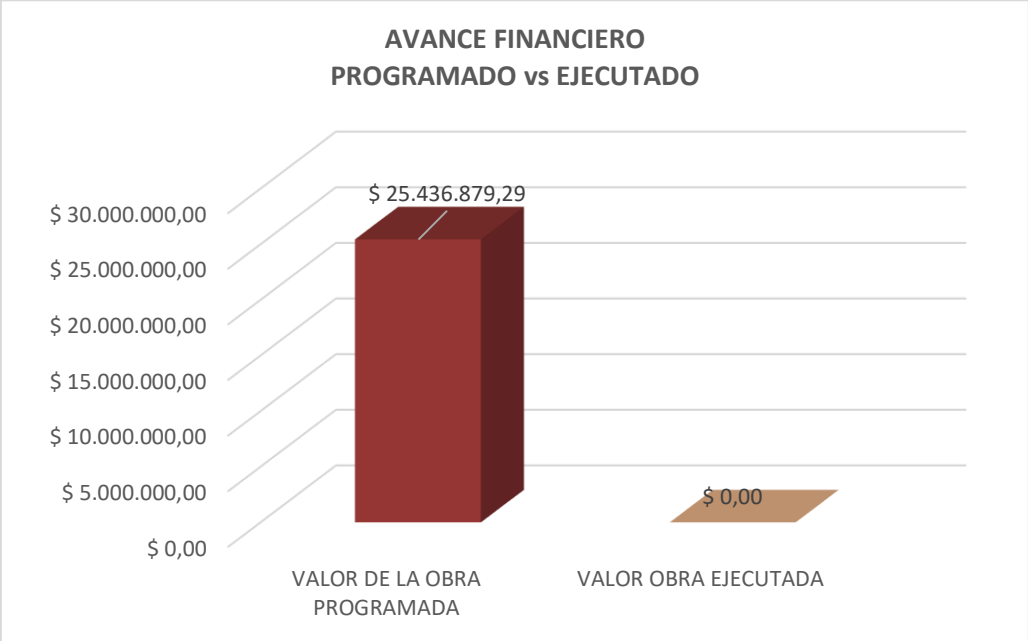

CONCLUSIONES (RECOMENCDACIONES, SUGERENCIAS, PROPUESTAS)

1. A la fecha del presente informe se tiene un avance del 0.0% esto debido a que las vías de la ciudadela Alcaravanes etapa 2 no se encuentran abiertas en su totalidad lo que no ha permitido realizar el replanteo.

2. Se solicita a la administración municipal la terminación de la totalidad de la apertura de las vías para así adelantar la actividad de replanteo, que permita consolidar el balance real de la obra.

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. SOCIALIZACION



Foto 2.SOCIALIZACION



Foto 3. REUNION CON COMUNIDAD



Foto 4. REUNION CON COMUNIDAD

ANEXO 2.
SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	211042453	9457499856	E	2023/10/18	2023/10/10	BANCOLOMBIA	0	$2,458,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$7,380,000	$1,180,800			$8,540,000	$341,600			$8,540,000	$341,600			$8,540,000	$594,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (7 Afiliados)						$7,380,000	$1,180,800			$8,540,000	$341,600			$8,540,000	$341,600			$8,540,000	$594,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (7 Afiliados)						$7,380,000	$1,180,800			$8,540,000	$341,600			$8,540,000	$341,600			$8,540,000	$594,700		$0	$0
1	CC	1115860119	ARIZA COMAYAN YESSICA ALEXANDRA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
2	CC	1118555499	BERNAL PARRA ADRIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	9658390	BERNAL LOPEZ VICTOR MANUEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	70129156	CORREA GARCES JOHN JAIRO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	74301198	NOCUA JORGE EDUARDO	230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS005	15	$1,000,000	$40,000	CCF69	15	$1,000,000	$40,000	14-23	15	$1,000,000	$69,600	15	$0	$0
6	CC	7224278	SAENZ CARVAJAL HUGO CESAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	74346706	TOLOZA DUEÑAS GILDARDO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$7,380,000	$1,180,800			$8,540,000	$341,600			$8,540,000	$341,600			$8,540,000	$594,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	211042453	9457499856	E	2023/10/18	2023/10/10	BANCOLOMBIA	0	$2,458,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,180,800	$0	$0	$1,180,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$995,200	$0	$0	$995,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$594,700	$0	$0	$594,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$594,700	$0	$0	$594,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$341,600	$0	$0	$341,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$341,600	$0	$0	$341,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$341,600	$0	$0	$341,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,000	$0	$0	$56,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$285,600	$0	$0	$285,600
TOTAL				**7**	**$2,458,700**	**$0**	**$0**	**$2,458,700**

ANEXO 3.
NOMINA

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

INDISCON INGENIERIA S.A.S.

NIT N 900.840.475-3

PERIODO DE PAGO

01/09/2023-30/09/2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C. No.	SUELDO BASICO	DIAS TRAB.	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCIDO	NETO PAGADO	FIRMA
					BASICO	H. EX.	AUX. TR.		SALUD	PENSIÓN	OTROS			
1	VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	9.658.390	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000,00		$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 464.000,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	
2	JOHN JAIRO CORREA GARCES	70.129.156	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000,00		$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00		$ 464.000,00	$ 46.400,00	$ 1.254.206,00	
3	HUGO CESAR SAENZ CARVAJAL	7.224.278	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000,00		$ 140.606,00	$ 1.300.606,00	$ 46.400,00	$ 46.400,00	$ 464.000,00	$ 92.800,00	$ 1.207.806,00	
4	GILDARDO TOLOZA DUEÑAS	74.346.706	$ 1.500.000	30	$ 1.500.000,00		$ 140.606,00	$ 1.640.606,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ 600.000,00	$ 120.000,00	$ 1.520.606,00	
5														
6														
TOTALES					**$ 4.980.000,00**	**$ 0,00**	**$ 562.424,00**	**$ 5.542.424,00**	**$ 199.200,00**	**$ 152.800,00**	**$ 1.992.000,00**	**$ 352.000,00**	**$ 5.190.424,00**	

APORTES EMPRESA		
PENSIÓN	16,0%	**$ 796.800,0**
ARP	6,96%	**$ 346.608,0**
CAJA DE COMPENSACIÓN	4,0%	**$ 221.697,0**
TOTAL APORTE EMPRESA		**1.365.105**

APROPIACIONES DE NOMINA	
CESANTIAS	461.684
INTERESES S/ CESANTIAS	55.424
PRIMA	461.684
VACACIONES	207.666
TOTAL APROPIADO	1.186.458
