| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL | Código: GLC-CONT-FO-016 |
|---|---|---|
| | PROCESO DE CONTRATACIÓN | Versión: 0 |

**INFORME No** 1 **FACTURA No**

**No. DE ACEPTACIÓN:**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 11 | 09 | 2023 |
| dd | mm | aaaa |

## 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

**CONTRATO No** 53 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** OBRA (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

**ORDENADOR DEL GASTO** SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIO GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

**CONTRATISTA** WRUSSY INGENIEROS S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:** **INDIVIDUAL** X **COLEGIADA**

**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO - GERENTE ADMINISTRATIVA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

**APOYO SUPERVISIÓN** SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO - PROFESIONAL 4 (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contratar la adecuación, dotación, traslado, montaje y desmontaje de la infraestructura física de los locales donde funciona y funcionará los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro.

**DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO** GERENCIA ADMINISTRATIVA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** CUATRO (4) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 8 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2023 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 7 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2023 (Año)

**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 5700000323

**VALOR DEL CONTRATO**

**El valor del presente contrato es la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($575.640.285), incluido IVA, la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y demás costos directos e indirectos en los que deba incurrir el futuro contratista con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.**

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

| PRÓRROGAS | |
|---|---|
| No. | PLAZO |
| 1 | 2 Meses |

| ADICIONES | | |
|---|---|---|
| No. | VALOR | RP |
| 1 | | |

| SUSPENSIONES | | |
|---|---|---|
| No | DESDE | HASTA |
| | | |

**2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 575,640,285 | **100.0%** |
| Adiciones 1 | | **0.0%** |
| Adiciones 2 | | **0.0%** |
| Adiciones 3 | | **0.0%** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 575,640,285** | **100.0%** |
| Valor ejecutado antes del presente pago | | **0.0%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 251,910,770 | **43.8%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 251,910,770** | **43.8%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **43.8%** |

**OBSERVACIONES**

Adecuaciones, dotación de mobiliario, montaje, desmontaje, traslado de mobiliario y equipos y todas aquellas actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para los puntos de atención de Acacias, Palmira, Yopal y Soacha.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

**3. DESCRIPCION ACTIVIDADES**

| | |
|---|---|
| Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha | **43.8%** |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | **43.8%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO** | **0.0%** |

**OBSERVACIONES**

Adecuaciones, dotación de mobiliario, montaje, desmontaje, traslado de mobiliario y equipos y todas aquellas actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para los puntos de atención de Acacias, Palmira, Yopal y Soacha.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

**4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Se certifica que la proforma adjunta al presente informe, cumple con lo establecido en el contrato en lo referente a los valores e items relacionados y tiempos de entrega establecidos.

**5. EVALUACIÓN CONTRATISTA** (Escala de 0 - 5)

| EVALUACION PARCIAL | |
|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | **4** |
| **Plazos** | **4** |
| **Aspectos administrativos** | **4** |

**6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO**

***LA SUSCRITA JEFE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 053 de 2023***

***CERTIFICA:***

**Que WRUSSY INGENIEROS S.A.S., identificado con NIT No. 901.109.885-1, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente al presente documento, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 053 de 2023.**

**ANEXOS PRESENTE INFORME**

| ANEXO | | No FOLIOS | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| Anexo Técnico | X | 56 | Corte de Obra (12), informe de obra (44) |
| Certifiicado pago Seguridad Social | X | 5 | Certificado de pago de seguridad Social (1), Planilla pago (2), Documentos contador público (2) |
| Certificación Bancaria | X | 1 | Certificacion Bancaria-Bancolombia (1) |
| OTROS | X | 12 | Factura proforma No. 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 (12) |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

**ONCE** (día en letras) **( 11 )** (día en números) días del mes de **Septiembre** (mes en letras) de **2023** (Año )

(Firma) DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO Firmado digitalmente por DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO Fecha: 2023.09.15 12:15:34 -05'00'

(Nombre) DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

**ANEXO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fecha de actualización:**

## 1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APOYO SUPERVISIÓN: | DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO | | | CONTRATO No. | 053 de 2023 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: | 08/06/2023 | HASTA: | 07/10/2023 | | |
| CONTRATISTA: | WRUSSY INGENIEROS S.A.S. | | | | |
| CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: | SI | X | NO | | |
| NÚMERO DE PAGO APROBADO: | 1 | 1 | MES: | Agosto | |

## 2. OBJETO

Contratar la adecuación, dotación, traslado, montaje y desmontaje de la infraestructura física de los locales donde funciona y funcionará los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro.

## 3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:

**PRORROGAS**

| No. | PLAZO |
|---|---|
| 1 | 2 MESES |
| | |
| | |
| | |
| | |

**ADICIONES**

| No. | VALOR | RP |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**SUSPENSIONES**

| No | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | | |

## 4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Adecuaciones, dotación de mobiliario, montaje, desmontaje, traslado de mobiliario y equipos y todas aquellas actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para los puntos de atención de acacias, Palmira, Yopal y Soacha.

## 5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

| DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 575,640,285 | 100% |
| Adiciones | | |
| Adiciones | | |
| Adiciones | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 575,640,285** | |
| Valor ejecutado antes del presente pago | | **0.0%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 251,910,770 | **43.8%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 251,910,770** | **43.8%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **56%** |

## 6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS

| N° Informe y Registro Presupuestal | Fecha de Trámite | N° Factura | Valor Pagado | % valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar | % Por Ejecutar | | TOTAL APROBADO | % TOTAL EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 1 CDP.10001777 | 15/03/23 | WRU 144 | $ 19,627,226 | 30.9% | $ 43,953,818 | 69.1% | | $ 19,627,226 | |
| N° 1 CDP.10001777 | 15/03/23 | WRU 145 | $ 22,798,364 | 35.9% | $ 40,782,680 | 64.1% | | $ 22,798,364 | |
| N° 1 CDP.10001778 | 15/03/23 | WRU 138 | $ 117,861,429 | 38.5% | $ 188,366,913 | 61.5% | | $ 117,861,429 | |
| N° 1 CDP.10001778 | 15/03/23 | WRU 139 | $ 8,045,335 | 2.6% | $ 298,183,007 | 97.4% | | $ 8,045,335 | |
| N° 1 CDP.10001779 | 15/03/23 | WRU 140 | $ 19,471,868 | 12.0% | $ 142,512,231 | 88.0% | | $ 19,471,868 | |
| N° 1 CDP.10001779 | 15/03/23 | WRU 141 | $ 2,217,196.78 | 1.4% | $ 159,766,902 | 98.6% | | $ 2,217,197 | |
| N° 1 CDP.10001780 | 15/03/23 | WRU 142 | $ 44,722,463.81 | 38.2% | $ 72,321,660 | 61.8% | | $ 44,722,464 | |
| N° 1 CDP.10001780 | 15/03/23 | WRU 143 | $ 17,166,887.19 | 14.7% | $ 99,877,237 | 85.3% | | $ 17,166,887 | |
| | | | | | | | TOTAL | $ 251,910,770 | |

## 7. COMPARATIVO DE PRECIOS

| CUADRO ECONÓMICO DEL CONTRATO | | | | | VALOR FACTURADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | ITEM | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
| **ACACIAS** | | | | | | | | | |
| **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo, reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectónico ajustado en DWG con la adecuación realizada | 55.00 | $ 142,124.00 | $ 7,816,820.00 | 1.1 | Localización y replanteo, reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectónico ajustado en DWG con la adecuación realizada | 43.25 | $ 142,124.00 | $ 6,146,152 |
| **ACCESORIOS SANITARIOS** | | | | | **ACCESORIOS SANITARIOS** | | | | |
| 2.1 | Suministro e instalacion de pileta para aseo 50 de largo x 60 de ancho x 40 de alto, Ceramica de formato 20 x 20 color blanca. A todo costo | 1.00 | $ 811,340.00 | $ 811,340.00 | 2.1 | MURO EN DRYWALL Espesor 15 cm, altura a 2.44 mt. Incluye placa de yeso dos caras, cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo | 1.00 | $ 811,340.00 | $ 811,340 |
| 2.2 | Suministro e instalacion de tuberia para desagüe de la pileta en tuberia de 2 ", incluye accesorios de conexión. Incluye regatas para instalacion y resane. A todo costo | 4.00 | $ 124,273.00 | $ 497,092.00 | 2.2 | Refuerzo Muros para muros en DRYWALL | 4.00 | $ 124,273.00 | $ 497,092 |
| **MESONES Y COCINA** | | | | | **MESONES Y COCINA** | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalacion de mueble de cocina de 120x88x52, en madera RH y en acero inoxidable, incluye griferia y accesorios de desagüe. A todo costo. | 1.00 | $ 1,833,551.00 | $ 1,833,551.00 | 3.1 | Suministro e instalacion de mueble de cocina de 120x88x52, en madera RH y en acero inoxidable, incluye griferia y accesorios de desagüe. A todo costo. | 1.00 | $ 1,833,551.00 | $ 1,833,551 |
| 3.2 | Elaboracion de punto de desague para lavaplatos en tuberia sanitaria 2", incluye accesorios, incluye regata en mamposteria y resane. A todo costo | 7.00 | $ 124,273.00 | $ 869,911.00 | 3.2 | Elaboracion de punto de desague para lavaplatos en tuberia sanitaria 2", incluye accesorios, incluye regata en mamposteria y resane. A todo costo | 4.50 | $ 124,273.00 | $ 559,229 |
| 3.3 | Suministro e instalación de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor por 42 cm de ancho enchapada en laminado plástico de alta presión. Incluye soporte y anclajes | 1.50 | $ 272,332.00 | $ 408,498.00 | 3.3 | Suministro e instalación de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor por 42 cm de ancho enchapada en laminado plástico de alta presión. Incluye soporte y anclajes | 1.50 | $ 272,332.00 | $ 408,498 |
| **PINTURA** | | | | | **PINTURA** | | | | |
| 4.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales | 119.95 | $ 11,752.00 | $ 1,409,652.00 | 4.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales | 119.29 | $ 11,752.00 | $ 1,401,890 |
| 4.2 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales | 12.60 | $ 15,687.00 | $ 197,656.00 | 4.2 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales | 12.18 | $ 15,687.00 | $ 191,068 |
| **VARIOS** | | | | | **VARIOS** | | | | |
| 5.1 | Limpieza de la obra. A todo costo | 1.00 | $ 433,100.00 | $ 433,100.00 | 5.1 | Limpieza de la obra. A todo costo | 1.00 | $ 433,100.00 | $ 433,100 |
| 5.2 | Retiro de Escombros a todo costo | 1.00 | $ 650,615.00 | $ 650,615.00 | 5.2 | Retiro de Escombros a todo costo | 1.00 | $ 650,615.00 | $ 650,615 |
| **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO** | | | | | **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO** | | | | |
| 6.1 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | 1.00 | $ 1,429,381.00 | $ 1,429,381.00 | 6.1 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | 1.00 | $ 1,429,381.00 | $ 1,429,381 |
| 6.2 | ESCRITORIO D • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. •Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20. •Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 •niveladores plásticos de 5/16". •Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de alto) •herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto) con espacio para | 3.00 | $ 2,318,297.00 | $ 6,954,891.00 | 6.2 | ESCRITORIO D • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. •Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20. •Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 •niveladores plásticos de 5/16". •Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de alto) •herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto) con espacio para | 3.00 | $ 2,318,297.00 | $ 6,954,891 |
| 6.3 | ESCRITORIO E • Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. •Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 •niveladores plásticos de 5/16". •Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor para laterales (0.60 x 0.40 de alto) | 2.00 | $ 1,489,385.00 | $ 2,978,770.00 | 6.3 | ESCRITORIO E • Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. •Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 •niveladores plásticos de 5/16". •Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor para laterales (0.60 x 0.40 de alto) | 2.00 | $ 1,489,385.00 | $ 2,978,770 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16". | 1.00 | $ 1,181,650.00 | $ 1,181,650.00 | 6.4 | Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16". | 1.00 | $ 1,181,650.00 | $ 1,181,650 |
| 6.5 | Silla alta para barra de cocina | 2.00 | $ 323,079.00 | $ 646,158.00 | 6.5 | Silla alta para barra de cocina | 2.00 | $ 323,079.00 | $ 646,158 |
| 6.6. | Silla ergonomica tipo profesional grirratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 5.00 | $ 565,752.00 | $ 2,828,760.00 | 6.6. | Silla ergonomica tipo profesional grirratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 5.00 | $ 565,752.00 | $ 2,828,760 |
| **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION** | | | | | **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION** | | | | |
| 7.1 | Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo | 1.32 | $ 845,414.00 | $ 1,115,946.00 | 7.1 | Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo | 1.32 | $ 845,414.00 | $ 1,115,946 |
| 7.2 | HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms | 1.00 | $ 148,553.00 | $ 148,553.00 | 7.2 | HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms | 1.00 | $ 148,553.00 | $ 148,553 |
| 7.3 | Suministro e intalacion de SEÑALETICA FRONTALES Colgante A todo costo, Señalética Numeración Front, sin cenefa, se ubica sobre los modulos de atencion. . Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA | 3.00 | $ 94,678.00 | $ 284,034.00 | 7.3 | Suministro e intalacion de SEÑALETICA FRONTALES Colgante A todo costo, Señalética Numeración Front, sin cenefa, se ubica sobre los modulos de atencion. . Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA | 3.00 | $ 94,678.00 | $ 284,034 |
| 7.4 | Suministro e Instalacion Aviso lona 2.7 x 0.4 mt, Caja en aluminio 10 cm, iluminacion en led color blanco, incluye accesorios para su instalacion. A todo costo. | 1.00 | $ 2,644,033.00 | $ 2,644,033.00 | 7.4 | Suministro e Instalacion Aviso lona 2.7 x 0.4 mt, Caja en aluminio 10 cm, iluminacion en led color blanco, incluye accesorios para su instalacion. A todo costo. | 1.00 | $ 2,644,033.00 | $ 2,644,033 |
| **NO PREVISTOS** | | | | | **NO PREVISTOS** | | | | |
| | | | | | NP 23 | RESANES GENERALES INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES | 15.00 | $ 16,051.00 | $ 240,765 |
| | | | | | NP 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO | 8.25 | $ 78,268.00 | $ 645,711 |
| | | | | | NP 31 | PAÑETE PARA MUROS, IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 2 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA. | 15.00 | $ 39,753.00 | $ 596,295 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | $ 35,140,411 | | **SUBTOTAL** | | $ 34,627,482 | |
| **ADMINISTRACION** | **8%** | $ 2,811,233 | | **ADMINISTRACION** | **8%** | $ 2,770,199 | |
| **IMPREVISTOS** | **5%** | $ 1,757,021 | | **IMPREVISTOS** | **5%** | $ 1,731,374 | |
| **UTILIDAD** | **8%** | $ 2,811,233 | | **UTILIDAD** | **8%** | $ 2,770,199 | |
| **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | **19%** | $ 534,134 | | **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | **19%** | $ 526,338 | |
| **TOTAL** | | $ 43,054,031.6 | | **TOTAL** | | $ 42,425,591 | |

| **SOACHA** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo, reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectónico ajustado en DWG con la adecuación realizada | 380.00 | $ 26,980.00 | $ 10,252,400.00 | 1.1 | Localización y replanteo, reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectónico ajustado en DWG con la adecuación realizada | 0.00 | $ 26,980.00 | $ - |
| **MUROS EN DRYWALL** | | | | | **MUROS EN DRYWALL** | | | | |
| 2.1 | MURO EN DRYWALL Espesor 15 cm, altura a 2.44 mt. Incluye placa de yeso dos caras, cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo | 173.67 | $ 81,793.00 | $ 14,204,990.31 | 2.1 | MURO EN DRYWALL Espesor 15 cm, altura a 2.44 mt. Incluye placa de yeso dos caras, cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo | 30.00 | $ 81,793.00 | $ 2,453,790 |
| 2.2 | Refuerzo Muros para muros en DRYWALL | 13.70 | $ 29,458.00 | $ 403,574.60 | 2.2 | Refuerzo Muros para muros en DRYWALL | 0.00 | $ 29,458.00 | $ - |
| 2.3 | AISLAMIENTO ACÚSTICO FRESCASA DE 3" PULGADA.A todo costo | 11.96 | $ 64,790.00 | $ 774,888.40 | 2.3 | AISLAMIENTO ACÚSTICO FRESCASA DE 3" PULGADA.A todo costo | 0.00 | $ 64,790.00 | $ - |
| **TECHO EN DRYWALL** | | | | | **TECHO EN DRYWALL** | | | | |
| 3.1 | Techo en Drywall a una sola cara, incluye cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo | 20.20 | $ 56,481.00 | $ 1,140,916.20 | 3.1 | Techo en Drywall a una sola cara, incluye cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo | 0.00 | $ 56,481.00 | $ - |
| **MESONES** | | | | | **MESONES** | | | | |
| 4.1 | Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22. de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared. Incluye traslado del punto antiguo al actual | 2.40 | $ 556,026.00 | $ 1,334,462.40 | 4.1 | Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22. de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared. Incluye traslado del punto antiguo al actual | 0.00 | $ 556,026.00 | $ - |
| **CARPINTERÍA METALICA - ALUMINIO** | | | | | **CARPINTERÍA METALICA - ALUMINIO** | | | | |
| 5.1 | Suministro e instalación de Puerta metálica con rejilla para RACK en lamina calibre 18; de 0,8, hasta 2,10 mts con marco en lamina y chapa (Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte). A todo costo | 1.00 | $ 1,081,654.00 | $ 1,081,654.00 | 5.1 | Suministro e instalación de Puerta metálica con rejilla para RACK en lamina calibre 18; de 0,8, hasta 2,10 mts con marco en lamina y chapa (Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte). A todo costo | 0.00 | $ 1,081,654.00 | $ - |
| **CARPINTERÍA METALICA - VIDRIOS y MADERA** | | | | | **CARPINTERÍA METALICA - VIDRIOS y MADERA** | | | | |
| 6.1 | Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm (Incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento).A todo costo | 28.38 | $ 419,636.00 | $ 11,909,269.68 | 6.1 | Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm (Incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento).A todo costo | 0.00 | $ 419,636.00 | $ - |
| 6.2 | Suministro e instalación de Puertas en Vidrio Templado 8 mm Pivote (Incluye topes de piso , accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento). A todo costo | 4.40 | $ 680,018.00 | $ 2,992,079.20 | 6.2 | Suministro e instalación de Puertas en Vidrio Templado 8 mm Pivote (Incluye topes de piso , accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento). A todo costo | 0.00 | $ 680,018.00 | $ - |
| 6.3 | Suministro e instalación de Vidrios Templado 10 mm (Incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento).A todo costo | 10.52 | $ 553,024.00 | $ 5,817,812.48 | 6.3 | Suministro e instalación de Vidrios Templado 10 mm (Incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento).A todo costo | 0.00 | $ 553,024.00 | $ - |
| 6.4 | Suministro e instalación de Puertas en Vidrio Templado 10 mm gato hidráulico y bisagra tubular en acero inoxidable (Incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento). A todo costo | 5.80 | $ 856,776.00 | $ 4,969,300.80 | 6.4 | Suministro e instalación de Puertas en Vidrio Templado 10 mm gato hidráulico y bisagra tubular en acero inoxidable (Incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento). A todo costo | 0.00 | $ 856,776.00 | $ - |
| 6.5 | Suministro e instalación de Sandbalsting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho . A todo costo (interior y Exterior) | 31.03 | $ 49,860.00 | $ 1,547,155.80 | 6.5 | Suministro e instalación de Sandbalsting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho . A todo costo (interior y Exterior) | 0.00 | $ 49,860.00 | $ - |
| **CARPINTERIA MADERA** | | | | | **CARPINTERIA MADERA** | | | | |
| 7.1 | Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 de ancho por 2.20 de alto, incluye marcos y todo lo necesario para su instalación. A todo costo. | 1.00 | $ 685,212.00 | $ 685,212.00 | 7.1 | Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 de ancho por 2.20 de alto, incluye marcos y todo lo necesario para su instalación. A todo costo. | 0.00 | $ 685,212.00 | $ - |
| 7.2 | Suministro e instalación de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor x 42 cm d eancho, enchapada en laminado plástico de alta presión. Incluye soporte y anclajes | 42.70 | $ 135,128.00 | $ 5,769,965.60 | 7.2 | Suministro e instalación de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor x 42 cm d eancho, enchapada en laminado plástico de alta presión. Incluye soporte y anclajes | 0.00 | $ 135,128.00 | $ - |
| 7.3 | Suministro e instalación de guarda escoba MDF, color roble nuevo | 44.70 | $ 22,225.00 | $ 993,457.50 | 7.3 | Suministro e instalación de guarda escoba MDF, color roble nuevo | 0.00 | $ 22,225.00 | $ - |
| **PINTURA** | | | | | **PINTURA** | | | | |
| 8.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales | 162.98 | $ 16,858.00 | $ 2,747,516.84 | 8.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales | 0.00 | $ 16,858.00 | $ - |
| 8.2 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales | 22.89 | $ 21,061.00 | $ 482,086.29 | 8.2 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales | 0.00 | $ 21,061.00 | $ - |
| 8.3 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno dos manos muros interiores negro A todo costo incluye lineales | 9.80 | $ 20,250.00 | $ 198,450.00 | 8.3 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno dos manos muros interiores negro A todo costo incluye lineales | 0.00 | $ 20,250.00 | $ - |
| 8.4 | Pintura en aceite color blanco mate dos manos, a todo costo | 30.00 | $ 19,866.00 | $ 595,980.00 | 8.4 | Pintura en aceite color blanco mate dos manos, a todo costo | 0.00 | $ 19,866.00 | $ - |
| **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Suministro e instalación de panel LED de sobreponer cuadrado de 60 x 60, 55 w, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 6 mt de tablero principal | 1.00 | $ | 285,273.00 | $ | 285,273.00 | 9.1 | Suministro e instalación de panel LED de sobreponer cuadrado de 60 x 60, 55 w, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 6 mt de tablero principal | 0.00 | $ 285,273.00 | $ - |
| 9.2 | Suministro e instalación de panel LED de sobreponer redondo de 26W, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 8 mt de tablero principal | 1.00 | $ | 169,285.00 | $ | 169,285.00 | 9.2 | Suministro e instalación de panel LED de sobreponer redondo de 26W, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 8 mt de tablero principal | 0.00 | $ 169,285.00 | $ - |
| **VARIOS** | | | | | | | **VARIOS** | | | | |
| 10.1 | Limpieza de la obra. A todo costo | 1.00 | $ | 653,066.00 | $ | 653,066.00 | 10.1 | Limpieza de la obra. A todo costo | 0.00 | $ 653,066.00 | $ - |
| 10.2 | Retiro de Escombros a todo costo | 1.00 | $ | 922,896.00 | $ | 922,896.00 | 10.2 | Retiro de Escombros a todo costo | 0.00 | $ 922,896.00 | $ - |
| **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO** | | | | | | | **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO** | | | | |
| 11.1 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | 3.00 | $ | 1,524,240.00 | $ | 4,572,720.00 | 11.1 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | 3.00 | $ 1,524,240.00 | $ 4,572,720 |
| 11.2 | ESCRITORIO C • Superficie de 1,50 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,90 (L) x 0,60 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA<br>Incluye cajonera metálica tres gavetas y archivador sobre retorno. | 1.00 | $ | 2,536,120.00 | $ | 2,536,120.00 | 11.2 | ESCRITORIO C • Superficie de 1,50 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,90 (L) x 0,60 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA<br>Incluye cajonera metálica tres gavetas y archivador sobre retorno. | 1.00 | $ 2,536,120.00 | $ 2,536,120 |
| 11.3 | ESCRITORIO D • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de alto)<br>•herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA<br>Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto), con espacio para | 25.00 | $ | 2,316,114.00 | $ | 57,902,850.00 | 11.3 | ESCRITORIO D • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de alto)<br>•herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA<br>Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto), con espacio para | 25.00 | $ 2,316,114.00 | $ 57,902,850 |
| 11.4 | Mesa de reuniones modular de 2.20m x 1.20m en aglomerado RH de 30mm de espesor, enchapada en laminado plástico de alta presión. Color Gris nube.<br>•Estructura metálica, tubo cuadrado de 2" cal. 16.<br>•Tapas de inspección fabricadas en MDF de 12 mm | 3.00 | $ | 1,564,608.00 | $ | 4,693,824.00 | 11.4 | Mesa de reuniones modular de 2.20m x 1.20m en aglomerado RH de 30mm de espesor, enchapada en laminado plástico de alta presión. Color Gris nube.<br>•Estructura metálica, tubo cuadrado de 2" cal. 16.<br>•Tapas de inspección fabricadas en MDF de 12 mm | 3.00 | $ 1,564,608.00 | $ 4,693,824 |
| 11.5 | Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16". | 3.00 | $ | 910,681.00 | $ | 2,732,043.00 | 11.5 | Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16". | 3.00 | $ 910,681.00 | $ 2,732,043 |
| 11.6 | Silla alta para barra de cocina | 4.00 | $ | 308,372.00 | $ | 1,233,488.00 | 11.6 | Silla alta para barra de cocina | 4.00 | $ 308,372.00 | $ 1,233,488 |
| 11.8 | Silla ergonomica tipo gerencial grirratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 1.00 | $ | 789,508.00 | $ | 789,508.00 | 11.8 | Silla ergonomica tipo gerencial grirratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 1.00 | $ 789,508.00 | $ 789,508 |
| 11.9 | Silla ergonomica tipo profesional grirratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 43.00 | $ | 547,578.00 | $ | 23,545,854.00 | 11.9 | Silla ergonomica tipo profesional grirratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 43.00 | $ 547,578.00 | $ 23,545,853 |
| **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION** | | | | | | | **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION** | | | | |
| 12.1 | Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo | 1.32 | $ | 587,233.00 | $ | 775,147.56 | 12.1 | Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo | 0.00 | $ 587,233.00 | $ - |
| 12.2 | HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms | 1.00 | $ | 155,921.00 | $ | 155,921.00 | 12.2 | HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms | 0.00 | $ 155,921.00 | $ - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | Suministro e intalacion de SEÑALETICA FRONTALES Colgante A todo costo, Señalética Numeración Front, sin cenefa, se ubica sobre los modulos de atencion. . Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA | 25.00 | $ 77,691.00 | $ 1,942,275.00 | 12.3 | Suministro e intalacion de SEÑALETICA FRONTALES Colgante A todo costo, Señalética Numeración Front, sin cenefa, se ubica sobre los modulos de atencion. . Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA | 0.00 | $ 77,691.00 | $ - |
| 12.4 | Instalacion Aviso lona 6 x 0.7 mt, Caja en aluminio 15cm, iluminacion en led color blanco. | 1.00 | $ 1,691,976.00 | $ 1,691,976.00 | 12.4 | Instalacion Aviso lona 6 x 0.7 mt, Caja en aluminio 15cm, iluminacion en led color blanco. | 0.00 | $ 1,691,976.00 | $ - |
| **DESMONTE, ADECUACION DE LOCAL A ENTREGAR EN SOACHA Y TRASLADO DE MOBIILIARIO Y EQUIPOS A PUNTO DE ATENCION NUEVO** | | | | | | | | | |
| **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | |
| 13.1 | Desmonte de mobiliario de asesores comerciales incluye divisiones, numeración, acrílico, a todo costo | 18.00 | $ 112,787.00 | $ 2,030,166.00 | 13.1 | Desmonte de mobiliario de asesores comerciales incluye divisiones, numeración, acrílico, a todo costo | 0.00 | $ 112,787.00 | $ - |
| 13.2 | Desmonte de muebles de cocineta, mesón, gabinetes, barra, etc/ global | 1.00 | $ 546,308.00 | $ 546,308.00 | 13.2 | Desmonte de muebles de cocineta, mesón, gabinetes, barra, etc/ global | 0.00 | $ 546,308.00 | $ - |
| 13.3 | Desmonte de mobiliario y escritorio | 5.00 | $ 94,865.00 | $ 474,325.00 | 13.3 | Desmonte de mobiliario y escritorio | 0.00 | $ 94,865.00 | $ - |
| 13.4 | Desmonte de oficina modular | 1.00 | $ 443,265.00 | $ 443,265.00 | 13.4 | Desmonte de oficina modular | 0.00 | $ 443,265.00 | $ - |
| 13.5 | Desmonte de archivador 4 cuerpos | 1.00 | $ 236,048.00 | $ 236,048.00 | 13.5 | Desmonte de archivador 4 cuerpos | 0.00 | $ 236,048.00 | $ - |
| 13.6 | Desmonte de logo de FNA interno en acrílico | 1.00 | $ 89,123.00 | $ 89,123.00 | 13.6 | Desmonte de logo de FNA interno en acrílico | 0.00 | $ 89,123.00 | $ - |
| 13.7 | Desmonte de aviso del FNA altura no mayor a 4 mts | 2.00 | $ 214,281.00 | $ 428,562.00 | 13.7 | Desmonte de aviso del FNA altura no mayor a 4 mts | 0.00 | $ 214,281.00 | $ - |
| 13.8 | Desmonte de aviso de FNA de fachada centro comercial, altura 12 mts | 1.00 | $ 503,121.00 | $ 503,121.00 | 13.8 | Desmonte de aviso de FNA de fachada centro comercial, altura 12 mts | 0.00 | $ 503,121.00 | $ - |
| 13.9 | Desmonte de sandblasting y limpieza de vidrios. | 66.00 | $ 17,019.00 | $ 1,123,254.00 | 13.9 | Desmonte de sandblasting y limpieza de vidrios. | 0.00 | $ 17,019.00 | $ - |
| **PINTURA** | | | | | **PINTURA** | | | | |
| 14.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, una mano en muros interiores blanco incluye lineales, resanes. A todo costo | 229.00 | $ 17,482.00 | $ 4,003,378.00 | 14.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, una mano en muros interiores blanco incluye lineales, resanes. A todo costo | 0.00 | $ 17,482.00 | $ - |
| **OTROS** | | | | | **OTROS** | | | | |
| 15.1 | Trasiego de mobiliario, incluye módulos de división, escritorios, sillas interlocutoras, sillas de funcionarios, sillas tándem, desde el local ubicado en el centro comercial mercurio carrera 7 No. 32 - 35 Soacha local 209 al local 314, hasta el punto nuevo del FNA ubicado en la Carrera 4 Este # 31-40 del Centro Comercial Gran Plaza, Local 2-218 A | 1.00 | $ 1,602,714.00 | $ 1,602,714.00 | 15.1 | Trasiego de mobiliario, incluye módulos de división, escritorios, sillas interlocutoras, sillas de funcionarios, sillas tándem, desde el local ubicado en el centro comercial mercurio carrera 7 No. 32 - 35 Soacha local 209 al local 314, hasta el punto nuevo del FNA ubicado en la Carrera 4 Este # 31-40 del Centro Comercial Gran Plaza, Local 2-218 A | 0.00 | $ 1,602,714.00 | $ - |
| 15.2 | Limpieza del sitio | 1.00 | $ 488,940.00 | $ 488,940.00 | 15.2 | Limpieza del sitio | 0.00 | $ 488,940.00 | $ - |
| **NO PREVISTOS** | | | | | **NO PREVISTOS** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | $ 184,472,623 | **SUBTOTAL** | | | | $ 100,460,196 |
| **ADMINISTRACION** | | **13%** | | $ 23,981,441 | **ADMINISTRACION** | | **13%** | | $ 13,059,826 |
| **IMPREVISTOS** | | **4%** | | $ 7,378,905 | **IMPREVISTOS** | | **4%** | | $ 4,018,408 |
| **UTILIDAD** | | **7%** | | $ 12,913,084 | **UTILIDAD** | | **7%** | | $ 7,032,214 |
| **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | | **19%** | | $ 2,453,486 | **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | | **19%** | | $ 1,336,121 |
| **TOTAL** | | | | $ 231,199,538.0 | **TOTAL** | | | | $ 125,906,764 |
| **YOPAL** | | | | | | | | | |
| **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo, reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectónico ajustado en DWG con la adecuación realizada | 95.00 | $ 111,857.00 | $ 10,626,415.00 | 1.1 | Localización y replanteo, reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectónico ajustado en DWG con la adecuación realizada | 0.00 | $ 111,857.00 | $ - |
| 1.2 | Demolición de muro en mamposteria | 6.00 | $ 30,313.00 | $ 181,878.00 | 1.2 | Demolición de muro en mamposteria | 0.00 | $ 30,313.00 | $ - |
| 1.3 | Desmonte de enchape de baño. A todo costo | 1.00 | $ 100,911.00 | $ 100,911.00 | 1.3 | Desmonte de enchape de baño. A todo costo | 0.00 | $ 100,911.00 | $ - |
| 1.4 | Desmonte de sanitario y lavamanos. A todo costo | 1.00 | $ 111,857.00 | $ 111,857.00 | 1.4 | Desmonte de sanitario y lavamanos. A todo costo | 0.00 | $ 111,857.00 | $ - |
| **PISOS** | | | | | **PISOS** | | | | |
| 2.1 | Suministro e instalación de Piso en vinisol laminclick SPC Plus, trafico comercial, resistente al agua, espesor de 5 mm, color cebrano | 93.00 | $ 194,626.00 | $ 18,100,218.00 | 2.1 | Suministro e instalación de Piso en vinisol laminclick SPC Plus, trafico comercial, resistente al agua, espesor de 5 mm, color cebrano | 0.00 | $ 194,626.00 | $ - |
| 2.2 | Suministro e instalación de piso porcelanato gris grafito formato 60 x 60. A todo costo | 2.30 | $ 181,736.00 | $ 417,993.00 | 2.2 | Suministro e instalación de piso porcelanato gris grafito formato 60 x 60. A todo costo | 0.00 | $ 181,736.00 | $ - |
| 2.3 | Suministro e instalación de cerámica para pared color otranto terra formato de 30 x 60. A todo costo | 12.67 | $ 133,366.00 | $ 1,689,747.00 | 2.3 | Suministro e instalación de cerámica para pared color otranto terra formato de 30 x 60. A todo costo | 0.00 | $ 133,366.00 | $ - |
| 2.4 | Suministro e instalación de guarda escoba MDF, color roble nuevo | 73.00 | $ 36,873.00 | $ 2,691,729.00 | 2.4 | Suministro e instalación de guarda escoba MDF, color roble nuevo | 0.00 | $ 36,873.00 | $ - |
| **ACCESORIOS SANITARIOS** | | | | | **ACCESORIOS SANITARIOS** | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalación de sanitario de una pieza, taza alongada de 4.8 litros, color blanco, porcelana vitrea | 1.00 | $ 780,592.00 | $ 780,592.00 | 3.1 | Suministro e instalación de sanitario de una pieza, taza alongada de 4.8 litros, color blanco, porcelana vitrea | 0.00 | $ 780,592.00 | $ - |
| 3.2 | Suministro e instalación de lavamanos avanti con pedestal, color blanco, incluye griferia y accesorios de desague. A todo costo. | 1.00 | $ 334,006.00 | $ 334,006.00 | 3.2 | Suministro e instalación de lavamanos avanti con pedestal, color blanco, incluye griferia y accesorios de desague. A todo costo. | 0.00 | $ 334,006.00 | $ - |
| 3.3 | Suministro e instalación de pileta para aseo 50 de largo x 60 de ancho x 40 de alto, Ceramica de formato 20 x 20 color blanca. A todo costo | 1.00 | $ 779,175.00 | $ 779,175.00 | 3.3 | Suministro e instalación de pileta para aseo 50 de largo x 60 de ancho x 40 de alto, Ceramica de formato 20 x 20 color blanca. A todo costo | 0.00 | $ 779,175.00 | $ - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Suministro e instalación de tubería para desagüe de la pileta en tuberia de 2 ", incluye accesorios de conexión. Incluye regatas para instalación. A todo costo | 3.00 | $ 173,585.00 | $ 520,755.00 | 3.4 | Suministro e instalación de tubería para desagüe de la pileta en tuberia de 2 ", incluye accesorios de conexión. Incluye regatas para instalación. A todo costo | 0.00 | $ 173,585.00 | $ - |
| **MUROS EN DRYWALL** | | | | | **MUROS EN DRYWALL** | | | | |
| 4.1 | MURO EN DRYWALL Espesor 15 cm, altura a 2.44 mt. Incluye placa de yeso dos caras, cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo | 20.50 | $ 86,991.00 | $ 1,783,316.00 | 4.1 | MURO EN DRYWALL Espesor 15 cm, altura a 2.44 mt. Incluye placa de yeso dos caras, cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo | 20.50 | $ 86,991.00 | $ 1,783,316 |
| 4.2 | Refuerzo Muros para muros en DRYWALL | 2.00 | $ 51,154.00 | $ 102,308.00 | 4.2 | Refuerzo Muros para muros en DRYWALL | 0.00 | $ 51,154.00 | $ - |
| **MESONES Y COCINA** | | | | | **MESONES Y COCINA** | | | | |
| 5.1 | Suministro e instalación de mueble de cocina de 120x88x52. en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe. A todo costo. | 1.00 | $ 1,932,168.00 | $ 1,932,168.00 | 5.1 | Suministro e instalación de mueble de cocina de 120x88x52. en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe. A todo costo. | 0.00 | $ 1,932,168.00 | $ - |
| 5.2 | Elaboración de punto de desague para lavaplatos en tuberia sanitaria 2", incluye accesorios, incluye regata en mamposteria. A todo costo | 3.30 | $ 144,652.00 | $ 477,352.00 | 5.2 | Elaboración de punto de desague para lavaplatos en tuberia sanitaria 2", incluye accesorios, incluye regata en mamposteria. A todo costo | 0.00 | $ 144,652.00 | $ - |
| **CARPINTERÍA METALICA - ALUMINIO** | | | | | **CARPINTERÍA METALICA - ALUMINIO** | | | | |
| 6.1 | Suministro e instalación de Puerta metálica con rejilla para RACK en lamina calibre 18; de 0,8, hasta 2,10 mts con marco en lamina y chapa (Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte). A todo costo | 1.00 | $ 934,807.00 | $ 934,807.00 | 6.1 | Suministro e instalación de Puerta metálica con rejilla para RACK en lamina calibre 18; de 0,8, hasta 2,10 mts con marco en lamina y chapa (Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte). A todo costo | 0.00 | $ 934,807.00 | $ - |
| **CARPINTERÍA METALICA - VIDRIOS y MADERA** | | | | | **CARPINTERÍA METALICA - VIDRIOS y MADERA** | | | | |
| 7.1 | Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm (Incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento).A todo costo | 12.49 | $ 540,909.00 | $ 6,755,953.00 | 7.1 | Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm (Incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento).A todo costo | 0.00 | $ 540,909.00 | $ - |
| 7.2 | Suministro e instalación de Puertas en Vidrio Templado 8 mm Pivote (Incluye topes de piso , accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento). A todo costo | 2.20 | $ 919,646.00 | $ 2,023,221.00 | 7.2 | Suministro e instalación de Puertas en Vidrio Templado 8 mm Pivote (Incluye topes de piso , accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento). A todo costo | 0.00 | $ 919,646.00 | $ - |
| 7.3 | Suministro e instalación de Sandbalsting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho . A todo costo (interior y Exterior) | 9.41 | $ 56,984.00 | $ 536,219.00 | 7.3 | Suministro e instalación de Sandbalsting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho . A todo costo (interior y Exterior) | 0.00 | $ 56,984.00 | $ - |
| **CARPINTERIA MADERA** | | | | | **CARPINTERIA MADERA** | | | | |
| 8.1 | Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 de ancho por 2.20 de alto, incluye marcos y todo lo necesario para su instalación. A todo costo. | 1.00 | $ 672,700.00 | $ 672,700.00 | 8.1 | Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 de ancho por 2.20 de alto, incluye marcos y todo lo necesario para su instalación. A todo costo. | 0.00 | $ 672,700.00 | $ - |
| 8.2 | Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,70 de ancho por 2.20 de alto, incluye marcos y todo lo necesario para su instalación. A todo costo. | 1.00 | $ 892,883.00 | $ 892,883.00 | 8.2 | Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,70 de ancho por 2.20 de alto, incluye marcos y todo lo necesario para su instalación. A todo costo. | 0.00 | $ 892,883.00 | $ - |
| 8.3 | Suministro e instalación de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor por 42 cm de ancho enchapada en laminado plástico de alta presión. Incluye soporte y anclajes | 9.30 | $ 166,482.00 | $ 1,548,283.00 | 8.3 | Suministro e instalación de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor por 42 cm de ancho enchapada en laminado plástico de alta presión. Incluye soporte y anclajes | 0.00 | $ 166,482.00 | $ - |
| **PINTURA** | | | | | **PINTURA** | | | | |
| 9.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales | 232.30 | $ 13,142.00 | $ 3,052,887.00 | 9.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales | 0.00 | $ 13,142.00 | $ - |
| 9.2 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales | 6.48 | $ 16,955.00 | $ 109,868.00 | 9.2 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales | 0.00 | $ 16,955.00 | $ - |
| **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 10.1 | Suministro e instalación de panel LED de empotrar cuadrado de 60 x 60, 55 w, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 6 mt de tablero principal | 12.00 | $ 428,170.00 | $ 5,138,040.00 | 10.1 | Suministro e instalación de panel LED de empotrar cuadrado de 60 x 60, 55 w, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 6 mt de tablero principal | 0.00 | $ 428,170.00 | $ - |
| 10.2 | Suministro e instalación de panel LED de empotrar redondo de 26W, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 8 mt de tablero principal | 2.00 | $ 192,505.00 | $ 385,010.00 | 10.2 | Suministro e instalación de panel LED de empotrar redondo de 26W, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 8 mt de tablero principal | 0.00 | $ 192,505.00 | $ - |
| 10.3 | Suministro de tubería conduit de 3/4", inclute accesorios de conexión, curvas, uniones, anclajes de fijacion. A todo costo | 2.84 | $ 77,871.00 | $ 221,154.00 | 10.3 | Suministro de tubería conduit de 3/4", inclute accesorios de conexión, curvas, uniones, anclajes de fijacion. A todo costo | 0.00 | $ 77,871.00 | $ - |
| 10.4 | Suministro de tubería EMT de 3/4 | 30.80 | $ 69,232.00 | $ 2,132,346.00 | 10.4 | Suministro de tubería EMT de 3/4 | 0.00 | $ 69,232.00 | $ - |
| 10.5 | Suministro e instalación de caja rawelt | 9.00 | $ 60,540.00 | $ 544,860.00 | 10.5 | Suministro e instalación de caja rawelt | 0.00 | $ 60,540.00 | $ - |
| 10.6 | Suministro e instalación de prensa cable electrico | 14.00 | $ 42,437.00 | $ 594,118.00 | 10.6 | Suministro e instalación de prensa cable electrico | 0.00 | $ 42,437.00 | $ - |
| 10.7 | Acometida eléctrica en cable AWG negro y blanco 2 x 12. A todo costo | 30.80 | $ 15,509.00 | $ 477,677.00 | 10.7 | Acometida eléctrica en cable AWG negro y blanco 2 x 12. A todo costo | 0.00 | $ 15,509.00 | $ - |
| **VARIOS** | | | | | **VARIOS** | | | | |
| 11.1 | Limpieza de la obra. A todo costo | 1.00 | $ 755,305.00 | $ 755,305.00 | 11.1 | Limpieza de la obra. A todo costo | 0.00 | $ 755,305.00 | $ - |
| 11.2 | Retiro de Escombros a todo costo | 1.00 | $ 873,208.00 | $ 873,208.00 | 11.2 | Retiro de Escombros a todo costo | 0.00 | $ 873,208.00 | $ - |
| **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO** | | | | | **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO** | | | | |
| 12.1 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | 1.00 | $ 1,832,927.00 | $ 1,832,927.00 | 12.1 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | 1.00 | $ 1,832,927.00 | $ 1,832,927 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | ESCRITORIO C • Superficie de 1,50 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,90 (L) x 0,60 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA<br>Incluye cajonera metálica tres gavetas y archivador sobre retorno. | 1.00 | $ 2,872,212.00 | $ 2,872,212.00 | 12.2 | ESCRITORIO C • Superficie de 1,50 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,90 (L) x 0,60 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA<br>Incluye cajonera metálica tres gavetas y archivador sobre retorno. | 1.00 | $ 2,872,212.00 | $ 2,872,212 |
| 12.3 | ESCRITORIO E • Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor para laterales (0.60 x 0.40 de alto) | 4.00 | $ 1,625,764.00 | $ 6,503,056.00 | 12.3 | ESCRITORIO E • Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor para laterales (0.60 x 0.40 de alto) | 4.00 | $ 1,625,764.00 | $ 6,503,056 |
| 12.4 | Silla ergonomica tipo gerencial grirratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 1.00 | $ 1,061,853.00 | $ 1,061,853.00 | 12.4 | Silla ergonomica tipo gerencial grirratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 1.00 | $ 1,061,853.00 | $ 1,061,853 |
| 12.5 | Silla ergonomica tipo profesional grirratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 4.00 | $ 584,453.00 | $ 2,337,812.00 | 12.5 | Silla ergonomica tipo profesional grirratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 4.00 | $ 584,453.00 | $ 2,337,813 |
| 12.6 | Silla alta para barra de cocina | 3.00 | $ 351,193.00 | $ 1,053,579.00 | 12.6 | Silla alta para barra de cocina | 3.00 | $ 351,193.00 | $ 1,053,579 |
| **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION** | | | | | **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION** | | | | |
| 13.1 | Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo | 1.32 | $ 1,004,710.00 | $ 1,326,217.00 | 13.1 | Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo | 0.00 | $ 1,004,710.00 | $ - |
| 13.2 | HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms | 1.00 | $ 152,363.00 | $ 152,363.00 | 13.2 | HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms | 0.00 | $ 152,363.00 | $ - |
| 13.3 | Suministro e instalación de SEÑALETICA FRONTALES Colgante A todo costo, Señalética Numeración Front, sin cenefa, se ubica sobre los modulos de atención. Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA | 25.00 | $ 118,887.00 | $ 2,972,175.00 | 13.3 | Suministro e instalación de SEÑALETICA FRONTALES Colgante A todo costo, Señalética Numeración Front, sin cenefa, se ubica sobre los modulos de atención. Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA | 0.00 | $ 118,887.00 | $ - |
| 13.4 | Suministro e instalación Aviso lona 2.7 x 0.4 mt, Caja en aluminio 10 cm, iluminacion en led color blanco, incluye accesorios para su instalación. A todo costo. | 1.00 | $ 2,623,964.00 | $ 2,623,964.00 | 13.4 | Suministro e instalación Aviso lona 2.7 x 0.4 mt, Caja en aluminio 10 cm, iluminacion en led color blanco, incluye accesorios para su instalación. A todo costo. | 0.00 | $ 2,623,964.00 | $ - |
| **DESMONTE, ADECUACION DE LOCAL A ENTREGAR EN YOPAL Y TRASLADO DE MOBIILIARIO Y EQUIPOS A PUNTO DE ATENCION NUEVO** | | | | | | | | | |
| **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | |
| 14.1 | Desmonte y traslado de mobiliario de asesores comerciales incluye divisiones, numeración, acrílico, a todo costo | 3.00 | $ 213,152.00 | $ 639,456.00 | 14.1 | Desmonte y traslado de mobiliario de asesores comerciales incluye divisiones, numeración, acrílico, a todo costo | 0.00 | $ 213,152.00 | $ - |
| 14.2 | Desmonte y traslado de aviso del FNA altura no mayor a 4 mts | 2.00 | $ 607,600.00 | $ 1,215,200.00 | 14.2 | Desmonte y traslado de aviso del FNA altura no mayor a 4 mts | 0.00 | $ 607,600.00 | $ - |
| 14.3 | Demolicion de muro en Drywall a dos caras de 15 cm de espesor. | 6.00 | $ 36,167.00 | $ 217,002.00 | 14.3 | Demolicion de muro en Drywall a dos caras de 15 cm de espesor. | 0.00 | $ 36,167.00 | $ - |
| **PINTURA** | | | | | **PINTURA** | | | | |
| 15.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, una mano en muros interiores blanco incluye lineales, resanes. A todo costo | 68.65 | $ 11,261.00 | $ 773,068.00 | 15.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno, una mano en muros interiores blanco incluye lineales, resanes. A todo costo | 0.00 | $ 11,261.00 | $ - |
| **OTROS** | | | | | **OTROS** | | | | |
| 16.1 | Trasciego de mobiliario, incluye módulos de división, escritorios, sillas interlocutoras, sillas de funcionarios, sillas tándem, desde el local ubicado en el centro comercial | 1.00 | $ 921,816.00 | $ 921,816.00 | 16.1 | Trasciego de mobiliario, incluye módulos de división, escritorios, sillas interlocutoras, sillas de funcionarios, sillas tándem, desde el local ubicado en el centro comercial | 0.00 | $ 921,816.00 | $ - |
| 16.2 | Limpieza del sitio | 1.00 | $ 616,106.00 | $ 616,106.00 | 16.2 | Limpieza del sitio | 0.00 | $ 616,106.00 | $ - |
| 16.3 | Retiro de escombros a todo costo | 1.00 | $ 734,039.00 | $ 734,039.00 | 16.3 | Retiro de escombros a todo costo | 0.00 | $ 734,039.00 | $ - |
| 16.4 | Limpieza de sitio A todo costo | 1.00 | $ 507,780.00 | $ 507,780.00 | 16.4 | Limpieza de sitio A todo costo | 0.00 | $ 507,780.00 | $ - |
| **NO PREVISTOS** | | | | | **NO PREVISTOS** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | $ 96,639,584 | **SUBTOTAL** | | $ 17,444,755 |
| **ADMINISTRACION** | **12%** | $ 11,596,750 | **ADMINISTRACION** | **12%** | $ 2,093,371 |
| **IMPREVISTOS** | **4%** | $ 3,865,583 | **IMPREVISTOS** | **4%** | $ 697,790 |
| **UTILIDAD** | **7%** | $ 6,764,771 | **UTILIDAD** | **7%** | $ 1,221,133 |
| **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | **19%** | $ 1,285,306 | **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | **19%** | $ 232,015 |

| TOTAL | $ 120,151,994.8 | TOTAL | $ 21,689,064 |
|---|---|---|---|

| PALMIRA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo , reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectonico ajustado en DWG con la adecuación realizada | 102.58 | $ 42,884.00 | $ 4,399,041.00 | 1.1 | Localización y replanteo , reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectonico ajustado en DWG con la adecuación realizada | 102.00 | $ 42,884.00 | $ 4,374,169 |
| **MUROS EN DRYWALL** | | | | | **MUROS EN DRYWALL** | | | | | |
| 2.1 | MURO EN DRYWALL Espesor 15 cm, altura a 2.44 mt. Incluye placa de yeso dos caras, cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo | 19.76 | $ 94,405.00 | $ 1,865,443.00 | 2.1 | MURO EN DRYWALL Espesor 15 cm, altura a 2.44 mt. Incluye placa de yeso dos caras, cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo | 17.55 | $ 94,405.00 | $ 1,656,530 |
| 2.2 | Refuerzo Muros para muros en DRYWALL | 4.00 | $ 53,080.00 | $ 212,320.00 | 2.2 | Refuerzo Muros para muros en DRYWALL | 4.00 | $ 53,080.00 | $ 212,320 |
| **CARPINTERÍA METALICA - ALUMINIO** | | | | | **CARPINTERÍA METALICA - ALUMINIO** | | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalación de Puerta metalica con rejilla para RACK en lamina calibre 18; de 0,8,hasta 2,10 mts con marco en lamina y chapa (Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte). A todo costo | 1.00 | $ 822,800.00 | $ 822,800.00 | 3.1 | Suministro e instalación de Puerta metalica con rejilla para RACK en lamina calibre 18; de 0,8,hasta 2,10 mts con marco en lamina y chapa (Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte). A todo costo | 0.00 | $ 822,800.00 | $ - |
| **CARPINTERIA MADERA** | | | | | **CARPINTERIA MADERA** | | | | | |
| 4.1 | Suministro e instalacion de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión.Incluye soporte y anclajes | 10.00 | $ 202,491.00 | $ 2,024,910.00 | 4.1 | Suministro e instalacion de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión.Incluye soporte y anclajes | 0.00 | $ 202,491.00 | $ - |
| 4.2 | Suministro e instalacion de guarda escoba MDF beigue | 13.40 | $ 39,074.00 | $ 523,592.00 | 4.2 | Suministro e instalacion de guarda escoba MDF beigue | 0.00 | $ 39,074.00 | $ - |
| **PINTURA** | | | | | **PINTURA** | | | | | |
| 5.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales | 359.14 | $ 17,643.00 | $ 6,336,307.00 | 5.1 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales | 359.14 | $ 17,643.00 | $ 6,336,307 |
| 5.2 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales | 11.70 | $ 21,366.00 | $ 249,982.00 | 5.2 | Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales | 7.71 | $ 21,366.00 | $ 164,732 |
| 5.3 | Pintura coraza primera calidad, muro exterior blaco. A todo costo incluye lineales | 22.80 | $ 27,449.00 | $ 625,837.00 | 5.3 | Pintura coraza primera calidad, muro exterior blaco. A todo costo incluye lineales | 16.53 | $ 27,449.00 | $ 453,732 |
| 5.4 | Pintura base aceite anticorrosiva 3 en 1, color gris. A todo costo | 8.40 | $ 22,730.00 | $ 190,932.00 | 5.4 | Pintura base aceite anticorrosiva 3 en 1, color gris. A todo costo | 8.40 | $ 22,730.00 | $ 190,932 |
| **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | |
| 6.1 | Suministro e instalacion de panel LED de sobreponer cuadrado de 60 x 60, 55 w, luz blanca, incluye acometida electrica en cable AWG No. 12 L-N, tuberia EMT de 1/2", 6 mt de punto electrico | 2.00 | $ 409,094.00 | $ 818,188.00 | 6.1 | Suministro e instalacion de panel LED de sobreponer cuadrado de 60 x 60, 55 w, luz blanca, incluye acometida electrica en cable AWG No. 12 L-N, tuberia EMT de 1/2", 6 mt de punto electrico | 0.00 | $ 409,094.00 | $ - |
| 6.2 | Suministro e instalacion de panel LED de colgar cuadrado de 60 x 60, 55 w, luz blanca, incluye acometida electrica en cable AWG No. 12 L-N, tuberia EMT de 1/2", incluye guayas encauchetado transparente, incluye cable bajante duplex 2 x12 transparente, 6 mt de punto electrico, 2.5 mt del techo, A todo costo. | 8.00 | $ 416,671.00 | $ 3,333,368.00 | 6.2 | Suministro e instalacion de panel LED de colgar cuadrado de 60 x 60, 55 w, luz blanca, incluye acometida electrica en cable AWG No. 12 L-N, tuberia EMT de 1/2", incluye guayas encauchetado transparente, incluye cable bajante duplex 2 x12 transparente, 6 mt de punto electrico, 2.5 mt del techo, A todo costo. | 0.00 | $ 416,671.00 | $ - |
| 6.3 | Suministro e instalacion de caja rawelt 1/2" x 4 salidas, incluye tapa ciega metalica, A todo costo | 13.00 | $ 69,900.00 | $ 908,700.00 | 6.3 | Suministro e instalacion de caja rawelt 1/2" x 4 salidas, incluye tapa ciega metalica, A todo costo | 0.00 | $ 69,900.00 | $ - |
| 6.4 | Suministro e instalacion de prensa cable 1/2" plastico | 13.00 | $ 45,178.00 | $ 587,314.00 | 6.4 | Suministro e instalacion de prensa cable 1/2" plastico | 0.00 | $ 45,178.00 | $ - |
| 6.5 | Suministro e instalacion de panel LED de sobreponer redondo de 26W, luz blanca, incluye acometida electrica, interruptor sencillo, 8 mt de tablero principal | 3.00 | $ 198,702.00 | $ 596,106.00 | 6.5 | Suministro e instalacion de panel LED de sobreponer redondo de 26W, luz blanca, incluye acometida electrica, interruptor sencillo, 8 mt de tablero principal | 0.00 | $ 198,702.00 | $ - |
| **VARIOS** | | | | | **VARIOS** | | | | | |
| 7.1 | Suministro e instalacion de desagüe para lavaplatos | 1.00 | $ 113,628.00 | $ 113,628.00 | 7.1 | Suministro e instalacion de desagüe para lavaplatos | 1.00 | $ 113,628.00 | $ 113,628 |
| 7.1 | Limpieza de la obra. A todo costo | 1.00 | $ 597,579.00 | $ 597,579.00 | 7.1 | Limpieza de la obra. A todo costo | 0.00 | $ 597,579.00 | $ - |
| 7.2 | Retiro de Escombros a todo costo | 1.00 | $ 871,961.00 | $ 871,961.00 | 7.2 | Retiro de Escombros a todo costo | 0.00 | $ 871,961.00 | $ - |
| **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO** | | | | | **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO** | | | | | |
| 8.1 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | 1.00 | $ 1,825,967.00 | $ 1,825,967.00 | 8.1 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | 1.00 | $ 1,825,967.00 | $ 1,825,967 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | ESCRITORIO D • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de alto)<br>•herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA<br>Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto), con espacio para | 5.00 | $ 2,794,476.00 | $ 13,972,380.00 | 8.2 | ESCRITORIO D • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de alto)<br>•herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA<br>Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto), con espacio para | 5.00 | $ 2,794,476.00 | $ 13,972,380 |
| 8.3 | ESCRITORIO E • Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor para laterales (0.60 x 0.40 de alto) | 4.00 | $ 2,180,986.00 | $ 8,723,944.00 | 8.3 | ESCRITORIO E • Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16".<br>•Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor para laterales (0.60 x 0.40 de alto) | 4.00 | $ 2,180,986.00 | $ 8,723,944 |
| 8.4 | Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16". | 1.00 | $ 1,311,189.00 | $ 1,311,189.00 | 8.4 | Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>•niveladores plásticos de 5/16". | 1.00 | $ 1,311,189.00 | $ 1,311,189 |
| 8.5 | Silla ergonomica tipo profesional girratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 9.00 | $ 848,582.00 | $ 7,637,238.00 | 8.5 | Silla ergonomica tipo profesional girratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | 9.00 | $ 848,582.00 | $ 7,637,238 |
| 8.6 | Silla alta para barra de cocina | 4.00 | $ 426,261.00 | $ 1,705,044.00 | 8.6 | Silla alta para barra de cocina | 4.00 | $ 426,261.00 | $ 1,705,044 |
| **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION** | | | | | **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION** | | | | |
| 9.1 | Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo | 1.32 | $ 1,173,836.00 | $ 1,549,464.00 | 9.1 | Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo | 0.00 | $ 1,173,836.00 | $ - |
| 9.2 | HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms | 1.00 | $ 140,038.00 | $ 140,038.00 | 9.2 | HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms | 0.00 | $ 140,038.00 | $ - |
| 9.3 | Suministro e intalacion de SEÑALETICA FRONTALES Colgante A todo costo, Señalética Numeración Front, sin cenefa, se ubica sobre los modulos de atencion. . Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA | 5.00 | $ 119,256.00 | $ 596,280.00 | 9.3 | Suministro e intalacion de SEÑALETICA FRONTALES Colgante A todo costo, Señalética Numeración Front, sin cenefa, se ubica sobre los modulos de atencion. . Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA | 0.00 | $ 119,256.00 | $ - |
| 9.4 | Suministro e instalacion Aviso lona 4 x 0.5 mt, Caja en aluminio 15cm, iluminacion en led color blanco, azul pantone Blue 0,72C, Textos en acrilico+canto 6cm, franja verde caja pantone 389C, + | 2.00 | $ 2,266,277.00 | $ 4,532,554.00 | 9.4 | Suministro e instalacion Aviso lona 4 x 0.5 mt, Caja en aluminio 15cm, iluminacion en led color blanco, azul pantone Blue 0,72C, Textos en acrilico+canto 6cm, franja verde caja pantone 389C, + | 0.00 | $ 2,266,277.00 | $ - |
| **NO PREVISTOS** | | | | | **NO PREVISTOS** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | $ 67,072,106 | **SUBTOTAL** | | $ 48,678,111 |
| **ADMINISTRACION** | **17%** | $ 11,402,258 | **ADMINISTRACION** | **17%** | $ 8,275,279 |
| **IMPREVISTOS** | **3%** | $ 2,012,163 | **IMPREVISTOS** | **3%** | $ 1,460,343 |
| **UTILIDAD** | **6%** | $ 4,024,326 | **UTILIDAD** | **6%** | $ 2,920,687 |
| **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | **19%** | $ 764,622 | **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | **19%** | $ 554,930 |
| **TOTAL** | | $ 85,275,475.6 | **TOTAL** | | $ 61,889,351 |

**8. OBSERVACIONES**

Se certifica que la factura adjunta al presente informe, cumple con lo establecido en el contrato en lo referente a los items, valores facturados y tiempos establecidos de entrega.

**9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Contratista ha realizado las entregas de los insumos conforme a lo solicitado

**10. CERTIFICACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Sandra P. Hoyos

**Apoyo a la Supervisión:** **Firma:**

**Elaboro: Sandra Hoyos**

v o

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal | | | | | | |
| Reg.prelim.por | JTORRESC | Contab.por | MRINCONZ | | | |
| Nº doc. | 5100002422 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2023 | |
| Fe.docum. | 18.09.2023 | Fecha contab. | 29.09.2023 | Período | 09 | |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | | |
| Referen. | 140 | | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202309262642187 | | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1003627743 | WRUSSY INGENIEROS SA | | ** | 114.175.498- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 83.496.661 |
| 3 | 91 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 26.531.163 |
| 5 | 91 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 6 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | U8 | 7.833.605 |
| 7 | 91 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | U8 | 0 |
| 8 | 83 | 5190953501 | DIFER SOL PED Y FACT | | W8 | 1 |
| 9 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 187.612- |
| 10 | 50 | 2519054648 | SERV 7X1000 SOACHA | | | 583.053- |
| 11 | 50 | 2519053401 | COMPRAS AL 2,5% | | | 2.915.267- |

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 140**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-18 | 14:52:03 |
| **Expedición** | 2023-09-18 | 14:53:27 |
| **Vencimiento** | 2023-10-17 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo. | UN | 3 | 1,524,240.00 | 4,572,720.00 |
| 0200001000001 | ESCRITORIO C ? Superficie de 1,50 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,90 (L) x 0,60 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. ?Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20. ?Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 ?niveladores plásticos de 5/16". ?herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA Incluye cajonera metálica tres gavetas y archivador sobre retorno. | UN | 1 | 2,536,120.00 | 2,536,120.00 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :639fe3c2b6bd16b1620d5e390f33078c8ca40b49bb428e61f61a546f7cedc17f5594330c0e8be0f0840083afd315353d

**ORIGINAL**

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 140**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-18 | 14:52:03 |
| **Expedición** | 2023-09-18 | 14:53:27 |
| **Vencimiento** | 2023-10-17 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | ESCRITORIO D ? Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>?Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20.<br>?Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a<br>superficie en lamina Cr calibre 16<br>?niveladores plásticos de 5/16".<br>?Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de<br>alto)<br>?herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16<br>con logo FNA<br>Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal<br>del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto), con espacio para entrega de<br>documentación en parte inferior de 30 cm de largo por 12 de algo y bordes<br>redondos. | UN | 25 | 2,316,114.00 | 57,902,850.00 |
| 0200001000001 | Mesa de reuniones modular de 2.20m x 1.20m en aglomerado RH de 30mm de espesor, enchapada en laminado plástico de alta presión. Color Gris nube.<br>?Estructura metálica, tubo cuadrado de 2" cal. 16.<br>?Tapas de inspección fabricadas en MDF de 12 mm | UN | 3 | 1,564,608.00 | 4,693,824.00 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :639fe3c2b6bd16b1620d5e390f33078c8ca40b49bb428e61f61a546f7cedc17f5594330c0e8be0f0840083afd315353d

**ORIGINAL**

# WRUSSY INGENIEROS SAS

NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 140**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-18 | 14:52:03 |
| **Expedición** | 2023-09-18 | 14:53:27 |
| **Vencimiento** | 2023-10-17 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | Silla ergonomica tipo gerencial griratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | UN | 1 | 789,508.00 | 789,508.00 |
| 0200001000001 | Silla ergonomica tipo profesional griratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | UN | 43 | 547,578.00 | 23,545,854.00 |
| 0200001000001 | ADMINISTRACIÓN 13% | UN | 1 | 12,225,313.88 | 12,225,313.88 |
| 0200001000001 | IMPREVISTOS 4% | UN | 1 | 3,761,635.04 | 3,761,635.04 |
| 0200002000001 | UTILIDAD 7% | | 1 | 6,582,861.32 | 6,582,861.32 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 116,610,686.24 |
| **IVA** | 1,250,743.65 |
| **Total a Pagar** | **$ 117.861.429,89** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 117.861.429,89 | Cuota 1 Vence el 2023-10-17 |

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Diecisiete Millones Ochocientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos M/Cte Con 89/100

**OBSERVACIONES**

1000046109 - 1000046110 - 1000046120
CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN .

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :639fe3c2b6bd16b1620d5e390f33078c8ca40b49bb428e61f61a546f7cedc17f5594330c0e8be0f0840083afd315353d

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

**INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____**

**PERIODO DE 8 de JUNIO de 2023 A 29 de JUNIO de 2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | : 0053 DE 2023 |
| **OBJETO** | : CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y ESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. |
| **LOCALIZACIÓN** | : YOPAL CASANARE. Calle 8 No. 18 - 49 |

## INFORME AVANCE DE OBRA

- El avance de obra en Yopal se ha visto perjudicado por temas de aceptación de algunas actividades adicionales que salieron durante la visita debido a que en el lugar se ha evidenciado algunas partes de humedad en el local localizadas, donde estas no se traten antes de realizar las intervenciones contratadas en el presupuesto, podria afectar todo el proceso.
















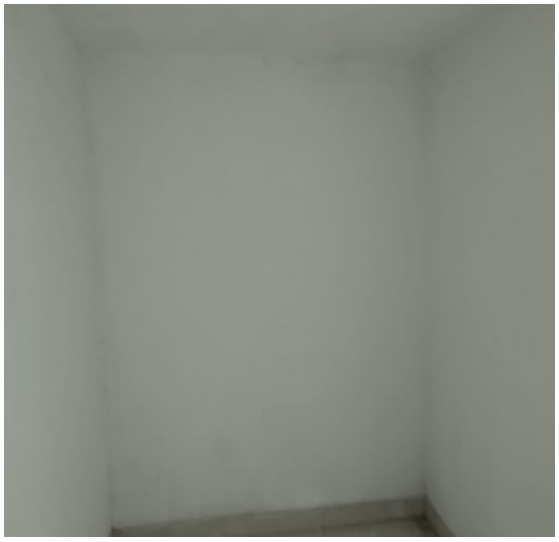







**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Como se evidencia en las imágenes adjuntas se puede observar la presencia de humedad en techos y paredes, si se llega a realizar el respectivo resane y pintura de dichos muros y cielo rasos, la humedad futuramente seguirá apareciendo y afectara dicho arreglo, por consiguiente, se presentó la propuesta de realizar la impermeabilización de la placa que se encuentra directamente por encima del local, la cual esta afectando por los temas de filtración de aguas presentados.

Por otro lado, se presencia redes de gas y eléctricas en algunos de los muros los cuales estan en Drywall, la propuesta esta en desmontar las redes de gas y eléctricas que se encuentran ahí y deshabilitar los tomacorrientes de pared con la respectiva suspensión de los puntos.

En el tema de los techos se plantea lo del cielo raso en PVC debido a que es un material que soporta un poco mas los temas de la humedad, debido a que la húmeda que se presenta en el lugar lleva muchos años ahí y eso no va a lograr desmanchar fácilmente.

Para la instalación del piso en vinilo se pudo observar que, en la puerta de acceso la luz de las puertas haria una especie de tropezón lo que afectaría futuramente el piso y lo levantaría, por eso se paso la propuesta del tapete que fuera incrustado en el piso levantando el enchape de piso de las dimensiones que tenga el tapete y adicionalmente se le incluirá un pirlan a dicha parte.

La estructura metálica se plantea por el hecho de que la estructura de drywall solicitada en los diseños, no le daría un soporte oportuno, ya que, este va a contener una puerta de acceso y el movimiento y peso del vidrio afectarían el Drywall.

Para la instalación del mobiliario, se necesita tener adecuado el local, el mobiliario solicitado para el punto ya se encuentra en fabricación y su entrega estimada está programada entre la primera y segunda semana del mes de julio, igualmente se pasó un diseño para adecuar la luminaria según los puestos de trabajo que se plantean en los planos.

Por otro lado, se está a la espera de la aprobación de las actividades adicionales que se evidenciaron en el recorrido inicial del punto y otras actividades que la supervisión solicito ser contempladas. Recordando que sin la aprobación de estos es difícil iniciar las actividades y posteriormente entregar en las fechas establecidas.

Cordialmente,



**WRUSSY INGENIEROS SAS**
**R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**
**C.C. 80.212.380 de Bogotá**


**PERSONA JURÍDICA**
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**
**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

**LIDA YAMILE RINCON ROMERO** identificada con C.C. No. 52.464.339 de Bogotá, y Tarjeta Profesional No. 123710-T, en mi condición de Revisor Fiscal, me permito informar que la empresa de razón social **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **901.109.885-1**, ha efectuado los aportes por concepto de pago a la seguridad social (EPS. ARL. AFP) correspondiente a un (1) mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección, y que en virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que se encuentra acogida a la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, siendo una sociedad contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá, al tercer dia (03) de agosto de 2023.

Atentamente,

LIDA YAMILE RINCON ROMERO
C.C. No. 52.464.339 de Bogotá
TP. 123710-T
Revisor Fiscal - WRUSSY INGENIEROS SAS
Nit: 901.109.885-1


FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1979
FOMEQUE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
25-MAR-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500112-42138212-F-0052464339-20051121
02736 05325A 02 201673485


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
52.464.339
RINCON ROMERO
APELLIDOS
LIDA YAMILE
NOMBRES
FIRMA


FIRMA DEL TITULAR
44492
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
123710-T
LIDA YAMILE
RINCON ROMERO
C.C. 52464339
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COMENARES RODRIGUEZ 113678

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

95E5E07427E53A19

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LIDA YAMILE RINCON ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52464339 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 123710-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | FNA / FNA | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-07 | 2023-06 | E | 25/07/2023 | 68955813 | $651.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 84.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 84.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 336.400 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 146.200 | | | | 146.200 | 1 | 200 | 146.400 | | | 1.462 | 146.400 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 84.000 | 1 | 100 | 84.100 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 84.000 | 84.100 |
| Pensión | 1 | 336.000 | 336.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 146.200 | 146.400 |
| CCF | 1 | 84.000 | 84.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 650.200 | 651.000 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901109885-1 | WRUSSY INGENIEROS SAS | | CALE 8 F N 79 94 | 4111513 | INGWILVER@HOTMAIL.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | FNA | FNA | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-07 | 2023-06 | E | 25/07/2023 | 68955813 | $651.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1014285166 | MORENO PAEZ PAULA MARIANA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.100.000 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.100.000 | 84.000 | 14-11 | 2.100.000 | 5 | 146.200 | CCF24 | 2.100.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 04/08/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **WRUSSY INGENIEROS SAS** con NIT **901.109.885-1** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**
Número 480969998529

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 140 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 06-oct-23 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300565228 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 06-oct-23 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 06-oct-23 |
| **PROPUESTA** | 37849 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 06-oct-23 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE | | |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. INDENTIFICACION** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE ENTREGA** | PAGO ELECTRÓNICO | | |
| **CIUDAD DE ENTREGA** | BOGOTÁ | | |
| **NUMERO DE CUENTA** | 480969998529 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BANCO DAVIVIENDA | | |
| **GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS** | 0 | | |

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | WRUSSY INGENIEROS SA | | |
| **OBSERVACIONES:** | FACT WRU140 RAD 02-2303-202309262642187 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2501050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BD03 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 114.175.498 | | |

## DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

| NO. DOCUMENTO | NO. FACTURA | IMPORTE | RETENCIÓN | NOMBRE DE LA CUENTA | CENTRO DE COSTO | NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

| ACREEDOR | DOC.COMP. | REFERENCIA | IMPORTE | TEXTO | PEDIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003627743 | 5300565228 | 140 | 114.175.498 | FACT WRU140 RAD 02-2303-2023092626421 | 5700000323 | 053 DE 2023 |

Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reg.prelim.por | JTORRESC | Contab.por | MRINCONZ | | |
| Nº doc. | 5100002423 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2023 |
| Fe.docum. | 18.09.2023 | Fecha contab. | 29.09.2023 | Período | 09 |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | |
| Referen. | 141 | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202309262642188 | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1003627743 | WRUSSY INGENIEROS SA | | ** | 7.793.729- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 7.510.606 |
| 3 | 91 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 534.729 |
| 5 | 91 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W0 | 0 |
| 6 | 50 | 2519053501 | RET CONT DE OBRA 2% | | | 159.199- |
| 7 | 50 | 2519055201 | PRO EST UNI NAL 0.5 | | | 39.800- |
| 8 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 12.807- |
| 9 | 50 | 2519054648 | SERV 7X1000 SOACHA | | | 39.800- |

# WRUSSY INGENIEROS SAS

NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 141**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-18 | 15:10:55 |
| **Expedición** | 2023-09-18 | 15:12:07 |
| **Vencimiento** | 2023-10-17 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | TOTAL COSTO DIRECTO<br>ACTA DE CORTE N° 1<br>SOACHA OBRA CIVIL | UN | 1 | 6,419,321.00 | 6,419,321.00 |
| 0200001000001 | ADMINISTRACIÓN 13% | UN | 1 | 834,511.73 | 834,511.73 |
| 0200001000001 | IMPREVISTOS 4% | UN | 1 | 256,772.84 | 256,772.84 |
| 0200002000001 | UTILIDAD 7% | | 1 | 449,352.47 | 449,352.47 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,959,958.04 |
| **IVA** | 85,376.97 |
| **Total a Pagar** | **$ 8.045.335,01** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 8.045.335,01 | Cuota 1 Vence el 2023-10-17 |

**VALOR EN LETRAS**

Ocho Millones Cuarenta Y Cinco Mil Trescientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte Con 01/100

**OBSERVACIONES**

1000046121 - 1000046122
CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :d2f4e280def6fdb1644ca85457a0fdfdab55f3ebccb1b1003f3c46b61b18e39841ef422c4d8e2222bc6a428ee7788041

**ORIGINAL**

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 141 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 06-oct-23 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300565229 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 06-oct-23 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 06-oct-23 |
| **PROPUESTA** | 37849 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 06-oct-23 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE | | |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. INDENTIFICACION** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE ENTREGA** | PAGO ELECTRÓNICO | | |
| **CIUDAD DE ENTREGA** | BOGOTÁ | | |
| **NUMERO DE CUENTA** | 480969998529 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BANCO DAVIVIENDA | | |
| **GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS** | 0 | | |

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | WRUSSY INGENIEROS SA | | |
| **OBSERVACIONES:** | FACT WRU141 RAD 02-2303-202309262642188 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2501050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BD03 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 7.793.729 | | |

## DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

| NO. DOCUMENTO | NO. FACTURA | IMPORTE | RETENCIÓN | NOMBRE DE LA CUENTA | CENTRO DE COSTO | NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

| ACREEDOR | DOC.COMP. | REFERENCIA | IMPORTE | TEXTO | PEDIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003627743 | 5300565229 | 141 | 7.793.729 | FACT WRU141 RAD 02-2303-2023092626421 | 5700000323 | 053 DE 2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal | | | | | | |
| Reg.prelim.por | JTORRESC | Contab.por | MRINCONZ | | | |
| Nº doc. | 5100002424 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2023 | |
| Fe.docum. | 19.09.2023 | Fecha contab. | 29.09.2023 | Período | 09 | |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | | |
| Referen. | 142 | | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202309262642190 | | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1003627743 | WRUSSY INGENIEROS SA | | ** | 18.670.079- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 11.977.219 |
| 3 | 91 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 1- |
| 4 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 5 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 6.190.051 |
| 6 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 7 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | U8 | 1.304.598 |
| 8 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | U8 | 0 |
| 9 | 50 | 2519053401 | COMPRAS AL 2,5% | | | 481.589- |
| 10 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 31.245- |
| 11 | 50 | 2519054635 | SERVICIOS YOPAL | | | 192.636- |
| 12 | 50 | 2519054635 | SERVICIOS YOPAL | | | 96.318- |

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 142**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-19 | 07:55:19 |
| **Expedición** | 2023-09-19 | 07:57:00 |
| **Vencimiento** | 2023-10-18 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | UN | 1 | 1,832,927.00 | 1,832,927.00 |
| 0200001000001 | ESCRITORIO C ? Superficie de 1,50 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,90 (L) x 0,60 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>?Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr<br>calibre 20.<br>?Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>?niveladores plásticos de 5/16".<br>?herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA<br>Incluye cajonera metálica tres gavetas y archivador sobre retorno. | UN | 1 | 2,872,212.00 | 2,872,212.00 |
| 0200001000001 | ESCRITORIO E ? Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>?Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>?niveladores plásticos de 5/16".<br>?Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor<br>para laterales (0.60 x 0.40 de alto) | UN | 4 | 1,625,764.00 | 6,503,056.00 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :6ad1e641f3b3bc7d8280fe096967f20319d05d468963fc3c08727754178e22cd7095b481691a39a4c3808c0a555fcc12

**ORIGINAL**

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 142**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-19 | 07:55:19 |
| **Expedición** | 2023-09-19 | 07:57:00 |
| **Vencimiento** | 2023-10-18 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | Silla ergonomica tipo gerencial griratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | UN | 1 | 1,061,853.00 | 1,061,853.00 |
| 0200001000001 | Silla ergonomica tipo profesional griratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | UN | 4 | 584,453.00 | 2,337,812.00 |
| 0200001000001 | SILLA ALTA PARA BARRA DE COCINA | UN | 3 | 351,193.00 | 1,053,579.00 |
| 0200001000001 | ADMINISTRACIÓN 12% | UN | 1 | 1,879,372.68 | 1,879,372.68 |
| 0200001000001 | IMPREVISTOS 4% | UN | 1 | 626,457.56 | 626,457.56 |
| 0200002000001 | UTILIDAD 7% | | 1 | 1,096,300.73 | 1,096,300.73 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 19,263,569.97 |
| **IVA** | 208,297.14 |
| **Total a Pagar** | **$ 19.471.867,11** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 19.471.867,11 | Cuota 1 Vence el 2023-10-18 |

**VALOR EN LETRAS**

Diecinueve Millones Cuatrocientos Setenta Y Un Mil Ochocientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte Con 11/100

**OBSERVACIONES**

1000046123 - 1000046124 - 1000046125
CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :6ad1e641f3b3bc7d8280fe096967f20319d05d468963fc3c08727754178e22cd7095b481691a39a4c3808c0a555fcc12

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

# INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

**INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____**

**PERIODO DE 8 de JUNIO de 2023 A 29 de JUNIO de 2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | : 0053 DE 2023 |
| **OBJETO** | : CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y ESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. |
| **LOCALIZACIÓN** | : PALMIRA VALLE DEL CAUCA |

## INFORME AVANCE DE OBRA

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas en el punto inicialmente son:

- Se realiza inicialmente una limpieza del local debido a la cantidad de suciedad que se presentaba en el lugar
- La localización y replanteo de las divisiones de muros en Drywall.
- Montaje de la estructura de los muros en Drywall
- Aplicación de pintura vinilo Blanco en los muros interiores a dos manos de las dos plantas.
- Aplicación de pintura vinilo Azul institucional (Referencia Azul Mediterráneo)
- Aplicación de Pintura coraza blanca en Fachada.
- Limpieza y aplicación de pintura anticorrosiva 3 en 1 color gris.
- Cambio de desagüe completo de lavaplatos.


































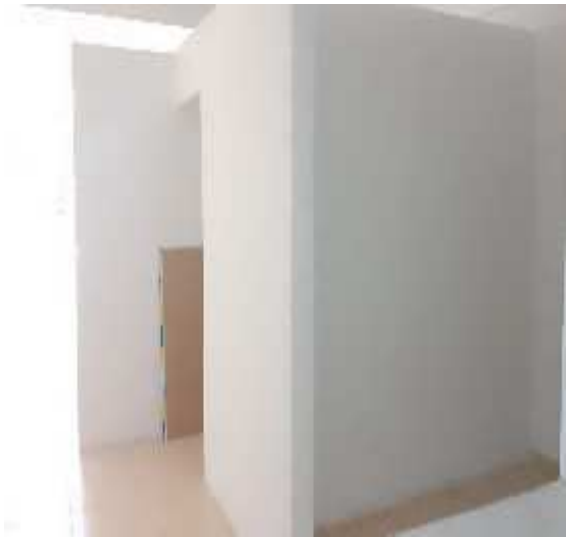

















**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Para la realización de las actividades finales se espera a la entrega del mobiliario, que está programada entre la primera y segunda semana del mes de julio, el resto de las actividades de carpintería se van a realizar al momento de la entrega del mobiliario, igualmente se pasó un diseño para adecuar la luminaria según los puestos de trabajo que se plantean en los planos.

Por otro lado, se está a la espera de la aprobación de las actividades adicionales que se evidenciaron en el recorrido inicial del punto y otras actividades que la supervisión solicito ser contempladas. Recordando que sin la aprobación de estos es difícil iniciar las actividades y posteriormente entregar en las fechas establecidas.

Cordialmente,



**WRUSSY INGENIEROS SAS**
**R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**
**C.C. 80.212.380 de Bogotá**

| INFORME DE OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | PERIODO DE INFORME |
| FNA-053-2023 | 08/06/2023 al 8/07/2023 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO PALMIRA**

**REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN**



Instalación de Estructura Drywall



Orden y Aseo



Orden y Aseo



Instalación de Estructura Drywall



Muros en Drywall



Muros en Drywall



Instalación de Estructura Drywall



Muros en Drywall

| INFORME DE OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | PERIODO DE INFORME |
| FNA-053-2023 | 08/06/2023 al 8/07/2023 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO PALMIRA**



Instalación de Estructura Drywall



Instalación de Estructura Drywall



Pintura Coraza Fachada



Pintura Anticorrosiva 3 en 1



Pintura Vinilo



Pintura Vinilo



Pintura Vinilo



Pintura Vinilo

| INFORME DE OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | PERIODO DE INFORME |
| FNA-053-2023 | 08/06/2023 al 8/07/2023 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO PALMIRA**



Orden y Aseo



Pintura Vinilo



Pintura Vinilo




Pintura Vinilo



Pintura Vinilo



Desagüe Lavaplatos

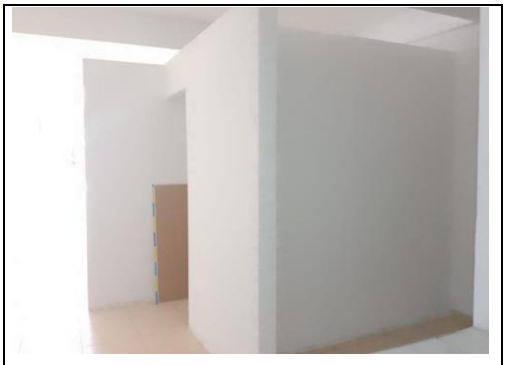

Muros en Drywall



Muros en Drywall

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 142 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 06-oct-23 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300565230 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 06-oct-23 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 06-oct-23 |
| **PROPUESTA** | 37849 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 06-oct-23 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC | | |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. INDENTIFICACION** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE ENTREGA** | PAGO ELECTRÓNICO | | |
| **CIUDAD DE ENTREGA** | BOGOTÁ | | |
| **NUMERO DE CUENTA** | 480969998529 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BANCO DAVIVIENDA | | |
| **GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS** | 0 | | |

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | WRUSSY INGENIEROS SA | | |
| **OBSERVACIONES:** | FACT WRU142 RAD 02-2303-202309262642190 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2501050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BD03 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 18.670.079 | | |

## DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

| NO. DOCUMENTO | NO. FACTURA | IMPORTE | RETENCIÓN | NOMBRE DE LA CUENTA | CENTRO DE COSTO | NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

| ACREEDOR | DOC.COMP. | REFERENCIA | IMPORTE | TEXTO | PEDIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003627743 | 5300565230 | 142 | 18.670.079 | FACT WRU142 RAD 02-2303-2023092626421 | 5700000323 | 053 DE 2023 |

Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reg.prelim.por | JTORRESC | Contab.por | MRINCONZ | | |
| Nº doc. | 5100002425 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2023 |
| Fe.docum. | 19.09.2023 | Fecha contab. | 29.09.2023 | Período | 09 |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | |
| Referen. | 143 | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202309262642193 | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1003627743 | WRUSSY INGENIEROS SA | | ** | 2.125.900- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 2.068.647 |
| 3 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 148.550 |
| 5 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W0 | 0 |
| 6 | 50 | 2519053501 | RET CONT DE OBRA 2% | | | 43.870- |
| 7 | 50 | 2519055201 | PRO EST UNI NAL 0.5 | | | 10.967- |
| 8 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 3.558- |
| 9 | 50 | 2519054635 | SERVICIOS YOPAL | | | 21.935- |
| 10 | 50 | 2519054635 | SERVICIOS YOPAL | | | 10.967- |

# WRUSSY INGENIEROS SAS

NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 143**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-19 | 08:22:43 |
| **Expedición** | 2023-09-19 | 08:23:37 |
| **Vencimiento** | 2023-10-18 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | TOTAL COSTO DIRECTO<br>ACTA DE CORTE N° 1<br>OBRA CIVIL YOPAL | UN | 1 | 1,783,316.00 | 1,783,316.00 |
| 0200001000001 | ADMINISTRACIÓN 12% | UN | 1 | 213,997.92 | 213,997.92 |
| 0200001000001 | IMPREVISTOS 4% | UN | 1 | 71,332.64 | 71,332.64 |
| 0200002000001 | UTILIDAD 7% | | 1 | 124,832.12 | 124,832.12 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,193,478.68 |
| **IVA** | 23,718.10 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.217.196,78** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 2.217.196,78 | Cuota 1 Vence el 2023-10-18

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Doscientos Diecisiete Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 78/100

**OBSERVACIONES**

1000046126 - 1000046127
CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :d4d7dab9ef86de4fb497114a2e762dcc0ff7ccfb94a44aa3f8d042c855105e436a34397bb7641b3adade944a20b0b855

**ORIGINAL**

# INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

**INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____**

**PERIODO DE 30 de JUNIO de 2023 A 19 de JULIO de 2023**

**CONTRATO No.** : 0053 DE 2023

**OBJETO** : CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y ESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

**LOCALIZACIÓN** : PALMIRA VALLE DEL CAUCA

## INFORME AVANCE DE OBRA


### ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas en el punto inicialmente son:

- Se realiza fabricación de mobiliario para el punto





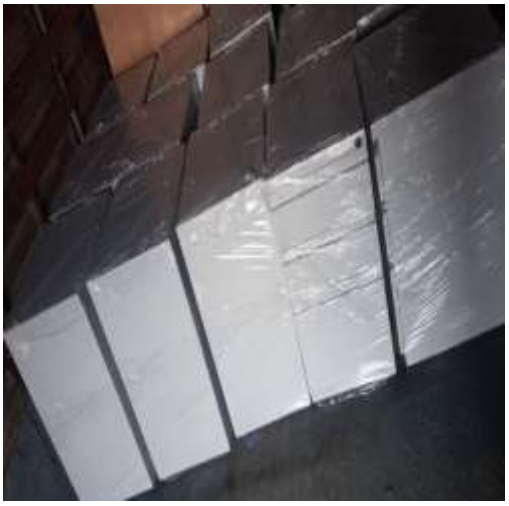





**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Para la realización de las actividades finales se espera la aprobación de las actividades adicionales que salieron durante la visita inicial, para de una vez realizar la instalación del mobiliario y señalética, así dar continuidad a la ejecución final, así como de los puntos eléctricos que hacen falta.

Por otro lado nos encontramos realizando la respectiva cotización de una actividad que hasta el momento nos tenían a la espera de confirmación para poder pasar la respectiva cotización.

Cordialmente,

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
**R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**
**C.C. 80.212.380 de Bogotá**

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 143 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 06-oct-23 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300565231 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 06-oct-23 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 06-oct-23 |
| **PROPUESTA** | 37849 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 06-oct-23 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC | | |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. INDENTIFICACION** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE ENTREGA** | PAGO ELECTRÓNICO | | |
| **CIUDAD DE ENTREGA** | BOGOTÁ | | |
| **NUMERO DE CUENTA** | 480969998529 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BANCO DAVIVIENDA | | |
| **GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS** | 0 | | |

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | WRUSSY INGENIEROS SA | | |
| **OBSERVACIONES:** | FACT WRU143 RAD 02-2303-202309262642193 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2511050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BD03 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 2.125.900 | | |

## DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

| NO. DOCUMENTO | NO. FACTURA | IMPORTE | RETENCIÓN | NOMBRE DE LA CUENTA | CENTRO DE COSTO | NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

| ACREEDOR | DOC.COMP. | REFERENCIA | IMPORTE | TEXTO | PEDIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003627743 | 5300565231 | 143 | 2.125.900 | FACT WRU143 RAD 02-2303-2023092626421 | 5700000323 | 053 DE 2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal | | | | | | |
| Reg.prelim.por | JTORRESC | Contab.por | MRINCONZ | | | |
| Nº doc. | 5100002446 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2023 | |
| Fe.docum. | 19.09.2023 | Fecha contab. | 29.09.2023 | Período | 09 | |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | | |
| Referen. | 144 | | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202309272646914 | | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1003627743 | WRUSSY INGENIEROS SA | | ** | 43.111.061- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 30.183.317 |
| 3 | 91 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 1- |
| 4 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 5 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 12.027.598 |
| 6 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 7 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | U8 | 2.511.550 |
| 8 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | U8 | 0 |
| 9 | 50 | 2519054715 | SERVICIOS PALMIRA | | | 443.215- |
| 10 | 50 | 2519053401 | COMPRAS AL 2,5% | | | 1.108.037- |
| 11 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 60.151- |

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 144**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-19 | 09:13:02 |
| **Expedición** | 2023-09-19 | 09:14:27 |
| **Vencimiento** | 2023-10-18 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | UN | 1 | 1,825,967.00 | 1,825,967.00 |
| 0200001000001 | ESCRITORIO D ? Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>?Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20.<br>?Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>?niveladores plásticos de 5/16".<br>?Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de alto)<br>?herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados<br>en lamina CR calibre 16 con logo FNA Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto), con espacio para entrega de documentación en parte inferior de 30 cm de largo por 12 de algo y bordes redondos. | UN | 5 | 2,794,476.00 | 13,972,380.00 |
| 0200001000001 | ESCRITORIO E ? Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>?Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>?niveladores plásticos de 5/16".<br>?Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor para laterales (0.60 x 0.40 de alto) | UN | 4 | 2,180,986.00 | 8,723,944.00 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :e2fb1a0499777b99bd56dca3f37732867c7ca5d3f23cf78faf89e3c62bc05fe445278783e56adad66f808df3aa3cf6e0

**ORIGINAL**

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 144**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-19 | 09:13:02 |
| **Expedición** | 2023-09-19 | 09:14:27 |
| **Vencimiento** | 2023-10-18 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>?Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>?niveladores plásticos de 5/16". | UN | 1 | 1,311,189.00 | 1,311,189.00 |
| 0200001000001 | Silla ergonomica tipo profesional griratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura | UN | 9 | 848,582.00 | 7,637,238.00 |
| 0200001000001 | Silla alta para barra de cocina | UN | 4 | 426,261.00 | 1,705,044.00 |
| 0200001000001 | ADMINISTRACIÓN 17% | UN | 1 | 5,979,879.54 | 5,979,879.54 |
| 0200001000001 | IMPREVISTOS 3% | UN | 1 | 1,055,272.86 | 1,055,272.86 |
| 0200002000001 | UTILIDAD 6% | | 1 | 2,110,545.72 | 2,110,545.72 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 44,321,460.12 |
| **IVA** | 401,003.69 |
| **Total a Pagar** | **$ 44.722.463,81** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 44.722.463,81 | Cuota 1 Vence el 2023-10-18 |

**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Cuatro Millones Setecientos Veintidos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte Con 81/100

**OBSERVACIONES**

1000046128 - 1000046129 - 1000046130
CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN .

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :e2fb1a0499777b99bd56dca3f37732867c7ca5d3f23cf78faf89e3c62bc05fe445278783e56adad66f808df3aa3cf6e0

**ORIGINAL**

# INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

**INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____**

**PERIODO DE 8 de JUNIO de 2023 A 29 de JUNIO de 2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | : 0053 DE 2023 |
| **OBJETO** | : CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y ESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. |
| **LOCALIZACIÓN** | : ACACIAS META. Calle 14 # 21 – 71 -73 |

## INFORME AVANCE DE OBRA

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas en el punto inicialmente son:

- Elaboración de regata para la instalación de la tuberia de desagüe de 2”, para la cocineta y pileta.
- Se realiza conexión de la tuberia de desagüe a un punto de desagüe existente
- Aplicación de pintura vinilo Blanco en los muros interiores a dos manos

























**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Para la realización de las actividades finales se espera a la entrega del mobiliario, que está programada para la primera semana del mes de julio, igualmente se pasó un diseño para adecuar la luminaria según los puestos de trabajo que se plantean en los planos.

Por otro lado, se está a la espera de la aprobación de las actividades adicionales que se evidenciaron en el recorrido inicial del punto. Recordando que sin la aprobación de estos es difícil iniciar las actividades y posteriormente entregar en las fechas establecidas.

Cordialmente,

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
**R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**
**C.C. 80.212.380 de Bogotá**

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 144 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 06-oct-23 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300565235 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 06-oct-23 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 06-oct-23 |
| **PROPUESTA** | 37849 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 06-oct-23 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC | | |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. INDENTIFICACION** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE ENTREGA** | PAGO ELECTRÓNICO | | |
| **CIUDAD DE ENTREGA** | BOGOTÁ | | |
| **NUMERO DE CUENTA** | 480969998529 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BANCO DAVIVIENDA | | |
| **GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS** | 0 | | |

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | WRUSSY INGENIEROS SA | | |
| **OBSERVACIONES:** | FACT WRU144 RAD 02-2303-202309272646914 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2511050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BD03 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 43.111.061 | | |

## DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

| NO. DOCUMENTO | NO. FACTURA | IMPORTE | RETENCIÓN | NOMBRE DE LA CUENTA | CENTRO DE COSTO | NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|


## DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

| ACREEDOR | DOC.COMP. | REFERENCIA | IMPORTE | TEXTO | PEDIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003627743 | 5300565235 | 144 | 43.111.061 | FACT WRU144 RAD 02-2303-2023092726469 | 5700000323 | 053 DE 2023 |

| INFORME DE OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | PERIODO DE INFORME |
| FNA-053-2023 | 08/06/2023 al 8/07/2023 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO ACACIAS**

**REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN**

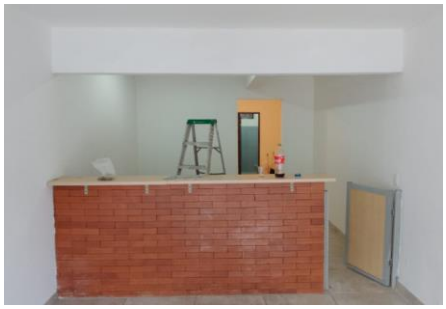

Pintura Vinilo



Pintura Vinilo



Pintura Vinilo



Tubería 2"



Tubería 2"



Pintura Vinilo



Pintura Vinilo



Pintura Vinilo

| INFORME DE OBRA | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | PERIODO DE INFORME |
| FNA-053-2023 | 08/06/2023 al 8/07/2023 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO ACACIAS**




Regata para Tubería Desagüe



Regata para Tubería Desagüe



Pintura Vinilo

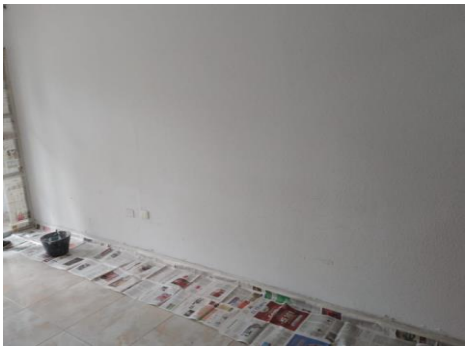


Pintura Vinilo



Regata para Tubería Desagüe



Regata para Tubería Desagüe

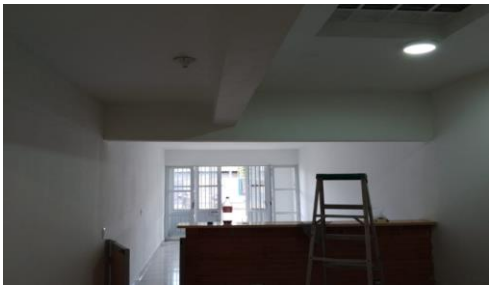

Pintura Vinilo



Pintura Vinilo

| RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1 | INFORME DE OBRA | | fna AHORRO |
|---|---|---|---|
| | CONTRATO DE OBRA | PERIODO DE INFORME | |
| | FNA-053-2023 | 08/06/2023 al 8/07/2023 | |

**REGISTRO FOTOGRAFICO ACACIAS**



Fabricación Mobiliario



Fabricación Mobiliario



Pintura de Mobiliario



Fabricación Mobiliario

# INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

**INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____**

**PERIODO DE 30 de JUNIO de 2023 A 19 de JULIO de 2023**

**CONTRATO No.** : 0053 DE 2023

**OBJETO** : CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y ESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

**LOCALIZACIÓN** : ACACIAS META. Calle 14 # 21 – 71 -73

## INFORME AVANCE DE OBRA

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas en el punto inicialmente son:

- Se realiza aplicación de pintura vinilo azul institucional
- Se hace la instalación del mueble de cocina
- Se instala entrepaño
- Se instalan puestos de trabajo, sillas y mueble de impresión
- Se realiza instalación de pileta de agua
























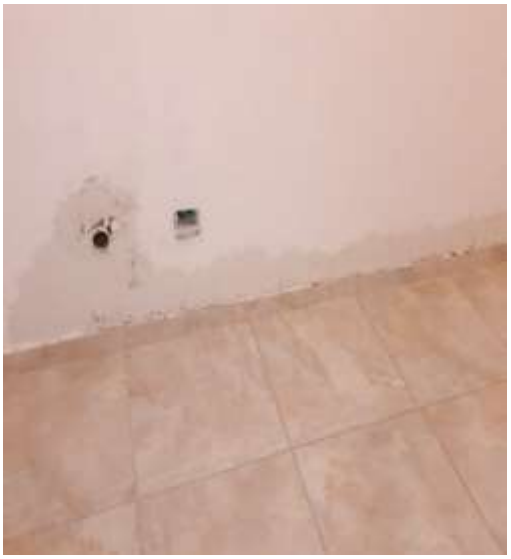





**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Para culminar las actividades de instalación de las actividades, como instalación de la señalización y señalética en general, se solicita realizar una visita con el fin de realizar la entrega final del punto y ajustar detalles pertinentes que la supervisión crea pertinentes.

Por otro lado, se está a la espera de la aprobación de las actividades adicionales que se evidenciaron en el recorrido inicial del punto.

Cordialmente,

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
**R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**
**C.C. 80.212.380 de Bogotá**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal | | | | | | |
| Reg.prelim.por | JTORRESC | Contab.por | MRINCONZ | | | |
| Nº doc. | 5100002426 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2023 | |
| Fe.docum. | 19.09.2023 | Fecha contab. | 29.09.2023 | Período | 09 | |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | | |
| Referen. | 146 | | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202309262642196 | | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1003627743 | WRUSSY INGENIEROS SA | | ** | 18.912.271- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 17.558.030 |
| 3 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 544.130 |
| 5 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 6 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | U8 | 1.525.066 |
| 7 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | U8 | 0 |
| 8 | 50 | 2519053401 | COMPRAS AL 2,5% | | | 484.593- |
| 9 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 36.525- |
| 10 | 50 | 2519054643 | SERVICIOS ACACIAS | | | 193.837- |

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 146**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-19 | 10:02:35 |
| **Expedición** | 2023-09-19 | 10:03:31 |
| **Vencimiento** | 2023-10-18 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo | UN | 1 | 1,429,381.00 | 1,429,381.00 |
| 0200001000001 | ESCRITORIO D ? Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. ?Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20. ?Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16?niveladores plásticos de 5/16". ?Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de alto)?herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNAIncluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto), con espacio para entrega de documentación en parte inferior de 30 cm de largo por 12 de algo y bordes redondos. | UN | 3 | 2,318,297.00 | 6,954,891.00 |
| 0200001000001 | ESCRITORIO E ? Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. ?Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 ?Niveladores plásticos de 5/16". ?Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor para laterales (0.60 x 0.40 de alto) | UN | 2 | 1,489,385.00 | 2,978,770.00 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :f279f80971b5a1568c1951aaeeef543d4c09fba60d940e10c1f5d4c4dbf8e02f8dc97854fa61f3ff2c8247a4a505fbea

**ORIGINAL**

**WRUSSY INGENIEROS SAS**
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 146**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-19 | 10:02:35 |
| **Expedición** | 2023-09-19 | 10:03:31 |
| **Vencimiento** | 2023-10-18 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.<br>?Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16<br>?Niveladores plásticos de 5/16" | UN | 1 | 1,181,650.00 | 1,181,650.00 |
| 0200001000001 | Silla alta para barra de cocina | UN | 2 | 323,079.00 | 646,158.00 |
| 0200001000001 | Silla ergonomica tipo profesional griratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura. | UN | 5 | 565,752.00 | 2,828,760.00 |
| 0200001000001 | ADMINISTRACIÓN 8% | UN | 1 | 1,281,568.80 | 1,281,568.80 |
| 0200001000001 | IMPREVISTOS 5% | UN | 1 | 800,980.50 | 800,980.50 |
| 0200002000001 | UTILIDAD 8% | | 1 | 1,281,568.80 | 1,281,568.80 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 19,383,728.10 |
| **IVA** | 243,498.07 |
| **Total a Pagar** | **$ 19.627.226,17** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 19.627.226,17 | Cuota 1 Vence el 2023-10-18 |

**VALOR EN LETRAS**

Diecinueve Millones Seiscientos Veintisiete Mil Doscientos Veintiseis Pesos M/Cte Con 17/100

**OBSERVACIONES**

1000046101 - 1000046103 - 1000046105
CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN .

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :f279f80971b5a1568c1951aaeeef543d4c09fba60d940e10c1f5d4c4dbf8e02f8dc97854fa61f3ff2c8247a4a505fbea

**ORIGINAL**

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”

**INFORME DE OBRA AGOSTO**

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y ESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”




**CONTRATO DE OBRA No. FNA-053-2023**

**INFORME DE OBRA AGOSTO**

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

**01 DE AGOSTO DE 2023 – 31 DE AGOSTO DE 2023**

**VERSIÓN 1**

**VOLUMEN 1-1**

**ORIGINAL**

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”


1. INTRODUCCIÓN ..... 3
2. INFORMACION DEL PROYECTO ..... 3
2.1. Localización del proyecto ..... 3
2.2. Características técnicas del proyecto y alcance ..... 7
2.3. CONTRATO SUSCRITO ..... 7
2.3.1. Contrato de Obra No. PN FNA-053-2023 ..... 7
2.3.2. Objeto del Contrato ..... 7
3.3.3. Contratista ..... 7
3.4. Plazo del Contrato ..... 7
3.5. Valor de la inversión ..... 7
4. CONTROL DE POLIZAS ..... 7
4.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS ..... 7
5. CONTROL DE RECUSOS ..... 8
5.1. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO ..... 8
5.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO ..... 8
6. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA ..... 9
6.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento ..... 9
7. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO ..... 10
7.1. Contrato o modificaciones Suscritas ..... 10
7.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO ..... 10
7.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ..... 10
7.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO. ..... 11
7.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA ..... 11
7.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO ..... 11
8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES ..... 11

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

# 1. INTRODUCCIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad la cual se creó con el fin de administrar las cesantías de los trabajadores públicos y oficiales del país.

Por lo que en la actualidad el Fondo Nacional del Ahorro a lo largo de los años, hasta la fecha actual cuenta con 70 puntos de atención nacional, para lo cual este debe mantener sus instalaciones en condiciones favorables para el personal interno y personas externas que se acerquen a la entidad. Es por esto, que se deben programar mantenimientos preventivos y correctivos en las diferentes instalaciones de la entidad, para garantizar que sus espacios sean adecuados.

A través de esto el FNA debe mantener en buen estado la infraestructura física de todas sus sedes, de igual forma, que sus instalaciones deben contar con las especificaciones y las normas técnicas mínimas para asegurar el confort y las condiciones apropiadas para el desarrollo de sus actividades, así como un diseño arquitectónico que asegure la óptima distribución de las áreas, teniendo en cuenta principalmente su estructura organizacional, condiciones de seguridad y las necesidades de cada una de las dependencias de acuerdo con los procesos y funciones que debe atender.

Es por esto por lo que la entidad vio la necesidad de trasladar cuatro de sus puntos en ciudades del país. Para realizar dicho traslado y colocar el funcionamiento dichas locaciones, es necesario adelantar las adecuaciones físicas que den garantía a la buena atención al público y garantizar condiciones óptimas para sus trabajadores.

Así las cosas; y siguiendo con las exigencias de la supervisión del contrato, presentamos el informe de obra No.01 correspondiente con fecha desde el 08 DE JUNIO DE 2023 – 8 DE JULIO DE 2023, el presente informe contiene el resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la obra de "CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.", cuya oferta comercial es por valor de $575.640.285 y su culminación está prevista para el 31 de julio de 2023.

# 2. INFORMACION DEL PROYECTO


## 2.1. Localización del proyecto

El proyecto consistirá en la adecuación, dotación de mobiliario, montaje total y demás actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para la adecuación.

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los servicios deberán ser prestados en su totalidad por el contratista, situados en:

- PUNTO DE ATENCION DEL FNA SOACHA CUNDINAMARCA. Carrera 4 Este # 31-40 del Centro Comercial Gran Plaza, Local 2-218 A, Soacha

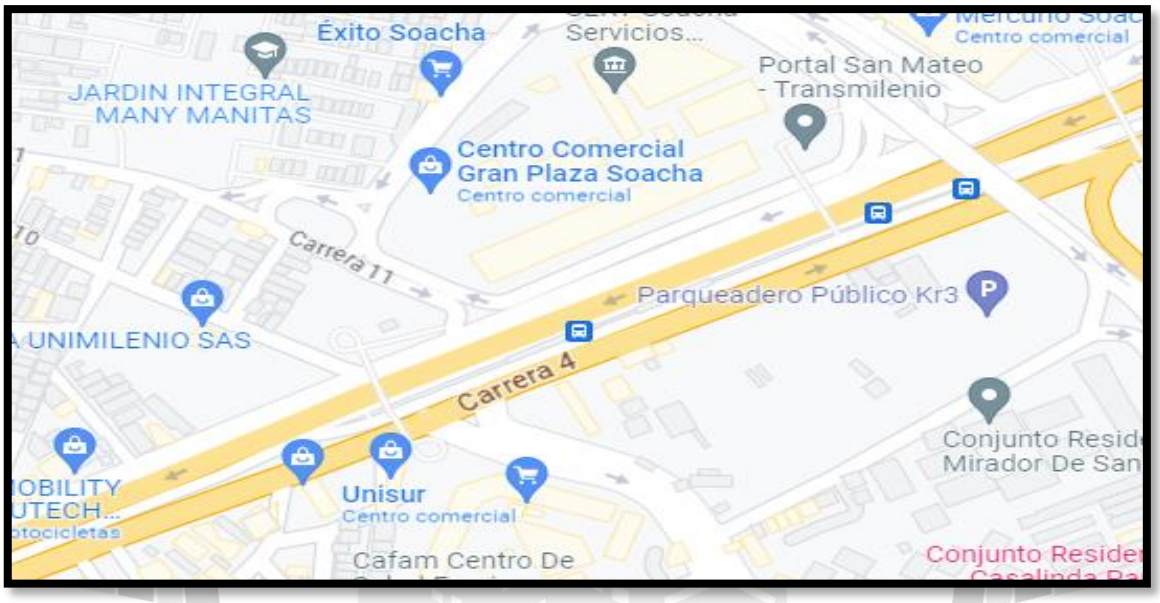


- TRASLADO DE MOBILIARIO Y ADECUACIÓN DE LOCAL. Carrera 7 No. 32 – 35 del Centro Comercial Mercurio, Local 309-314, Soacha




"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

- PUNTO DE ATENCION DEL FNA ACACIAS META. Calle 14 # 21 – 71 -73




- PUNTO DE ATENCION DEL FNA YOPAL CASANARE. Calle 8 No. 18 – 49 Yopal-Casanare

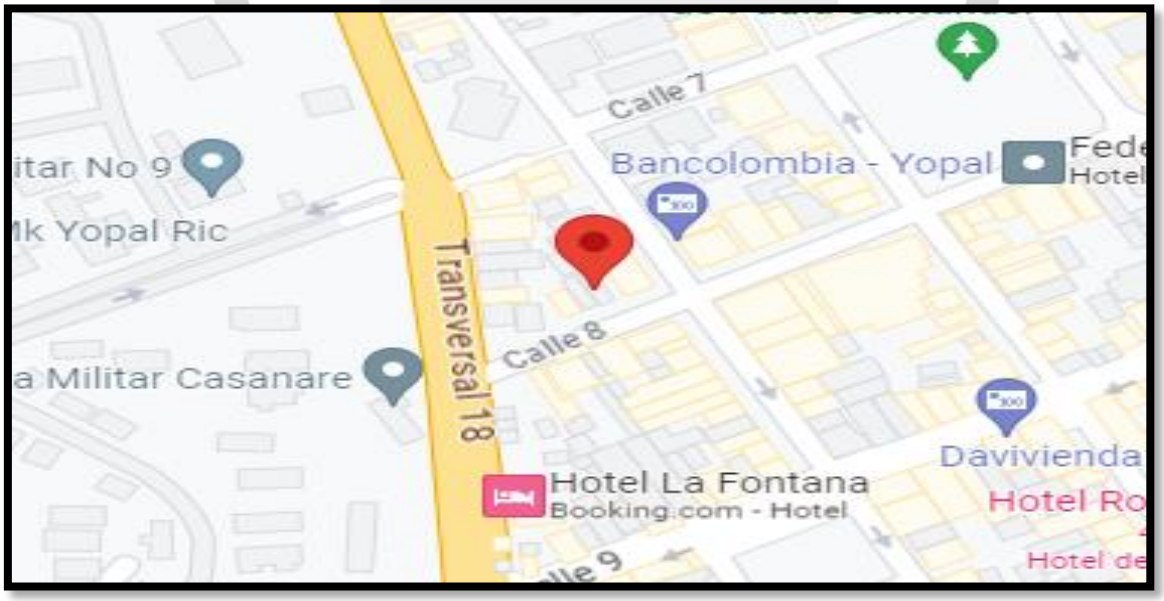


"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

- TRASLADO DE MOBILIARIO Y ADECUACIÓN DE LOCAL. Carrera 25 No. 12 – 35 Yopal-Casanare




- PUNTO DE ATENCION DEL FNA PALMIRA VALLE DEL CAUCA. Carrera 30 No.31-39 Palmira-Valle del cauca

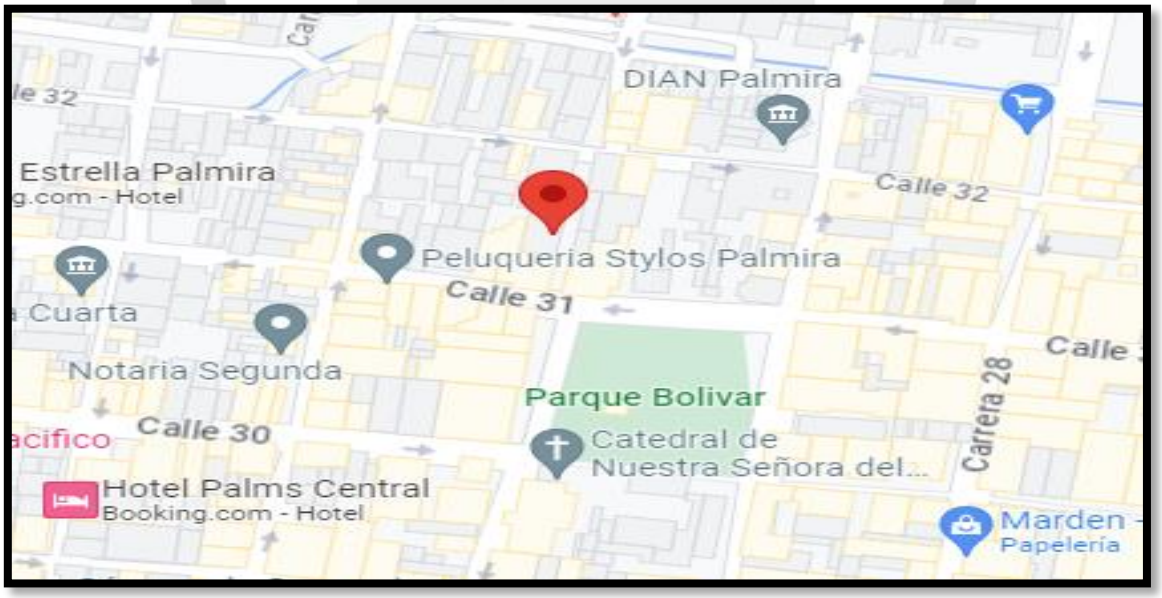

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

## 2.2. Características técnicas del proyecto y alcance

Para la ejecución del contrato No. FNA-053-2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."se contempló la adecuación, dotación, traslado de montaje y desmontaje de la infraestructura física de los locales en 4 frentes de obra del Fondo Nacional del Ahorro, ubicados en Soacha-Cundinamarca, Acacias-Meta, Yopal-Casanare y Palmira-Valle del Cauca.

## 2.3. CONTRATO SUSCRITO

### 2.3.1. Contrato de Obra No. PN FNA-053-2023

### 2.3.2. Objeto del Contrato

El objeto del Contrato de Obra es: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

### 3.3.3. Contratista

El contratista es WURSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.109.885-1

## 3.4. Plazo del Contrato

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato de Obra son 60 días calendario contemplados desde el 01 de junio de 2023 hasta el 31 de julio 2023

## 3.5. Valor de la inversión

El valor para invertir es de: **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($575.640.285)**

# 4. CONTROL DE POLIZAS

## 4.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."
**CONTRATO FNA-053-2023**

**TABLA 6. POLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza de cumplimiento | 11-45-101125741 | | |
| Póliza de Resp. civil Extracontractual | 11-40-101053122 | | |
| Expedida por: | SEGUROS DEL ESTADO S. A | | |
| Fecha de expedición: | 16 de mayo de 2023 | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | Fecha inicial | fecha final | |
| Cumplimiento de Contrato | *15/05/2023* | *15/11/2023* | $115.128.057,00 |
| Salarios y prestaciones sociales | *15/05/2023* | *15/07/2026* | $57.564.029,00 |
| Estabilidad de la obra | *Si ampara 3 años contados a partir de la fecha de acta de recibo final* | | $115.128.057,00 |
| Calidad del servicio | *15/05/2023* | *15/01/2024* | $115.128.057,00 |
| Responsabilidad civil extracontractual | *15/05/2023* | *15/07/2023* | $115.128.057,00 |

## 5. CONTROL DE RECUSOS

### 5.1. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS cuenta con el siguiente personal de apoyo profesional:

**TABLA 3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA**

| NOMBRE | ACTIVIDAD |
|---|---|
| Paula Mariana Moreno | Coordinador De obra |

### 5.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

**TABLA 4 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS**

| CANTIDAD | EQUIPO |
|---|---|
| Varios | Equipo de herramienta menor |

## 6. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA

### 6.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento

Se realizan actividades de acuerdo con lo contratado en el presupuesto y según lo aprobado por parte de la supervisión técnica del Fondo Nacional del Ahorro.

**FRENTE DE OBRA ACACIAS**

Para el frente de obra se realizó la ejecución de las siguientes actividades de obra:

- **Actividades Preliminares**
  - Localización y replanteo
- **Accesorios Sanitarios**
  - Instalación de tubería para desagüe de pileta
- **Mesones y Cocina**
  - Instalación de tubería de desagüe de lavaplatos
- **Pintura**
  - Pintura vinilo tipo 1, muros interiores

**FRENTE DE OBRA PALMIRA**

Para el frente de obra se realizó la ejecución de las siguientes actividades de obra:

- **Actividades Preliminares**
  - Localización y replanteo
- **Muros en Drywall**
  - Muros en Drywall
  - Refuerzo para muros en Drywall
- **Pintura**
  - Pintura vinilo tipo 1, muros interiores
  - Pintura tipo 1, color azul institucional

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

- Pintura coraza blanca muros exteriores
- Pintura base aceite anticorrosiva 3 en 1, color gris

- **Varios**
  - Suministro e instalación de desagüe para lavaplatos.

FRENTE DE OBRA YOPAL

- MURO EN DRYWALL
- INSTALACION DE MOBILIARIO "ESCRITORIOS, SILLAS , LOCKER"

Para los frentes de trabajo en general se ha ido adelantando la producción de los puestos de trabajo, relacionado con bases, superficies y costados, cajoneras, sillas y lockers.

Todo este se puede evidenciar en el Anexo de Registro fotográfico.

## 7. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO

### 7.1. Contrato o modificaciones Suscritas

**CONTRATOS Y/O MODIFICACIONES**

| FECHA | TIPO DE CONTRATO | CONTRATISTA |
|---|---|---|
| 12 de mayo de 2023 | CONTRATO 053 FNA 2023 | WRUSSY INGENIEROS SAS |
| 8 de junio de 2023 | ACTA DE INICIO | WRUSSY INGENIEROS SAS |

### 7.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

#### 7.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | | $ 575.640.285,00 |
| Corte de obra 1 | | $207.185.417,04 |
| VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | $368.454.867,96 | |

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

## 7.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO.

### 7.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

A la fecha no se ha realizado acta de modificación de cantidades de obra

### 7.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO

No existen otras actividades de orden jurídico

## 8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Por el momento solo se han iniciado dos frentes de obra, dentro de los cuales se encuentran Acacias-Meta y Palmira-Valle del Cauca, estos frentes se encuentran activos, donde se encuentran en ejecución de actividades y ultimando detalles para posterior entrega, sin embargo, salieron unas actividades no previstas, que han dado atraso al avance de obra debido a su falta de aprobación.

Se encuentra en ejecución el frente de Soacha y se finalizan actividades en el frente de yopal.

Por otro lado, el mobiliario de los puntos solicitados, ya se encuentra en fabricación, de acuerdo a lo enviado en las fichas técnicas de los mismos.

***ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO***
***Representante Legal***
***WRUSSY INGENIEROS SAS***
***NIT:901.109.885-1***

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 146 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 06-oct-23 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300565232 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 06-oct-23 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 06-oct-23 |
| **PROPUESTA** | 37849 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 06-oct-23 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE | | |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. INDENTIFICACION** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE ENTREGA** | PAGO ELECTRÓNICO | | |
| **CIUDAD DE ENTREGA** | BOGOTÁ | | |
| **NUMERO DE CUENTA** | 480969998529 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BANCO DAVIVIENDA | | |
| **GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS** | 0 | | |

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | WRUSSY INGENIEROS SA | | |
| **OBSERVACIONES:** | FACT WRU146 RAD 02-2303-202309262642196 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2511050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BD03 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 18.912.271 | | |

## DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

| NO. DOCUMENTO | NO. FACTURA | IMPORTE | RETENCIÓN | NOMBRE DE LA CUENTA | CENTRO DE COSTO | NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

| ACREEDOR | DOC.COMP. | REFERENCIA | IMPORTE | TEXTO | PEDIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003627743 | 5300565232 | 146 | 18.912.271 | FACT WRU146 RAD 02-2303-2023092626421 | 5700000323 | 053 DE 2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal | | | | | | |
| Reg.prelim.por | JTORRESC | Contab.por | MRINCONZ | | | |
| Nº doc. | 5100002427 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2023 | |
| Fe.docum. | 19.09.2023 | Fecha contab. | 29.09.2023 | Período | 09 | |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | | |
| Referen. | 147 | | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202309262642198 | | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1003627743 | WRUSSY INGENIEROS SA | | ** | 21.967.895- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 10.646.327 |
| 3 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 10.380.568 |
| 5 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 6 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 1.771.469 |
| 7 | 81 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W0 | 0 |
| 8 | 50 | 2519053501 | RET CONT DE OBRA 2% | | | 450.310- |
| 9 | 50 | 2519055201 | PRO EST UNI NAL 0.5 | | | 112.578- |
| 10 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 42.426- |
| 11 | 50 | 2519054643 | SERVICIOS ACACIAS | | | 225.155- |

# WRUSSY INGENIEROS SAS

NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 147**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-19 | 10:10:28 |
| **Expedición** | 2023-09-19 | 10:11:35 |
| **Vencimiento** | 2023-10-18 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | TOTAL COSTO DIRECTO<br>ACTA DE CORTE N° 1<br>OBRA CIVIL ACACIAS | UN | 1 | 18,607,871.74 | 18,607,871.74 |
| 0200001000001 | ADMINISTRACIÓN 8% | UN | 1 | 1,488,629.74 | 1,488,629.74 |
| 0200001000001 | IMPREVISTOS 5% | UN | 1 | 930,393.59 | 930,393.59 |
| 0200002000001 | UTILIDAD 8% | | 1 | 1,488,629.74 | 1,488,629.74 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 22,515,524.81 |
| **IVA** | 282,839.65 |
| **Total a Pagar** | **$ 22.798.364,46** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 22.798.364,46 | Cuota 1 Vence el 2023-10-18

**VALOR EN LETRAS**

Veintidos Millones Setecientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 46/100

**OBSERVACIONES**

1000046106 - 1000046107 - 1000046108
CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :606acd60d3701f01af5c5f9e61499dc2801b73fefb67562593dcccfd1b3413fbf39435ec8ddc1ce14896f88b7bf35c66

**ORIGINAL**

# INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

**INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____**



**PERIODO DE 8 de JUNIO de 2023 A 29 de JUNIO de 2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | : 0053 DE 2023 |
| **OBJETO** | : CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y ESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. |
| **LOCALIZACIÓN** | : SOACHA CUNDINAMARCA. Carrera 4 Este # 31-40 del Centro Comercial Gran Plaza, Local 2-218 A, Soacha |

**INFORME AVANCE DE OBRA**

- El avance de obra en el punto del Fondo Nacional de Soacha se encuentra aplazadas las actividades de inicio por temas de ingreso al lugar.

  Por parte de la administración del lugar no dan ingreso hasta que se presenten los diseños de la RCI

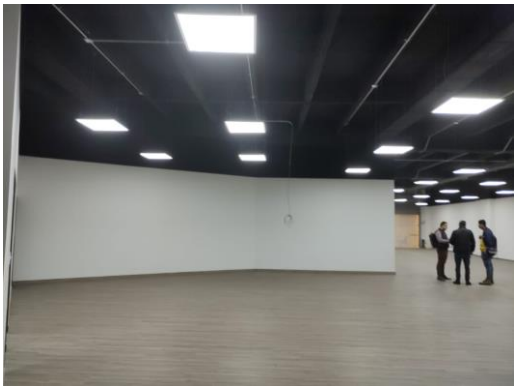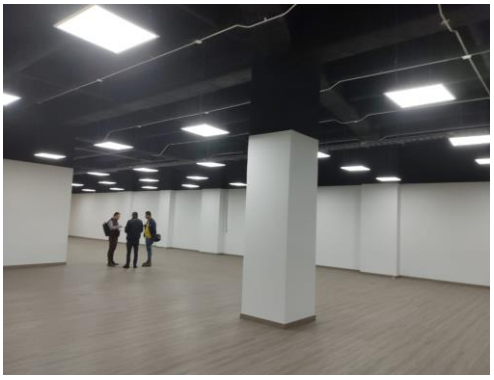


**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

En el momento las actividades se encuentran suspendidas por temas de ingreso al local, esto se debe a que notificaron que, sin los diseños de la RCI, no se podria acceder ni iniciar temas de obra.

Por otro lado, se está a la espera de la aprobación de las actividades adicionales solicitaron. Para proceder a la realización de diseños y demás elementos que esto conlleva, se debe enviar por parte de la entidad una serie de documentos solicitados anteriormente.

Para la instalación del mobiliario, se necesita tener adecuado el local, el mobiliario solicitado para el punto ya se encuentra en fabricación y su entrega estimada está programada entre la primera y segunda semana del mes de julio, igualmente se pasó un diseño para adecuar la luminaria según los puestos de trabajo que se plantean en los planos.

Cordialmente,



**WRUSSY INGENIEROS SAS**
**R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**
**C.C. 80.212.380 de Bogotá**

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 147 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 06-oct-23 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300565233 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 06-oct-23 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 06-oct-23 |
| **PROPUESTA** | 37849 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 06-oct-23 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC | | |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. INDENTIFICACION** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE ENTREGA** | PAGO ELECTRÓNICO | | |
| **CIUDAD DE ENTREGA** | BOGOTÁ | | |
| **NUMERO DE CUENTA** | 480969998529 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BANCO DAVIVIENDA | | |
| **GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS** | 0 | | |

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | WRUSSY INGENIEROS SA | | |
| **OBSERVACIONES:** | FACT WRU147 RAD 02-2303-202309262642198 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2511050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BD03 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 21.967.895 | | |

## DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

| NO. DOCUMENTO | NO. FACTURA | IMPORTE | RETENCIÓN | NOMBRE DE LA CUENTA | CENTRO DE COSTO | NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

| ACREEDOR | DOC.COMP. | REFERENCIA | IMPORTE | TEXTO | PEDIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003627743 | 5300565233 | 147 | 21.967.895 | FACT WRU147 RAD 02-2303-2023092626421 | 5700000323 | 053 DE 2023 |

Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reg.prelim.por | JTORRESC | Contab.por | MRINCONZ | | |
| Nº doc. | 5100002430 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2023 |
| Fe.docum. | 22.09.2023 | Fecha contab. | 29.09.2023 | Período | 09 |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | |
| Referen. | 148 | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202309262642212 | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1003627743 | WRUSSY INGENIEROS SA | | ** | 16.548.342- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 16.202.818 |
| 3 | 91 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W8 | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 964.067 |
| 5 | 91 | 5130950114 | SERV DE APOYO TEMP | | W0 | 0 |
| 6 | 50 | 2519053501 | RET CONT DE OBRA 2% | | | 340.259- |
| 7 | 50 | 2519055201 | PRO EST UNI NAL 0.5 | | | 85.065- |
| 8 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 23.089- |
| 9 | 50 | 2519054715 | SERVICIOS PALMIRA | | | 170.130- |

# WRUSSY INGENIEROS SAS

NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **NIT** | 899,999,284 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3077070 |
| **Dirección** | CR 65 11 83 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. - COLOMBIA | **Centro Costo** | 78 |
| **Correo** | facturacionelectronica@fna.gov.co | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**WRU 148**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-09-22 | 10:45:19 |
| **Expedición** | 2023-09-22 | 10:46:28 |
| **Vencimiento** | 2023-10-21 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200001000001 | TOTAL COSTO DIRECTO<br>ACTA DE CORTE N° 1<br>OBRA CIVIL PALMIRA | UN | 1 | 13,502,348.04 | 13,502,348.04 |
| 0200001000001 | ADMINISTRACIÓN 17% | UN | 1 | 2,295,399.17 | 2,295,399.17 |
| 0200001000001 | IMPREVISTOS 3% | UN | 1 | 405,070.44 | 405,070.44 |
| 0200002000001 | UTILIDAD 6% | | 1 | 810,140.88 | 810,140.88 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 17,012,958.53 |
| **IVA** | 153,926.77 |
| **Total a Pagar** | **$ 17.166.885,30** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 17.166.885,30 | Cuota 1 Vence el 2023-10-21 |

**VALOR EN LETRAS**

Diecisiete Millones Ciento Sesenta Y Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 30/100

**OBSERVACIONES**

1000046131 - 1000046132
CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : NATALIA ALEJAND**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764040035330 **aprobado en** 2022-11-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 110 **al** 15000

CUFE :6103c722bfb8f9f736eb541c550d12c52ebb0753cd4d5b6792f499aa6359f28594fadcbeae11cff38491c499d8d2e9e3

**ORIGINAL**

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”

**INFORME DE OBRA JUNIO**

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y ESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”




**CONTRATO DE OBRA No. FNA-053-2023**

**INFORME DE OBRA JUNIO**

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

**08 DE JUNIO DE 2023 – 8 DE JULIO DE 2023**

**VERSIÓN 1**

**VOLUMEN 1-1**

**ORIGINAL**

# “CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”

1. INTRODUCCIÓN ..... 3
2. INFORMACION DEL PROYECTO ..... 3
2.1. Localización del proyecto ..... 3
2.2. Características técnicas del proyecto y alcance ..... 7
2.3. CONTRATO SUSCRITO ..... 7
2.3.1. Contrato de Obra No. PN FNA-053-2023. ..... 7
2.3.2. Objeto del Contrato ..... 7
3.3.3. Contratista ..... 7
3.4. Plazo del Contrato ..... 7
3.5. Valor de la inversión ..... 7
4. CONTROL DE POLIZAS ..... 7
4.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS ..... 7
5. CONTROL DE RECUSOS ..... 8
5.1. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO ..... 8
5.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO ..... 8
6. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA ..... 9
6.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento ..... 9
7. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO ..... 10
7.1. Contrato o modificaciones Suscritas ..... 10
7.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO ..... 10
7.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ..... 10
7.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO. ..... 10
7.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA ..... 10
7.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO ..... 10
8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES ..... 11

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

# 1. INTRODUCCIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad la cual se creó con el fin de administrar las cesantías de los trabajadores públicos y oficiales del país.

Por lo que en la actualidad el Fondo Nacional del Ahorro a lo largo de los años, hasta la fecha actual cuenta con 70 puntos de atención nacional, para lo cual este debe mantener sus instalaciones en condiciones favorables para el personal interno y personas externas que se acerquen a la entidad. Es por esto, que se deben programar mantenimientos preventivos y correctivos en las diferentes instalaciones de la entidad, para garantizar que sus espacios sean adecuados.

A través de esto el FNA debe mantener en buen estado la infraestructura física de todas sus sedes, de igual forma, que sus instalaciones deben contar con las especificaciones y las normas técnicas mínimas para asegurar el confort y las condiciones apropiadas para el desarrollo de sus actividades, así como un diseño arquitectónico que asegure la óptima distribución de las áreas, teniendo en cuenta principalmente su estructura organizacional, condiciones de seguridad y las necesidades de cada una de las dependencias de acuerdo con los procesos y funciones que debe atender.

Es por esto por lo que la entidad vio la necesidad de trasladar cuatro de sus puntos en ciudades del país. Para realizar dicho traslado y colocar el funcionamiento dichas locaciones, es necesario adelantar las adecuaciones físicas que den garantía a la buena atención al público y garantizar condiciones óptimas para sus trabajadores.

Así las cosas; y siguiendo con las exigencias de la supervisión del contrato, presentamos el informe de obra No.01 correspondiente con fecha desde el 08 DE JUNIO DE 2023 – 8 DE JULIO DE 2023, el presente informe contiene el resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la obra de "CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.", cuya oferta comercial es por valor de $575.640.285 y su culminación está prevista para el 31 de julio de 2023.

# 2. INFORMACION DEL PROYECTO

## 2.1. Localización del proyecto

El proyecto consistirá en la adecuación, dotación de mobiliario, montaje total y demás actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para la adecuación.

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los servicios deberán ser prestados en su totalidad por el contratista, situados en:

- PUNTO DE ATENCION DEL FNA SOACHA CUNDINAMARCA. Carrera 4 Este # 31-40 del Centro Comercial Gran Plaza, Local 2-218 A, Soacha




- TRASLADO DE MOBILIARIO Y ADECUACIÓN DE LOCAL. Carrera 7 No. 32 – 35 del Centro Comercial Mercurio, Local 309-314, Soacha




"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

- PUNTO DE ATENCION DEL FNA ACACIAS META. Calle 14 # 21 – 71 -73




- PUNTO DE ATENCION DEL FNA YOPAL CASANARE. Calle 8 No. 18 – 49 Yopal-Casanare

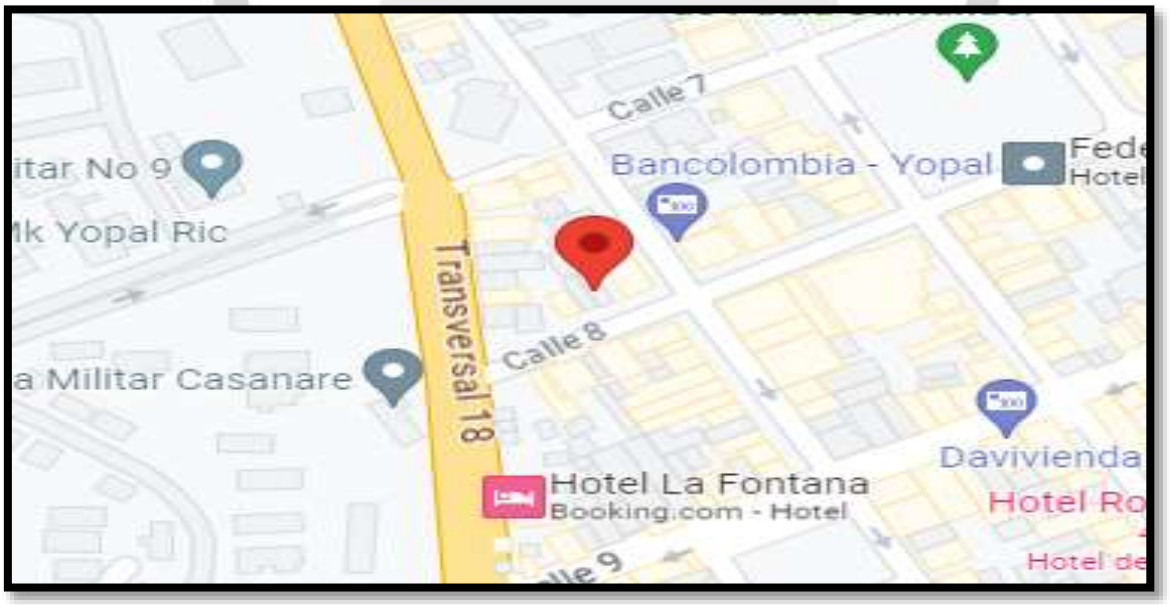

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

- TRASLADO DE MOBILIARIO Y ADECUACIÓN DE LOCAL. Carrera 25 No. 12 – 35 Yopal-Casanare




- PUNTO DE ATENCION DEL FNA PALMIRA VALLE DEL CAUCA. Carrera 30 No.31-39 Palmira-Valle del cauca



"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

## 2.2. Características técnicas del proyecto y alcance

Para la ejecución del contrato No. FNA-053-2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."se contempló la adecuación, dotación, traslado de montaje y desmontaje de la infraestructura física de los locales en 4 frentes de obra del Fondo Nacional del Ahorro, ubicados en Soacha-Cundinamarca, Acacias-Meta, Yopal-Casanare y Palmira-Valle del Cauca.

## 2.3. CONTRATO SUSCRITO

### 2.3.1. Contrato de Obra No. PN FNA-053-2023

### 2.3.2. Objeto del Contrato

El objeto del Contrato de Obra es: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

### 3.3.3. Contratista

El contratista es WURSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.109.885-1

## 3.4. Plazo del Contrato

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato de Obra son 60 días calendario contemplados desde el 01 de junio de 2023 hasta el 31 de julio 2023

## 3.5. Valor de la inversión

El valor para invertir es de: **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($575.640.285)**

# 4. CONTROL DE POLIZAS

## 4.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato

**TABLA 6. POLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza de cumplimiento | 11-45-101125741 | | |
| Póliza de Resp. civil Extracontractual | 11-40-101053122 | | |
| Expedida por: | SEGUROS DEL ESTADO S. A | | |
| Fecha de expedición: | 16 de mayo de 2023 | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | Fecha inicial | fecha final | |
| Cumplimiento de Contrato | *15/05/2023* | *15/11/2023* | $115.128.057,00 |
| Salarios y prestaciones sociales | *15/05/2023* | *15/07/2026* | $57.564.029,00 |
| Estabilidad de la obra | *Si ampara 3 años contados a partir de la fecha de acta de recibo final* | | $115.128.057,00 |
| Calidad del servicio | *15/05/2023* | *15/01/2024* | $115.128.057,00 |
| Responsabilidad civil extracontractual | *15/05/2023* | *15/07/2023* | $115.128.057,00 |

## 5. CONTROL DE RECUSOS

### 5.1. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS cuenta con el siguiente personal de apoyo profesional:

**TABLA 3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA**

| NOMBRE | ACTIVIDAD |
|---|---|
| Paula Mariana Moreno | Coordinador De obra |

### 5.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

**TABLA 4 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS**

| CANTIDAD | EQUIPO |
|---|---|
| Varios | Equipo de herramienta menor |

## 6. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA

### 6.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento

Se realizan actividades de acuerdo con lo contratado en el presupuesto y según lo aprobado por parte de la supervisión técnica del Fondo Nacional del Ahorro.

**FRENTE DE OBRA ACACIAS**

Para el frente de obra se realizó la ejecución de las siguientes actividades de obra:

- **Actividades Preliminares**
  - Localización y replanteo
- **Accesorios Sanitarios**
  - Instalación de tubería para desagüe de pileta
- **Mesones y Cocina**
  - Instalación de tubería de desagüe de lavaplatos
- **Pintura**
  - Pintura vinilo tipo 1, muros interiores

**FRENTE DE OBRA PALMIRA**

Para el frente de obra se realizó la ejecución de las siguientes actividades de obra:

- **Actividades Preliminares**
  - Localización y replanteo
- **Muros en Drywall**
  - Muros en Drywall
  - Refuerzo para muros en Drywall
- **Pintura**
  - Pintura vinilo tipo 1, muros interiores
  - Pintura tipo 1, color azul institucional

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

- Pintura coraza blanca muros exteriores
- Pintura base aceite anticorrosiva 3 en 1, color gris

- **Varios**
  - Suministro e instalación de desagüe para lavaplatos.

Para los frentes de trabajo en general se ha ido adelantando la producción de los puestos de trabajo, relacionado con bases, superficies y costados, cajoneras, sillas y lockers.

Todo este se puede evidenciar en el Anexo de Registro fotográfico.

## 7. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO

### 7.1. Contrato o modificaciones Suscritas

**CONTRATOS Y/O MODIFICACIONES**

| FECHA | TIPO DE CONTRATO | CONTRATISTA |
|---|---|---|
| 12 de mayo de 2023 | CONTRATO 053 FNA 2023 | WRUSSY INGENIEROS SAS |
| 8 de junio de 2023 | ACTA DE INICIO | WRUSSY INGENIEROS SAS |

### 7.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

#### 7.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | | $ 575.640.285,00 |
| VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | $575.640.285,00 | |

### 7.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO.

#### 7.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

A la fecha no se ha realizado acta de modificación de cantidades de obra

#### 7.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO

No existen otras actividades de orden jurídico

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

## 8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Por el momento solo se han iniciado dos frentes de obra, dentro de los cuales se encuentran Acacias-Meta y Palmira-Valle del Cauca, estos frentes se encuentran activos, donde se encuentran en ejecución de actividades y ultimando detalles para posterior entrega, sin embargo, salieron unas actividades no previstas, que han dado atraso al avance de obra debido a su falta de aprobación.

Los otros frentes, los cuales son Soacha-Cundinamarca y Yopal-Casanare, se encuentran a la espera de la aprobación de una serie de actividades, las cuales son previas para el inicio de la adecuación de los puntos del Fondo Nacional del Ahorro.

Por otro lado, el mobiliario de los puntos solicitados, ya se encuentra en fabricación, de acuerdo a lo enviado en las fichas técnicas de los mismos.

***ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO***
***Representante Legal***
***WRUSSY INGENIEROS SAS***
***NIT:901.109.885-1***

# División de Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 148 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 06-oct-23 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300565234 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 06-oct-23 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 06-oct-23 |
| **PROPUESTA** | 37849 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 06-oct-23 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE | | |

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. INDENTIFICACION** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE ENTREGA** | PAGO ELECTRÓNICO | | |
| **CIUDAD DE ENTREGA** | BOGOTÁ | | |
| **NUMERO DE CUENTA** | 480969998529 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BANCO DAVIVIENDA | | |
| **GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS** | 0 | | |

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | WRUSSY INGENIEROS SAS | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 9011098851 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | WRUSSY INGENIEROS SA | | |
| **OBSERVACIONES:** | FACT WRU148 RAD 02-2303-202309262642212 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2511050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BD03 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 16.548.342 | | |

## DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

| NO. DOCUMENTO | NO. FACTURA | IMPORTE | RETENCIÓN | NOMBRE DE LA CUENTA | CENTRO DE COSTO | NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

## DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

| ACREEDOR | DOC.COMP. | REFERENCIA | IMPORTE | TEXTO | PEDIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003627743 | 5300565234 | 148 | 16.548.342 | FACT WRU148 RAD 02-2303-2023092626422 | 5700000323 | 053 DE 2023 |
