INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 27 de noviembre de 2023 Al: 3 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SEDE: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SOCHA — SUPERVISOR: BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

En la visita de diagnóstico se pactó que el inicio de las labores en obra era a partir del 20 de noviembre de 2023, es por ello que para el presente periodo no se evidencia avance alguno. No obstante, también se realiza la salvedad de que el contratista no remitió la documentación correspondiente al personal operativo, por lo cual, no se podrá autorizar ninguna actividad en campo hasta tanto desde el área SST no se aprueben los respectivos ingresos.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA SAS
Contrato No.	2390 de 2023
Valor Inicial:	$ 659.580.192,63
Valor Actualizado:	$ 659.580.192,63
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	2410 de 2023
Valor Inicial:	$ 109.038.795,60
Valor Actualizado:	$ 109.038.795,60
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA

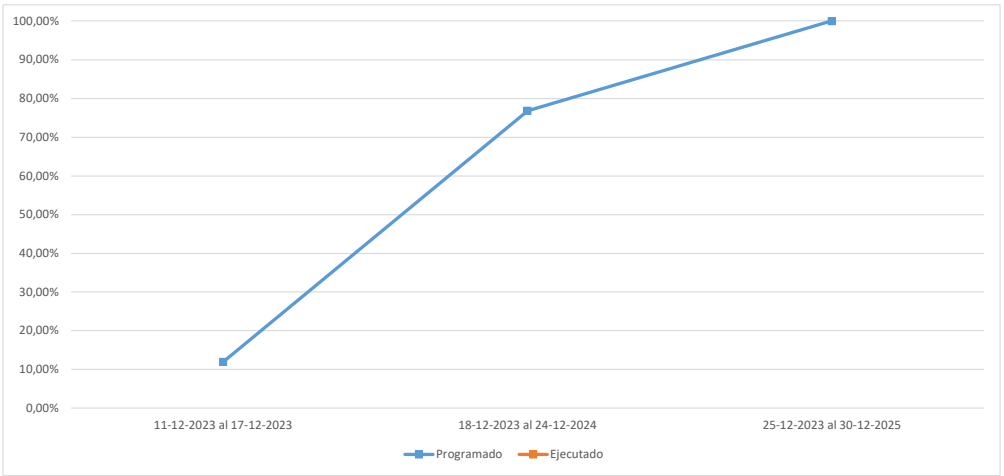


IMAGEN OFICINA



AVANCE

De acuerdo con lo planteado en comité el dia 28 de niviembre de 2023, el contratista de obra se compromete a iniciar obra para el dia 11 de diciembre de 2023, debibo a inconvenientes de proveedor y traslado de material a sitio.
En lo que respecta al registro fotográfico, se mantienen las tomadas durante la visita de diagnóstico y se vincula gráfica de la curva "S" conforme a las programaciones remitidas por la firma contratista de obra.



IMAGENES AVANCE



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Edison Ricardo Duarte Díaz Matrícula No.: 54202216964 NTS
