INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 Del: 4 de diciembre de 2023 Al: 10 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SEDE: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SOATÁ — SUPERVISOR: BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA SAS
Contrato No.	2390 de 2023
Valor Inicial:	$ 659.580.192,63
Valor Actualizado:	$ 659.580.192,63
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	2410 de 2023
Valor Inicial:	$ 109.038.795,60
Valor Actualizado:	$ 109.038.795,60
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA

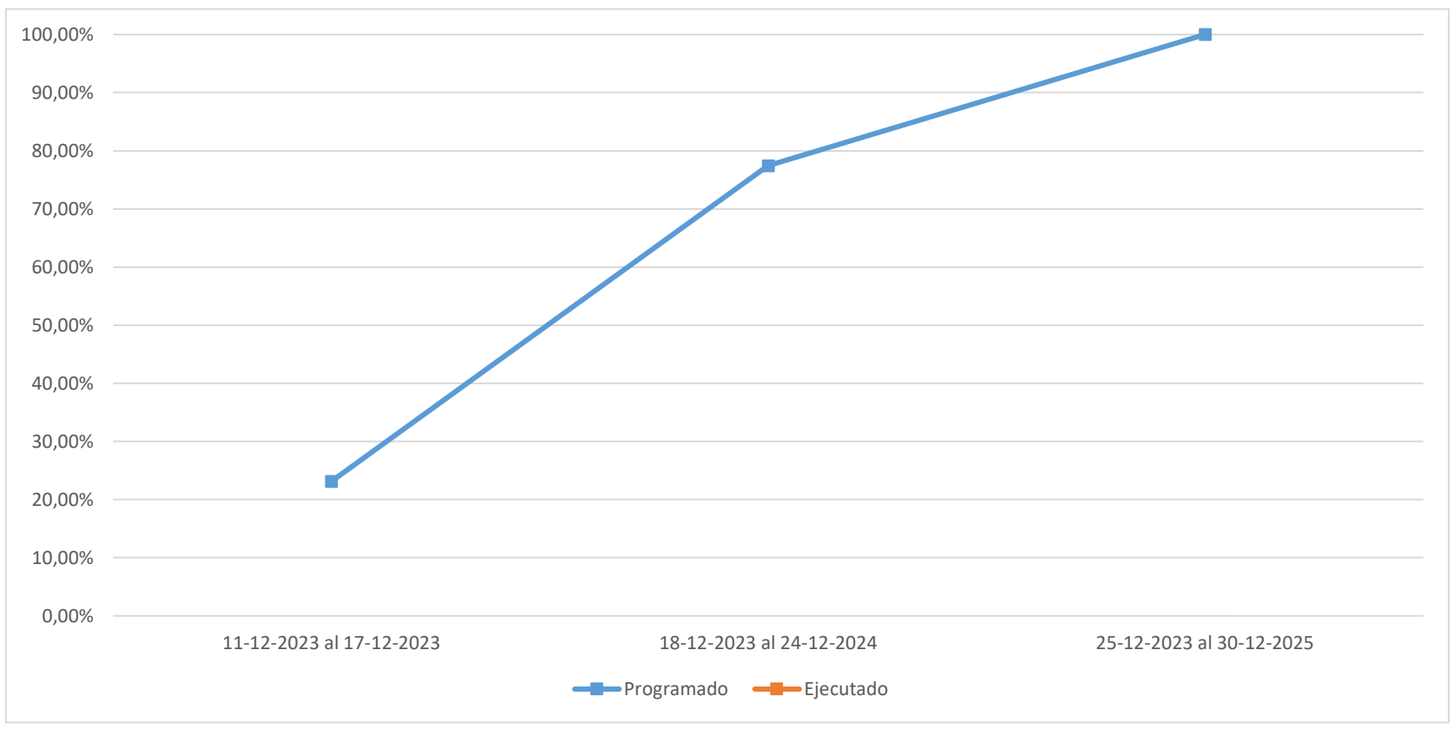


IMAGEN OFICINA



AVANCE

De acuerdo con lo planteado en comité el dia 28 de niviembre de 2023, el contratista de obra se compromete a iniciar obra para el dia 11 de diciembre de 2023, debibo a inconvenientes de proveedor y traslado de material a sitio.
En lo que respecta al registro fotográfico, se mantienen las tomadas durante la visita de diagnóstico y se vincula gráfica de la curva "S" conforme a las programaciones remitidas por la firma contratista de obra.



IMAGENES AVANCE



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE NTERVENTORIA
Se mantiene registro fotografico de la visita de obra inicial ya que mediante comité el dia 28 de nov se programo inicio de intervención para el dia 11/12/2023, por tanto no se presenta avance de obra.	Firma Nombre : Edison Ricardo Duarte Diaz Matrícula No.: 54202216964 NTS
