INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 Del: 4 de diciembre de 2023 Al: 10 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	SEDE	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER	SUPERVISOR	BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra	$ -	$ -

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA SAS
Contrato No.	2390 de 2023
Valor Inicial:	$ 659.580.192,63
Valor Actualizado:	$ 659.580.192,63
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	2410 de 2023
Valor Inicial:	$ 109.038.795,60
Valor Actualizado:	$ 109.038.795,60
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA



AVANCE

Se llevó a cabo visita de reconocimiento con ocasión al inicio de los trabajos de este frente el día 20 de noviembre de 2023, en compañía de la Supervisión de la SNR, Contratista de obra, Contratista de Interventoría y Registrador o delegado.

Se prevee inicio de labores para el día 11 de diciembre de 2023, ya que el contratista manifiesta no pudo gestionar el inicio para el 04 de diciembre de 2023 como se tenía previsto inicialmente.

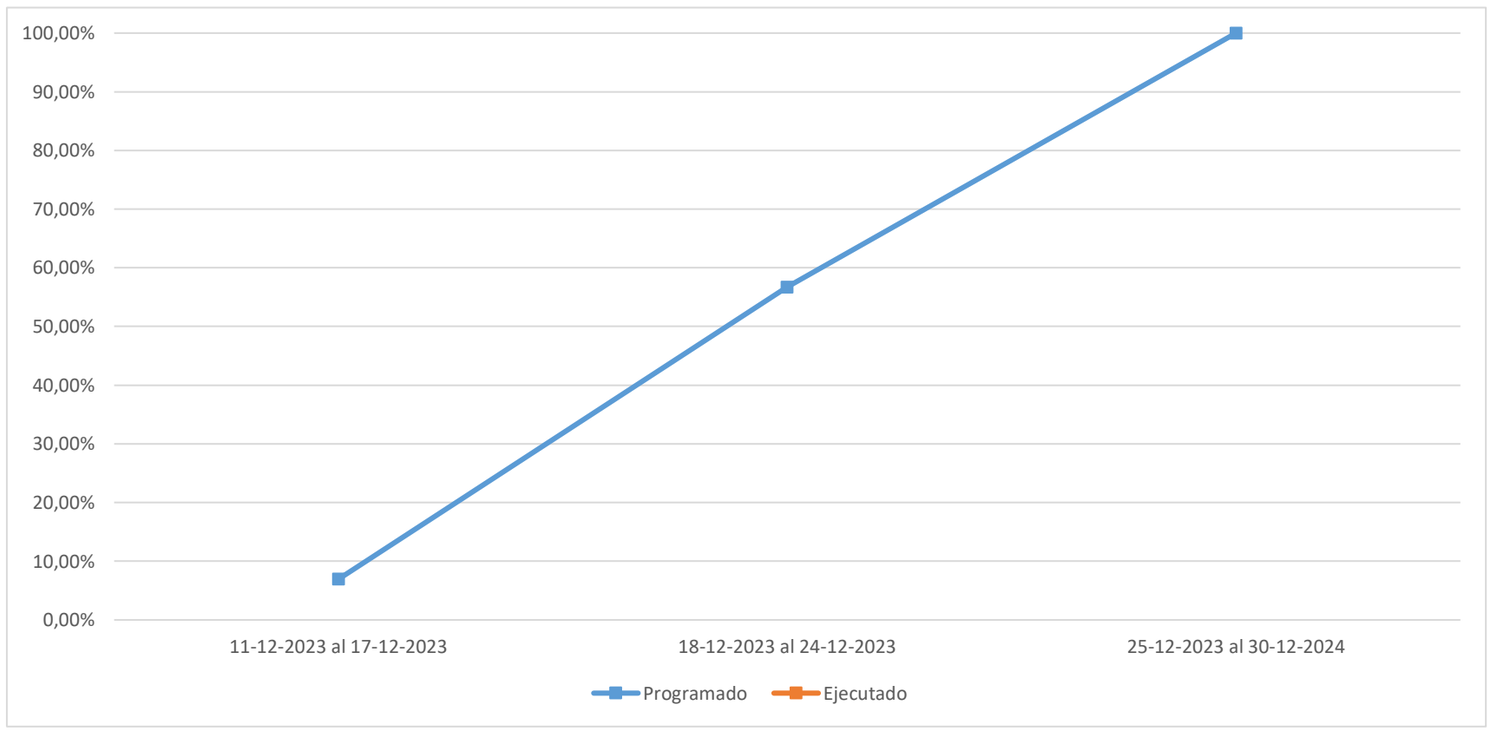

IMAGENES AVANCE



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.




Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.



Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.

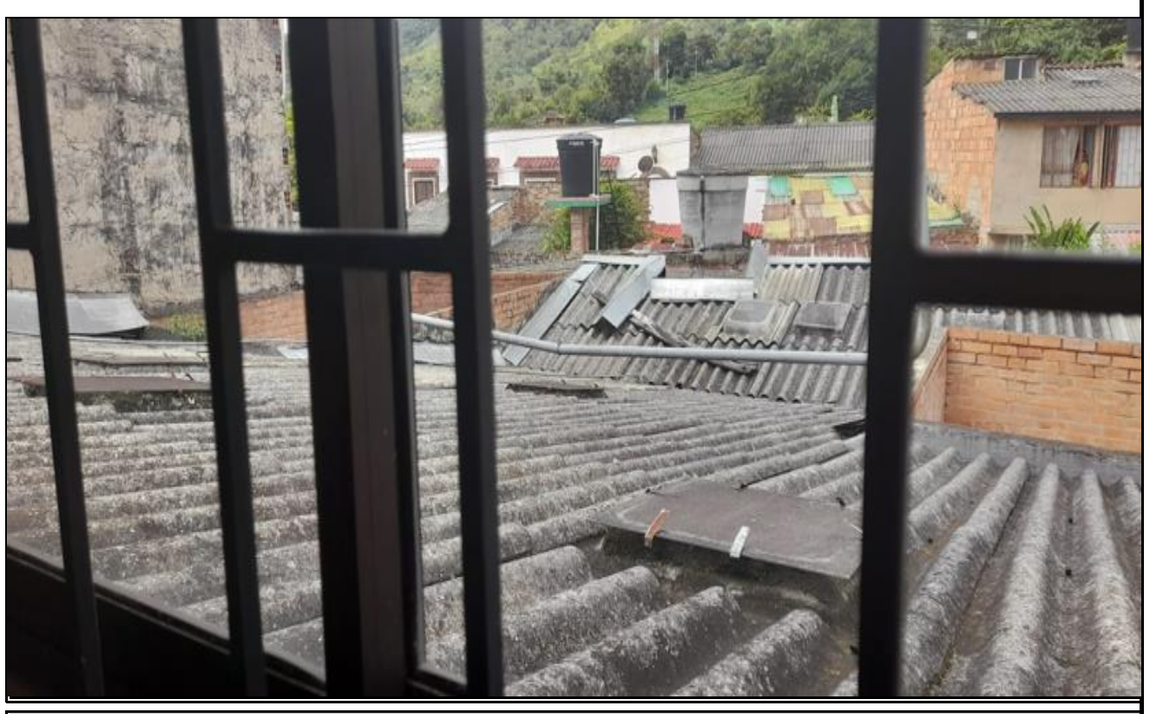

Comentario: Visita de reconocimiento para inicio de las labores.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE NTERVENTORIA
Durante la presente semana no se inician labores en campo, a pesar de estar programado el inicio a partir del 04 de diciembre de 2023. El contratista manifiesta que ha tenido dificultades en el transporte de los materiales y en la contratación del personal operativo, ya que en la zona el mismo es bastante escaso.	Firma Nombre : Edison Ricardo Duarte Díaz Matrícula No.: 54202216964 NTS
