


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0		**0**	**0**	**FLK-621-2022-GRUPO1-CLB-20231023**	**338 días**	**mié 5/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 21.047.175.114,00**
1		**1**	**1**	**CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1.**	**338 días**	**mié 5/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 21.047.175.114,00**
2		**1.1**	**2**	**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA**	**0 días**	**mié 5/10/22**	**mié 5/10/22**	**$ 0,00**
3		**1.2**	**2**	**FASE DE PRELIMINARES**	**48 días**	**mié 5/10/22**	**lun 5/12/22**	**$ 215.764.555,00**
4		**1.2.1**	**3**	**INICIO DE LOS PRELIMINARES**	**0 días**	**mié 5/10/22**	**mié 5/10/22**	**$ 0,00**
5		**1.2.2**	**3**	**Actividades despues inicio de contrato**	**5 días**	**mar 11/10/22**	**mar 18/10/22**	**$ 0,00**
6		**1.2.2.1**	**4**	**Entrega documentos preliminares de interventoria**	**0 días**	**mar 11/10/22**	**mar 11/10/22**	**$ 0,00**
7		**1.2.2.2**	**4**	**Aprobación de documentos preliminares de interventoria**	**0 días**	**mar 18/10/22**	**mar 18/10/22**	**$ 0,00**
8		**1.2.3**	**3**	**RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION**	**48 días**	**mié 5/10/22**	**lun 5/12/22**	**$ 215.764.555,00**
9		**1.2.3.1**	**4**	**TOPOGRAFIA**	**46 días**	**mié 5/10/22**	**jue 1/12/22**	**$ 43.152.912,00**
10		1.2.3.1	5	Elaboración del Informe de revisión, verificación y análisis de información topográfica 50% CIVs	25 días	mié 5/10/22	vie 4/11/22	$ 8.630.583,00
11		1.2.3.1	5	Levantamiento de información para verificación del diseño geometrico (incluye ubicación y verificación de GPS) 50% de los CIVS	25 días	mié 5/10/22	vie 4/11/22	$ 8.630.583,00
12		1.2.3.1	5	Materialización del abscisado 50% de los CIVS	25 días	mié 5/10/22	vie 4/11/22	$ 4.315.290,00
13		**1.2.3.1**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**vie 4/11/22**	**vie 4/11/22**	**$ 0,00**
14		1.2.3.1	5	Levantamiento de información para verificación del diseño geometrico (incluye ubicación y verificación de GPS) 100% de los CIVS	21 días	vie 4/11/22	jue 1/12/22	$ 8.630.582,00
15		1.2.3.1	5	Materialización del abscisado 100% de los CIVS	21 días	vie 4/11/22	jue 1/12/22	$ 6.472.937,00
16		1.2.3.1	5	Elaboración del Informe de revisión, verificación y análisis de información topográfica saldo al 100% CIVs	21 días	vie 4/11/22	jue 1/12/22	$ 6.472.937,00
17		**1.2.3.1**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y dseños del 100% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**jue 1/12/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
18		**1.2.3.2**	**4**	**ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**	**46 días**	**mié 5/10/22**	**jue 1/12/22**	**$ 21.576.456,00**
19		1.2.3.2	5	Metodología para el estudio de transito	25 días	mié 5/10/22	vie 4/11/22	$ 10.788.228,00
20		**1.2.3.2**	**5**	**Entrega a interventoria**	**0 días**	**vie 4/11/22**	**vie 4/11/22**	**$ 0,00**
21		**1.2.3.2**	**5**	**Aprobación interventoría y radicacion a SDM de los primeros CIVS**	**0 días**	**mié 9/11/22**	**mié 9/11/22**	**$ 0,00**
22		**1.2.3.2**	**5**	**Aprobacion SDM de los primeros CIVs de intervención**	**0 días**	**jue 24/11/22**	**jue 24/11/22**	**$ 0,00**
23		1.2.3.2	5	Elaboración del Informe de recopilación y análisis de información de transito 50% CIVS	23 días	vie 7/10/22	vie 4/11/22	$ 5.394.114,00
24		**1.2.3.2**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**vie 4/11/22**	**vie 4/11/22**	**$ 0,00**
25		1.2.3.2	5	Elaboración del Informe de recopilación y análisis de información de transito saldo al 100% CIVs	21 días	vie 4/11/22	jue 1/12/22	$ 5.394.114,00
26		**1.2.3.2**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**jue 1/12/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
27		**1.2.3.3**	**4**	**GEOTECNIA Y PAVIMENTOS**	**46 días**	**mié 5/10/22**	**jue 1/12/22**	**$ 43.152.910,00**
28		1.2.3.3	5	Exploración del subsuelo Priorización 50% CIVS	25 días	mié 5/10/22	vie 4/11/22	$ 12.945.873,00
29		1.2.3.3	5	Elaboración de Informe de investigación y recopilación de información pavimentos del 50% de los CIVs	25 días	mié 5/10/22	vie 4/11/22	$ 8.630.582,00
30		**1.2.3.3**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**vie 4/11/22**	**vie 4/11/22**	**$ 0,00**
31		1.2.3.3	5	Exploración del subsuelo Priorización hasta el 100% CIVS	20 días	vie 4/11/22	mié 30/11/22	$ 12.945.873,00

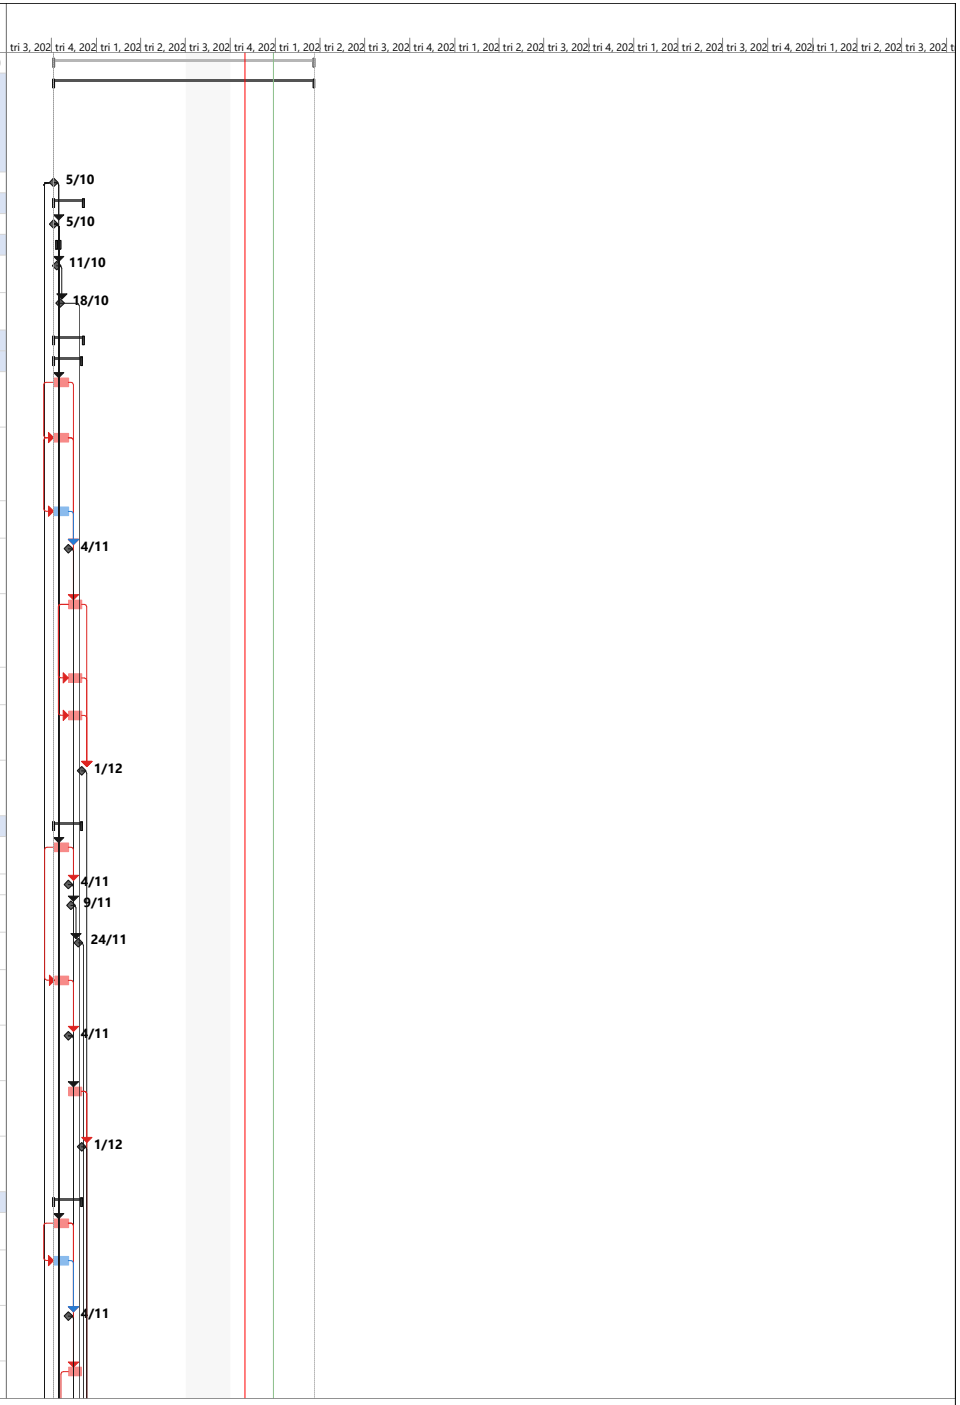


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
32		1.2.3.3	5	Elaboración del informe de Analisis de los resultados de los ensayos de laboratorio y propuesta de alternativas de diseño del 100% de los CIVS	18 días	mié 9/11/22	jue 1/12/22	$ 8.630.582,00
33		**1.2.3.3**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**jue 1/12/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
34		**1.2.3.4**	**4**	**DISEÑO GEOMETRICO**	**46 días**	**mié 5/10/22**	**jue 1/12/22**	**$ 21.576.456,00**
35		1.2.3.4	5	Elaboración del Informe de recopilación y análisis de información del 50% de CIVS	25 días	mié 5/10/22	vie 4/11/22	$ 10.788.228,00
36		**1.2.3.4**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**vie 4/11/22**	**vie 4/11/22**	**$ 0,00**
37		1.2.3.4	5	Elaboración del Informe de recopilación y análisis de información del saldo al 100% de CIVS	21 días	vie 4/11/22	jue 1/12/22	$ 10.788.228,00
38		**1.2.3.4**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**jue 1/12/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
39		**1.2.3.5**	**4**	**DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO**	**46 días**	**mié 5/10/22**	**jue 1/12/22**	**$ 12.945.873,00**
40		**1.2.3.5**	**5**	**Notificación a entidades de servicios publicos**	**0 días**	**mié 5/10/22**	**mié 5/10/22**	**$ 0,00**
41		1.2.3.5	5	Elaboración del informe de Recopilación y análisis de informacion existente del 50% de los CIVS	23 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 6.472.937,00
42		**1.2.3.5**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**mié 2/11/22**	**mié 2/11/22**	**$ 0,00**
43		1.2.3.5	5	Elaboración del informe de Recopilación y análisis de informacion del saldo al 100% de los CIVS	23 días	mié 2/11/22	jue 1/12/22	$ 6.472.936,00
44		**1.2.3.5**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**jue 1/12/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
45		**1.2.3.6**	**4**	**DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, Y OTROS OPERADORES**	**46 días**	**mié 5/10/22**	**jue 1/12/22**	**$ 12.945.873,00**
46		**1.2.3.6**	**5**	**Notificación a entidades de servicios publicos**	**0 días**	**mié 5/10/22**	**mié 5/10/22**	**$ 0,00**
47		1.2.3.6	5	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion existente 50% CIVS	23 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 6.472.936,00
48		**1.2.3.6**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**mié 2/11/22**	**mié 2/11/22**	**$ 0,00**
49		1.2.3.6	5	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion saldo al 100% CIVS	23 días	mié 2/11/22	jue 1/12/22	$ 6.472.937,00
50		**1.2.3.6**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**jue 1/12/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
51		**1.2.3.7**	**4**	**URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO**	**46 días**	**mié 5/10/22**	**jue 1/12/22**	**$ 12.945.873,00**
52		1.2.3.7	5	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion existente 50% CIVS	23 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 6.472.936,00
53		**1.2.3.7**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**mié 2/11/22**	**mié 2/11/22**	**$ 0,00**
54		1.2.3.7	5	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion saldo al 100% CIVS	23 días	mié 2/11/22	jue 1/12/22	$ 6.472.937,00
55		**1.2.3.7**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**jue 1/12/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
56		**1.2.3.8**	**4**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES**	**46 días**	**mié 5/10/22**	**jue 1/12/22**	**$ 8.630.582,00**
57		1.2.3.8	5	Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion existente 50% CIVS	23 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 4.315.291,00
58		**1.2.3.8**	**5**	**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**mié 2/11/22**	**mié 2/11/22**	**$ 0,00**

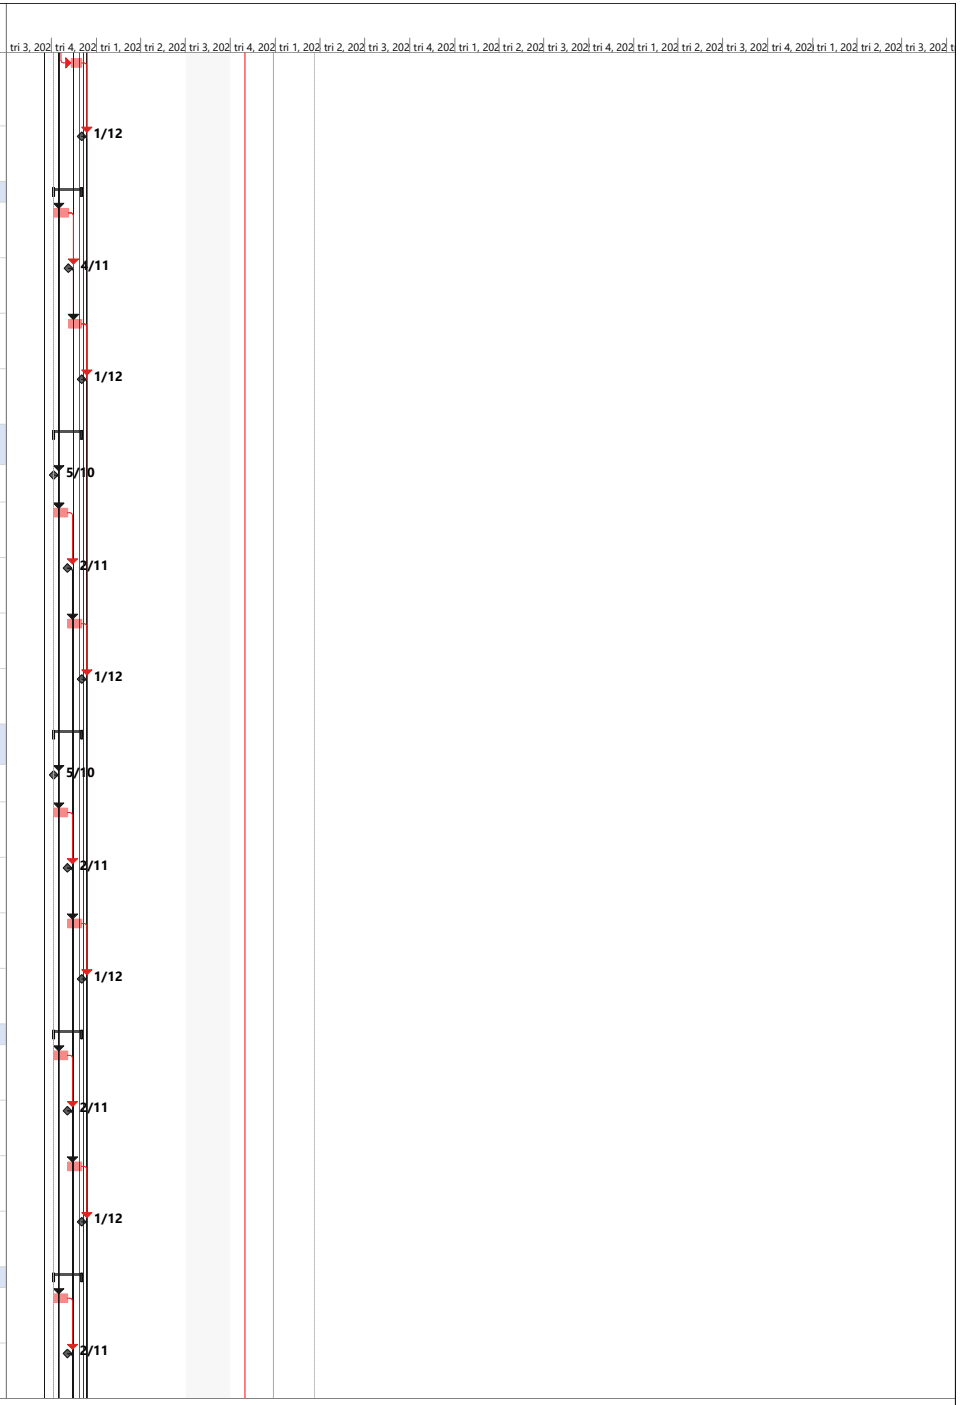


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
59		1.2.3.85		Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion saldo al 100% CIVS	23 días	mié 2/11/22	jue 1/12/22	$ 4.315.291,00
60		**1.2.3.85**		**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**jue 1/12/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
61		**1.2.3.94**		**ESTUDIOS FORESTALES**	**46 días**	**mié 5/10/22**	**jue 1/12/22**	**$ 12.945.874,00**
62		1.2.3.95		Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion existente 50% CIVS	23 días	mié 5/10/22	mié 2/11/22	$ 6.472.937,00
63		**1.2.3.95**		**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**mié 2/11/22**	**mié 2/11/22**	**$ 0,00**
64		1.2.3.95		Elaboración de informe de Recopilación y análisis de informacion saldo al 100% CIVS	23 días	mié 2/11/22	jue 1/12/22	$ 6.472.937,00
65		**1.2.3.95**		**Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**jue 1/12/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
66		**1.2.3.14**		**ESTUDIOS SOCIALES**	**46 días**	**mié 5/10/22**	**jue 1/12/22**	**$ 12.945.874,00**
67		1.2.3.15		Plan de Gestion social, Plan de dialogo ciudadano, comunicación estrategica con la propuesta metodologica y cronograma	5 días	mié 5/10/22	mar 11/10/22	$ 6.472.937,00
68		**1.2.3.15**		**Entrega a interventoria**	**0 días**	**mar 11/10/22**	**mar 11/10/22**	**$ 0,00**
69		**1.2.3.15**		**Aprobacion de interventoria**	**0 días**	**vie 14/10/22**	**vie 14/10/22**	**$ 0,00**
70		1.2.3.15		Elaboración de Actas de Vecindad (Programa de Acompañamiento Técnico)	38 días	vie 14/10/22	jue 1/12/22	$ 6.472.937,00
71		**1.2.3.15**		**Entrega a interventoria**	**0 días**	**jue 1/12/22**	**jue 1/12/22**	**$ 0,00**
72		**1.2.3.14**		**ESTUDIOS AMBIENTALES Y SST**	**25 días**	**mié 5/10/22**	**vie 4/11/22**	**$ 12.945.872,00**
73		**1.2.3.15**		**ENTREGA DE INFORMACION SST**	**13 días**	**mié 5/10/22**	**vie 21/10/22**	**$ 6.472.936,00**
74		1.2.3.16		Elaboración de formatos y organización de Hojas de vida	5 días	mié 5/10/22	mar 11/10/22	$ 1.294.587,00
75		**1.2.3.16**		**Entrega a interventoria**	**0 días**	**mar 11/10/22**	**mar 11/10/22**	**$ 0,00**
76		**1.2.3.16**		**Aprobacion de interventoria**	**0 días**	**vie 14/10/22**	**vie 14/10/22**	**$ 0,00**
77		1.2.3.16		Documentos de ingreso (contrato laboral, con sus respectivos soportes)	5 días	mar 11/10/22	mar 18/10/22	$ 1.294.587,00
78		**1.2.3.16**		**Entrega a interventoria**	**0 días**	**mar 18/10/22**	**mar 18/10/22**	**$ 0,00**
79		**1.2.3.16**		**Aprobacion de interventoria**	**0 días**	**vie 21/10/22**	**vie 21/10/22**	**$ 0,00**
80		1.2.3.16		Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y cronograma	5 días	mar 11/10/22	mar 18/10/22	$ 3.883.762,00
81		**1.2.3.16**		**Aprobacion de interventoria**	**0 días**	**vie 21/10/22**	**vie 21/10/22**	**$ 0,00**
82		**1.2.3.15**		**ESTUDIOS AMBIENTALES**	**22 días**	**mié 5/10/22**	**mar 1/11/22**	**$ 6.472.936,00**
83		1.2.3.16		Elaboración del MAO	5 días	mié 5/10/22	mar 11/10/22	$ 2.589.175,00
84		**1.2.3.16**		**Entrega a interventoria**	**0 días**	**mar 11/10/22**	**mar 11/10/22**	**$ 0,00**
85		1.2.3.16		Elaboración Plan de Gestión de RCD de obras	5 días	mié 5/10/22	mar 11/10/22	$ 1.294.587,00
86		**1.2.3.16**		**Entrega a interventoria**	**0 días**	**mar 11/10/22**	**mar 11/10/22**	**$ 0,00**
87		1.2.3.16		Elaboración de listado de Permisos Ambientales (según lo indicado en el MAO)	5 días	mié 5/10/22	mar 11/10/22	$ 1.294.587,00
88		**1.2.3.16**		**Entrega a interventoria**	**0 días**	**mar 11/10/22**	**mar 11/10/22**	**$ 0,00**
89		**1.2.3.16**		**Capacitación en orden y aseo**	**0 días**	**mar 1/11/22**	**mar 1/11/22**	**$ 0,00**
90		1.2.3.16		Elaboración del Inventario de sumideros	5 días	mié 26/10/22	mar 1/11/22	$ 1.294.587,00
91		**1.2.3.16**		**Entrega a interventoria**	**0 días**	**mar 1/11/22**	**mar 1/11/22**	**$ 0,00**
92		**1.2.3.15**		**Aprobación de formatos y planes por parte de la Interventoría para el contrato**	**0 días**	**vie 4/11/22**	**vie 4/11/22**	**$ 0,00**
93		**1.2.3.14**		**ENTREGA FINAL DE INFORMES DE RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION Y CONCEPTO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS**	**23 días**	**vie 4/11/22**	**lun 5/12/22**	**$ 0,00**
94		**1.2.3.15**		**Entrega a interventoria de concepto de revisión e informes de los estudios y diseños del 50% de los CIV's priorizados**	**0 días**	**vie 4/11/22**	**vie 4/11/22**	**$ 0,00**

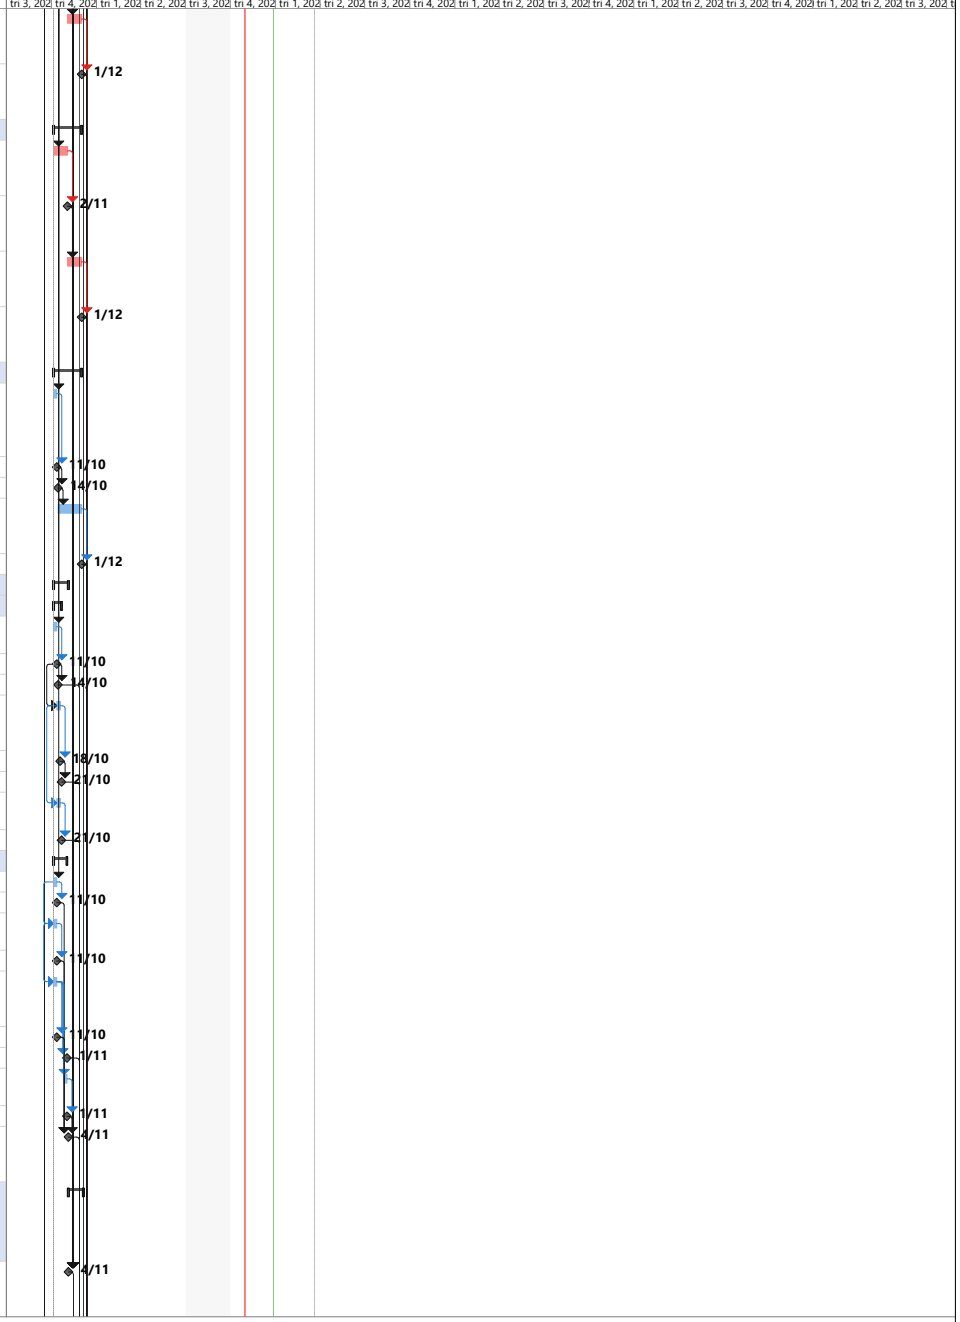


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
95		1.2.3.1	5	Aprobacion de interventoria de la revisión de información y los conceptos 50% de los CIVS	0 días	vie 4/11/22	vie 4/11/22	$ 0,00
96		1.2.3.1	5	Entrega a interventoria de concepto de revisión y concepto de los estudios y diseños del 100% de los CIV's priorizados	0 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22	$ 0,00
97		1.2.3.1	5	Aprobacion de interventoria de la revisión de información, los conceptos y/o alternativas del 100% de los CIVS	0 días	lun 5/12/22	lun 5/12/22	$ 0,00
98		1.2.4	3	FIN DE LOS PRELIMINARES	0 días	lun 5/12/22	lun 5/12/22	$ 0,00
99		1.3	2	FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA	318 días	lun 31/10/22	mar 19/03/24	$ 17.252.186.054,50
100		1.3.1	3	INICIO DE OBRA	0 días	lun 5/12/22	lun 5/12/22	$ 0,00
101		1.3.2	3	FRENTE 1	290 días	lun 5/12/22	mar 19/03/24	$ 744.950.669,68
102		1.3.2.1	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	lun 5/12/22	jue 22/12/22	$ 0,00
103		1.3.2.2	4	Inicio de actividades de obra	0 días	vie 16/12/22	vie 16/12/22	$ 0,00
104		1.3.2.3	4	P28-CIV8000929	280 días	vie 16/12/22	mar 19/03/24	$ 413.417.421,27
105		1.3.2.3	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	7 días	vie 16/12/22	lun 26/12/22	$ 357.341,50
106		1.3.2.3	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	20 días	lun 16/01/23	mié 8/02/23	$ 59.154.828,31
107		1.3.2.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	25 días	mié 8/02/23	jue 9/03/23	$ 24.632.163,63
108		1.3.2.3	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 19.611.760,00
109		1.3.2.3	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	15 días	jue 9/03/23	mar 28/03/23	$ 39.347.817,93
110		1.3.2.3	5	MONOBLOCK	45 días	mié 7/06/23	vie 1/12/23	$ 142.356.385,20
111		1.3.2.3	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 8.383.452,00
112		1.3.2.3	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	20 días	mar 28/03/23	vie 21/04/23	$ 18.124.924,28
113		1.3.2.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	15 días	vie 21/04/23	mié 10/05/23	$ 10.660.929,15
114		1.3.2.3	5	ACABADOS EN ANDEN	15 días	mié 10/05/23	lun 29/05/23	$ 42.901.962,10
115		1.3.2.3	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	5 días	lun 19/06/23	sáb 24/06/23	$ 23.127.107,16
116		1.3.2.3	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	5 días	sáb 24/06/23	vie 30/06/23	$ 12.662.904,01
117		1.3.2.3	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	mar 7/11/23	jue 16/11/23	$ 12.095.846,00
118		1.3.2.4	4	P29-CIV8000996	280 días	vie 16/12/22	mar 19/03/24	$ 331.533.248,41
119		1.3.2.4	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	7 días	vie 16/12/22	lun 26/12/22	$ 353.038,00
120		1.3.2.4	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	20 días	lun 16/01/23	mié 8/02/23	$ 51.622.682,52
121		1.3.2.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	20 días	mié 8/02/23	jue 2/03/23	$ 38.031.005,30
122		1.3.2.4	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 22.063.230,00
123		1.3.2.4	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	25 días	mié 15/03/23	sáb 15/04/23	$ 39.533.991,61
124		1.3.2.4	5	MONOBLOCK	55 días	lun 29/05/23	lun 4/12/23	$ 41.082.750,00
125		1.3.2.4	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 12.972.096,00
126		1.3.2.4	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	20 días	sáb 15/04/23	mié 10/05/23	$ 18.276.834,66
127		1.3.2.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	15 días	mié 10/05/23	lun 29/05/23	$ 17.782.225,26
128		1.3.2.4	5	ACABADOS EN ANDEN	15 días	lun 29/05/23	jue 15/06/23	$ 43.213.948,00
129		1.3.2.4	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 22.756.434,88
130		1.3.2.4	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 12.451.550,18
131		1.3.2.4	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	mar 7/11/23	jue 16/11/23	$ 11.393.462,00
132		1.3.2.5	4	Fin de actividades de obra	0 días	mar 19/03/24	mar 19/03/24	$ 0,00
133		1.3.3	3	FRENTE 2	318 días	lun 31/10/22	mar 19/03/24	$ 789.227.678,64
134		1.3.3.1	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	mar 27/12/22	jue 12/01/23	$ 0,00
135		1.3.3.2	4	Inicio de actividades de obra	0 días	mar 27/12/22	mar 27/12/22	$ 0,00
136		1.3.3.3	4	P24-CIV8000871	315 días	lun 31/10/22	vie 15/03/24	$ 356.268.173,88
137		1.3.3.3	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	7 días	mar 27/12/22	mié 4/01/23	$ 356.986,65
138		1.3.3.3	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	20 días	jue 26/01/23	lun 20/02/23	$ 57.776.256,61
139		1.3.3.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	25 días	lun 20/02/23	mié 22/03/23	$ 26.104.184,02
140		1.3.3.3	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	15 días	mié 22/03/23	lun 10/04/23	$ 37.981.179,70
141		1.3.3.3	5	MONOBLOCK	25 días	lun 31/10/22	mié 30/11/22	$ 114.961.342,00

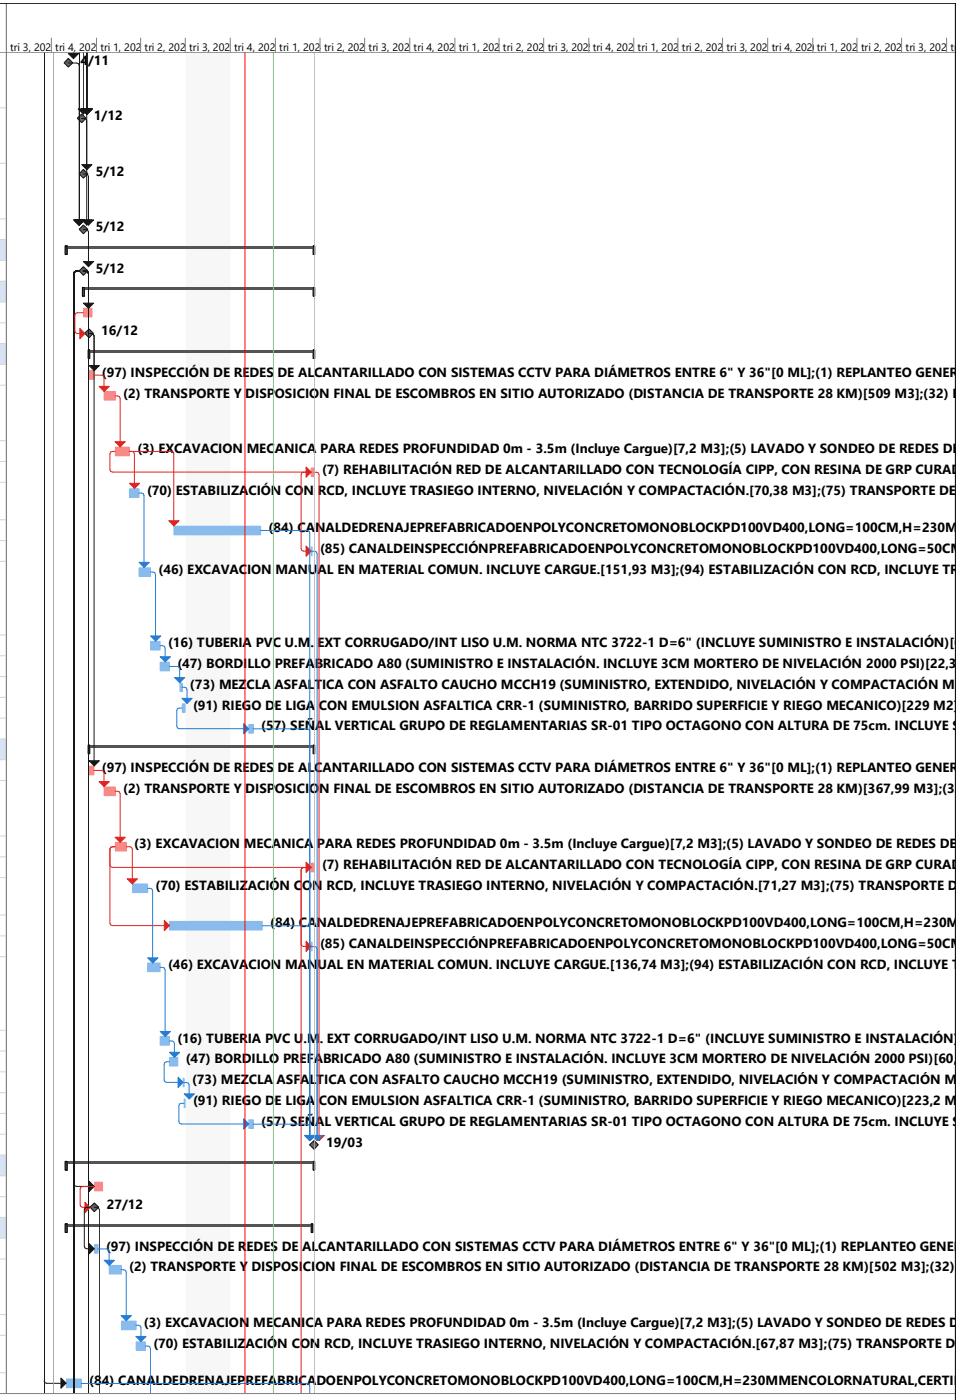


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
142		1.3.3.3	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.683.966,00
143		1.3.3.3	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	20 días	lun 10/04/23	jue 4/05/23	$ 16.337.959,22
144		1.3.3.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	15 días	jue 4/05/23	mar 23/05/23	$ 8.046.480,00
145		1.3.3.3	5	ACABADOS EN ANDEN	15 días	mar 23/05/23	vie 9/06/23	$ 43.573.845,73
146		1.3.3.3	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 22.316.071,44
147		1.3.3.3	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 12.189.612,51
148		1.3.3.3	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	jue 11/01/24	vie 19/01/24	$ 10.940.290,00
149		**1.3.3.4**	**4**	**P25-CIV8000923**	**272 días**	**mar 27/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 432.959.504,76**
150		1.3.3.4	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	7 días	mar 27/12/22	mié 4/01/23	$ 1.283.071,25
151		1.3.3.4	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	25 días	jue 26/01/23	vie 24/02/23	$ 53.111.086,42
152		1.3.3.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	25 días	vie 24/02/23	mar 28/03/23	$ 26.567.907,90
153		1.3.3.4	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 58.008.373,00
154		1.3.3.4	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	7 días	mar 28/03/23	mié 5/04/23	$ 39.066.126,02
155		1.3.3.4	5	MONOBLOCK	65 días	sáb 3/06/23	jue 21/12/23	$ 130.921.400,65
156		1.3.3.4	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.683.966,00
157		1.3.3.4	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	20 días	mié 5/04/23	sáb 29/04/23	$ 17.744.117,78
158		1.3.3.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	15 días	sáb 29/04/23	jue 18/05/23	$ 9.509.429,50
159		1.3.3.4	5	ACABADOS EN ANDEN	15 días	jue 18/05/23	mar 6/06/23	$ 43.892.430,94
160		1.3.3.4	5	PAVIMENTOS 1 (Grano caucho)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 22.727.911,50
161		1.3.3.4	5	PAVIMENTOS 2 (MD 13)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 12.449.817,80
162		1.3.3.4	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	jue 11/01/24	vie 19/01/24	$ 11.993.866,00
163		**1.3.3.5**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
164		**1.3.4**	**3**	**FRENTE 3**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 841.792.563,97**
165		1.3.4.1	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	lun 30/01/23	jue 16/02/23	$ 0,00
166		**1.3.4.2**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**lun 30/01/23**	**lun 30/01/23**	**$ 0,00**
167		**1.3.4.3**	**4**	**P13-CIV8000772**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 343.830.885,72**
168		1.3.4.3	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	15 días	lun 30/01/23	jue 16/02/23	$ 1.051.305,10
169		1.3.4.3	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	20 días	jue 16/02/23	vie 10/03/23	$ 43.550.281,61
170		1.3.4.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	25 días	vie 10/03/23	mié 12/04/23	$ 21.133.126,03
171		1.3.4.3	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 12.257.350,00
172		1.3.4.3	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	7 días	mié 12/04/23	jue 20/04/23	$ 36.568.024,95
173		1.3.4.3	5	MONOBLOCK	25 días	lun 31/10/22	mié 30/11/22	$ 117.651.926,60
174		1.3.4.3	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.683.966,00
175		1.3.4.3	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	20 días	jue 20/04/23	lun 15/05/23	$ 14.588.124,29
176		1.3.4.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	7 días	lun 15/05/23	mié 24/05/23	$ 3.828.943,00
177		1.3.4.3	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mié 24/05/23	jue 1/06/23	$ 41.822.351,02
178		1.3.4.3	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 20.893.159,12
179		1.3.4.3	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 11.430.673,00
180		1.3.4.3	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	jue 11/01/24	vie 19/01/24	$ 13.371.655,00
181		**1.3.4.4**	**4**	**P14-CIV8000814**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 497.961.678,25**
182		1.3.4.4	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	15 días	lun 30/01/23	jue 16/02/23	$ 1.268.574,84
183		1.3.4.4	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	25 días	lun 6/03/23	mié 5/04/23	$ 53.443.661,21
184		1.3.4.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	25 días	jue 20/04/23	sáb 20/05/23	$ 39.196.309,47
185		1.3.4.4	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 85.801.450,00
186		1.3.4.4	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	15 días	sáb 20/05/23	jue 8/06/23	$ 40.011.103,22
187		1.3.4.4	5	MONOBLOCK	25 días	lun 31/10/22	mié 30/11/22	$ 146.514.561,40
188		1.3.4.4	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 11.082.938,00

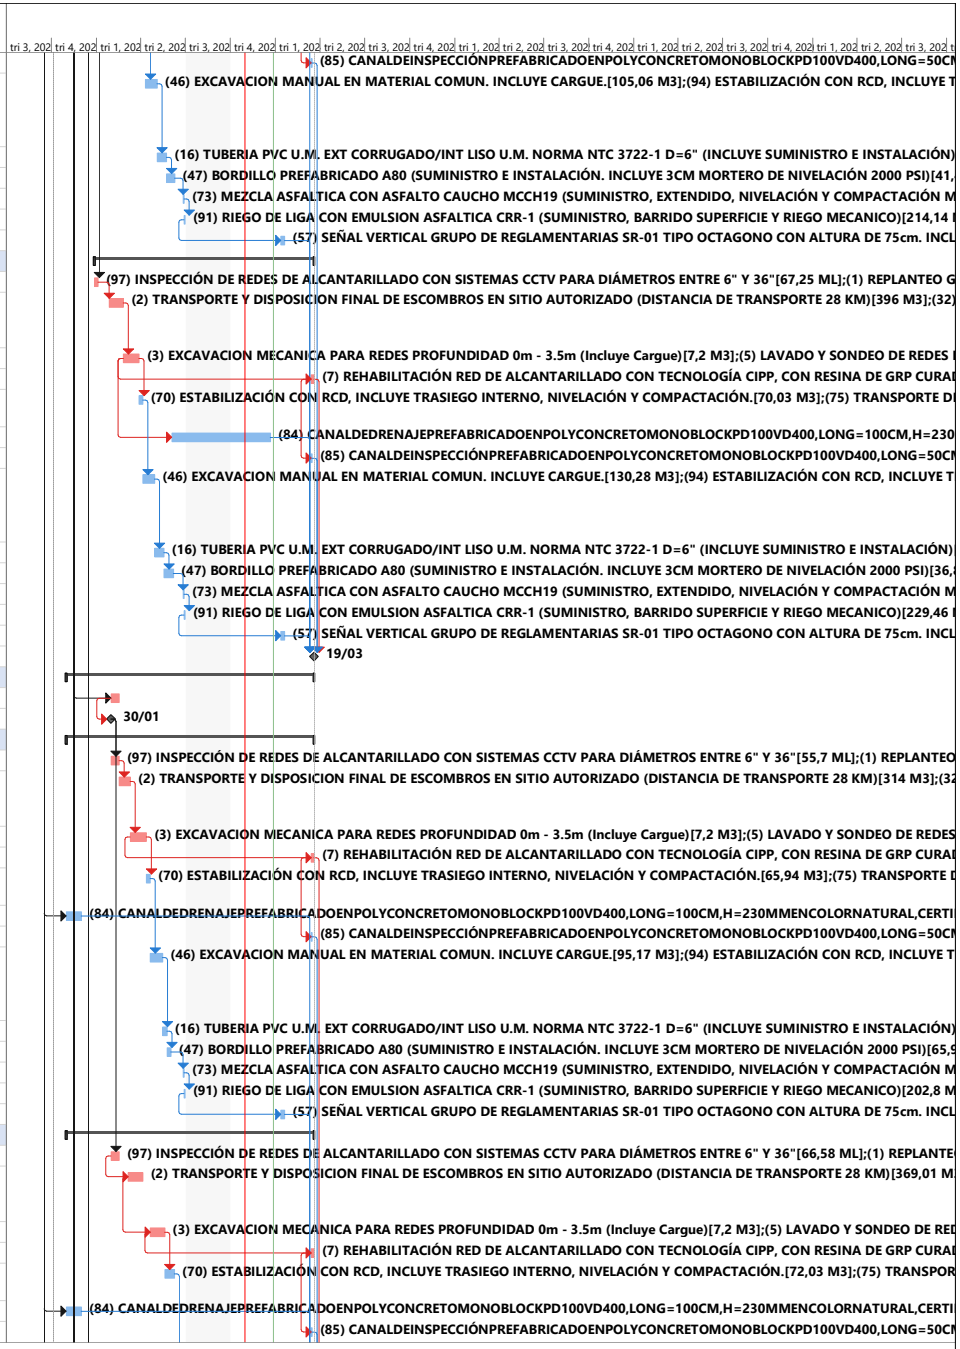


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
189		1.3.4.4	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	27 días	jue 8/06/23	vie 10/11/23	$ 17.876.378,04
190		1.3.4.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	12 días	jue 8/06/23	jue 22/06/23	$ 9.737.630,68
191		1.3.4.4	5	ACABADOS EN ANDEN	12 días	jue 8/06/23	jue 22/06/23	$ 42.554.005,78
192		1.3.4.4	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 23.057.477,68
193		1.3.4.4	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 12.641.164,93
194		1.3.4.4	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	jue 11/01/24	vie 19/01/24	$ 14.776.423,00
195		**1.3.4.5**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
196		**1.3.5**	**3**	**FRENTE 4**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 1.009.052.437,81**
197		1.3.5.1	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	vie 27/01/23	mié 15/02/23	$ 0,00
198		**1.3.5.2**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**vie 27/01/23**	**vie 27/01/23**	**$ 0,00**
199		**1.3.5.3**	**4**	**P17-CIV8000794**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 464.224.364,42**
200		1.3.5.3	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	7 días	vie 27/01/23	lun 6/02/23	$ 310.758,00
201		1.3.5.3	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	25 días	lun 6/02/23	mar 7/03/23	$ 52.969.651,12
202		1.3.5.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	25 días	lun 13/03/23	jue 13/04/23	$ 78.313.848,70
203		1.3.5.3	5	SUMIDERO	112 días	vie 31/03/23	vie 15/12/23	$ 7.012.796,00
204		1.3.5.3	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 15.934.555,00
205		1.3.5.3	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	7 días	jue 13/04/23	vie 21/04/23	$ 38.101.168,32
206		1.3.5.3	5	MONOBLOCK	20 días	lun 31/10/22	jue 24/11/22	$ 160.089.783,70
207		1.3.5.3	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.683.966,00
208		1.3.5.3	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	20 días	vie 21/04/23	mar 16/05/23	$ 15.033.422,93
209		1.3.5.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	12 días	mar 16/05/23	mié 31/05/23	$ 6.109.700,00
210		1.3.5.3	5	ACABADOS EN ANDEN	12 días	mié 31/05/23	mié 14/06/23	$ 42.041.816,39
211		1.3.5.3	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	$ 21.270.410,60
212		1.3.5.3	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 15/12/23	lun 18/12/23	$ 11.641.369,66
213		1.3.5.3	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	jue 11/01/24	vie 19/01/24	$ 9.711.118,00
214		**1.3.5.4**	**4**	**P18-CIV8000839**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 544.828.073,39**
215		1.3.5.4	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	7 días	vie 27/01/23	lun 6/02/23	$ 1.250.701,85
216		1.3.5.4	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	20 días	lun 6/02/23	mié 1/03/23	$ 53.920.733,55
217		1.3.5.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	20 días	lun 13/03/23	vie 7/04/23	$ 24.515.185,59
218		1.3.5.4	5	SUMIDERO	116,88 días	vie 24/03/23	vie 15/12/23	$ 14.025.592,00
219		1.3.5.4	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 80.364.982,96
220		1.3.5.4	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	7 días	vie 7/04/23	sáb 15/04/23	$ 40.016.764,72
221		1.3.5.4	5	MONOBLOCK	20 días	lun 31/10/22	jue 24/11/22	$ 197.757.968,10
222		1.3.5.4	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 10.797.944,00
223		1.3.5.4	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	20 días	sáb 15/04/23	mié 10/05/23	$ 17.519.191,75
224		1.3.5.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	12 días	mié 10/05/23	jue 25/05/23	$ 15.333.024,03
225		1.3.5.4	5	ACABADOS EN ANDEN	12 días	jue 25/05/23	jue 8/06/23	$ 42.389.401,09
226		1.3.5.4	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	$ 22.923.655,44
227		1.3.5.4	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 15/12/23	lun 18/12/23	$ 12.545.850,31
228		1.3.5.4	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	jue 11/01/24	vie 19/01/24	$ 11.467.078,00
229		**1.3.5.5**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
230		**1.3.6**	**3**	**FRENTE 5**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 945.592.869,24**
231		1.3.6.1	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	mar 3/01/23	jue 19/01/23	$ 0,00
232		**1.3.6.2**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**mar 3/01/23**	**mar 3/01/23**	**$ 0,00**
233		**1.3.6.3**	**4**	**P22-CIV8000864**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 509.014.911,97**
234		1.3.6.3	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	7 días	mar 3/01/23	mié 11/01/23	$ 1.273.966,57
235		1.3.6.3	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	15 días	mié 11/01/23	vie 27/01/23	$ 61.917.808,34
236		1.3.6.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	25 días	vie 27/01/23	lun 27/02/23	$ 27.868.125,50
237		1.3.6.3	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 97.411.459,84
238		1.3.6.3	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	7 días	lun 27/02/23	mar 7/03/23	$ 38.303.589,02

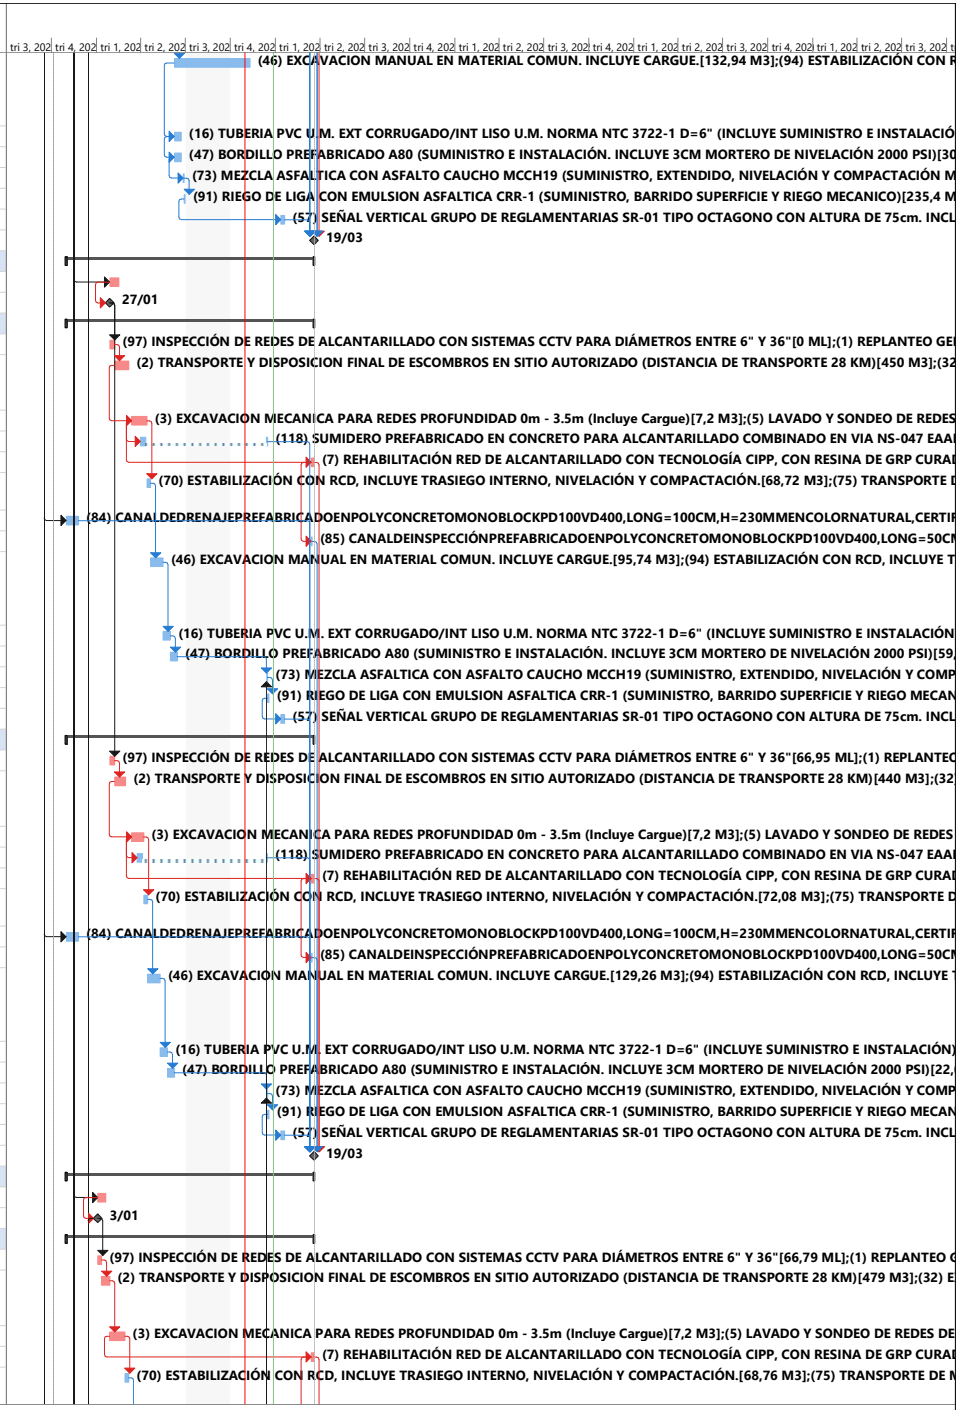


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
239		1.3.6.3	5	MONOBLOCK	25 días	lun 31/10/22	mié 30/11/22	$ 149.828.872,43
240		1.3.6.3	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	sáb 10/06/23	mar 13/06/23	$ 8.383.452,00
241		1.3.6.3	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	20 días	mar 7/03/23	vie 31/03/23	$ 17.858.174,32
242		1.3.6.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	15 días	vie 31/03/23	mié 19/04/23	$ 22.071.028,83
243		1.3.6.3	5	ACABADOS EN ANDEN	15 días	mié 19/04/23	lun 8/05/23	$ 38.362.591,26
244		1.3.6.3	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 22.599.268,16
245		1.3.6.3	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 12.371.881,70
246		1.3.6.3	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	jue 11/01/24	vie 19/01/24	$ 10.764.694,00
247		**1.3.6.4**	**4**	**P21-CIV8000821**	**249 días**	**lun 23/01/23**	**mar 19/03/24**	**$ 436.577.957,27**
248		1.3.6.4	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	7 días	lun 23/01/23	mar 31/01/23	$ 315.393,70
249		1.3.6.4	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	15 días	mar 31/01/23	jue 16/02/23	$ 59.881.493,96
250		1.3.6.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	15 días	jue 16/02/23	mar 7/03/23	$ 25.632.895,69
251		1.3.6.4	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 86.675.470,18
252		1.3.6.4	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	7 días	mar 7/03/23	mié 15/03/23	$ 38.421.613,07
253		1.3.6.4	5	MONOBLOCK	55 días	mié 31/05/23	mié 6/12/23	$ 105.177.398,00
254		1.3.6.4	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.683.966,00
255		1.3.6.4	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	20 días	mar 7/03/23	vie 31/03/23	$ 15.676.754,16
256		1.3.6.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	15 días	vie 31/03/23	mié 19/04/23	$ 10.367.739,00
257		1.3.6.4	5	ACABADOS EN ANDEN	15 días	mié 19/04/23	lun 8/05/23	$ 43.730.776,81
258		1.3.6.4	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 21.573.226,00
259		1.3.6.4	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 11.798.556,70
260		1.3.6.4	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	jue 11/01/24	vie 19/01/24	$ 11.642.674,00
261		**1.3.6.5**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
262		**1.3.7**	**3**	**FRENTE 6**	**238 días**	**mié 1/02/23**	**vie 15/03/24**	**$ 392.160.112,77**
263		1.3.7.1	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	mié 1/02/23	vie 17/02/23	$ 0,00
264		**1.3.7.2**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**mié 1/02/23**	**mié 1/02/23**	**$ 0,00**
265		**1.3.7.3**	**4**	**P3-CIV8000957**	**238 días**	**mié 1/02/23**	**vie 15/03/24**	**$ 392.160.112,77**
266		1.3.7.3	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	7 días	mié 1/02/23	jue 9/02/23	$ 1.256.312,30
267		1.3.7.3	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	15 días	jue 9/02/23	lun 27/02/23	$ 55.970.007,89
268		1.3.7.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	15 días	lun 27/02/23	jue 16/03/23	$ 29.244.795,66
269		1.3.7.3	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	7 días	jue 16/03/23	vie 24/03/23	$ 40.118.108,12
270		1.3.7.3	5	MONOBLOCK	55 días	lun 5/06/23	lun 11/12/23	$ 129.637.258,00
271		1.3.7.3	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 8.383.452,00
272		1.3.7.3	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	20 días	vie 24/03/23	mié 19/04/23	$ 18.846.272,66
273		1.3.7.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	15 días	mié 19/04/23	lun 8/05/23	$ 20.188.256,75
274		1.3.7.3	5	ACABADOS EN ANDEN	15 días	lun 8/05/23	vie 26/05/23	$ 43.497.991,07
275		1.3.7.3	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 21.938.424,88
276		1.3.7.3	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 12.036.963,44
277		1.3.7.3	5	SEÑALIZACIÓN	7 días	jue 11/01/24	vie 19/01/24	$ 11.042.270,00
278		**1.3.7.4**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**vie 15/03/24**	**vie 15/03/24**	**$ 0,00**
279		**1.3.8**	**3**	**FRENTE 8**	**210 días**	**lun 6/03/23**	**vie 15/03/24**	**$ 546.876.785,75**
280		1.3.8.1	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	lun 6/03/23	vie 24/03/23	$ 0,00
281		**1.3.8.2**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**vie 24/03/23**	**vie 24/03/23**	**$ 0,00**
282		**1.3.8.3**	**4**	**P32-CIV8000979**	**195 días**	**vie 24/03/23**	**vie 15/03/24**	**$ 172.409.437,80**
283		1.3.8.3	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23	$ 670.033,16
284		1.3.8.3	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mar 28/03/23	lun 3/04/23	$ 32.325.911,21
285		1.3.8.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	lun 3/04/23	sáb 15/04/23	$ 16.804.316,34
286		1.3.8.3	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	sáb 15/04/23	jue 27/04/23	$ 20.880.262,65
287		1.3.8.3	5	MONOBLOCK	55 días	lun 29/05/23	lun 4/12/23	$ 36.812.089,30
288		1.3.8.3	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.683.966,00

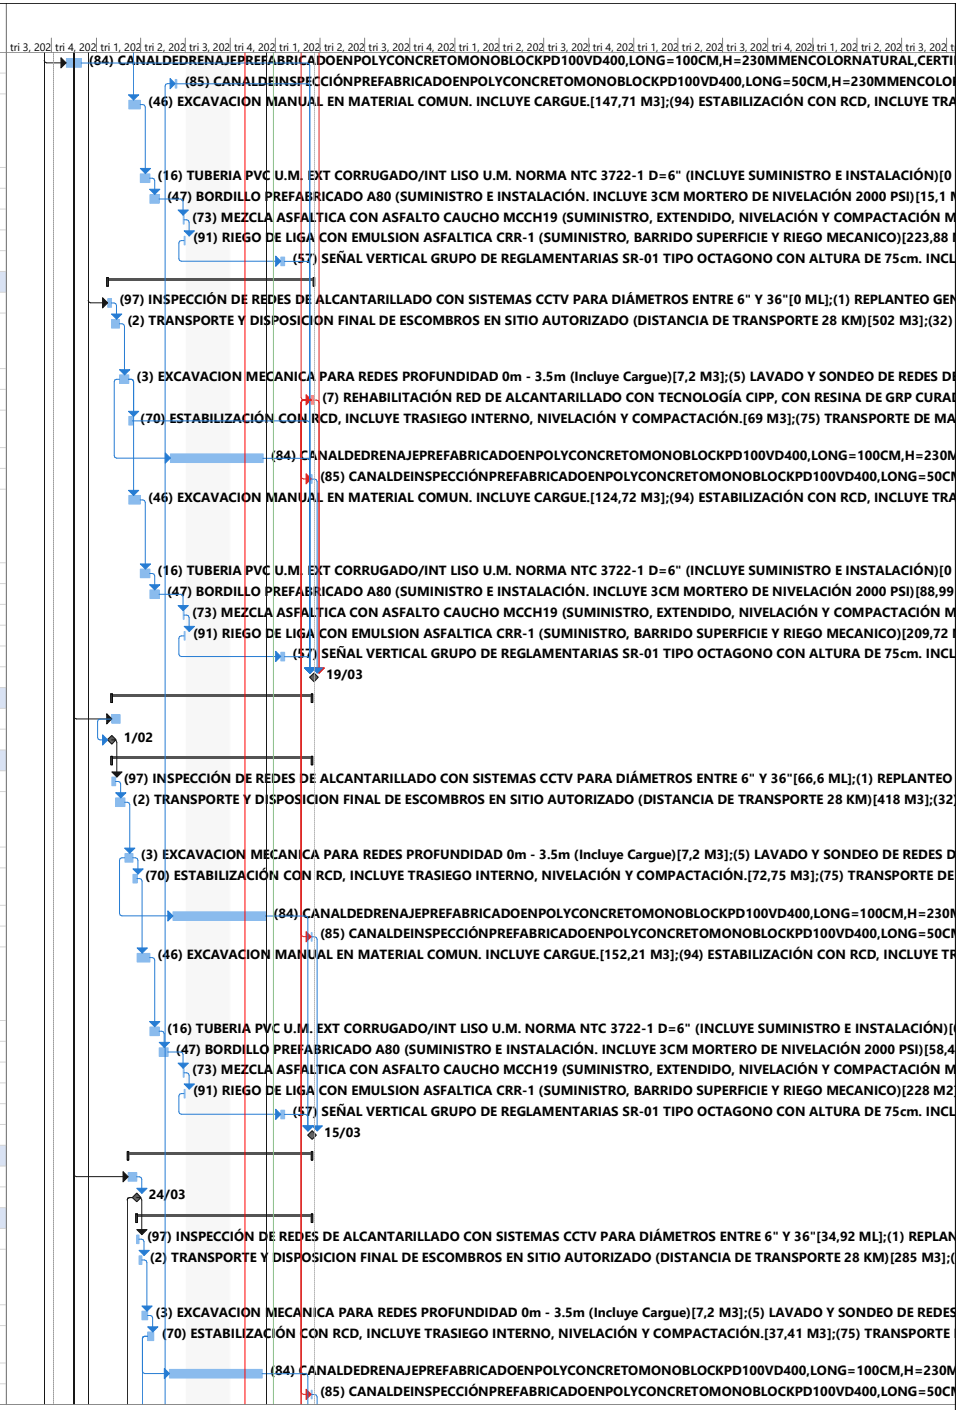


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
289		1.3.8.3	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	sáb 6/05/23	lun 15/05/23	$ 9.645.992,66
290		1.3.8.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	lun 15/05/23	sáb 20/05/23	$ 2.646.258,00
291		1.3.8.3	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	sáb 20/05/23	mar 30/05/23	$ 22.712.724,41
292		1.3.8.3	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 11.806.548,84
293		1.3.8.3	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 6.471.349,23
294		1.3.8.3	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 5.949.986,00
295		**1.3.8.4**	**4**	**P4-CIV8001069**	**189 días**	**vie 31/03/23**	**vie 15/03/24**	**$ 178.763.610,98**
296		1.3.8.4	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	vie 31/03/23	mar 4/04/23	$ 164.325,75
297		1.3.8.4	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mar 4/04/23	mar 11/04/23	$ 25.645.594,01
298		1.3.8.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mar 11/04/23	sáb 22/04/23	$ 27.046.639,88
299		1.3.8.4	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	sáb 22/04/23	vie 5/05/23	$ 19.861.251,02
300		1.3.8.4	5	MONOBLOCK	55 días	mar 30/05/23	mar 5/12/23	$ 46.473.734,00
301		1.3.8.4	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.398.972,00
302		1.3.8.4	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	sáb 13/05/23	mar 23/05/23	$ 8.124.425,59
303		1.3.8.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mar 23/05/23	lun 29/05/23	$ 3.040.528,00
304		1.3.8.4	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	lun 29/05/23	mar 6/06/23	$ 19.311.964,31
305		1.3.8.4	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 11.217.249,34
306		1.3.8.4	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 6.140.941,08
307		1.3.8.4	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 6.337.986,00
308		**1.3.8.5**	**4**	**P33-CIV8001041**	**188 días**	**vie 31/03/23**	**vie 15/03/24**	**$ 195.703.736,97**
309		1.3.8.5	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	vie 31/03/23	mié 5/04/23	$ 587.295,20
310		1.3.8.5	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mié 5/04/23	mié 12/04/23	$ 46.153.511,81
311		1.3.8.5	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mié 12/04/23	lun 24/04/23	$ 19.146.694,09
312		1.3.8.5	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	lun 24/04/23	sáb 6/05/23	$ 19.653.853,61
313		1.3.8.5	5	MONOBLOCK	25 días	mié 31/05/23	jue 29/06/23	$ 46.473.734,00
314		1.3.8.5	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.683.966,00
315		1.3.8.5	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	lun 15/05/23	mié 24/05/23	$ 9.445.232,82
316		1.3.8.5	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mié 24/05/23	mar 30/05/23	$ 2.638.684,00
317		1.3.8.5	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mar 30/05/23	mié 7/06/23	$ 23.143.155,46
318		1.3.8.5	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 11.486.049,62
319		1.3.8.5	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 6.293.170,36
320		1.3.8.5	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 4.998.390,00
321		**1.3.8.6**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**vie 15/03/24**	**vie 15/03/24**	**$ 0,00**
322		**1.3.9**	**3**	**FRENTE 11**	**181 días**	**vie 14/04/23**	**mar 19/03/24**	**$ 721.324.234,14**
323		1.3.9.1	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	vie 14/04/23	mié 3/05/23	$ 0,00
324		**1.3.9.2**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**vie 14/04/23**	**vie 14/04/23**	**$ 0,00**
325		**1.3.9.3**	**4**	**P30-CIV8001058**	**181 días**	**vie 14/04/23**	**mar 19/03/24**	**$ 357.708.529,48**
326		1.3.9.3	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	vie 14/04/23	mar 18/04/23	$ 1.250.111,66
327		1.3.9.3	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mar 18/04/23	lun 24/04/23	$ 55.877.395,27
328		1.3.9.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	lun 24/04/23	sáb 6/05/23	$ 20.459.304,74
329		1.3.9.3	5	SUMIDERO	92,88 días	lun 24/04/23	vie 15/12/23	$ 7.012.796,00
330		1.3.9.3	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 22.063.230,00
331		1.3.9.3	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	sáb 6/05/23	jue 18/05/23	$ 18.679.389,76
332		1.3.9.3	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23	$ 18.667.622,17
333		1.3.9.3	5	MONOBLOCK	60 días	mié 31/05/23	mar 12/12/23	$ 80.472.939,40
334		1.3.9.3	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.683.966,00
335		1.3.9.3	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	sáb 27/05/23	lun 5/06/23	$ 18.422.092,59

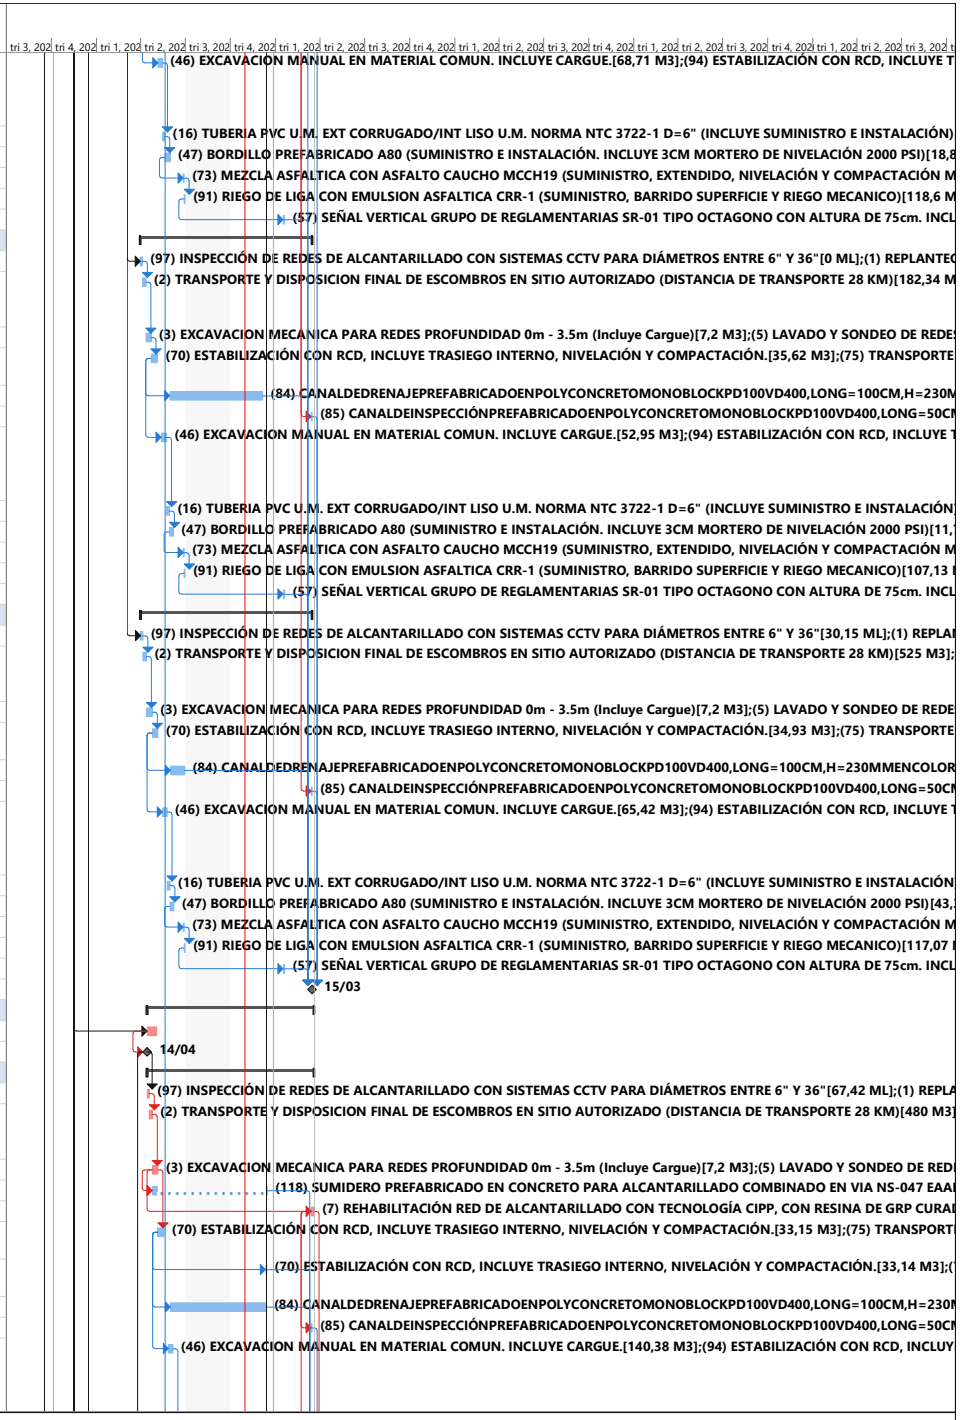


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
336		1.3.9.3	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	lun 5/06/23	sáb 10/06/23	$ 17.151.048,51
337		1.3.9.3	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	sáb 10/06/23	lun 19/06/23	$ 46.593.396,07
338		1.3.9.3	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	$ 22.529.499,20
339		1.3.9.3	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 15/12/23	lun 18/12/23	$ 12.330.256,11
340		1.3.9.3	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 10.515.482,00
341		**1.3.9.4**	**4**	**P31-CIV8001125**	**175 días**	**mar 18/04/23**	**vie 15/03/24**	**$ 363.615.704,66**
342		1.3.9.4	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 18/04/23	vie 21/04/23	$ 354.095,00
343		1.3.9.4	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	vie 21/04/23	jue 27/04/23	$ 64.369.612,14
344		1.3.9.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	jue 27/04/23	mié 10/05/23	$ 23.607.571,48
345		1.3.9.4	5	SUMIDERO	90,25 días	jue 27/04/23	vie 15/12/23	$ 7.012.796,00
346		1.3.9.4	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	mié 10/05/23	mar 23/05/23	$ 19.731.244,70
347		1.3.9.4	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23	$ 19.719.920,22
348		1.3.9.4	5	MONOBLOCK	60 días	jue 1/06/23	mié 13/12/23	$ 92.458.270,80
349		1.3.9.4	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.683.966,00
350		1.3.9.4	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	mié 31/05/23	jue 8/06/23	$ 17.223.510,79
351		1.3.9.4	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	jue 8/06/23	mié 14/06/23	$ 23.707.907,22
352		1.3.9.4	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mié 14/06/23	jue 22/06/23	$ 41.005.849,12
353		1.3.9.4	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	$ 23.798.045,40
354		1.3.9.4	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 15/12/23	lun 18/12/23	$ 13.022.665,79
355		1.3.9.4	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 11.920.250,00
356		**1.3.9.5**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
357		**1.3.10**	**3**	**FRENTE 12**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 341.139.272,02**
358		1.3.10.4		Tramite y Aprobación PMT	15 días	mié 7/06/23	sáb 24/06/23	$ 0,00
359		**1.3.10.4**		**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**mié 7/06/23**	**mié 7/06/23**	**$ 0,00**
360		**1.3.10.4**		**P12-CIV8000849**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 341.139.272,02**
361		1.3.10.5		ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mié 7/06/23	sáb 10/06/23	$ 320.422,00
362		1.3.10.5		EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	sáb 10/06/23	vie 16/06/23	$ 50.726.457,03
363		1.3.10.5		REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	vie 16/06/23	mié 28/06/23	$ 21.678.491,17
364		1.3.10.5		SUMIDERO	49,38 días	vie 16/06/23	vie 15/12/23	$ 14.025.592,00
365		1.3.10.5		REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 25.740.435,00
366		1.3.10.5		RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	mié 28/06/23	vie 10/11/23	$ 19.535.864,78
367		1.3.10.5		RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23	$ 19.524.540,30
368		1.3.10.5		MONOBLOCK	30 días	mié 31/05/23	vie 3/11/23	$ 73.379.580,00
369		1.3.10.5		COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 10.797.944,00
370		1.3.10.5		EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	lun 20/11/23	mar 28/11/23	$ 15.025.539,78
371		1.3.10.5		REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mar 28/11/23	lun 4/12/23	$ 6.128.582,01
372		1.3.10.5		ACABADOS EN ANDEN	7 días	lun 4/12/23	mar 12/12/23	$ 37.189.619,53
373		1.3.10.5		PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	$ 21.423.193,60
374		1.3.10.5		PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 15/12/23	lun 18/12/23	$ 11.744.567,82
375		1.3.10.5		SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 13.898.443,00
376		**1.3.10.4**		**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
377		**1.3.11**	**3**	**FRENTE 9**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 862.844.189,04**
378		1.3.11.4		Tramite y Aprobación PMT	15 días	vie 9/06/23	mar 27/06/23	$ 0,00
379		**1.3.11.4**		**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**vie 9/06/23**	**vie 9/06/23**	**$ 0,00**
380		**1.3.11.4**		**P15-CIV8000856**	**314 días**	**lun 31/10/22**	**jue 14/03/24**	**$ 418.575.237,68**
381		1.3.11.5		ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	vie 9/06/23	mar 13/06/23	$ 339.599,00
382		1.3.11.5		EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mar 13/06/23	lun 19/06/23	$ 52.517.422,34
383		1.3.11.5		REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	lun 19/06/23	vie 30/06/23	$ 19.230.139,23
384		1.3.11.5		SUMIDERO	47,13 días	lun 19/06/23	vie 15/12/23	$ 7.012.796,00
385		1.3.11.5		RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	vie 30/06/23	mar 14/11/23	$ 18.799.312,13

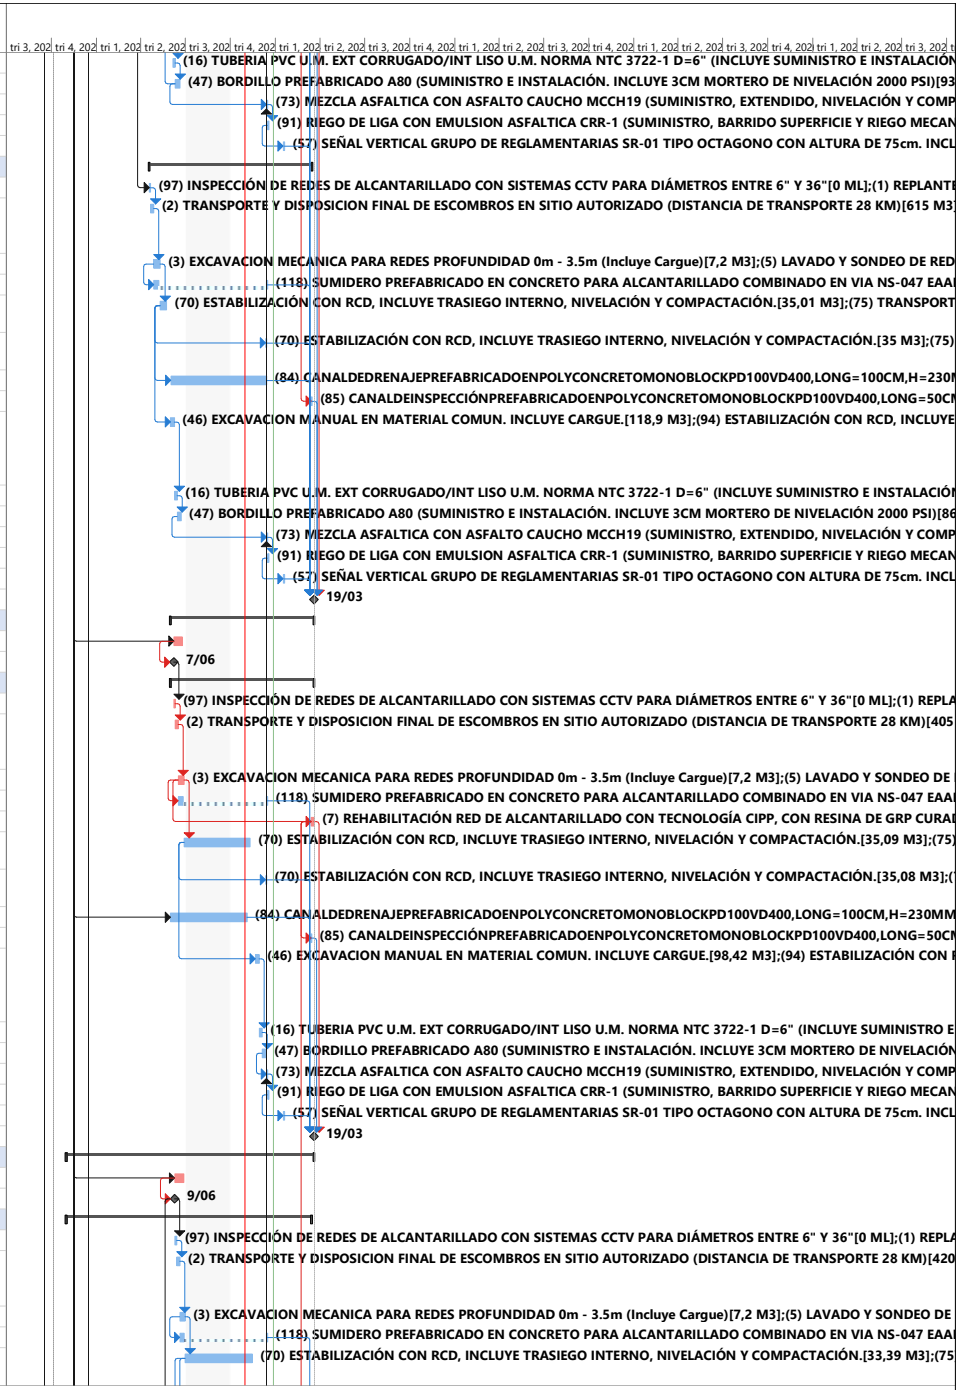


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
386		1.3.11.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23	$ 18.787.544,54
387		1.3.11.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	25 días	lun 31/10/22	mié 30/11/22	$ 127.215.731,86
388		1.3.11.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 54.521.027,94
389		1.3.11.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 8.383.452,00
390		1.3.11.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	vie 30/06/23	jue 9/11/23	$ 17.841.083,75
391		1.3.11.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	jue 9/11/23	jue 16/11/23	$ 8.208.755,00
392		1.3.11.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	jue 16/11/23	vie 24/11/23	$ 35.653.274,46
393		1.3.11.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	$ 22.697.542,16
394		1.3.11.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 15/12/23	lun 18/12/23	$ 12.415.538,27
395		1.3.11.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 14.952.019,00
396		**1.3.11.**	**4**	**P16-CIV8000907**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 444.268.951,36**
397		1.3.11.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mié 14/06/23	sáb 17/06/23	$ 1.138.325,56
398		1.3.11.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	sáb 17/06/23	vie 23/06/23	$ 46.807.634,72
399		1.3.11.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	5 días	vie 23/06/23	jue 29/06/23	$ 20.015.224,36
400		1.3.11.	5	SUMIDERO	43,75 días	vie 23/06/23	vie 15/12/23	$ 7.012.796,00
401		1.3.11.	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 53.004.402,00
402		1.3.11.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	jue 29/06/23	sáb 11/11/23	$ 18.140.599,00
403		1.3.11.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23	$ 18.130.730,42
404		1.3.11.	5	MONOBLOCK	25 días	lun 31/10/22	mié 30/11/22	$ 168.895.333,30
405		1.3.11.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.398.972,00
406		1.3.11.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	mar 21/11/23	mié 29/11/23	$ 15.766.618,81
407		1.3.11.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mié 29/11/23	mar 5/12/23	$ 8.615.568,30
408		1.3.11.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mar 5/12/23	mié 13/12/23	$ 33.766.049,81
409		1.3.11.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	$ 21.992.839,96
410		1.3.11.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 15/12/23	lun 18/12/23	$ 12.036.606,12
411		1.3.11.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 13.547.251,00
412		**1.3.11.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
413		**1.3.12**	**3**	**FRENTE 10**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 834.977.882,75**
414		1.3.12.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	sáb 17/06/23	vie 3/11/23	$ 0,00
415		**1.3.12.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**sáb 17/06/23**	**sáb 17/06/23**	**$ 0,00**
416		**1.3.12.**	**4**	**P26-CIV8000988**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 394.738.047,43**
417		1.3.12.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	sáb 17/06/23	mié 21/06/23	$ 355.907,00
418		1.3.12.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mié 21/06/23	mar 27/06/23	$ 58.331.203,57
419		1.3.12.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	2 días	mar 27/06/23	jue 29/06/23	$ 28.956.093,64
420		1.3.12.	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 26.966.170,00
421		1.3.12.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	jue 29/06/23	sáb 11/11/23	$ 38.335.083,24
422		1.3.12.	5	MONOBLOCK	47 días	mié 31/05/23	lun 27/11/23	$ 113.194.345,00
423		1.3.12.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 9.870.356,00
424		1.3.12.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	3 días	jue 29/06/23	jue 2/11/23	$ 18.847.905,74
425		1.3.12.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	jue 2/11/23	jue 9/11/23	$ 15.747.038,58
426		1.3.12.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	jue 9/11/23	sáb 18/11/23	$ 38.773.642,10
427		1.3.12.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	jue 9/11/23	sáb 11/11/23	$ 22.519.402,02
428		1.3.12.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	sáb 11/11/23	mié 15/11/23	$ 12.325.418,54
429		1.3.12.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 10.515.482,00
430		**1.3.12.**	**4**	**P27-CIV8001052**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 440.239.835,32**
431		1.3.12.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	jue 22/06/23	lun 26/06/23	$ 1.266.064,06
432		1.3.12.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	lun 26/06/23	mié 1/11/23	$ 48.586.463,25
433		1.3.12.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mié 1/11/23	mié 15/11/23	$ 22.281.755,69
434		1.3.12.	5	SUMIDERO	36,5 días	mié 1/11/23	vie 15/12/23	$ 7.012.796,00

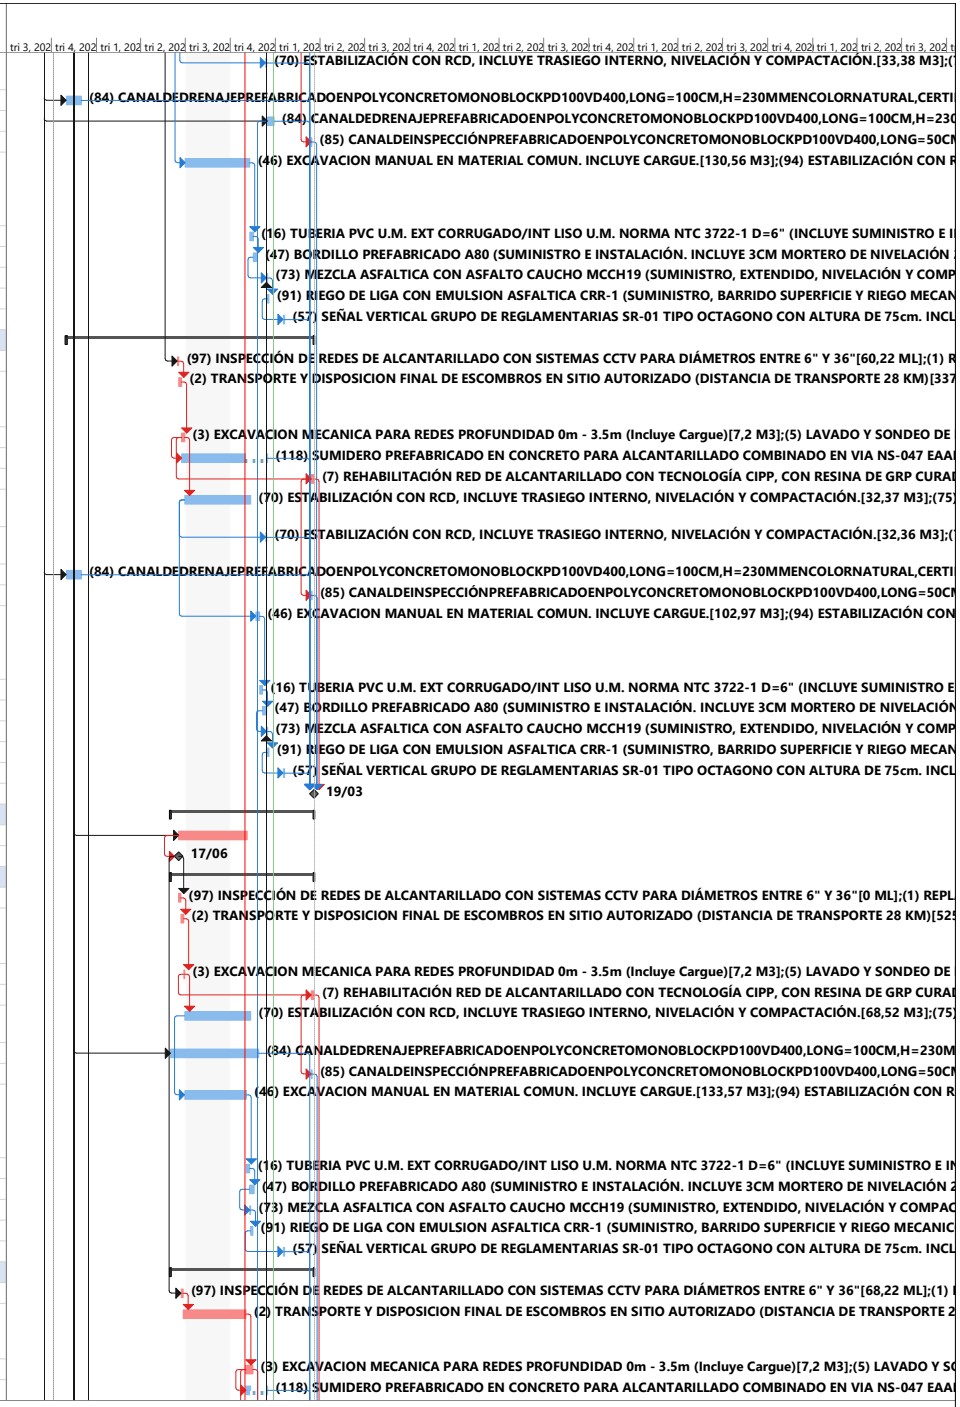


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
435		1.3.12.	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 106.801.795,38
436		1.3.12.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	mié 15/11/23	lun 27/11/23	$ 19.103.173,05
437		1.3.12.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	sáb 16/12/23	mar 19/12/23	$ 19.093.304,47
438		1.3.12.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	30 días	mié 31/05/23	vie 3/11/23	$ 65.320.056,13
439		1.3.12.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 27.994.309,77
440		1.3.12.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 5.683.966,00
441		1.3.12.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	mar 5/12/23	mié 13/12/23	$ 16.972.428,84
442		1.3.12.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mié 13/12/23	mar 19/12/23	$ 17.554.625,45
443		1.3.12.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mar 19/12/23	jue 28/12/23	$ 36.111.201,26
444		1.3.12.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mar 19/12/23	jue 21/12/23	$ 23.117.649,56
445		1.3.12.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	jue 21/12/23	sáb 23/12/23	$ 12.649.168,41
446		1.3.12.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 10.691.078,00
447		**1.3.12.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
448		**1.3.13**	**3**	**FRENTE 7**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 841.340.906,02**
449		1.3.13.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	lun 27/11/23	jue 14/12/23	$ 0,00
450		**1.3.13.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**lun 27/11/23**	**lun 27/11/23**	**$ 0,00**
451		**1.3.13.**	**4**	**P8-CIV8002417**	**92 días**	**mié 31/05/23**	**vie 19/01/24**	**$ 477.430.341,05**
452		1.3.13.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	lun 27/11/23	jue 30/11/23	$ 2.169.345,22
453		1.3.13.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	jue 30/11/23	mié 6/12/23	$ 55.393.717,58
454		1.3.13.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mié 6/12/23	lun 18/12/23	$ 32.047.500,76
455		1.3.13.	5	SUMIDERO	10 días	mié 6/12/23	lun 18/12/23	$ 7.012.796,00
456		1.3.13.	5	REHABILITACIÓN	5 días	sáb 13/01/24	vie 19/01/24	$ 93.537.180,00
457		1.3.13.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	lun 18/12/23	sáb 30/12/23	$ 22.684.929,75
458		1.3.13.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	sáb 30/12/23	mar 2/01/24	$ 22.673.162,16
459		1.3.13.	5	MONOBLOCK	30 días	mié 31/05/23	vie 3/11/23	$ 102.044.250,00
460		1.3.13.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	sáb 13/01/24	mar 16/01/24	$ 13.113.380,00
461		1.3.13.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	lun 18/12/23	mié 27/12/23	$ 14.591.998,37
462		1.3.13.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mié 27/12/23	mar 2/01/24	$ 19.713.925,60
463		1.3.13.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mar 2/01/24	mié 10/01/24	$ 35.911.119,40
464		1.3.13.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mar 2/01/24	jue 4/01/24	$ 26.718.374,46
465		1.3.13.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	jue 4/01/24	sáb 6/01/24	$ 14.627.259,75
466		1.3.13.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 15.191.402,00
467		**1.3.13.**	**4**	**P9-CIV8002500**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 363.910.564,97**
468		1.3.13.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mié 29/11/23	sáb 2/12/23	$ 292.336,00
469		1.3.13.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	sáb 2/12/23	vie 8/12/23	$ 43.415.064,93
470		1.3.13.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	vie 8/12/23	mié 20/12/23	$ 23.903.788,46
471		1.3.13.	5	SUMIDERO	10 días	vie 8/12/23	mié 20/12/23	$ 7.012.796,00
472		1.3.13.	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 76.356.294,00
473		1.3.13.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	mié 20/12/23	mar 2/01/24	$ 18.577.543,64
474		1.3.13.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	mar 2/01/24	jue 4/01/24	$ 18.567.675,06
475		1.3.13.	5	MONOBLOCK	30 días	mié 31/05/23	vie 3/11/23	$ 70.238.250,00
476		1.3.13.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 9.729.072,00
477		1.3.13.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	mié 20/12/23	vie 29/12/23	$ 12.381.309,49
478		1.3.13.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 9.524.651,00
479		1.3.13.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	jue 4/01/24	vie 12/01/24	$ 26.117.260,41
480		1.3.13.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	jue 4/01/24	sáb 6/01/24	$ 22.455.346,52
481		1.3.13.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	sáb 6/01/24	mar 9/01/24	$ 12.291.735,46
482		1.3.13.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 13.047.442,00

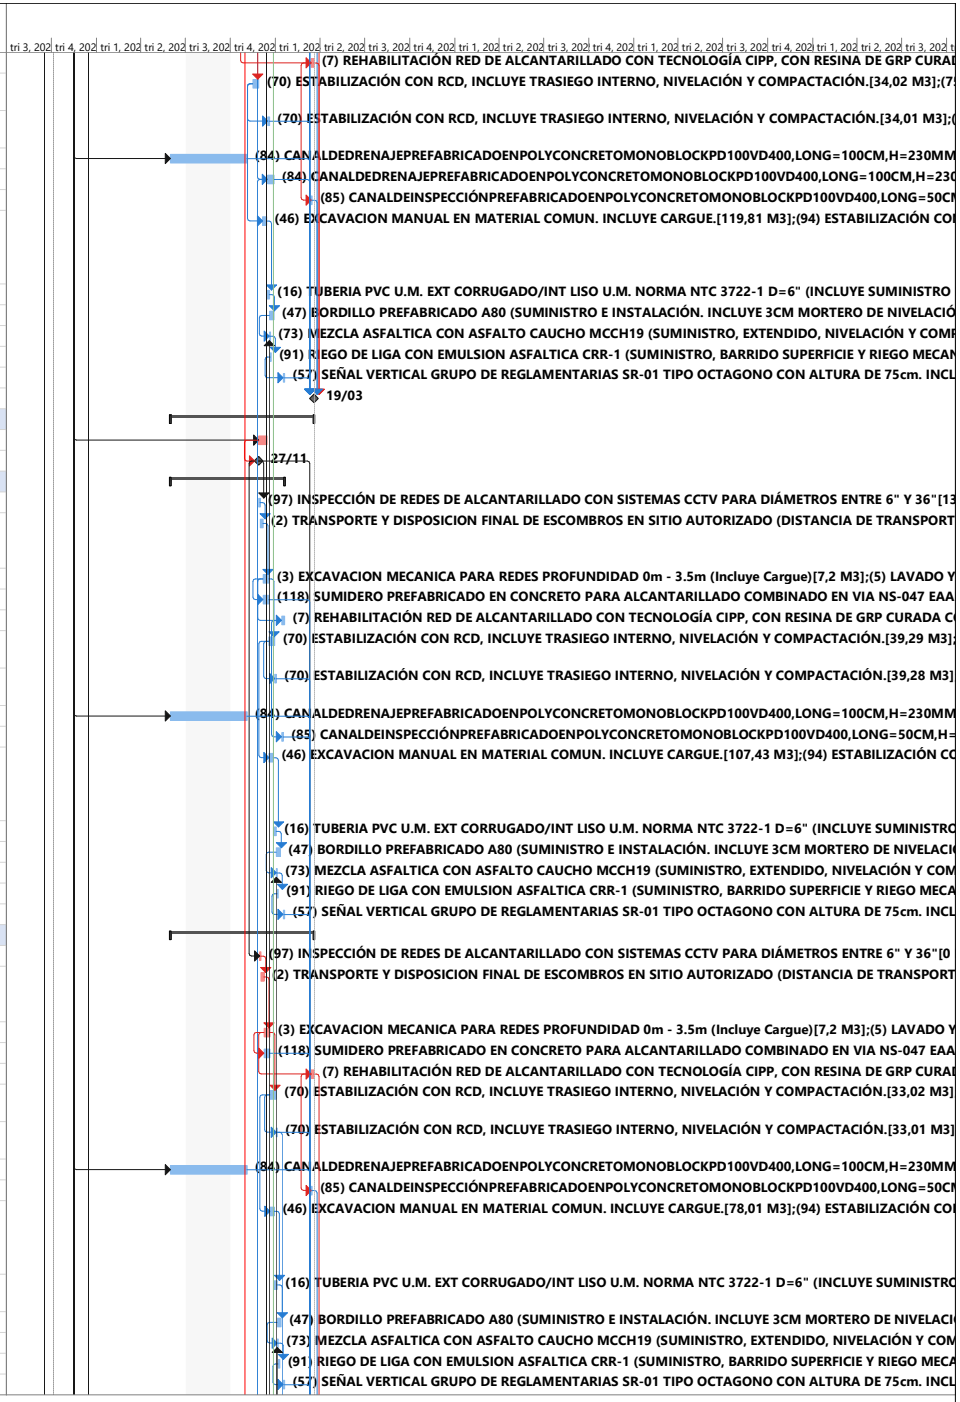


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
483		**1.3.13.4**		**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
484		**1.3.14**	**3**	**FRENTE 13**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 378.935.982,21**
485		1.3.14.4		Tramite y Aprobación PMT	15 días	mar 5/12/23	vie 22/12/23	$ 0,00
486		**1.3.14.4**		**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**mar 5/12/23**	**mar 5/12/23**	**$ 0,00**
487		**1.3.14.4**		**P20-CIV8000938**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 378.935.982,21**
488		1.3.14.5		ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 5/12/23	vie 8/12/23	$ 1.207.915,00
489		1.3.14.5		EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	vie 8/12/23	jue 14/12/23	$ 42.633.458,74
490		1.3.14.5		REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	jue 14/12/23	mié 27/12/23	$ 19.082.436,41
491		1.3.14.5		SUMIDERO	10 días	jue 14/12/23	mié 27/12/23	$ 7.012.796,00
492		1.3.14.5		REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 76.012.100,40
493		1.3.14.5		RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	mié 27/12/23	lun 8/01/24	$ 17.509.453,38
494		1.3.14.5		RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	lun 8/01/24	mié 10/01/24	$ 17.502.160,32
495		1.3.14.5		MONOBLOCK SUMINISTRO	30 días	mié 31/05/23	vie 3/11/23	$ 59.926.657,00
496		1.3.14.5		MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 25.682.853,00
497		1.3.14.5		COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 8.383.452,00
498		1.3.14.5		EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	mié 27/12/23	jue 4/01/24	$ 15.293.358,27
499		1.3.14.5		REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 12.825.931,90
500		1.3.14.5		ACABADOS EN ANDEN	7 días	mié 10/01/24	jue 18/01/24	$ 32.510.772,43
501		1.3.14.5		PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 10/01/24	vie 12/01/24	$ 21.049.414,54
502		1.3.14.5		PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 12/01/24	lun 15/01/24	$ 11.538.528,82
503		1.3.14.5		SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 10.764.694,00
504		**1.3.14.4**		**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
505		**1.3.15**	**3**	**FRENTE 14**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 941.486.730,47**
506		1.3.15.4		Tramite y Aprobación PMT	15 días	jue 8/06/23	lun 26/06/23	$ 0,00
507		**1.3.15.4**		**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**jue 8/06/23**	**jue 8/06/23**	**$ 0,00**
508		**1.3.15.4**		**P23-CIV8000916**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 497.560.450,91**
509		1.3.15.5		ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	jue 8/06/23	lun 12/06/23	$ 1.272.397,40
510		1.3.15.5		EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	lun 12/06/23	sáb 17/06/23	$ 47.836.131,44
511		1.3.15.5		REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	sáb 17/06/23	jue 29/06/23	$ 24.768.988,61
512		1.3.15.5		SUMIDERO	10 días	sáb 17/06/23	jue 29/06/23	$ 7.012.796,00
513		1.3.15.5		REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 29.417.640,00
514		1.3.15.5		RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	jue 29/06/23	sáb 11/11/23	$ 18.828.284,28
515		1.3.15.5		RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23	$ 18.816.516,69
516		1.3.15.5		MONOBLOCK	25 días	lun 31/10/22	mié 30/11/22	$ 225.678.898,29
517		1.3.15.5		COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 8.383.452,00
518		1.3.15.5		EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	jue 29/06/23	mié 8/11/23	$ 16.656.161,39
519		1.3.15.5		REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mié 8/11/23	mié 15/11/23	$ 15.932.714,20
520		1.3.15.5		ACABADOS EN ANDEN	7 días	mié 15/11/23	jue 23/11/23	$ 35.660.690,61
521		1.3.15.5		PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 13/12/23	vie 15/12/23	$ 22.698.775,76
522		1.3.15.5		PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 15/12/23	lun 18/12/23	$ 12.427.542,24
523		1.3.15.5		SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 12.169.462,00
524		**1.3.15.4**		**P6-CIV8000977**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 443.926.279,56**
525		1.3.15.5		ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	sáb 10/06/23	mié 14/06/23	$ 363.532,50
526		1.3.15.5		EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mié 14/06/23	mar 20/06/23	$ 49.902.303,71
527		1.3.15.5		REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mar 20/06/23	mié 1/11/23	$ 25.204.269,54
528		1.3.15.5		SUMIDERO	10 días	mar 20/06/23	mié 1/11/23	$ 7.012.796,00
529		1.3.15.5		REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 82.124.245,00
530		1.3.15.5		RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	mié 1/11/23	mié 15/11/23	$ 19.510.589,82
531		1.3.15.5		RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (segunda capa)	2 días	jue 21/12/23	sáb 23/12/23	$ 19.499.265,34
532		1.3.15.5		MONOBLOCK SUMINISTRO	25 días	lun 31/10/22	mié 30/11/22	$ 82.582.953,75

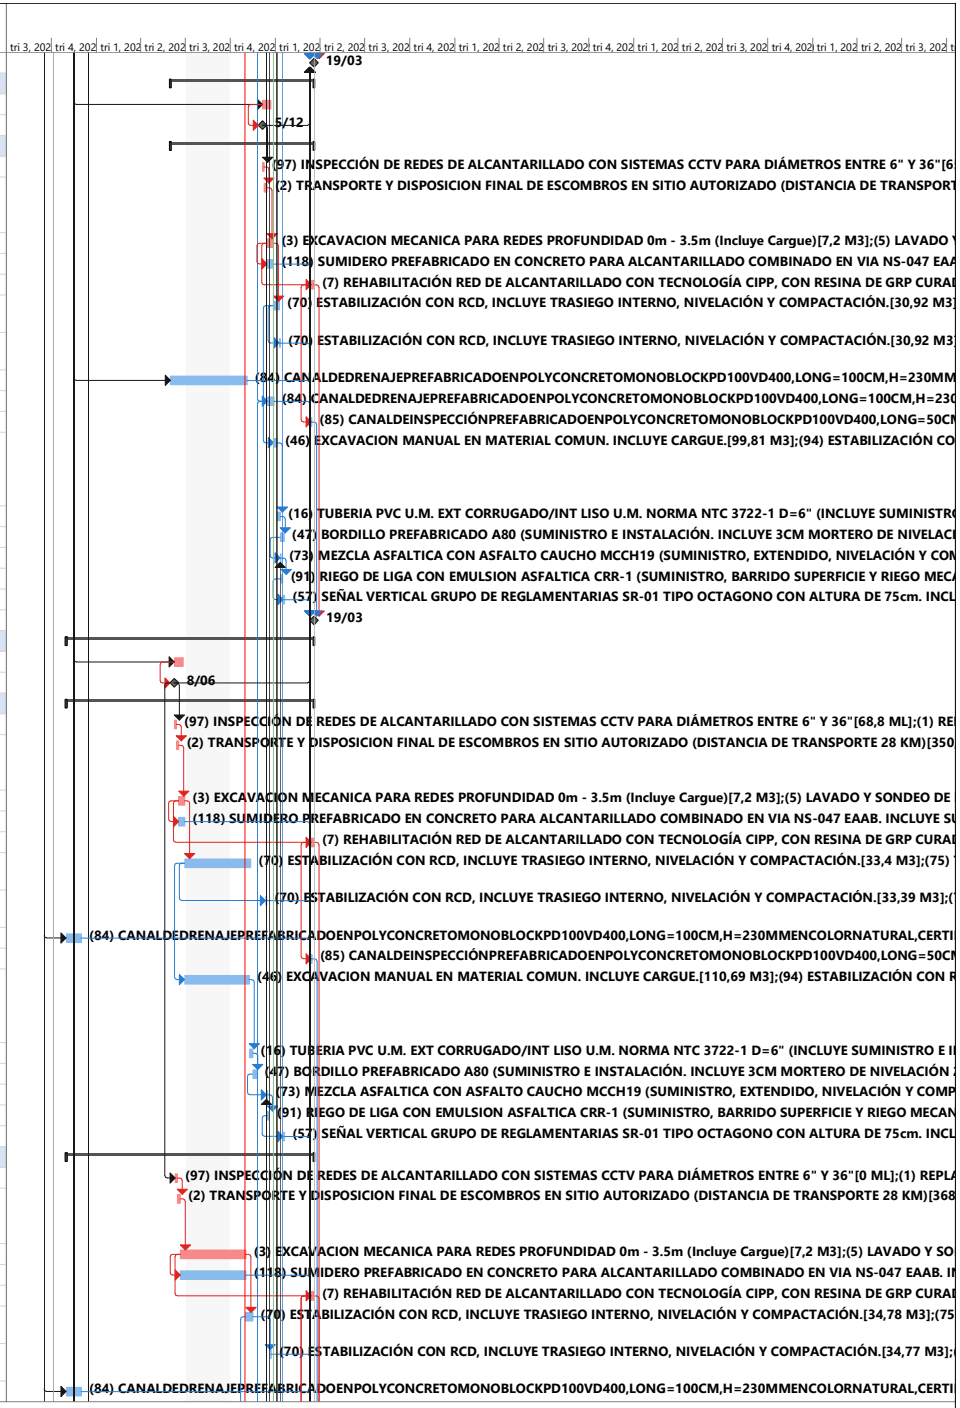


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
533		1.3.15.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 35.390.801,25
534		1.3.15.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 6.486.048,00
535		1.3.15.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	jue 23/11/23	vie 1/12/23	$ 17.763.541,83
536		1.3.15.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	vie 1/12/23	jue 7/12/23	$ 11.257.664,59
537		1.3.15.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	jue 7/12/23	vie 15/12/23	$ 38.942.492,98
538		1.3.15.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	sáb 23/12/23	mié 27/12/23	$ 23.649.146,02
539		1.3.15.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mié 27/12/23	vie 29/12/23	$ 12.945.147,23
540		1.3.15.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 11.291.482,00
541		**1.3.15.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
542		**1.3.16**	**3**	**FRENTE 15**	**139 días**	**mié 31/05/23**	**jue 14/03/24**	**$ 432.413.214,91**
543		1.3.16.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	sáb 16/12/23	jue 4/01/24	$ 0,00
544		**1.3.16.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**sáb 16/12/23**	**sáb 16/12/23**	**$ 0,00**
545		**1.3.16.**	**4**	**P43-CIV8002595**	**139 días**	**mié 31/05/23**	**jue 14/03/24**	**$ 432.413.214,91**
546		1.3.16.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	sáb 16/12/23	mié 20/12/23	$ 1.833.273,74
547		1.3.16.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mié 20/12/23	mié 27/12/23	$ 65.370.662,90
548		1.3.16.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	5 días	mié 27/12/23	mar 2/01/24	$ 45.834.715,78
549		1.3.16.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	2 días	mar 2/01/24	jue 4/01/24	$ 24.696.546,98
550		1.3.16.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	jue 4/01/24	sáb 6/01/24	$ 24.691.152,93
551		1.3.16.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	30 días	mié 31/05/23	vie 3/11/23	$ 86.273.775,00
552		1.3.16.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 36.974.475,00
553		1.3.16.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 12.972.096,00
554		1.3.16.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	vie 8/12/23	sáb 16/12/23	$ 18.812.939,64
555		1.3.16.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	sáb 16/12/23	vie 22/12/23	$ 10.026.980,00
556		1.3.16.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	vie 22/12/23	lun 1/01/24	$ 41.195.220,46
557		1.3.16.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	sáb 6/01/24	mar 9/01/24	$ 29.904.337,56
558		1.3.16.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mar 9/01/24	jue 11/01/24	$ 16.389.696,92
559		1.3.16.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 17.437.342,00
560		**1.3.16.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**jue 14/03/24**	**jue 14/03/24**	**$ 0,00**
561		**1.3.17**	**3**	**FRENTE 16**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 921.687.467,24**
562		1.3.17.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	mar 26/12/23	vie 12/01/24	$ 0,00
563		**1.3.17.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**mar 26/12/23**	**mar 26/12/23**	**$ 0,00**
564		**1.3.17.**	**4**	**P37-CIV8011974**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 501.312.022,86**
565		1.3.17.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 26/12/23	vie 29/12/23	$ 306.303,50
566		1.3.17.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	2 días	vie 29/12/23	lun 1/01/24	$ 44.873.411,62
567		1.3.17.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	5 días	lun 1/01/24	sáb 6/01/24	$ 19.969.053,81
568		1.3.17.	5	SUMIDERO	5 días	lun 1/01/24	sáb 6/01/24	$ 7.012.796,00
569		1.3.17.	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 114.299.788,75
570		1.3.17.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	2 días	sáb 6/01/24	mar 9/01/24	$ 19.049.361,39
571		1.3.17.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	vie 12/01/24	lun 15/01/24	$ 19.042.068,33
572		1.3.17.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	30 días	mié 31/05/23	vie 3/11/23	$ 116.428.933,60
573		1.3.17.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 49.898.114,40
574		1.3.17.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 8.383.452,00
575		1.3.17.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	lun 1/01/24	mar 9/01/24	$ 13.049.245,88
576		1.3.17.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mar 9/01/24	lun 15/01/24	$ 11.880.988,99
577		1.3.17.	5	ACABADOS EN ANDEN	2 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24	$ 27.251.390,18
578		1.3.17.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	1 día	lun 15/01/24	mar 16/01/24	$ 22.997.351,36
579		1.3.17.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	1 día	mar 16/01/24	mié 17/01/24	$ 12.593.149,05
580		1.3.17.	5	SEÑALIZACIÓN	1 día	jue 18/01/24	vie 19/01/24	$ 14.276.614,00
581		**1.3.17.**	**4**	**P38-CIV8011973**	**140 días**	**mié 31/05/23**	**vie 15/03/24**	**$ 420.375.444,38**
582		1.3.17.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 26/12/23	vie 29/12/23	$ 341.939,50

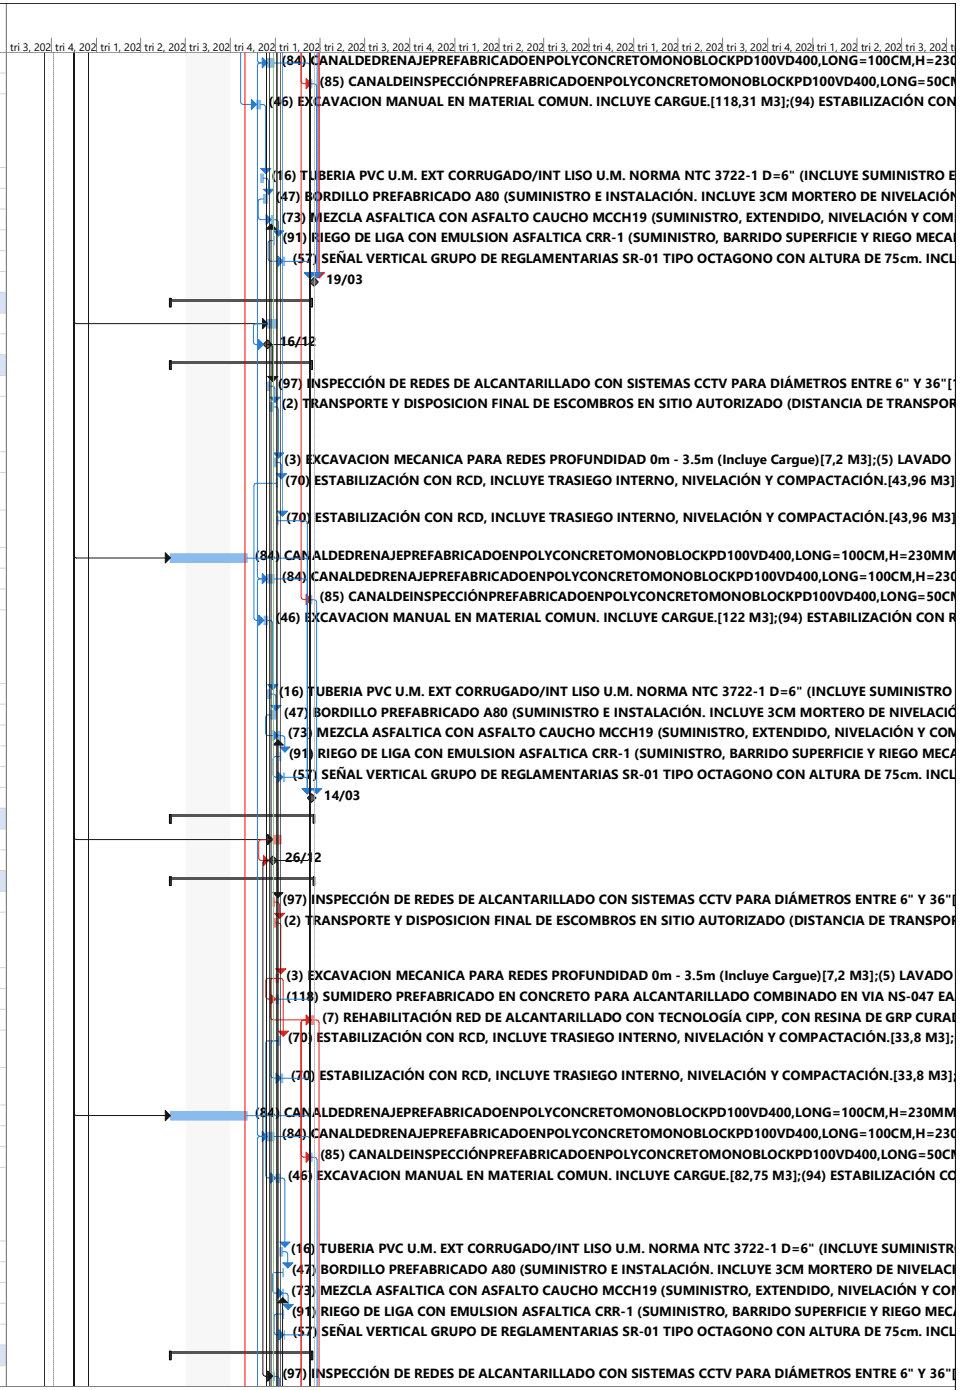


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
583		1.3.17.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 47.743.458,82
584		1.3.17.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	jue 4/01/24	mar 16/01/24	$ 39.152.721,74
585		1.3.17.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	2 días	jue 4/01/24	sáb 6/01/24	$ 21.102.862,11
586		1.3.17.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	jue 11/01/24	sáb 13/01/24	$ 21.096.012,16
587		1.3.17.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	25 días	mié 31/05/23	jue 29/06/23	$ 113.004.553,20
588		1.3.17.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 48.430.522,80
589		1.3.17.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 10.797.944,00
590		1.3.17.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	3 días	jue 4/01/24	lun 8/01/24	$ 14.592.798,71
591		1.3.17.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	lun 8/01/24	sáb 13/01/24	$ 18.090.061,30
592		1.3.17.	5	ACABADOS EN ANDEN	2 días	sáb 13/01/24	mar 16/01/24	$ 30.918.190,51
593		1.3.17.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	sáb 13/01/24	mar 16/01/24	$ 25.465.453,86
594		1.3.17.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mar 16/01/24	jue 18/01/24	$ 13.957.543,67
595		1.3.17.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 15.681.382,00
596		**1.3.17.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
597		**1.3.17.**	**4**	**Aprobación de tramite PMT última etapa, por parte de la interventoría**	**0 días**	**jue 2/11/23**	**jue 2/11/23**	**$ 0,00**
598		**1.3.17.**	**4**	**Aprobación de tramite PMT última etapa, por parte de la SDM**	**0 días**	**mar 14/11/23**	**mar 14/11/23**	**$ 0,00**
599		**1.3.17.**	**4**	**Aprobación de acta de fijación No. 5**	**0 días**	**sáb 11/11/23**	**sáb 11/11/23**	**$ 0,00**
600		**1.3.18**	**3**	**FRENTE 18**	**151 días**	**sáb 20/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 1.179.086.895,49**
601		1.3.18.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	sáb 20/05/23	jue 8/06/23	$ 0,00
602		**1.3.18.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**mar 14/11/23**	**mar 14/11/23**	**$ 0,00**
603		**1.3.18.**	**4**	**P36-CIV8000619**	**140 días**	**mié 31/05/23**	**vie 15/03/24**	**$ 589.543.447,00**
604		1.3.18.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 14/11/23	vie 17/11/23	$ 498.125,00
605		1.3.18.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	$ 69.550.917,00
606		1.3.18.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	jue 23/11/23	mar 5/12/23	$ 57.036.247,00
607		1.3.18.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	mar 5/12/23	sáb 16/12/23	$ 30.741.875,00
608		1.3.18.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	25 días	mié 31/05/23	jue 29/06/23	$ 30.731.896,00
609		1.3.18.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 164.620.883,00
610		1.3.18.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 70.551.807,00
611		1.3.18.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	lun 11/12/23	mar 19/12/23	$ 15.730.048,00
612		1.3.18.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	lun 11/12/23	sáb 16/12/23	$ 21.258.253,00
613		1.3.18.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	sáb 16/12/23	mar 26/12/23	$ 26.352.937,00
614		1.3.18.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mar 26/12/23	jue 28/12/23	$ 45.040.484,00
615		1.3.18.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	jue 28/12/23	sáb 30/12/23	$ 37.097.138,00
616		1.3.18.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 20.332.837,00
617		**1.3.18.**	**4**	**P19-CIV8000563**	**143 días**	**mié 31/05/23**	**mar 19/03/24**	**$ 589.543.448,49**
618		1.3.18.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 14/11/23	vie 17/11/23	$ 498.125,00
619		1.3.18.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	$ 69.550.919,00
620		1.3.18.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	jue 23/11/23	mar 5/12/23	$ 57.036.247,00
621		1.3.18.	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24	$ 30.741.875,00
622		1.3.18.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	mar 5/12/23	sáb 16/12/23	$ 30.731.896,00
623		1.3.18.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	25 días	mié 31/05/23	jue 29/06/23	$ 164.620.883,00
624		1.3.18.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 70.551.807,00
625		1.3.18.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 15.730.048,00
626		1.3.18.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	$ 21.258.253,00
627		1.3.18.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mié 3/01/24	mar 9/01/24	$ 26.352.937,00
628		1.3.18.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mar 9/01/24	mié 17/01/24	$ 45.040.484,00
629		1.3.18.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 10/01/24	vie 12/01/24	$ 37.097.138,00

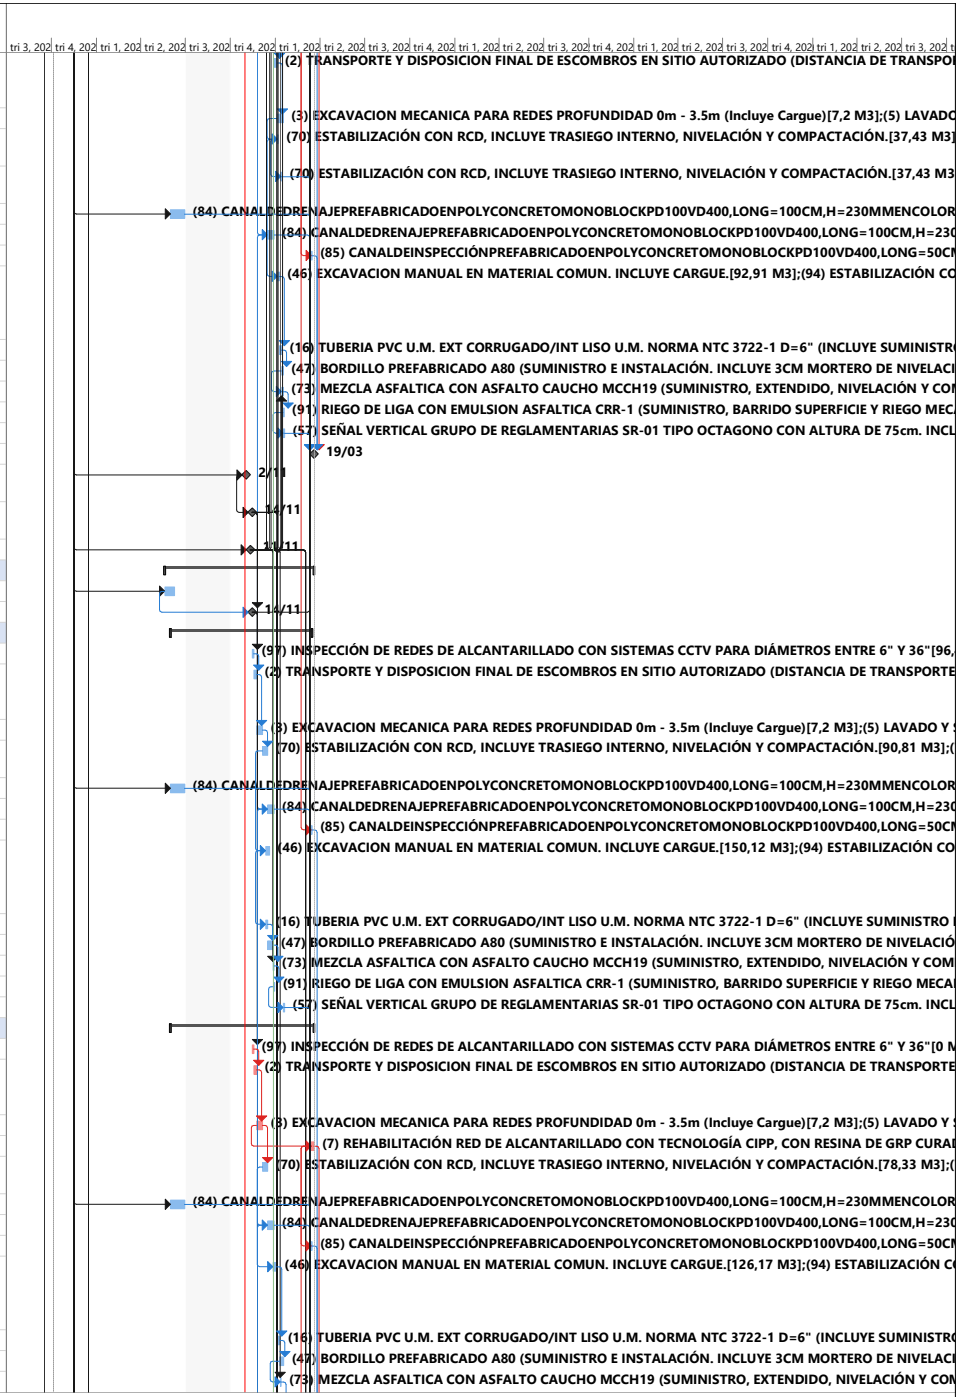


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
630		1.3.18.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 12/01/24	lun 15/01/24	$ 10.166.418,49
631		1.3.18.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 10.166.418,00
632		**1.3.18.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
633		**1.3.19**	**3**	**FRENTE 19**	**315 días**	**lun 31/10/22**	**vie 15/03/24**	**$ 0,00**
634		1.3.19.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	sáb 2/12/23	mié 20/12/23	$ 0,00
635		**1.3.19.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**sáb 2/12/23**	**sáb 2/12/23**	**$ 0,00**
636		**1.3.19.**	**4**	**P5-CIV8000655**	**315 días**	**lun 31/10/22**	**vie 15/03/24**	**$ 0,00**
637		1.3.19.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	sáb 2/12/23	mié 6/12/23	$ 0,00
638		1.3.19.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	$ 0,00
639		1.3.19.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mar 12/12/23	sáb 23/12/23	$ 0,00
640		1.3.19.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	sáb 23/12/23	vie 5/01/24	$ 0,00
641		1.3.19.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	25 días	lun 31/10/22	mié 30/11/22	$ 0,00
642		1.3.19.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 0,00
643		1.3.19.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 0,00
644		1.3.19.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	sáb 23/12/23	mar 2/01/24	$ 0,00
645		1.3.19.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	sáb 23/12/23	sáb 30/12/23	$ 0,00
646		1.3.19.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mié 27/12/23	jue 4/01/24	$ 0,00
647		1.3.19.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	1 día	jue 4/01/24	vie 5/01/24	$ 0,00
648		1.3.19.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	1 día	vie 5/01/24	sáb 6/01/24	$ 0,00
649		1.3.19.	5	SEÑALIZACIÓN	1 día	jue 18/01/24	vie 19/01/24	$ 0,00
650		**1.3.19.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**vie 15/03/24**	**vie 15/03/24**	**$ 0,00**
651		**1.3.20**	**3**	**FRENTE 21**	**129 días**	**sáb 15/04/23**	**vie 19/01/24**	**$ 542.676.292,61**
652		1.3.20.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	sáb 15/04/23	jue 4/05/23	$ 0,00
653		**1.3.20.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**mar 14/11/23**	**mar 14/11/23**	**$ 0,00**
654		**1.3.20.**	**4**	**P34-CIV8000709**	**92 días**	**mié 31/05/23**	**vie 19/01/24**	**$ 245.295.537,16**
655		1.3.20.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 14/11/23	vie 17/11/23	$ 989.071,93
656		1.3.20.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	$ 39.878.611,65
657		1.3.20.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	jue 23/11/23	mar 5/12/23	$ 21.444.070,14
658		1.3.20.	5	REHABILITACIÓN	5 días	mié 3/01/24	mar 9/01/24	$ 12.257.350,00
659		1.3.20.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	mar 5/12/23	sáb 16/12/23	$ 31.845.755,06
660		1.3.20.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	25 días	mié 31/05/23	jue 29/06/23	$ 28.757.925,00
661		1.3.20.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 12.324.825,00
662		1.3.20.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 13.638.714,00
663		1.3.20.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	$ 13.115.582,12
664		1.3.20.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mar 26/12/23	lun 1/01/24	$ 3.205.476,00
665		1.3.20.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	$ 28.498.191,79
666		1.3.20.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 19.421.755,22
667		1.3.20.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 5/01/24	lun 8/01/24	$ 10.631.899,25
668		1.3.20.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 9.286.310,00
669		**1.3.20.**	**4**	**P35-CIV8000743**	**92 días**	**mié 31/05/23**	**vie 19/01/24**	**$ 297.380.755,45**
670		1.3.20.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 14/11/23	vie 17/11/23	$ 1.251.167,27
671		1.3.20.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	$ 48.351.470,80
672		1.3.20.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	jue 23/11/23	mar 5/12/23	$ 31.007.215,83
673		1.3.20.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	mar 5/12/23	sáb 16/12/23	$ 37.717.571,90
674		1.3.20.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	25 días	mié 31/05/23	jue 29/06/23	$ 42.804.755,00
675		1.3.20.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 18.344.895,00
676		1.3.20.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 16.196.916,00
677		1.3.20.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	$ 16.772.783,52
678		1.3.20.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mar 26/12/23	lun 1/01/24	$ 1.819.679,00
679		1.3.20.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	$ 37.301.884,18

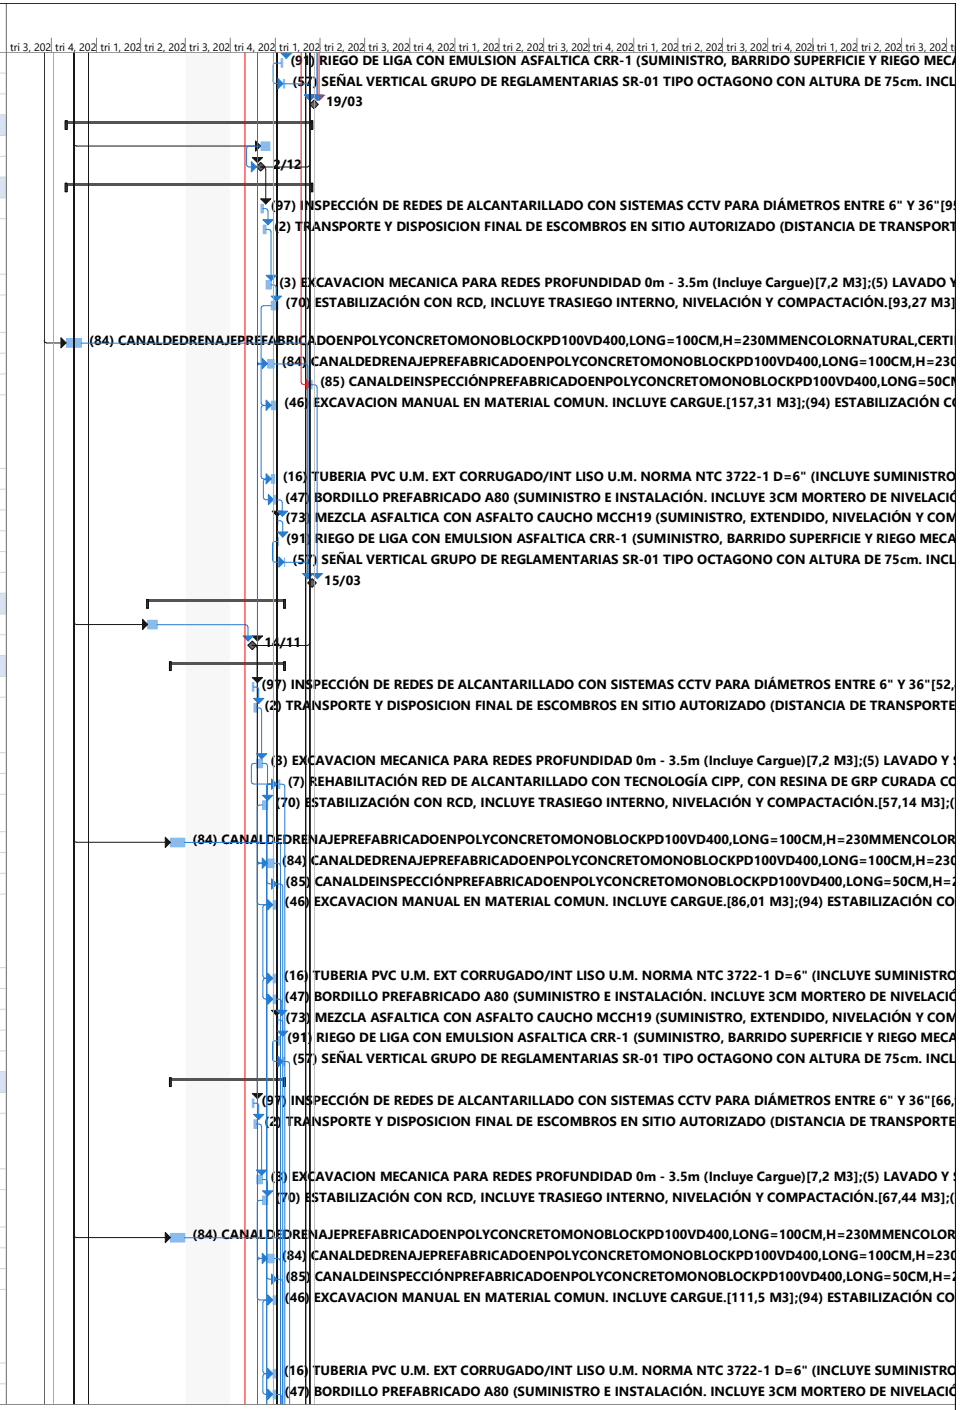


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
680		1.3.20.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 22.924.889,04
681		1.3.20.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 5/01/24	lun 8/01/24	$ 12.547.641,91
682		1.3.20.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 10.339.886,00
683		**1.3.20.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**vie 19/01/24**	**vie 19/01/24**	**$ 0,00**
684		**1.3.21**	**3**	**FRENTE 22**	**129 días**	**sáb 15/04/23**	**vie 19/01/24**	**$ 646.361.668,90**
685		1.3.21.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	sáb 15/04/23	jue 4/05/23	$ 0,00
686		**1.3.21.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**mar 14/11/23**	**mar 14/11/23**	**$ 0,00**
687		**1.3.21.**	**4**	**P7-CIV8000736**	**92 días**	**mié 31/05/23**	**vie 19/01/24**	**$ 646.361.668,90**
688		1.3.21.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 14/11/23	vie 17/11/23	$ 1.875.560,92
689		1.3.21.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	$ 78.197.206,01
690		1.3.21.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	jue 23/11/23	mar 5/12/23	$ 28.241.933,06
691		1.3.21.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	mar 5/12/23	sáb 16/12/23	$ 54.902.427,74
692		1.3.21.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	25 días	mié 31/05/23	jue 29/06/23	$ 223.196.222,50
693		1.3.21.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 95.662.512,46
694		1.3.21.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 13.782.424,00
695		1.3.21.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	$ 25.275.729,56
696		1.3.21.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mar 26/12/23	lun 1/01/24	$ 2.853.720,00
697		1.3.21.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	$ 55.041.043,23
698		1.3.21.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 33.014.091,98
699		1.3.21.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 5/01/24	lun 8/01/24	$ 18.110.627,44
700		1.3.21.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 16.208.170,00
701		**1.3.21.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**vie 19/01/24**	**vie 19/01/24**	**$ 0,00**
702		**1.3.22**	**3**	**FRENTE 23**	**71 días**	**mié 27/12/23**	**mar 19/03/24**	**$ 706.193.661,39**
703		1.3.22.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	mié 27/12/23	sáb 13/01/24	$ 0,00
704		**1.3.22.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**sáb 13/01/24**	**sáb 13/01/24**	**$ 0,00**
705		**1.3.22.**	**4**	**P10-CIV8011960**	**56 días**	**sáb 13/01/24**	**mar 19/03/24**	**$ 706.193.661,39**
706		1.3.22.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	sáb 13/01/24	mié 17/01/24	$ 621.969,00
707		1.3.22.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mié 17/01/24	mar 23/01/24	$ 99.533.242,65
708		1.3.22.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mar 23/01/24	sáb 3/02/24	$ 44.716.385,20
709		1.3.22.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	sáb 3/02/24	jue 15/02/24	$ 75.220.397,98
710		1.3.22.	5	MONOBLOCK	25 días	jue 15/02/24	vie 15/03/24	$ 261.720.502,00
711		1.3.22.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	vie 15/03/24	lun 18/03/24	$ 6.771.042,00
712		1.3.22.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	vie 23/02/24	sáb 2/03/24	$ 26.317.734,76
713		1.3.22.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	vie 23/02/24	jue 29/02/24	$ 41.703.114,08
714		1.3.22.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	vie 23/02/24	sáb 2/03/24	$ 55.988.196,90
715		1.3.22.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	sáb 2/03/24	mar 5/03/24	$ 45.573.361,72
716		1.3.22.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mar 5/03/24	jue 7/03/24	$ 24.971.301,10
717		1.3.22.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	vie 15/03/24	mar 19/03/24	$ 23.056.414,00
718		**1.3.22.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
719		**1.3.23**	**3**	**FRENTE 24**	**71 días**	**mié 27/12/23**	**mar 19/03/24**	**$ 717.903.769,51**
720		1.3.23.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	mié 27/12/23	sáb 13/01/24	$ 0,00
721		**1.3.23.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**sáb 13/01/24**	**sáb 13/01/24**	**$ 0,00**
722		**1.3.23.**	**4**	**P11-CIV8011955**	**56 días**	**sáb 13/01/24**	**mar 19/03/24**	**$ 717.903.769,51**
723		1.3.23.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	sáb 13/01/24	mié 17/01/24	$ 2.505.182,30
724		1.3.23.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mié 17/01/24	mar 23/01/24	$ 99.887.156,54
725		1.3.23.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mar 23/01/24	sáb 3/02/24	$ 37.376.595,41
726		1.3.23.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	sáb 3/02/24	jue 15/02/24	$ 79.142.373,52
727		1.3.23.	5	MONOBLOCK	25 días	jue 15/02/24	vie 15/03/24	$ 276.396.418,00
728		1.3.23.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	vie 15/03/24	lun 18/03/24	$ 5.683.966,00
729		1.3.23.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	vie 23/02/24	sáb 2/03/24	$ 28.295.154,07

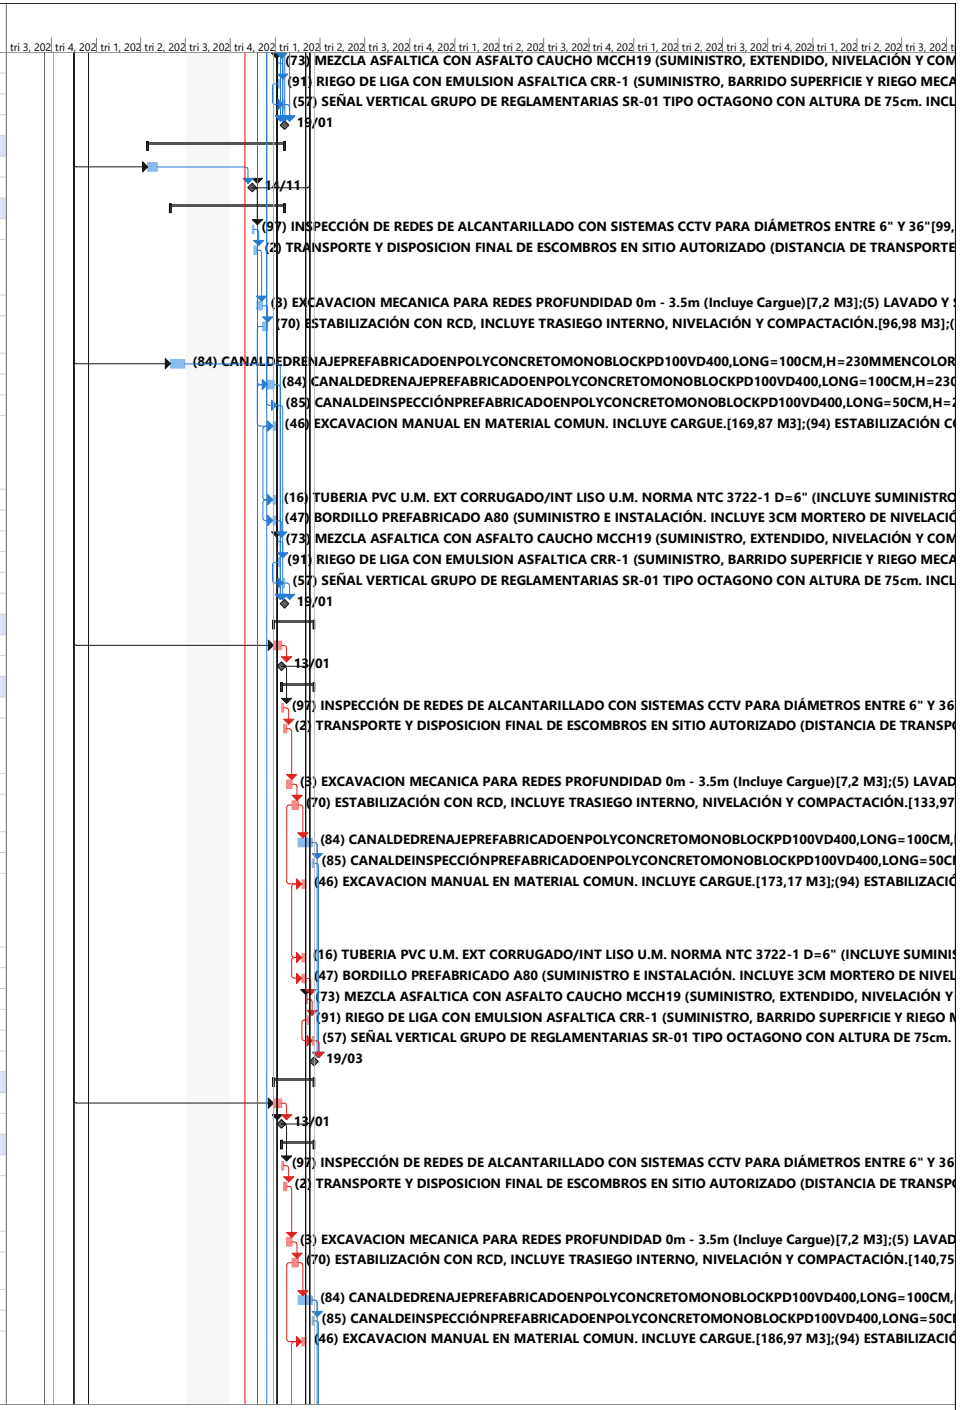


Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
730		1.3.23.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	vie 23/02/24	jue 29/02/24	$ 29.607.234,17
731		1.3.23.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	vie 23/02/24	sáb 2/03/24	$ 60.946.547,05
732		1.3.23.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	sáb 2/03/24	mar 5/03/24	$ 47.879.589,26
733		1.3.23.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mar 5/03/24	jue 7/03/24	$ 26.249.159,19
734		1.3.23.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	vie 15/03/24	mar 19/03/24	$ 23.934.394,00
735		**1.3.23.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
736		**1.3.24**	**3**	**FRENTE 25**	**71 días**	**mié 27/12/23**	**mar 19/03/24**	**$ 738.798.785,53**
737		1.3.24.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	mié 27/12/23	sáb 13/01/24	$ 0,00
738		**1.3.24.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**sáb 13/01/24**	**sáb 13/01/24**	**$ 0,00**
739		**1.3.24.**	**4**	**P40-CIV8011953**	**56 días**	**sáb 13/01/24**	**mar 19/03/24**	**$ 738.798.785,53**
740		1.3.24.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	sáb 13/01/24	mié 17/01/24	$ 2.536.962,33
741		1.3.24.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mié 17/01/24	mar 23/01/24	$ 105.243.353,15
742		1.3.24.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mar 23/01/24	sáb 3/02/24	$ 43.329.335,61
743		1.3.24.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	sáb 3/02/24	jue 15/02/24	$ 79.888.945,08
744		1.3.24.	5	MONOBLOCK	25 días	jue 15/02/24	vie 15/03/24	$ 269.058.460,00
745		1.3.24.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	vie 15/03/24	lun 18/03/24	$ 13.497.430,00
746		1.3.24.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	vie 23/02/24	sáb 2/03/24	$ 28.259.876,31
747		1.3.24.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	vie 23/02/24	jue 29/02/24	$ 38.430.793,61
748		1.3.24.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	vie 23/02/24	sáb 2/03/24	$ 60.610.284,47
749		1.3.24.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	sáb 2/03/24	mar 5/03/24	$ 48.262.825,92
750		1.3.24.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mar 5/03/24	jue 7/03/24	$ 26.448.509,05
751		1.3.24.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	vie 15/03/24	mar 19/03/24	$ 23.232.010,00
752		**1.3.24.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
753		**1.3.25**	**3**	**FRENTE 26**	**71 días**	**mié 27/12/23**	**mar 19/03/24**	**$ 359.009.196,57**
754		1.3.25.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	mié 27/12/23	sáb 13/01/24	$ 0,00
755		**1.3.25.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**sáb 13/01/24**	**sáb 13/01/24**	**$ 0,00**
756		**1.3.25.**	**4**	**P41-CIV8011950**	**56 días**	**sáb 13/01/24**	**mar 19/03/24**	**$ 359.009.196,57**
757		1.3.25.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	sáb 13/01/24	mié 17/01/24	$ 402.868,00
758		1.3.25.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mié 17/01/24	mar 23/01/24	$ 53.420.760,98
759		1.3.25.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mar 23/01/24	sáb 3/02/24	$ 41.355.736,72
760		1.3.25.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	sáb 3/02/24	jue 15/02/24	$ 23.740.037,37
761		1.3.25.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	lun 12/02/24	mié 14/02/24	$ 23.730.168,79
762		1.3.25.	5	MONOBLOCK	25 días	jue 15/02/24	vie 15/03/24	$ 79.515.000,00
763		1.3.25.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	vie 15/03/24	lun 18/03/24	$ 13.497.430,00
764		1.3.25.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	vie 23/02/24	sáb 2/03/24	$ 17.675.345,81
765		1.3.25.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	vie 23/02/24	jue 29/02/24	$ 8.635.679,00
766		1.3.25.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	vie 23/02/24	sáb 2/03/24	$ 38.312.956,65
767		1.3.25.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	sáb 2/03/24	mar 5/03/24	$ 28.830.607,88
768		1.3.25.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mar 5/03/24	jue 7/03/24	$ 15.791.587,37
769		1.3.25.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	vie 15/03/24	mar 19/03/24	$ 14.101.018,00
770		**1.3.25.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
771		**1.3.26**	**3**	**FRENTE 27**	**318 días**	**lun 31/10/22**	**mar 19/03/24**	**$ 816.352.787,84**
772		1.3.26.	4	Tramite y Aprobación PMT	15 días	lun 3/04/23	vie 21/04/23	$ 0,00
773		**1.3.26.**	**4**	**Inicio de actividades de obra**	**0 días**	**mar 14/11/23**	**mar 14/11/23**	**$ 0,00**
774		**1.3.26.**	**4**	**P42-CIV8011949**	**267 días**	**lun 31/10/22**	**vie 19/01/24**	**$ 419.363.359,75**
775		1.3.26.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 14/11/23	vie 17/11/23	$ 389.957,50
776		1.3.26.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	$ 54.302.703,98
777		1.3.26.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	jue 23/11/23	mar 5/12/23	$ 41.032.961,41
778		1.3.26.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Primera capa)	10 días	mar 5/12/23	sáb 16/12/23	$ 24.084.123,51
779		1.3.26.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA (Segunda capa)	2 días	jue 7/12/23	sáb 9/12/23	$ 24.074.698,04
780		1.3.26.	5	MONOBLOCK SUMINISTRO	25 días	lun 31/10/22	mié 30/11/22	$ 99.307.031,60

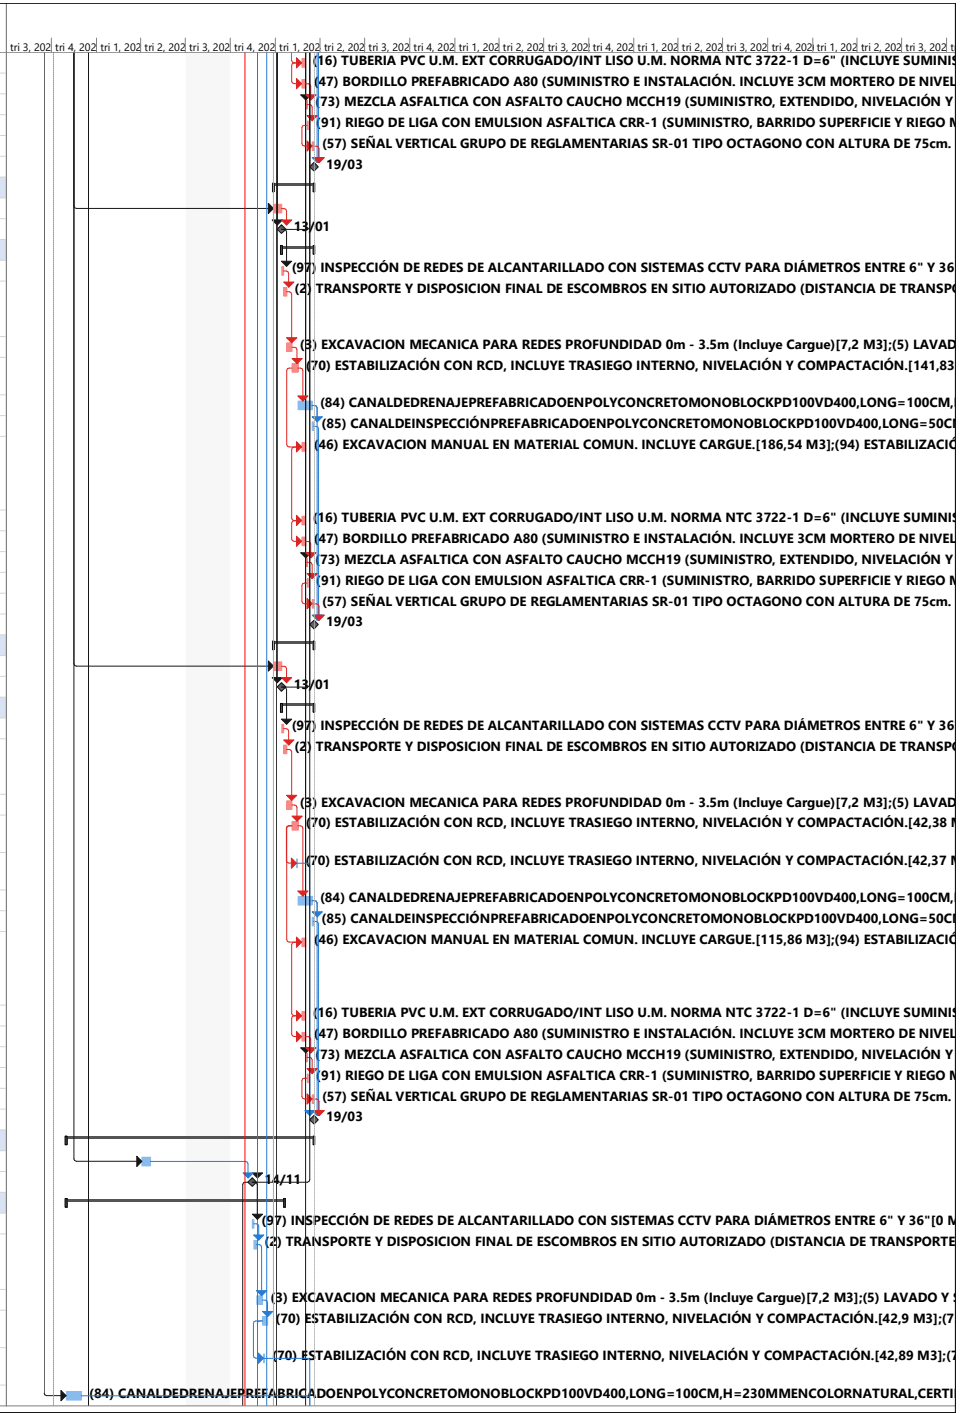

Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
781		1.3.26.	5	MONOBLOCK INSTALACIÓN	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23	$ 42.560.156,40
782		1.3.26.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 13.782.424,00
783		1.3.26.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	$ 16.283.619,64
784		1.3.26.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	mar 26/12/23	lun 1/01/24	$ 9.194.760,00
785		1.3.26.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	mar 26/12/23	mié 3/01/24	$ 34.236.589,86
786		1.3.26.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 29.184.192,58
787		1.3.26.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	vie 5/01/24	lun 8/01/24	$ 15.987.951,23
788		1.3.26.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	mar 16/01/24	vie 19/01/24	$ 14.942.190,00
789		**1.3.26.**	**4**	**P2-CIV8001595**	**56 días**	**sáb 13/01/24**	**mar 19/03/24**	**$ 396.989.428,09**
790		1.3.26.	5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	sáb 13/01/24	mié 17/01/24	$ 1.354.516,90
791		1.3.26.	5	EAXCAVACIÓN Y TRANSPORTE,ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE VÍA	5 días	mié 17/01/24	mar 23/01/24	$ 46.488.486,95
792		1.3.26.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN LA VÍA	10 días	mar 23/01/24	sáb 3/02/24	$ 37.649.609,71
793		1.3.26.	5	RAP ESTABILIZADO MEZCLADO E INSTALACIÓN VÍA	10 días	sáb 3/02/24	jue 15/02/24	$ 41.703.624,45
794		1.3.26.	5	MONOBLOCK	25 días	jue 15/02/24	vie 15/03/24	$ 146.759.160,00
795		1.3.26.	5	COMPLEMENTO DE MONOBLOCK	2 días	vie 15/03/24	lun 18/03/24	$ 11.082.938,00
796		1.3.26.	5	EXCAVACIÓN DE ANDENES, ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE ANDEN Y LLENO MATERIAL GRANULAR ANDEN	7 días	vie 23/02/24	sáb 2/03/24	$ 14.743.189,19
797		1.3.26.	5	REDES HIDROSANITARIAS EN ANDEN	5 días	vie 23/02/24	jue 29/02/24	$ 11.189.373,00
798		1.3.26.	5	ACABADOS EN ANDEN	7 días	vie 23/02/24	sáb 2/03/24	$ 31.875.213,03
799		1.3.26.	5	PAVIMENTOS 1 (Mezcla Base)	2 días	sáb 2/03/24	mar 5/03/24	$ 25.276.211,32
800		1.3.26.	5	PAVIMENTOS 2 (Mezcla Rodadura)	2 días	mar 5/03/24	jue 7/03/24	$ 13.851.299,54
801		1.3.26.	5	SEÑALIZACIÓN	3 días	vie 15/03/24	mar 19/03/24	$ 15.015.806,00
802		**1.3.26.**	**4**	**Fin de actividades de obra**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
803		**1.3.27**	**3**	**FIN DE LA OBRA**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
804		**1.4**	**2**	**COMPONENTES**	**290 días**	**lun 5/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 3.579.224.504,50**
805		**1.4.1**	**3**	**COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (B**	**290 días**	**lun 5/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 1.000.135.433,70**
806		1.4.1.1	4	diciembre 22	22 días	lun 5/12/22	vie 30/12/22	$ 65.491.911,10
807		1.4.1.2	4	enero 23	25 días	lun 2/01/23	mar 31/01/23	$ 3.619.123,00
808		1.4.1.3	4	febrero 23	23 días	mié 1/02/23	mar 28/02/23	$ 21.402.898,00
809		1.4.1.4	4	marzo 23	25 días	mié 1/03/23	vie 31/03/23	$ 28.151.759,00
810		1.4.1.5	4	abril 23	23 días	vie 31/03/23	sáb 29/04/23	$ 21.820.388,00
811		1.4.1.6	4	mayo 23	24 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23	$ 12.667.315,00
812		1.4.1.7	4	junio 23	25 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23	$ 157.722.238,00
813		1.4.1.8	4	julio 23	23 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	$ 36.822.686,00
814		1.4.1.9	4	agosto 23	23 días	jue 30/11/23	jue 28/12/23	$ 25.191.251,00
815		1.4.1.1	4	septiembre 23	23 días	jue 28/12/23	mié 24/01/24	$ 37.478.702,00
816		1.4.1.1	4	octubre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 52.207.069,00
817		1.4.1.1	4	noviembre 23	23 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24	$ 20.418.161,60
818		1.4.1.1	4	diciembre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 20.418.161,60
819		1.4.1.1	4	enero 24	11 días	mar 20/02/24	lun 4/03/24	$ 40.836.323,20
820		1.4.1.1	4	febrero 24	11 días	mié 24/01/24	mar 6/02/24	$ 40.836.323,20
821		1.4.1.1	4	marzo 24	13 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24	$ 415.051.124,00
822		**1.4.2**	**3**	**COSTO COMPONENTE SOCIAL (C)**	**290 días**	**lun 5/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 378.880.578,00**
823		1.4.2.1	4	diciembre 22	22 días	lun 5/12/22	vie 30/12/22	$ 0,00
824		1.4.2.2	4	enero 23	25 días	lun 2/01/23	mar 31/01/23	$ 1.361.444,00
825		1.4.2.3	4	febrero 23	23 días	mié 1/02/23	mar 28/02/23	$ 8.108.044,00
826		1.4.2.4	4	marzo 23	25 días	mié 1/03/23	vie 31/03/23	$ 9.960.012,00
827		1.4.2.5	4	abril 23	23 días	vie 31/03/23	sáb 29/04/23	$ 8.461.667,00
828		1.4.2.6	4	mayo 23	24 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23	$ 4.849.671,00
829		1.4.2.7	4	junio 23	25 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23	$ 59.482.735,00
830		1.4.2.8	4	julio 23	23 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	$ 14.069.099,00
831		1.4.2.9	4	agosto 23	23 días	jue 30/11/23	jue 28/12/23	$ 9.602.349,00
832		1.4.2.1	4	septiembre 23	23 días	jue 28/12/23	mié 24/01/24	$ 13.870.060,00
833		1.4.2.1	4	octubre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 18.195.361,00
834		1.4.2.1	4	noviembre 23	23 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24	$ 10.462.661,00
835		1.4.2.1	4	diciembre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 10.462.661,00
836		1.4.2.1	4	enero 24	11 días	mar 20/02/24	lun 4/03/24	$ 20.925.322,00
837		1.4.2.1	4	febrero 24	11 días	mié 24/01/24	mar 6/02/24	$ 20.925.322,00

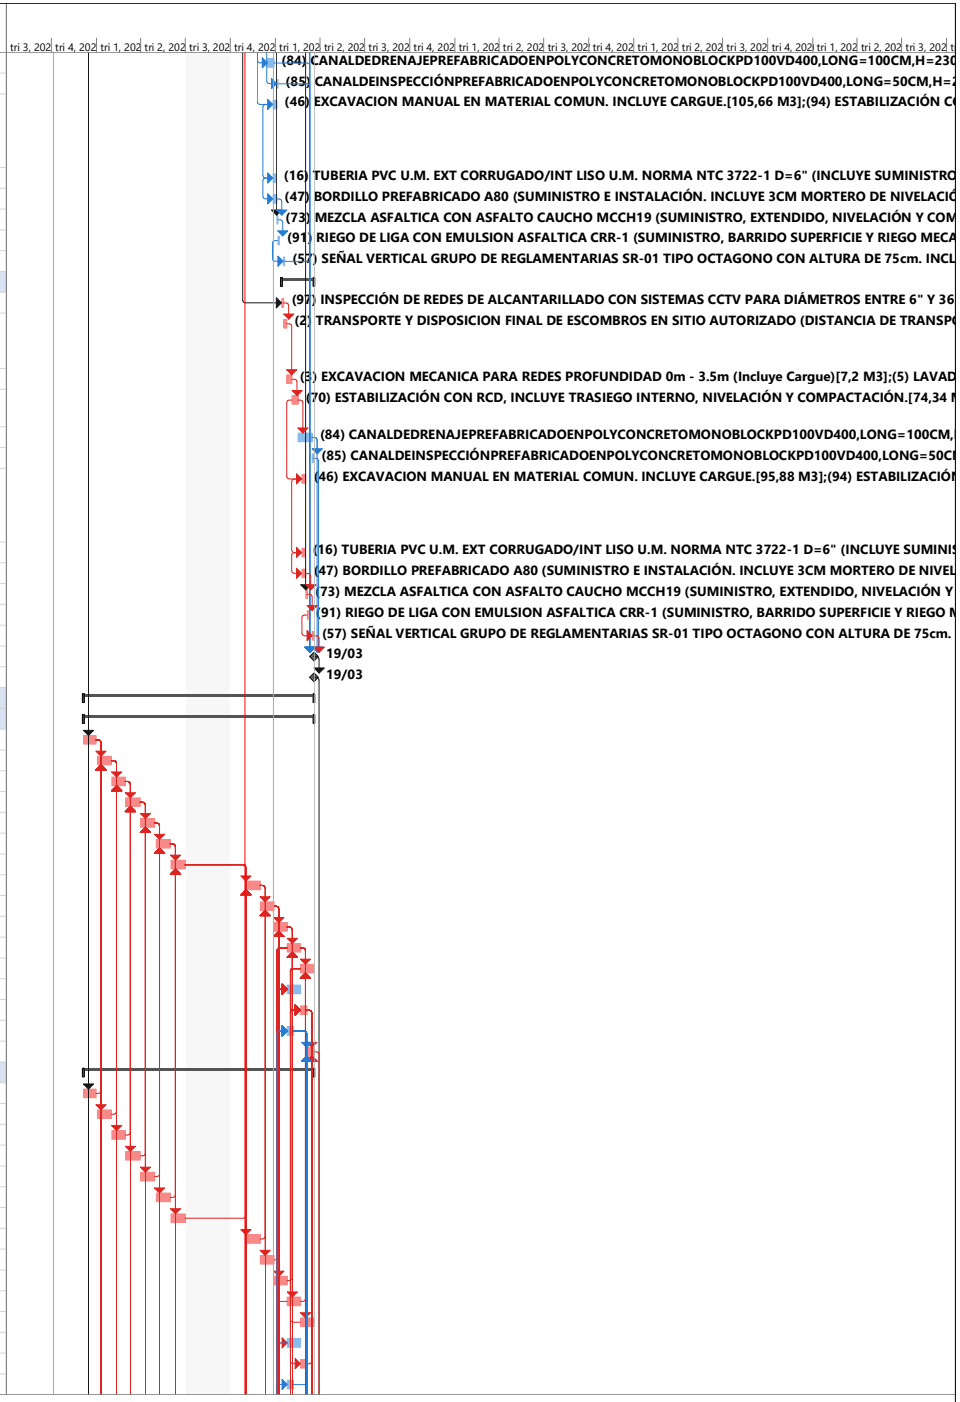

Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
838		1.4.2.1	4	marzo 24	13 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24	$ 168.144.170,00
839		**1.4.3**	**3**	**COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (D)**	**290 días**	**lun 5/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 481.633.322,80**
840		1.4.3.1	4	diciembre 22	22 días	lun 5/12/22	vie 30/12/22	$ 0,00
841		1.4.3.2	4	enero 23	25 días	lun 2/01/23	mar 31/01/23	$ 1.624.710,00
842		1.4.3.3	4	febrero 23	23 días	mié 1/02/23	mar 28/02/23	$ 9.379.327,00
843		1.4.3.4	4	marzo 23	25 días	mié 1/03/23	vie 31/03/23	$ 12.797.319,00
844		1.4.3.5	4	abril 23	23 días	vie 31/03/23	sáb 29/04/23	$ 9.035.441,00
845		1.4.3.6	4	mayo 23	24 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23	$ 5.178.521,00
846		1.4.3.7	4	junio 23	25 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23	$ 68.670.316,00
847		1.4.3.8	4	julio 23	23 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	$ 15.917.339,00
848		1.4.3.9	4	agosto 23	23 días	jue 30/11/23	jue 28/12/23	$ 11.096.831,00
849		1.4.3.1	4	septiembre 23	23 días	jue 28/12/23	mié 24/01/24	$ 16.345.993,00
850		1.4.3.1	4	octubre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 24.387.022,00
851		1.4.3.1	4	noviembre 23	23 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24	$ 14.665.606,30
852		1.4.3.1	4	diciembre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 14.665.606,30
853		1.4.3.1	4	enero 24	11 días	mar 20/02/24	lun 4/03/24	$ 29.331.212,60
854		1.4.3.1	4	febrero 24	11 días	mié 24/01/24	mar 6/02/24	$ 29.331.212,60
855		1.4.3.1	4	marzo 24	13 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24	$ 219.206.866,00
856		**1.4.4**	**3**	**AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E)**	**290 días**	**lun 5/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 1.570.000.000,00**
857		1.4.4.1	4	diciembre 22	22 días	lun 5/12/22	vie 30/12/22	$ 0,00
858		1.4.4.2	4	enero 23	25 días	lun 2/01/23	mar 31/01/23	$ 0,00
859		1.4.4.3	4	febrero 23	23 días	mié 1/02/23	mar 28/02/23	$ 0,00
860		1.4.4.4	4	marzo 23	25 días	mié 1/03/23	vie 31/03/23	$ 0,00
861		1.4.4.5	4	abril 23	23 días	vie 31/03/23	sáb 29/04/23	$ 0,00
862		1.4.4.6	4	mayo 23	24 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23	$ 0,00
863		1.4.4.7	4	junio 23	25 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23	$ 0,00
864		1.4.4.8	4	julio 23	23 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	$ 0,00
865		1.4.4.9	4	agosto 23	23 días	jue 30/11/23	jue 28/12/23	$ 0,00
866		1.4.4.1	4	septiembre 23	23 días	jue 28/12/23	mié 24/01/24	$ 0,00
867		1.4.4.1	4	octubre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 0,00
868		1.4.4.1	4	noviembre 23	23 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24	$ 0,00
869		1.4.4.1	4	diciembre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 0,00
870		1.4.4.1	4	enero 24	11 días	mar 20/02/24	lun 4/03/24	$ 864.000.000,00
871		1.4.4.1	4	febrero 24	11 días	mié 24/01/24	mar 6/02/24	$ 70.600.000,00
872		1.4.4.1	4	marzo 24	13 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24	$ 635.400.000,00
873		**1.4.5**	**3**	**COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (**	**290 días**	**lun 5/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 143.575.170,00**
874		1.4.5.1	4	diciembre 22	22 días	lun 5/12/22	vie 30/12/22	$ 0,00
875		1.4.5.2	4	enero 23	25 días	lun 2/01/23	mar 31/01/23	$ 9.571.678,00
876		1.4.5.3	4	febrero 23	23 días	mié 1/02/23	mar 28/02/23	$ 9.571.678,00
877		1.4.5.4	4	marzo 23	25 días	mié 1/03/23	vie 31/03/23	$ 9.571.678,00
878		1.4.5.5	4	abril 23	23 días	vie 31/03/23	sáb 29/04/23	$ 9.571.678,00
879		1.4.5.6	4	mayo 23	24 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23	$ 9.571.678,00
880		1.4.5.7	4	junio 23	25 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23	$ 9.571.678,00
881		1.4.5.8	4	julio 23	23 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	$ 9.571.678,00
882		1.4.5.9	4	agosto 23	23 días	jue 30/11/23	jue 28/12/23	$ 9.571.678,00
883		1.4.5.1	4	septiembre 23	23 días	jue 28/12/23	mié 24/01/24	$ 9.571.678,00
884		1.4.5.1	4	octubre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 9.571.678,00
885		1.4.5.1	4	noviembre 23	23 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24	$ 9.571.678,00
886		1.4.5.1	4	diciembre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 9.571.678,00
887		1.4.5.1	4	enero 24	11 días	mar 20/02/24	lun 4/03/24	$ 9.571.678,00
888		1.4.5.1	4	febrero 24	11 días	mié 24/01/24	mar 6/02/24	$ 9.571.678,00
889		1.4.5.1	4	marzo 24	13 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24	$ 9.571.678,00
890		**1.4.6**	**3**	**COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA (H)**	**290 días**	**lun 5/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 5.000.000,00**
891		1.4.6.1	4	diciembre 22	22 días	lun 5/12/22	vie 30/12/22	$ 0,00
892		1.4.6.2	4	enero 23	25 días	lun 2/01/23	mar 31/01/23	$ 0,00
893		1.4.6.3	4	febrero 23	23 días	mié 1/02/23	mar 28/02/23	$ 0,00
894		1.4.6.4	4	marzo 23	25 días	mié 1/03/23	vie 31/03/23	$ 0,00
895		1.4.6.5	4	abril 23	23 días	vie 31/03/23	sáb 29/04/23	$ 0,00
896		1.4.6.6	4	mayo 23	24 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23	$ 0,00
897		1.4.6.7	4	junio 23	25 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23	$ 0,00
898		1.4.6.8	4	julio 23	23 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	$ 0,00
899		1.4.6.9	4	agosto 23	23 días	jue 30/11/23	jue 28/12/23	$ 0,00

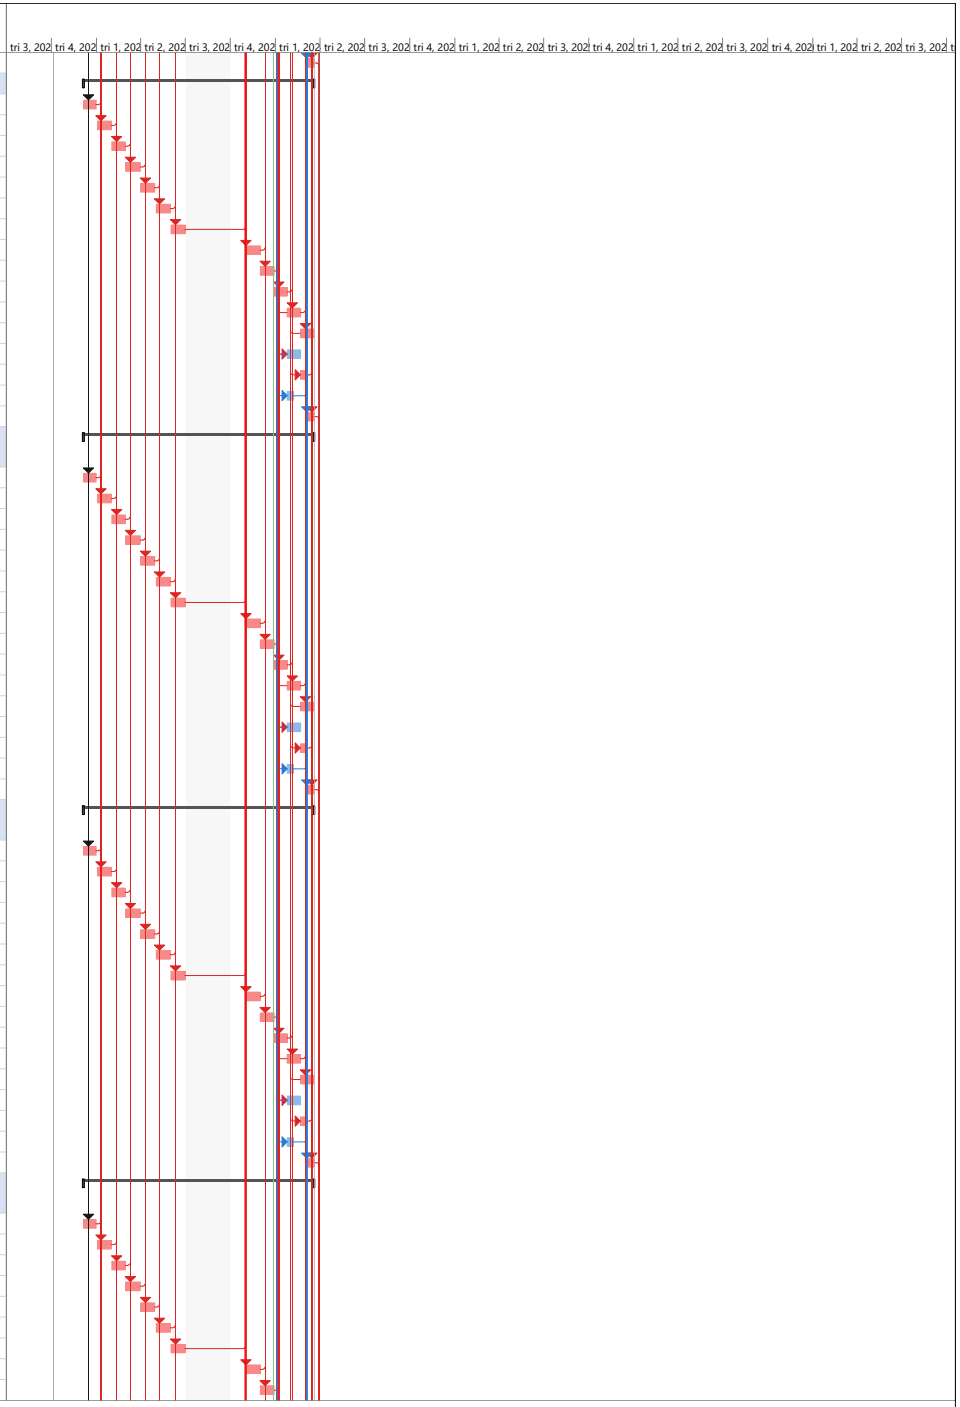

Id	Modo de tarea	EDT	Nivel de esquem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
900		1.4.6.1	4	septiembre 23	23 días	jue 28/12/23	mié 24/01/24	$ 0,00
901		1.4.6.1	4	octubre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 0,00
902		1.4.6.1	4	noviembre 23	23 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24	$ 0,00
903		1.4.6.1	4	diciembre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 0,00
904		1.4.6.1	4	enero 24	11 días	mar 20/02/24	lun 4/03/24	$ 0,00
905		1.4.6.1	4	febrero 24	11 días	mié 24/01/24	mar 6/02/24	$ 0,00
906		1.4.6.1	4	marzo 24	13 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24	$ 5.000.000,00
907		**1.4.7**	**3**	**PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19 (**	**290 días**	**lun 5/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
908		1.4.7.1	4	diciembre 22	22 días	lun 5/12/22	vie 30/12/22	$ 0,00
909		1.4.7.2	4	enero 23	25 días	lun 2/01/23	mar 31/01/23	$ 0,00
910		1.4.7.3	4	febrero 23	23 días	mié 1/02/23	mar 28/02/23	$ 0,00
911		1.4.7.4	4	marzo 23	25 días	mié 1/03/23	vie 31/03/23	$ 0,00
912		1.4.7.5	4	abril 23	23 días	vie 31/03/23	sáb 29/04/23	$ 0,00
913		1.4.7.6	4	mayo 23	24 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23	$ 0,00
914		1.4.7.7	4	junio 23	25 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23	$ 0,00
915		1.4.7.8	4	julio 23	23 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	$ 0,00
916		1.4.7.9	4	agosto 23	23 días	jue 30/11/23	jue 28/12/23	$ 0,00
917		1.4.7.1	4	septiembre 23	23 días	jue 28/12/23	mié 24/01/24	$ 0,00
918		1.4.7.1	4	octubre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 0,00
919		1.4.7.1	4	noviembre 23	23 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24	$ 0,00
920		1.4.7.1	4	diciembre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 0,00
921		1.4.7.1	4	enero 24	11 días	mar 20/02/24	lun 4/03/24	$ 0,00
922		1.4.7.1	4	febrero 24	11 días	mié 24/01/24	mar 6/02/24	$ 0,00
923		1.4.7.1	4	marzo 24	13 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24	$ 0,00
924		**1.4.8**	**3**	**AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ACTIVIDADES DE ACERO**	**290 días**	**lun 5/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
925		1.4.8.1	4	diciembre 22	22 días	lun 5/12/22	vie 30/12/22	$ 0,00
926		1.4.8.2	4	enero 23	25 días	lun 2/01/23	mar 31/01/23	$ 0,00
927		1.4.8.3	4	febrero 23	23 días	mié 1/02/23	mar 28/02/23	$ 0,00
928		1.4.8.4	4	marzo 23	25 días	mié 1/03/23	vie 31/03/23	$ 0,00
929		1.4.8.5	4	abril 23	23 días	vie 31/03/23	sáb 29/04/23	$ 0,00
930		1.4.8.6	4	mayo 23	24 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23	$ 0,00
931		1.4.8.7	4	junio 23	25 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23	$ 0,00
932		1.4.8.8	4	julio 23	23 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	$ 0,00
933		1.4.8.9	4	agosto 23	23 días	jue 30/11/23	jue 28/12/23	$ 0,00
934		1.4.8.1	4	septiembre 23	23 días	jue 28/12/23	mié 24/01/24	$ 0,00
935		1.4.8.1	4	octubre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 0,00
936		1.4.8.1	4	noviembre 23	23 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24	$ 0,00
937		1.4.8.1	4	diciembre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 0,00
938		1.4.8.1	4	enero 24	11 días	mar 20/02/24	lun 4/03/24	$ 0,00
939		1.4.8.1	4	febrero 24	11 días	mié 24/01/24	mar 6/02/24	$ 0,00
940		1.4.8.1	4	marzo 24	13 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24	$ 0,00
941		**1.4.9**	**3**	**AJUSTE AL VALOR DEL CONTRATO POR PROPUESTA ECONOMICA**	**290 días**	**lun 5/12/22**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
942		1.4.9.1	4	diciembre 22	22 días	lun 5/12/22	vie 30/12/22	$ 0,00
943		1.4.9.2	4	enero 23	25 días	lun 2/01/23	mar 31/01/23	$ 0,00
944		1.4.9.3	4	febrero 23	23 días	mié 1/02/23	mar 28/02/23	$ 0,00
945		1.4.9.4	4	marzo 23	25 días	mié 1/03/23	vie 31/03/23	$ 0,00
946		1.4.9.5	4	abril 23	23 días	vie 31/03/23	sáb 29/04/23	$ 0,00
947		1.4.9.6	4	mayo 23	24 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23	$ 0,00
948		1.4.9.7	4	junio 23	25 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23	$ 0,00
949		1.4.9.8	4	julio 23	23 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	$ 0,00
950		1.4.9.9	4	agosto 23	23 días	jue 30/11/23	jue 28/12/23	$ 0,00
951		1.4.9.1	4	septiembre 23	23 días	jue 28/12/23	mié 24/01/24	$ 0,00
952		1.4.9.1	4	octubre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 0,00
953		1.4.9.1	4	noviembre 23	23 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24	$ 0,00
954		1.4.9.1	4	diciembre 23	23 días	mié 24/01/24	mar 20/02/24	$ 0,00
955		1.4.9.1	4	enero 24	11 días	mar 20/02/24	lun 4/03/24	$ 0,00
956		1.4.9.1	4	febrero 24	11 días	mié 24/01/24	mar 6/02/24	$ 0,00
957		1.4.9.1	4	marzo 24	13 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24	$ 0,00
958		**1.4.10**	**3**	**ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**
959		**1.4.11**	**3**	**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL DE OBRA**	**0 días**	**mar 19/03/24**	**mar 19/03/24**	**$ 0,00**

